

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 4
Dirección Provincial Manabí

PROYECTO: K090 MTOP -Programa de apoyo al desarrollo vial de los gobiernos autonomos descentralizado (plan de repavimentación y construcción de varias calles del cantón Jipijapa).

Líder del Proyecto:	Negrete Vélez, Claudio Fabián (cnegrete@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Programas Relacionados:	
Titular:	Zambrano Pincay, Geomar Dumar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.373954	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	900,000.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	08/08/2019 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	03/12/2019	Fecha de Fin Base:	31/03/2020
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2020

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción: Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el MTOP y el GAD Municipal de Jipijapa, para la transferencia de recursos para la ejecución del plan de repavimentación y construcción de varias calles del cantón Jipijapa
 Producto: Ejecución del plan de repavimentación y construcción de varias calles del cantón Jipijapa, a través de la ejecución.

Línea base: Convenio Marco entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el GAD de Jipijapa firmado el 8/8/2019, en el cual el MTOP se compromete a realizar las gestiones de ser el caso, ubicar y transferir las inversiones que se tienen previstas para promover y ejecutar el plan de repavimentación y construcción de varias calles del cantón Jipijapa.

Objetivo: El objeto del convenio es transferir a favor del Gobierno Descentralizado Municipal de Jipijapa Provincia de Manabí, el monto de NOVECIENTOS MIL CON 00/100 (USD 900.000,00), como parte del MTOP para financiar el plan de repavimentación y construcción de varias calles del cantón Jipijapa por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Objetivo específico: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas transferirá al Gobierno Municipal de Jipijapa el 100% de los (USD 900.000,00) de acuerdo con la planificación presupuestaria de la Dirección Distrital de Manabí.

Beneficios Cualitativos

El convenio específico de cooperación interinstitucional entre el MTOP y el GAD Municipal de Jipijapa, para la transferencia de recursos para la ejecución del plan de repavimentación y construcción de varias calles del cantón Jipijapa, beneficiará a la ciudadanía en general del cantón, permitiendo que el GAD ejecute el proyecto que permitirá tener un mejor servicio, mejorando estéticamente la urbe, elevando el nivel de vida de sus habitantes, facilitando la movilidad, el comercio y el turismo del cantón.

Tipo de Beneficiario

Población en general del cantón, transeúntes, comerciantes, turistas, entre otros.

Restricciones


Tiempo: El convenio tendrá una validez de 5 meses, contados desde el 29 de octubre de 2019.

Costo: El costo del convenio es de USD 900.000,00, si en la ejecución del proyecto se necesitaran más recurso, estos tendrían que ser asumidos por el GAD de Jipijapa.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 22.85 %
 Fecha de Inicio: 08/08/2019 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

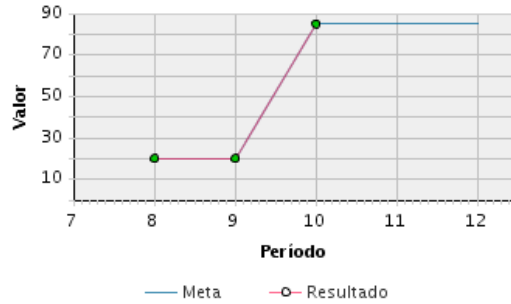

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
								20 %	20 %	85 %	85 %	85 %
	Avance real acumulado											
								20 %	20 %	85 %		
Estado												
								●	●	●		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Noviembre 2019: Se realiza la transferencia de recursos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas al GAD cantonal de Jipijapa.	Zambrano Pincay, Geomar Dumar	02/12/2019 - 04:28 PM
Octubre: El 29 de Octubre de 2019, se firma el Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el MTOP y el GAD Municipal de Jipijapa, para la transferencia de recursos para la ejecución del plan de repavimentación y construcción de varias calles del cantón Jipijapa.	Zambrano Pincay, Geomar Dumar	02/12/2019 - 04:23 PM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Definición: Firma de Convenio Marco, entre MTOP y GAD de Jipijapa.	Z - Compromiso Ministerial	08/08/2019		08/08/2019	●	Sí	20.0
2	Planeación: Entrega de proyecto de repavimentación y construcción de varias calles del cantón Jipijapa del GAD cantonal	5-Entregables Intermedios	14/10/2019		14/10/2019	●	Sí	5.0
3	Planeación: Validación componente ambiental Plan de Repavimentación y Construcción de Varias calles del cantón Jipijapa, por parte del Subsecretaria Zonal 4 MTOP.	5-Entregables Intermedios	15/10/2019		15/10/2019	●	Sí	5.0
4	Planeación: Validación proyecto Plan de	5-Entregables Intermedios	15/10/2019		15/10/2019	●	Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Repavimentación y Construcción de Varias calles del cantón Jipijapa, por parte del Subsecretaria Zonal 4 MTOP.							
5	Planeación: Aval para transferencia de recursos al GAD de Jipijapa.	5-Entregables Intermedios	28/10/2019		28/10/2019		Sí	5.0
6	Ejecución: Firma del Convenio del convenio específico de cooperación interinstitucional entre el MTOP y el GAD Municipal de Jipijapa.	9-Entregables Formales	29/10/2019		29/10/2019		Sí	40.0
7	Planeación: Certificación Presupuestaria para transferencia de recursos a GAD de Jipijapa.	5-Entregables Intermedios	29/10/2019		29/10/2019		Sí	5.0
8	Cierre: Entrega del acta de recepción provisional por parte del GAD cantonal de jipijapa de los trabajos de Repavimentación y Construcción de Varias calles del cantón Jipijapa	9-Entregables Formales	30/06/2020	30/06/2020			No	5.0
9	Completado: Entrega del acta de recepción definitiva por parte del GAD cantonal de jipijapa de los trabajos de Repavimentación y Construcción de Varias calles del cantón Jipijapa	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2020	31/12/2020			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	900,000.00 **
Costo Total:	900,000.00
Total Devengado:	900,000.00
% Costo Total Devengado:	100.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 100.00 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
Ppto. Codificado	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
Ppto. Devengado	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
Pagado Real	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
Estimado a fin de año	* 0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Nov	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00		900,000.00				
Total	900,000.00	900,000.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
----	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el MTOP y el GAD Municipal de Jipijapa.	Convenio_especifico_de_cooperación_interinstitucional_entre_MTOP_y_el_GAD_Municipal_de_Jipijapa_Firmado_incluye_antecedentes..pdf	03/11/2019
2	Firma de Convenio Marco, entre MTOP y GAD de Jipijapa.	Convenio_Marco_entre_MTOP_y_GAD_de_Jipijapa-Firmado..pdf	03/12/2019
3	Transferencia Convenio.	Cedula_presupuestaria_y_Devengado..pdf	02/12/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Patrocinador ejecutivo.	Subsecretario Zonal 4	iganchozo@mtop.gob.ec	023974600
Negrete Vélez, Claudio Fabián	Lider de Seguimiento convenio.	Supervisor de Obra Manabí	cnegrete@mtop.gob.ec	023974600
Zambrano Pincay, Geomar Dumar	Administrador del Convenio.	Director Distrital MTOP-Manabí.	gdzambrano@mtop.gob.ec	
