

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Cañar

PROYECTO: K023 MTOP- Mantenimiento Vial de la Provincia del Cañar

Líder del Proyecto:	Dután Sanango, Italo Medardo (imдутан@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, Provincia - Cañar, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3657	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,194,511.97
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2008 - 31/03/2022
Fecha de última actualización:	05/12/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Dután Sanango, Italo Medardo	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION:

La conservación de la red vial estatal de Cañar, durante el periodo comprendido entre el año 2008 - 2019, está supeditado por un incremento acelerado de vehículos, que consecuentemente genera un aumento en el uso y desgaste de las vías. Esta situación generó la necesidad de implementar el programa de conservación vial por Administración Directa, generando un compromiso para lograr la permanente movilidad, seguridad, economía y comodidad en la circulación vial, realizar de manera efectiva el mantenimiento de las vías, atender oportunamente las demandas prioritarias de la comunidad y hacer un uso eficiente de los recursos disponibles.

Para el efecto, mediante el Acuerdo Ministerial 001-12-2001 en su artículo 3, establece que la Red Vial Estatal está constituida por todas las vías administradas por el MTOP, como única entidad encargada del manejo y control.

El Acuerdo Ministerial No. 059 de 22 de junio de 2015, en su Capítulo 3. DE LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA, 3.5 PROCESOS DESCONCENTRADOS, 3.5.2 DIRECCIÓN DISTRITAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: el numeral 14 faculta a Supervisar y controlar la ejecución de las obras de Conservación de Infraestructura del Transporte contratados y los que se realicen por administración directa

Línea base del Proyecto.

Al tratarse de un proyecto de mantenimiento vial, la línea base del proyecto está determinado por el estado en que se encuentra el inventario vial de la provincia, el 75% de las vías estatales de la provincia están intervenidas con mantenimiento vial. Desde este punto de vista, el estado actual de la infraestructura vial que es administrada por el MTOP y forman parte del programa de mantenimiento vial de la provincia de Cañar se presenta de la siguiente manera:

RIO ANGAS LTE PROV/CAÑAR/CHIMBORAZO-ZHUD
 ZHUD-CAÑAR
 CAÑAR-BIBLIAN
 EL DESCANSO-AZOGUES-BIBLIAN
 ZHUD-DUCUR
 DUCUR-COCHANCAJ
 COCHANCAJ-LATRONCAL-MANUEL J. CALLE (EL TRIUNFO)
 LIMITE GUAYAS/CAÑAR - VENTURA LIMITE CAÑAR/CHIMBORAZO
 LA TRONCAL-PANCHO NEGRO-LTE PROV. GUAYAS/CAÑAR
 AZOGUES INTERSECCIÓN ESTADIO-CEMENTERIO- "Y" DE MATRAMA "Y" DE PAUTE
 "Y" DE MATRAMA -MAZAR (REPRESA) - CRUCE CON E40 (PAUTE/SAN PABLO/MENDEZ)

Objetivo General.-

DATOS GENERALES

Descripción

Mantener la infraestructura vial de la provincia en buenas condiciones de movilidad, con requerimientos de infraestructura vial de primer nivel, para garantizar un servicio de calidad y seguridad vial.

Objetivos específicos.

Garantizar la operatividad de la Unidad Ejecutora para intervenir con acciones de mantenimiento vial en la red estatal no concesionada. Mantener un nivel administrativo óptimo que permita gestionar, ejecutar, supervisar y controlar el uso de los recursos del Estado en la inversión del programa de Mantenimiento vial de la provincia.

Beneficios Cualitativos

Permitir un mayor y mejor desarrollo socio económico de las poblaciones involucradas al contar con una vía que permite mejorar la capacidad de circulación vehicular, imagen y seguridad de la población.

Proveer de una vía de comunicación y transporte eficiente y segura para los habitantes del sector y usuarios en general.

Conservar la inversión realizada por el estado en las vías.

Reducir el tiempo de viaje, con lo que se produce un ahorro económico.

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Directos: Para efectos del proyecto, se considera como beneficiarios directos a aquellos que están intervenidos por las vías estatales a cargo del mantenimiento vial por administración Directa; así, tenemos los Cantones Azogues, Biblián, Cañar, Tambo, Suscal y Troncal; estableciéndose que la población de demanda efectiva es de 219084 habitantes.

Beneficiarios Indirectos: Los beneficiarios indirectos se consideran a las personas que visitan la provincia por motivos turísticos, y/o por comercio, por lo que se considera que la población es de 16730 habitantes.

Restricciones

Tiempo: El plazo para el mantenimiento es anual, el mismo que será programado hasta el 2021, luego de lo cual se solicitará actualización de dictamen para ampliar el plazo.

Costo: El valor total para el mantenimiento es aproximadamente de USD \$500.000,00 por año,

Calidad: Las actividades de mantenimiento necesarias para la conservación de la infraestructura implementada deben cumplir con lo siguiente:

Conservar la inversión existente en la red vial estatal de la provincia.

Brindar adecuados niveles de seguridad, servicialidad y comodidad a los usuarios viales.

Contar con carreteras debidamente señalizadas y con seguridad vial

Mejorar las carreteras existentes a través de inversiones menores.

Recursos: Se considera tres grupos:

Recursos Financieros: La limitación en recursos económicos en el país podría causar que no se disponga de los insumos necesarios para poder ejecutar el mantenimiento vial correctamente.

Recursos Humanos: la falta de personal o gente especializada podría causar retrasos en el desarrollo del proyecto.

Recursos Tecnológico: Existe restricción en el suministro de materiales para la ejecución del mantenimiento, como en la compra de mezcla asfáltica, equipos, pinturas para señalización.

Riesgo: La falta de recursos causaría el retraso en el mantenimiento vial

Alcance: La administración y operación de las vías de Cañar, prevé la conservación de la infraestructura implementada bajo el cumplimiento de estándares de calidad; para lograr un mantenimiento vial que conserve las condiciones de la red vial y en consecuencia, sea satisfactorio para los usuarios se centra en la aplicación de un sistema de trabajo permanente y eficiente.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 84.26 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2008 Fecha de Fin: 31/03/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	76 %	76 %	78 %	78 %	78 %	80 %	80 %	80 %	81 %	81 %	81 %	82 %
	Avance real acumulado											
	76 %	76 %	78 %	78 %	78 %	78 %	80 %	80 %	81 %			
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Panamericana El Descanso - Azogues - Biblián, Vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián, Zhud - Biblián. Se contratan 4 microempresas a partir del 26/11/2019 para realizar mantenimiento rutinario en los siguientes tramos: Carretera Matrama Mazar: Tramo 1 (Matrama - Pindilig, de 30 km); Tramo 2 (Pindilig - Mazar, de 30 km) Carretera La Troncal - Puerto Inca, de 27 km. Carretera Zhud - Cochancay - El Triunfi: Tramo Chilchil - El Chorro, de 33 km.</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>Limpieza de derrumbes, bacheo asfáltico y reconfiguración de calzada en tramos de la vía Matrama - Mazar. Limpieza de derrumbes con maquinaria del MTOP provocados por fuertes lluvias en la Panamericana El Descanso - Azogues - Biblián y en la Vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián. Colocación de tachas reflectivas en las zona urbana del cantón Cañar. Carretera Zhud - Biblián Colocación de tachas reflectivas en las zona urbana del cantón La Troncal. Carretera Zhud - Cochancay - El Triunfo. Mantenimiento rutinario con microempresas en los tramos establecidos.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/12/2019 - 01:19 PM
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas.</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>Bacheo asfáltico en la vía Zhud- Biblián. Limpieza de derrumbes en la vía Matrama - Mazar.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/11/2019 - 04:16 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar, hasta el 25 de septiembre de 2019.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	02/10/2019 - 09:54 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>Limpieza de cunetas, roza a mano y alcantarillas en la vía Zhud - Cochancay; Zhud - Río Angas. Reconstrucción de muro de gaviones en la vía Zhud- Biblián. Limpieza de derrumbes en la vía Matrama - Mazar.</p>		
<p>AGOSTO 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar.</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>Limpieza de cunetas, roza a mano y alcantarillas en la vía Zhud - Cochancay; Zhud - Río Angas. Bacheo asfáltico en diferentes tramos de la vía Zhud- Biblián. Limpieza de derrumbes en la vía Matrama - Mazar.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	03/09/2019 - 05:15 PM
<p>JULIO 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar.</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>Terminación de la construcción de muro de gaviones sector Rumiurco de la vía Azogues - Descanso. Limpieza de cunetas, roza a mano y alcantarillas en la vía Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Bacheo asfáltico en los sectores de Javin y Chilchil, pertenecientes al Tramo Zhud- Cochancay.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	01/08/2019 - 12:41 PM
<p>JUNIO 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar.</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>Construcción de muro de gaviones sector Rumiurco de la vía Azogues - Descanso. Limpieza de cunetas, roza a mano y alcantarillas en la vía Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/07/2019 - 11:05 AM
<p>MAYO 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	03/06/2019 - 03:46 PM
<p>ABRIL 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay - El Triunfo y Pasos Laterales; y, Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	02/05/2019 - 08:18 AM
<p>MARZO 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay - El Triunfo y Pasos Laterales; y, Zhud - Biblián, panamericana antigua tramo Biblián - Descanso. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud Río Angas y Matrama Mazar.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	02/04/2019 - 04:21 PM
<p>FEBRERO 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián. Se ha contratado 2 microempresas desde el 26 y 27 de febrero de 2019, las mismas que atienden los tramos: Zhud Río Angas y Matrama Mazar.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/03/2019 - 10:29 AM
<p>ENERO 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/03/2019 - 10:28 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se ha contratado 2 microempresas desde el 26 y 27 de febrero de 2019, las mismas que atienden los tramos: Zhud Río Angas y Matrama Mazar.		
ENERO 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián. Se ha iniciado la gestión para obtener recursos para la contratación de microempresas.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	05/02/2019 - 08:14 AM
DICIEMBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vía Zhud - Biblián. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Río Angas.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	04/01/2019 - 08:09 AM
NOVIEMBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; Y Zhud - Río Angas.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/12/2018 - 05:07 PM
OCTUBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; Y Zhud - Río Angas.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/11/2018 - 04:09 PM
SEPTIEMBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/10/2018 - 12:31 PM
AGOSTO 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Buestan Toral, José Remigio	05/09/2018 - 05:30 PM
JULIO 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Dután Sanango, Italo Medardo	03/08/2018 - 10:45 AM
JUNIO 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/07/2018 - 12:31 PM
Mayo2018 Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/06/2018 - 04:46 PM
Abril 2018 Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 4 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/05/2018 - 02:08 PM
Marzo 2018	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/04/2018 - 04:18 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 4 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso.		
Febrero 2018 Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Descanso - Azogues, y Troncal - Puerto Inca. No se ha logrado contratar a las microempresas por falta de aprobación del aval para el servicio de voluntariado.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:52 AM
ENERO 2018 Se realiza mantenimiento de la vía matrama - Mazar por administración directa, puesto que no se ha podido contratar a las microempresas.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:50 AM
DICIEMBRE 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, con el propósito de mantener la vía en condiciones de transitabilidad confiable para los usuarios.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/01/2018 - 04:48 PM
NOVIEMBRE 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, con el propósito de mantener la vía en condiciones de transitabilidad confiable para los usuarios.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/12/2017 - 04:15 PM
OCTUBRE 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano. Además se coloca tachas en la vía Azogues - Matrama con la ayuda de los microempresarios.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 11:48 AM
SEPTIEMBRE 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/10/2017 - 03:38 PM
AGOSTO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/09/2017 - 05:53 PM
JULIO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial	García González, Mariana Alexandra	05/08/2017 - 09:29 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano		
<p>JUNIO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante la limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte época invernal en la red vial estatal.. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano.</p>	García González, Mariana Alexandra	05/07/2017 - 10:29 AM
<p>MAYO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte época invernal en la red vial estatal.. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar con tres microempresas de conservación vial contratadas</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	01/06/2017 - 11:28 AM
<p>ABRIL 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte época invernal en la red vial estatal.. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar con tres microempresas de conservación vial contratadas</p>	García González, Mariana Alexandra	05/05/2017 - 12:37 PM
<p>MARZO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte época invernal Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 02:13 PM
<p>FEBRERO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte época invernal Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 02:12 PM
<p>FEBRERO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/03/2017 - 01:35 PM
<p>DICIEMBRE 2016 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes y bacheo en la carretera Matrama-Mazar, en la carretera descansos-azogues-biblian (panamericana) Y en la carretera Zhud-Biblián se encuentran realizando limpieza de cunetas, bordillos y roza a mano</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/01/2017 - 07:03 PM
<p>NOVIEMBRE 2016 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes y bacheo en la carretera Matrama-Mazar, en la carretera descansos-azogues-biblian (panamericana) Y en la carretera Zhud-Biblián se encuentran realizando limpieza de cunetas, bordillos y roza a mano</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/12/2016 - 03:07 PM
<p>OCTUBRE 2016 los contratos de las microempresas culmino por falta de recursos . Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazary la carretera descansos-azogues-biblian (panamericana)</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/11/2016 - 06:33 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de alcantarillas desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p>	<p>04/10/2016 - 07:46 PM</p>
<p>AGOSTO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de alcantarillas desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>01/09/2016 - 07:51 AM</p>
<p>JULIO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 5+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>04/08/2016 - 12:30 PM</p>
<p>JUNIO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 10+000 al 19+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>04/07/2016 - 02:32 PM</p>
<p>MAYO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>05/06/2016 - 08:12 PM</p>
<p>ABRIL 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 30+000 al Km 60+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>05/05/2016 - 07:43 AM</p>
<p>MARZO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 00+000 al Km 30+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>04/04/2016 - 09:32 PM</p>
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 30+000 al Km 50+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>06/03/2016 - 05:26 PM</p>
<p>ENERO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 20+000 al Km 50+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>05/02/2016 - 10:45 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 30+000</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>06/01/2016 - 07:38 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
al Km 69+000 de la carretera Matrama-Mazar		
NOVIEMBRE 2015: Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 30+000 al Km 69+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/12/2015 - 10:21 AM
OCTUBRE 2015: Personal y maquinaria del MTOP continua con la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/11/2015 - 10:25 PM
SEPTIEMBRE 2015 Personal y maquinaria del MTOP continua con la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/10/2015 - 04:22 PM
AGOSTO 2015 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2015 - 10:24 AM
JULIO 2015 Por la fuerte temporada invernal En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de derrumbes y alcantarillas con personal y maquinaria del MTOP Km 30 +000 al 69+000..	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2015 - 09:28 PM
JUNIO 2015 En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños desde el Km 40 +000 al 69+000..	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/07/2015 - 03:42 PM
MAYO 2015 En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 10+000 al 19+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/06/2015 - 02:17 PM
ABRIL 2015 En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 00+000 al 10+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/05/2015 - 07:48 AM
MARZO 2015 En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 10+000 al 19+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2015 - 03:35 PM
FEBRERO 2015 En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos. E la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/03/2015 - 09:41 AM
ENERO 2014 En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/02/2015 - 03:21 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
realizando la limpieza de cunetas, bordillos y limpieza del derecho de vía. en la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando el bacheo asfáltico desde el Km 6+000 al 19+000.		
DICIEMBRE 2014 Se esta realizando el bacheo asfáltico en la carretera Biblian-Azogues-Descanso, antigua panamericana, tambien la limioieza de cunetas y bordillos en la carretera Azogues-Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2015 - 11:49 AM
NOVIEMBRE 2014 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos. Tambien se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos del tramo Azogues a Matrama.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/12/2014 - 03:21 PM
OCTUBRE 2014 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos. Tambien se esta realizando la limpieza de derrumbes pequeños en el tramo comprendido entre el Km 50 + 000 al 60 +000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/11/2014 - 09:31 PM
SEPTIEMBRE 2014 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de derrumbes pequeños.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/10/2014 - 12:09 PM
AGOSTO 2014 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta restituyendo una alcantarilla en el sector de Buenos Aires en la carretera Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2014 - 08:44 PM
JULIO 2014 En la carretera Matrama-mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos, como tambien de derrumbes pequeños con personal y maquinaria del MTOP y la microempresa.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2014 - 10:39 PM
JUNIO 2014 En la carretera Matrama-mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos, como tambine de derrumbes pequeños.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	10/07/2014 - 08:31 AM
MAYO 2014 En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos y tambien alcantarillas. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos como tambien la limpieza de derrumbes pequeños.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	03/06/2014 - 02:34 PM
ABRIL 2014 En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos como tambien la limpieza de alcantarillas.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/05/2014 - 08:05 PM
MARZO 2014 En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando el sellado de fisuras.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2014 - 07:40 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos. Se esta limpiando alcantarillas con ayuda de la excavadora 320 en el sector de Buenos Aires.		
FEBRERO 2014 En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando mla limpieza de cunetas, En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de Alcantarillas.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	28/02/2014 - 09:31 AM
ENERO 2014 En la carrtera Matrama-Mazar, en el tramo entre Buenos Aires y Rivera se esta realizando el bacheo con mezcla asfaltica.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2014 - 07:27 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Deformaciones en la red vial estatal	05/12/2019	Galo Fernando Izquierdo Campoverde	20	20	4	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2014 contratada.	3-Adjudicación	10/01/2014		10/01/2014		Sí	2.0
2	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2014 contratada	3-Adjudicación	10/01/2014		10/01/2014		Sí	2.0
3	EJECUCION: Bacheo asfaltico desde el Km 30+000 al 60+000 en la carretera Matrama-Mazar realizado	5-Entregables Intermedios	15/05/2014		15/05/2014		Sí	2.0
4	EJECUCION: Bacheo asfaltico desde el Km 00+000 al 19+000 en la carretera Descanso-Biblian realizado	5-Entregables Intermedios	15/06/2014		15/06/2014		Sí	2.0
5	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2014 realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	15/07/2014		15/07/2014		Sí	2.0
6	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente	5-Entregables Intermedios	15/07/2014		15/07/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2014 realizado a satisfaccion del MTOP							
7	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera Azogues-Matrama-Mazar realizado.	5-Entregables Intermedios	15/08/2014		15/08/2014		Sí	3.0
8	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera biblian-Azogues-Descanso realizado	5-Entregables Intermedios	15/09/2014		15/09/2014		Sí	3.0
9	EJECUCION: Bacheo asfaltico desde el Km 00+000 al 30+000 en la carretera Matrama-Mazar realizado.	5-Entregables Intermedios	15/10/2014		15/10/2014		Sí	2.0
10	EJECUCION: Limpieza de derrumbes en la carretera matrama-mazar realizado.	5-Entregables Intermedios	15/11/2014		15/11/2014		Sí	3.0
11	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	3.0
12	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
13	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2015 contratada.	3-Adjudicación	10/01/2015		10/01/2015		Sí	2.0
14	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2015 contratada.	3-Adjudicación	10/01/2015		10/01/2015		Sí	2.0
15	EJECUCION: Bacheo asfaltico desde el Km 30+000 al 60+000 en la carretera Matrama-Mazar realizado.	5-Entregables Intermedios	15/05/2015		15/05/2015		Sí	2.0
16	EJECUCION: Bacheo asfáltico desde el Km 00+000 al 19+000 en la carretera Descanso-Biblian realizado.	5-Entregables Intermedios	15/06/2015		15/06/2015		Sí	2.0
17	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2015 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	15/07/2015		15/07/2015		Sí	3.0
18	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo	5-Entregables Intermedios	15/07/2015		15/07/2015		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Enero a Junio del 2015 realizado a satisfacción del MTOP.							
19	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera Azogues-Matrama-Mazar realizado.	5-Entregables Intermedios	15/08/2015		15/08/2015		Sí	3.0
20	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera biblian-Azogues-Descanso realizado.	5-Entregables Intermedios	15/09/2015		15/09/2015		Sí	3.0
21	EJECUCION: Bacheo asfáltico desde el Km 00+000 al 30+000 en la carretera Matrama-Mazar realizado.	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		15/10/2015		Sí	3.0
22	EJECUCION: Limpieza de derrumbes en la carretera matrama-mazar concluido.	5-Entregables Intermedios	15/11/2015		15/11/2015		Sí	3.0
23	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2015 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	3.0
24	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso (antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	3.0
25	EJECUCION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2016 contratada.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		16/05/2016		Sí	2.0
26	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el periodo de Enero a Junio del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	19/07/2016		19/07/2016		Sí	1.0
27	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	19/07/2016		19/07/2016		Sí	1.0
28	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
29	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso (antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2016	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	realizado a satisfacción del MTOP.							
30	EJECUCION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-Mazar para el 2017 contratado.	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/02/2017		Sí	1.0
31	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el periodo de enero a junio 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	24/07/2017		31/12/2017		Sí	1.0
32	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	24/07/2017		31/12/2017		Sí	1.0
33	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	1.0
34	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2017 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	1.0
35	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2017		31/12/2017		Sí	1.0
36	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a junio 2018 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	1.0
37	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.5
38	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Diciembre del 2018 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.0
39	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Troncal - Puerto Inca en el periodo de Enero a Diciembre del 2018 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.0
40	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio - diciembre 2018 realizado a satisfacción del MTOP							
41	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Febero a Marzo del 2019 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	29/03/2019		29/03/2019		Sí	2.0
42	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Abril a Junio del 2019 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	28/06/2019		01/07/2019		Sí	1.0
43	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.5
44	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Julio a Septiembre del 2019 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.0
45	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Octubre a Diciembre del 2019 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
46	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Febero a Marzo del 2020 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	01/04/2020			No	1.0
47	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Abril a Junio del 2020 Realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	01/07/2020			No	1.0
48	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Julio a Septiembre del 2020 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	01/10/2020			No	1.0
49	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2020	31/12/2020			No	0.5
50	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	01/01/2021			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Octubre a Diciembre del 2020 realizado a satisfacción del MTOP							
51	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Febero a Marzo del 2021 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/03/2021	02/04/2021			No	0.5
52	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Abril a mayo del 2021 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/05/2021	31/05/2021			No	0.5
53	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Mayo a Junio del 2021 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	0.5
54	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Junio a julio del 2021 realizado a satisfacción del MTOP	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/07/2021	31/07/2021			No	0.5
55	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Julio a Agosto del 2021 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/08/2021	31/08/2021			No	0.5
56	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Agosto a Septiembre del 2021 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	0.5
57	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Septiembre a Octubre del 2021 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/10/2021	31/10/2021			No	0.5
58	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Octubre a Noviembre del 2021 Realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/11/2021	30/11/2021			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
59	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2021	31/12/2021			No	1.0
60	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Noviembre a Diciembre del 2021 Realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5
61	CIERRE: Informes del Supervisor aprobados	5-Entregables Intermedios	04/01/2022	04/01/2022			No	1.0
62	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	10/01/2022	10/01/2022			No	1.0
63	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado.	9-Entregables Formales	15/02/2022	15/02/2022			No	2.0
64	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	5-Entregables Intermedios	22/02/2022	22/02/2022			No	1.0
65	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	25/02/2022	25/02/2022			No	1.0
66	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	15/03/2022	15/03/2022			No	1.5
67	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/03/2022	31/03/2022			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión Positiva: Limpieza de cunetas y bordillos	Quishpi Vélez, Luis Manuel	{PR} - Provincia - CAÑAR	31/08/2017
2	Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza y mantenimiento	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	20/07/2016
3	Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza en la vía.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/04/2016
4	Supervisión Positiva- Se realizan mantenimientos en diferentes vías	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/11/2015
5	Limpieza de cunetas y lastrado de las vías en las Parroquias	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/05/2015
6	Verificación de la terminación del Proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2015
7	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/10/2014
8	Mantenimiento vial, limpieza de derrumbes	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/05/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Km de la Red Vial en buen estado		100.00 %	0.65	0.65	01/01/2014	Noviembre
2	Porcentaje de cumplimiento económico del cronograma		100.00 %	0.96	0.96	01/01/2014	Noviembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,194,511.97 **
Costo Total:	10,692,966.81
Total Devengado:	2,876,428.38
% Costo Total Devengado:	26.90 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 26.90 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,628,872.00	3,140,000.00	0.00	4,768,872.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	2,401,029.99	324,433.13	0.00	2,725,463.12
Ppto. Codificado	2,091,963.90	811,910.15	0.00	2,903,874.05
Ppto. Comprometido	1,643,552.68	403,683.25	0.00	2,047,235.93
Planeado - Codificado (2019)		2,328,089.85		
Programado a Devengar	2,732,384.37	721,711.79	0.00	3,454,096.16
Ppto. Devengado	2,472,800.18	403,628.20	0.00	2,876,428.38
Pagado Real	1,576,194.53	266,492.79	0.00	1,842,687.32
Estimado a fin de año	* 2,472,800.18	811,910.15	0.00	3,284,710.33
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	259,584.19	-90,198.36	0.00	169,385.83
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 90.50 %	55.93 %	0.00 %	83.28 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

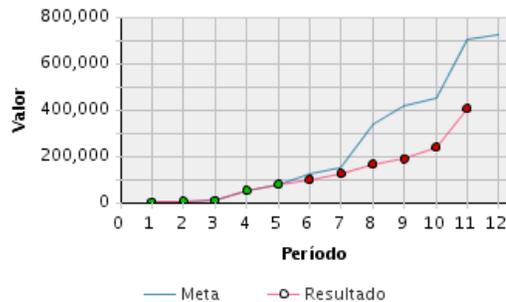

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	2,877.22	2,877.22	2,877.22	2,877.22	100.00 %	●	0.40 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	2,877.22	3,095.80	5,754.44	5,973.02	103.80 %		0.83 %
Mar	2,877.22	3,095.80	8,631.66	9,068.82	105.06 %		1.26 %
Abr	43,508.23	43,508.25	52,139.89	52,577.07	100.84 %		7.29 %
May	26,692.56	25,223.55	78,832.45	77,800.62	98.69 %		10.78 %
Jun	41,937.01	22,063.78	120,769.46	99,864.40	82.69 %		13.84 %
Jul	26,419.37	24,747.06	147,188.83	124,611.46	84.66 %		17.27 %
Ago	192,533.49	40,786.11	339,722.32	165,397.57	48.69 %		22.92 %
Sep	74,496.86	23,651.18	414,219.18	189,048.75	45.64 %		26.19 %
Oct	36,782.04	49,651.03	451,001.22	238,699.78	52.93 %		33.07 %
Nov	253,090.71	164,928.42	704,091.93	403,628.20	57.33 %		55.93 %
Dic	17,619.86		721,711.79				
Total	721,711.79	403,628.20					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
15	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1-Informe sitop-mayo-05-micro-Matapin	Inf-sitop-mayo05--micro-Matapin.pdf	09/06/2015
2	A2-Informe-sitop-mayo-05-micro-Zhoray	Inf-sitop-mayo-05-micro-Zhoray.pdf	09/06/2015
3	A3-Informe sitop-junio-05-micro-Sageo	Informe_sitop_junio-05_micro-Sageo.pdf	08/07/2015
4	A4-Informe sitop junio-05-micro-Matapin	Informe_sitop_junio-05_micro-Matapin.pdf	08/07/2015
5	A5 Acta de recepción definitiva	Acta_de_trabajos_microempresa_primavera.pdf	05/08/2017
6	A5-Informe-sitop-junio-05-micro-Zhoray	Informe_sitop_junio-05-micro-zhoray.pdf	08/07/2015
7	A6-Informe-sitop-micro-matapin-agos-05	Inf-sitop-matapin-agos-05.pdf	07/09/2015
8	A7-Inf-micro-sageo-junio-06	A7-Inf-micro-sageo-junio-06.pdf	04/07/2016
9	A8-Inf-sitop-julio-06-Matapin	A8-Inf-sitop-julio-06-Matapin.pdf	04/08/2016
10	A9 Acta de recepción microempresa sageo	19559_-Acta_Definitiva.pdf	05/12/2017
11	A9-Inf-sitop-julio-06-Zhoray	A9-Inf-sitop-julio-06-Zhoray.pdf	04/08/2016
12	B0-Inf-sitop-junio-2017	informe_ejecutivo_El_Descanso.pdf	05/07/2017
13	B1-Inf-sitop-junio-2017	Matrama_Mazar_tramo_1.pdf	05/07/2017
14	B2-Inf-sitop-junio-2017	Matrama_Mazar_tramo_2.pdf	05/07/2017
15	B3-Inf-sitop-junio-2017	Informe_Troncal_Puerto_Inca.pdf	05/07/2017
16	B4 INFORME SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_SAGEO.pdf	04/10/2016
17	B5 INFOMRE SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_ZHORAY.pdf	04/10/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	B6 Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVOMICROEMPRESA_SAGEO.pdf	05/09/2017
19	B7 informe sitop matapin octubre	microempresa_matapin.pdf	05/11/2016
20	B8 informe sitop octubre sageo	microempresa_sageo.pdf	05/11/2016
21	B9 INFORME SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_MATAPIN.pdf	04/10/2016
22	C0 informese sitop octubre zhoray	microempresa_zhoray.pdf	05/11/2016
23	C1 Acta de recepción definitiva	Acta_de_trabajos_microempresa_primavera.pdf	05/08/2017
24	C2 PLANILLA DE TRABAJOS MATRAMA - MAZAR	Planilla_microempresa_Matapin_marzo_2017.pdf	05/05/2017
25	C3 Planilla de Trabajos realizados carretera Azogues - Matrama - Mazar	Planilla_microempresa_Zhoray_marzo_2017.pdf	05/05/2017
26	C4 Informe-sitop-micro-sageo-agos-05	Inf-sitop-sageo-agos-05.pdf	07/09/2015
27	C5 Planilla mes de mayo de 2017 Tramo 1	PLANILLA_MICROEMPRESA_MATAPIN.pdf	05/07/2017
28	C6 Planilla mes de mayo de 2017 Tramo 2	PLANILLA_MICROEMPRESA_ZHORAY.pdf	05/07/2017
29	C7 Trabajos de mantenimiento en la carretera Biblián - Descanso - Azogues.	Planilla_microempresa_Sageo_marzo_2017.pdf	05/05/2017
30	C8 Acta de recepción microempresa matapin	Acta_de_recepción_parcial_Matrama_mazar_T1.pdf	05/10/2017
31	C9 Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Mensual_Microempresa_Sageo_-_Sep.pdf	01/11/2017
32	D0 Acta de recepción microempresa matapin	Acta_Microempresa_Matapin_-_Sep.pdf	01/11/2017
33	D1 Acta de recepción microempresa matapin	19561_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf	05/12/2017
34	D2 Acta de recepción microempresa sageo	Acta_de_recepción_parcial_Descaso_Biblián.pdf	05/10/2017
35	D3 Acta de recepción microempresa ZHORAY	19561_Acta_de_recepción_parcial_2.pdf	05/01/2018
36	D4 Acta de recepción microempresa sageo	Acta_Microempresa_Sageo_-_Sep.pdf	01/11/2017
37	D5 Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa CHONTAMARCA	22348_Chontamarca_Acta_Recepción_Definitiva_2018.pdf	04/01/2019
38	D6 Informe ejecutivo mes de Marzo 2018 Descanso Biblián	informe_ejecutivo_sageo.pdf	05/04/2018
39	D7 Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa MATAPIN	Acta_de_recepcion_definitivo_Matapin.pdf	04/01/2019
40	D8 Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_MATRAMA_MAZAR_T2.pdf	03/08/2018
41	D9 Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_TRONCAL_PUERTO_INCA.pdf	03/08/2018
42	E0 Acta de recepcion parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA SAGEO	Acta_de_recepcion_parcial_sageo_diciembre.pdf	04/01/2019
43	E0 Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJECT_DESCANSO_-_AZOG-BI.pdf	03/08/2018
44	E1 Acta de recepción parcial mes de abril 2019 Zhoray	23398_Acta_Recepción_Parcial_Zhoray_Abril_2019.pdf	02/05/2019
45	E1 Acta de recepción parcial mes de marzo 2019	23397_Acta_Recepción_Parcial_Nuevo_Javín_Marzo_2019.pdf	02/05/2019
46	E1 Acta de recepción parcial mes de marzo 2019 Zhoray	23398_Acta_Recepción_Parcial_Zhoray_Marzo_2019.pdf	02/05/2019
47	E1 Planilla Nro 1 Microempresa Nuevo Javin	23397_Planilla_1_Nuevo_Javín_Marzo_2019.pdf	02/05/2019
48	E1 Planilla Nro 1 Microempresa Zhoray 2019	23398_Planilla_1_Zhoray_Marzo_2019.pdf	02/05/2019
49	E2 Trabajos de mantenimiento rutinario y emergente en la red vial estatal de la provincia del Cañar.	trabajos_microempresas.pdf	21/08/2019
50	E3 Acta de Recepción Definitiva Septiembre 2019 Nuevo Javin	Acta_de_Recepción_Definitiva_Javin_2019.pdf	02/10/2019
51	E3 Acta de Recepción Definitiva Septiembre 2019 Zhoray	Acta_de_Recepción_Definitiva_Zhoray_2019.pdf	02/10/2019
52	E4 Planilla Agosto Septiembre Microempresa Nuevo Javin	Planillas_Julio_Septiembre_Nuevo_Javín_2019.pdf	02/10/2019
53	E4 Planilla Agosto Septiembre Microempresa Zhoray	Planillas_Julio_Septiembre_Zhoray_2019.pdf	02/10/2019
54	Formato SENPLADES Julio 19	2019-07-16_09-37-54_FORMATOMANTENIMIENTOSENPLADES2019.PDF	
55	Orden de compra Microempresa Zhoray	23398_Orden_de_Compra_Septiembre_2019.pdf	28/11/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Dután Sanango, Italo Medardo	Lider de Proyecto	Especialista Tecnico de Infraestructura Distrital	imdutan@mtop.gob.ec	072240227 ext 62801
Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	Titular	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	gizquierdo@mtop.gob.ec	
Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Regional 6	jjaramillo@mtop.gob.ec	62751
Torres Jara, Julia Brumilda	Coordinador Administrativo Financiero	Analista Administrativa Financiero	jttores@mtop.gob.ec	072240227 ext 62814

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
75724_1.jpg	05/08/2019
