

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial El Oro

PROYECTO: K038 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de El Oro

Líder del Proyecto:	Barriga Loaiza, Jorge Antonio (jbarriga@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Programas Relacionados:	
Titular:	Bazurto Orellana, Pedro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	2.56
CUP:	175200000.506.3851	TIR:	23.14 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	24,882,633.43
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,972,258.85
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2018 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	05/12/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2019

DATOS GENERALES

Descripción

Mantenimiento General de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro, comprende trabajos por administración directa, y trabajos realizados por Asociaciones de Conservación Vial - Microempresas: Bacheo asfáltico común, limpieza de cunetas a mano y a máquina, limpieza de alacantarillas, encausamientos, limpieza de derrumbes, sellos asfálticos, reconfiguración de rasantes, rellenos, mantenimiento de señalización vertical y horizontal. Se incluyen obras de mantenimiento a contratar, señalización, mantenimiento de puentes, obras de emergencia.

Objetivo General:

- Mantenimiento Vial de la Provincia de El Oro.

Objetivos Específicos:

- Mantener en estado óptimo la infraestructura de la red vial, edificios, maquinaria, equipos y vehículos correspondiente a la Dirección Provincial de El Oro.
- Mantener en estado óptimo la infraestructura de todas las modalidades de transporte, que tiene como competencia la Dirección provincial de El Oro.

Beneficios Cualitativos

Contribuir al Plan Maestro Vial Nacional y en concordancia con la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.

Beneficios:

- Mejorar en el tiempo de viaje
- Bajar costos de transportación
- Mejorar la calidad de vida de la población
- Mejorar la circulación vehicular

Tipo de Beneficiario

La población del área de influencia directa que se beneficiará con el Mantenimiento Vial es de 600.659 habitantes, en los sectores: agrícola, ganadero, minero, pesquero, acuícola, turístico


Restricciones

Disponibilidad de equipo, efectos colaterales de estación invernal, transporte de materia prima, abastecimiento de mezcla asfáltica, disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de los trabajos de mantenimiento vial dentro de los plazos establecidos.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 50.10 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

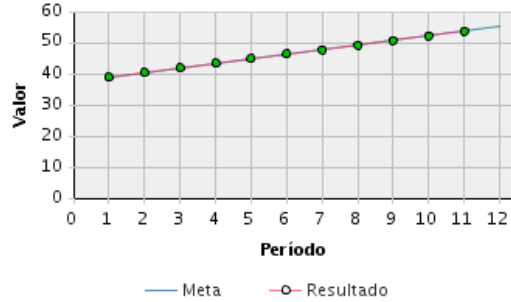

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	39 %	40 %	42 %	43 %	45 %	46 %	48 %	49 %	51 %	52 %	54 %	55 %
	Avance real acumulado											
	39 %	40 %	42 %	43 %	45 %	46 %	48 %	49 %	51 %	52 %	54 %	
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 25) 2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 8+500, 16+100 y 39+500 (Hito cumplido 25) 3.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 25) 4.- Bacheo Asfáltico en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 25) 5.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 25)</p> <p>Para el mes de Noviembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/12/2019 - 07:04 AM
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 24) 2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 8+500 y 16+100 (Hito cumplido 24) 3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 24) 4.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 24) 5.- Bacheo Asfáltico en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 24)</p> <p>Para el mes de Octubre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/11/2019 - 11:08 AM
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 23) 2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 45+500 (Hito cumplido 23) 3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 23) 4.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 23) 5.- Reposición de señalización vertical (chevrone) en la carretera Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 23)</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/10/2019 - 11:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Para el mes de Septiembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>		
<p>AGOSTO 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 22) 2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 20+400 (Hito cumplido 22) 3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 22) 4.- Bacheo Asfáltico Común en el Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 22) 5.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 22) <p>Para el mes de Agosto de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/09/2019 - 02:19 PM</p>
<p>JULIO 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 21) 2.- Limpieza de derrumbes menores en las carreteras: La Avanzada-Saracay; Saracay-Piñas (Hito cumplido 21) 3.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 20+400 (Hito cumplido 21) 4.- Reconformación de rasante en la carretera Saracay-Piñas sector Monos (Hito cumplido 21) 5.- Bacheo Asfáltico Común en las carreteras: Piñas-Portovelo-Zaruma y Yee del Cambio-Yee de Tillales (Hito cumplido 21) <p>Para el mes de Julio de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/08/2019 - 03:50 PM</p>
<p>JUNIO 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 20) 2.- Limpieza de derrumbes menores en las carreteras: Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo y Arenillas-La victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 20) 3.- Estabilización de talud en la carretera Saracay-Piñas sector Las Bateas (Hito cumplido 20) 4.- Mantenimiento de Señalización Horizontal en reductores de velocidad en la carretera La Avanzada-Saracay (Hito cumplido 20) 5.- Bacheo Asfáltico Común en la carretera Piñas Portovelo-Zaruma (Hito cumplido 20) <p>Para el mes de Junio de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>03/07/2019 - 02:33 PM</p>
<p>MAYO 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 19) 2.- Limpieza de derrumbes en las carreteras: Portovelo- Salati-Ambocas y Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 19) 3.- Estabilización de talud en la carretera Saracay-Piñas sector Las Bateas (Hito cumplido 19) 4.- Mantenimiento de Señalización Vertical en la carretera Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 19) <p>Para el mes de Mayo de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/06/2019 - 12:50 PM</p>
<p>ABRIL 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 18) 2.- Limpieza de derrumbes en las carreteras: Portovelo-Salati-Ambocas; Saracay-Piñas; Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango y Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 18) 3.- Bacheo Asfáltico Común en las carreteras: Saracay-Piñas; Saracay-Balsas y La Avanzada-Saracay (Hito cumplido 18) 	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>02/05/2019 - 11:24 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Para el mes de Abril de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.		
Marzo 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Balsas-Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Piñas; Limpieza de alcantarillas en la carretera Saracay-Piñas sector Las bateas; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/04/2019 - 10:39 AM
Febrero 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Balsas-Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	01/03/2019 - 11:04 AM
Enero 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reposición de rellenos, limpieza de alcantarillas, construcción de bordillos y bacheo asfáltico en la carretera Saracay-Balsas-Rio Pindo; Limpieza de alcantarillas en la carretera la Avanzada-Saracay; Reposición de delineadores retroreflectivos en el Paso Lateral Pasaje; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Bacheo asfáltico y limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Piñas; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/02/2019 - 08:24 AM
Diciembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores y cunetas en la carretera Saracay - Piñas y Piñas - Portovelo, Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas - La Victoria - Pte. Puyango, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/01/2019 - 04:05 PM
Noviembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores y cunetas en la carretera Saracay - Piñas, Desmontaje y traslado de puente Bailey desde la carretera Buenavista - Paccha hasta el Campamento Piñas, Reconstrucción de talud inferior en los km 38+300 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/12/2018 - 12:08 PM
Octubre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Reconstrucción de talud inferior en los km 38+300 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/11/2018 - 03:01 PM
Septiembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Reconstrucción de talud inferior en los km 15+500 y 25+750 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/10/2018 - 10:24 AM
Agosto 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de alcantarillas y derrumbes menores a máquina en las carretera La Avanzada - Saracay; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reconstrucción de talud inferior en el km 15+500 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/09/2018 - 11:21 AM
Julio 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reposición de señalización vertical en las carretera La Avanzada - Saracay, Reconstrucción de talud inferior en el km 15+500 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/08/2018 - 08:47 AM
Junio 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reposición de señalización vertical en las carreteras: Corralitos - Pasaje, Piñas - Zaruma, Arenillas - La Victoria.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/07/2018 - 08:50 AM
Mayo 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/06/2018 - 11:19 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
en las carreteras Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras Piñas - Portovelo - Zaruma.		
Abril 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Río Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras: La Avanzada - Saracay, Saracay - Piñas, Piñas - Portovelo - Zaruma.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/05/2018 - 01:24 PM
Marzo 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Río Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras: Corralitos - Pasaje, Yee del Enano - Buenavista - Pasaje.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/04/2018 - 09:58 AM
Febrero 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Río Pindo, Arenillas - La Victoria - Pte. Puyango.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	02/03/2018 - 03:48 PM
Enero 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reconfiguración de rasante con material de mejoramiento en el km 33+500 de la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango, Limpieza de espaldones, Bacheo asfáltico común, Limpieza de derrumbes a máquina.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	19/02/2018 - 04:37 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Demora en la Aprobación de Aavales para la contratación de servicios de Mantenimiento y adquisición de Repuestos para la Maquinaria	05/12/2019	Jorge Antonio Barriga Loaiza	30	30	9	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
3- REGIONAL. Ambiental. Presencia del Fenómeno del niño CAUSARIA retraso en la ejecución de obra	05/12/2019	Jorge Antonio Barriga Loaiza	30 %	40	12	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Proyecto definido	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí 10.0
2	PLANEACION:Justificativos-técnicos-económicos elaborados y aprobados	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí 10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	1.46
4	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	1.46
5	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	1.46
6	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	1.46
7	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	1.46
8	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	1.46
9	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	1.46
10	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	1.46
11	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.46
12	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	1.46
13	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.46
14	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.46
15	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	1.46
16	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	1.46
17	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	1.46

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	1.46
19	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	1.46
20	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.46
21	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	1.46
22	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	1.46
23	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.46
24	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	1.46
25	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	1.46
26	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	1.46
27	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro Año 2020	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	17.5
28	CIERRE:Acta de terminación de trabajos	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	10.0
29	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro Año 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	17.46

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de kilómetros mantenidos		91.96 %	212.61	195.52	01/01/2018	Noviembre

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,972,258.85 **
Costo Total:	4,564,536.38
Total Devengado:	5,668,513.61
% Costo Total Devengado:	124.19 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 124.19 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	4,564,536.38	3,749,893.00	0.00	8,314,429.38
Ppto. Externo Planeado	0.00	2,715,700.52	0.00	2,715,700.52
Ppto. Aprobado Inicial	4,564,536.38	3,152,832.46	0.00	7,717,368.84
Ppto. Codificado	5,733,596.53	3,152,832.46	0.00	8,886,428.99
Ppto. Comprometido	0.00	3,152,832.46	0.00	3,152,832.46
Planeado - Codificado (2019)		597,060.54		
Programado a Devengar	5,733,596.53	3,193,250.07	0.00	8,926,846.60
Ppto. Devengado	2,779,008.78	2,889,504.83	0.00	5,668,513.61
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 2,779,008.78	3,152,832.46	0.00	5,931,841.24
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	2,954,587.75	40,417.61	0.00	2,995,005.36
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 48.47 %	90.49 %	0.00 %	63.50 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

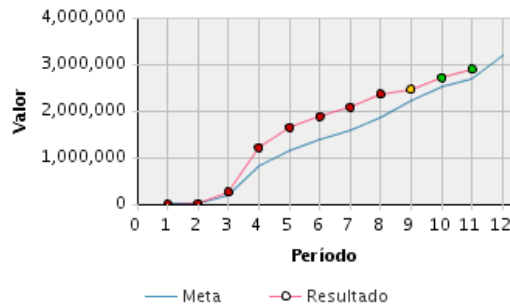

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	8,034.08	0.00	8,034.08	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	8,576.36	8,576.36	16,610.44	8,576.36	51.63 %		0.27 %
Mar	168,147.93	244,544.09	184,758.37	253,120.45	137.00 %		7.93 %
Abr	628,359.48	962,823.95	813,117.85	1,215,944.40	149.54 %		38.08 %
May	328,713.56	419,009.22	1,141,831.41	1,634,953.62	143.19 %		51.20 %
Jun	237,709.71	243,950.09	1,379,541.12	1,878,903.71	136.20 %		58.84 %
Jul	193,938.63	200,538.22	1,573,479.75	2,079,441.93	132.16 %		65.12 %
Ago	272,137.76	275,986.37	1,845,617.51	2,355,428.30	127.62 %		73.76 %
Sep	370,336.04	105,404.96	2,215,953.55	2,460,833.26	111.05 %		77.06 %
Oct	288,936.56	249,649.70	2,504,890.11	2,710,482.96	108.21 %		84.88 %
Nov	191,658.22	179,021.87	2,696,548.33	2,889,504.83	107.16 %		90.49 %
Dic	496,701.74		3,193,250.07				
Total	3,193,250.07	2,889,504.83					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
20	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
21	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
22	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
23	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Enero 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_ENERO_2018.pdf	02/03/2018
2	A.2 Febrero 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_FEBRERO_2018.pdf	05/04/2018
3	A.3 Marzo 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	A_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MTO EL_ORO_MARZO_2018.pdf	05/04/2018
4	A.4 Marzo 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
5	A.5 Abril 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	A_5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MTO EL_ORO_ABRIL_2018.pdf	05/05/2018
6	A.6 Abril 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_6_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
7	A.7 Mayo 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_MAYO_2018.pdf	04/07/2018
8	A.8 Junio 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_JUNIO_2018.pdf	04/08/2018
9	A.9 Julio 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
10	B.1 Agosto 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	B_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_AGOSTO_2018.pdf	05/10/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta	
11	B.2 Septiembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/09/2018	
12	B.3 Octubre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/06/2018	
13	B.4 Septiembre 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	B_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018	
14	B.5 Noviembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/02/2018	
15	B.6 Diciembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/01/2019	
16	B.7 Enero 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/02/2019	
17	B.8 Febrero 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_8_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/03/2019	
18	B.9 Marzo 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_9_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/04/2019	
19	C.1 Abril 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/05/2019	
20	C.2 Mayo 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/06/2019	
21	C.3 Mayo 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.3_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_MAYO_2018.pdf	05/03/2019	
22	C.4 Junio 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.4_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/07/2019	
23	C.5 Junio 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.5_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_JUNIO_2018.pdf	05/08/2019	
24	C.6 Julio 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/08/2019	
25	C.7 Julio 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_JULIO_2019.pdf	05/09/2019	
26	C.8 Agosto 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.8_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/09/2019	
27	C.9 Agosto 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_AGOSTO_2019.pdf	05/10/2019	
28	D.1 Septiembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/09/2019	
29	D.2 Septiembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	D.2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019	
30	D.3 Octubre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/11/2019	
31	D.4 Octubre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	D.4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_OCTUBRE_2019.pdf	05/12/2019	
32	D.5 Noviembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL.pdf	05/12/2019	

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	SUBSECRETARIO REGION 7	Subsecretario Zonal 7	faltamirano@mtop.gob.ec	
Barriga Loaiza, Jorge Antonio	LIDER DEL PROYECTO	Analista de Infraestructura Provincial	jbarriga@mtop.gob.ec	023974600
Bazurto Orellana, Pedro	DIRECTOR DISTRITAL	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro	pbazurto@mtop.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
González Villavicencio, Volter Hernel	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	Analista de Infraestructura Provincial 1	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
125216_1.jpg	02/03/2018
