

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 7**  
**Dirección Provincial El Oro**

**PROYECTO: K038 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de El Oro**

Líder del Proyecto:	Barriga Loaiza, Jorge Antonio (jbarriga@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Programas Relacionados:	
Titular:	Bazurto Orellana, Pedro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.78
CUP:	175200000.506.3851	TIR:	37.96 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	30,360,188.74
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,850,355.41
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2018 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	05/05/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	Fecha del siguiente Hito:	31/05/2020

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Descripción del Proyecto: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, es el ente rector del Sistema Nacional del Transporte Multimodal formula, implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del País, teniendo dentro de sus actividades la de llevar adelante la planificación, el diseño, construcción y mantenimiento vial de la red estatal. El Mantenimiento Rutinario, Periodico y de Emergencia de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro, comprende trabajos por Administración Directa, y trabajos realizados por Asociaciones de Conservación Vial (Microempresas): Bacheo asfáltico común, limpieza de cunetas a mano y a máquina, limpieza de alcantarillas, encausamientos, limpieza de derrumbes, sellos asfálticos, reconformación de rasantes, rellenos, mantenimiento de señalización vertical y horizontal. Se incluye obras de mantenimiento a contratar, señalización, mantenimiento de puentes, obras de emergencia.

Línea Base: La Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro cuenta con 400,94 Km de los cuales 209,44 Km se encuentran actualmente en mantenimiento por Administración Directa, conformada por calzada de pavimento flexible y pavimento rígido en buen estado.

**Producto:**

- . Porcentaje de mantenimiento de la red Vial Estatal 98%
- . Porcentaje de kilómetros construidos y/o rehabilitados 95%
- . Porcentaje de Kilómetros señalizados de la Red Vial Estatal Nacional 100%
- . Porcentaje de maquinaria operativa 95%

**Objetivo General:**

- Ejecutar el mantenimiento de 450 km de la Infraestructura Vial por administración directa, con la finalidad de tener las vías en excelente estado para así brindar un buen servicio a la transportación y así contribuir con el desarrollo social, cultural, comercial, agrícola y ganadero.

**Objetivos Específicos:**

- . Realizar el mantenimiento vial a través de los gastos operacionales, que permitirán la repotenciación de equipo y maquinaria.
- . Fortalecer el mantenimiento vial a través de actores sociales que se organizan y forman las microempresas para dar el servicio de mantenimiento rutinario.
- . Realizar las obras de infraestructura necesaria que permitan la conectividad y transitabilidad en la vía a fin de garantizar la vida de los usuarios.
- . Realizar los estudios de puntos críticos, puentes y demás obras viales que se presenten en la red vial estatal, y realizar su fiscalización así como la fiscalización de las obras de infraestructura.

**Beneficios Cualitativos**

Contribuir al Plan Maestro Vial Nacional y en concordancia con la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.

**Beneficios:**

- Mejorar en el tiempo de viaje
- Bajar costos de transportación

**Beneficios Cualitativos**

- Mejorar la calidad de vida de la población
- Mejorar la circulación vehicular

**Tipo de Beneficiario**

De acuerdo al Censo realizado por el INEC para el año 2010, la población del área de influencia directa que se beneficiará con el Mantenimiento Vial es de 600.659 habitantes., en los sectores: agrícola, ganadero, minero, pesquero, acuícola, turístico

CANTÓN	TOTAL
ARENILLAS	26.844
ATAHUALPA	5.833
BALSAS	6.861
CHILLA	2.484
EL GUABO	50.009
HUAQUILLAS	48.285
LAS LAJAS	4.794
MACHALA	245.972
MARCABELI	5.450
PASAJE	72.806
PIÑAS	25.988
PORTOVELO	12.200
SANTA ROSA	69.036
ZARUMA	24.097
<b>TOTAL</b>	<b>600.659</b>


**Restricciones**

Restricción de Tiempo: El proyecto tendrá una duración de 4 años (2018-2021)  
 Restricción de Costo: \$ 38.726.082,74 (Marco Lógico)  
 Restricción de Calidad: Cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de trabajos de mantenimiento  
 Restricción de Recursos: Disponibilidad de maquinaria y operadores, abastecimiento de mezcla asfáltica  
 Restricción Riesgos: Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de trabajos de mantenimiento vial  
 Restricción Alcance: Mantenimiento Rutinario, Periódico y de Emergencia de la Red Vial Estatal de acuerdo a las NORMAS DE EJECUCIÓN DEL MTOP y ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES MTOP-001-F-2002.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 60.37 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2018      Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

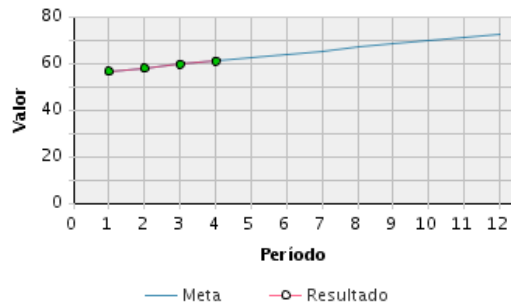

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	56 %	58 %	59 %	61 %	62 %	64 %	65 %	67 %	68 %	70 %	71 %	73 %
	Avance real acumulado											
	56 %	58 %	59 %	61 %								
Estado												
	●	●	●	●								

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias) (Hito cumplido 30)</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, Pasaje-Quera-Puente Mollopongo; Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 30)</p> <p>Para el mes de ABRIL de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/05/2020 - 10:45 PM</p>
<p>MARZO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE por Administración Directa (Hito cumplido 29)</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, Pasaje-Quera-Puente Mollopongo (Hito cumplido 29)</p> <p>3.- Reconstrucción de talud inferior km 22+550 del tramo Saracay-Balsas-Pte. Rio Pindo (Hito cumplido 29)</p> <p>Para el mes de MARZO de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento Rutinario, Periódico y de Emergencia de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>03/04/2020 - 02:02 PM</p>
<p>FEBRERO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE por Administración Directa (Hito cumplido 28)</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Saracay-Piñas, Saracay-Balsas-Rio Pindo, Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma (Hito cumplido 28)</p> <p>Para el mes de Febrero de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>03/03/2020 - 10:16 AM</p>
<p>ENERO 2020</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE por Administración Directa (Hito cumplido 27)</p> <p>2.- Bacheo Asfáltico en las carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 27)</p> <p>3.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 27)</p> <p>Para el mes de Enero de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>04/02/2020 - 02:06 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 26)</p> <p>2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 39+500 (Hito cumplido 26)</p> <p>3.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 26)</p> <p>4.- Bacheo Asfáltico en las carreteras: Paso Lateral Pasaje y Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 26)</p> <p>5.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 26)</p> <p>Para el mes de Diciembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>04/01/2020 - 12:28 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 25)</p> <p>2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 8+500, 16+100 y 39+500 (Hito cumplido 25)</p> <p>3.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 25)</p> <p>4.- Bacheo Asfáltico en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 25)</p> <p>5.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 25)</p> <p>Para el mes de Noviembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/12/2019 - 07:04 AM</p>
<p>OCTUBRE 2019</p>	<p>Barriga Loaiza, Jorge Antonio</p>	<p>05/11/2019 - 11:08 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 24)</p> <p>2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 8+500 y 16+100 (Hito cumplido 24)</p> <p>3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 24)</p> <p>4.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 24)</p> <p>5.- Bacheo Asfáltico en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 24)</p> <p>Para el mes de Octubre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 23)</p> <p>2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 45+500 (Hito cumplido 23)</p> <p>3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 23)</p> <p>4.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 23)</p> <p>5.- Reposición de señalización vertical (chevrone) en la carretera Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 23)</p> <p>Para el mes de Septiembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/10/2019 - 11:35 AM
<p>AGOSTO 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 22)</p> <p>2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 20+400 (Hito cumplido 22)</p> <p>3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 22)</p> <p>4.- Bacheo Asfáltico Común en el Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 22)</p> <p>5.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 22)</p> <p>Para el mes de Agosto de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/09/2019 - 02:19 PM
<p>JULIO 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 21)</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes menores en las carreteras: La Avanzada-Saracay; Saracay-Piñas (Hito cumplido 21)</p> <p>3.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 20+400 (Hito cumplido 21)</p> <p>4.- Reconformación de rasante en la carretera Saracay-Piñas sector Monos (Hito cumplido 21)</p> <p>5.- Bacheo Asfáltico Común en las carreteras: Piñas-Portovelo-Zaruma y Yee del Cambio-Yee de Tillales (Hito cumplido 21)</p> <p>Para el mes de Julio de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/08/2019 - 03:50 PM
<p>JUNIO 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 20)</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes menores en las carreteras: Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo y Arenillas-La victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 20)</p> <p>3.- Estabilización de talud en la carretera Saracay-Piñas sector Las Bateas (Hito cumplido 20)</p> <p>4.- Mantenimiento de Señalización Horizontal en reductores de velocidad en la carretera La Avanzada-Saracay (Hito cumplido 20)</p> <p>5.- Bacheo Asfáltico Común en la carretera Piñas Portovelo-Zaruma (Hito cumplido 20)</p> <p>Para el mes de Junio de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	03/07/2019 - 02:33 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2019:</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 19)</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes en las carreteras: Portovelo- Salati-Ambocas y Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 19)</p> <p>3.- Estabilización de talud en la carretera Saracay-Piñas sector Las Bateas (Hito cumplido 19)</p> <p>4.- Mantenimiento de Señalización Vertical en la carretera Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 19)</p> <p>Para el mes de Mayo de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/06/2019 - 12:50 PM
<p>ABRIL 2019:</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 18)</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes en las carreteras: Portovelo-Salati-Ambocas; Saracay-Piñas; Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango y Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 18)</p> <p>3.- Bacheo Asfáltico Común en las carreteras: Saracay-Piñas; Saracay-Balsas y La Avanzada-Saracay (Hito cumplido 18)</p> <p>Para el mes de Abril de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	02/05/2019 - 11:24 AM
<p>Marzo 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Balsas-Río Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Piñas; Limpieza de alcantarillas en la carretera Saracay-Piñas sector Las bateas; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/04/2019 - 10:39 AM
<p>Febrero 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Balsas-Río Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	01/03/2019 - 11:04 AM
<p>Enero 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reposición de rellenos, limpieza de alcantarillas, construcción de bordillos y bacheo asfáltico en la carretera Saracay-Balsas-Río Pindo; Limpieza de alcantarillas en la carretera la Avanzada-Saracay; Reposición de delineadores retroreflectivos en el Paso Lateral Pasaje; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Bacheo asfáltico y limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Piñas; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/02/2019 - 08:24 AM
<p>Diciembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores y cunetas en la carretera Saracay - Piñas y Piñas - Portovelo, Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas - La Victoria - Pte. Puyango, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/01/2019 - 04:05 PM
<p>Noviembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores y cunetas en la carretera Saracay - Piñas, Desmontaje y traslado de puente Bailey desde la carretera Buenavista - Paccha hasta el Campamento Piñas, Reconstrucción de talud inferior en los km 38+300 de la Carretera Saracay - Balsas - Río Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/12/2018 - 12:08 PM
<p>Octubre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Reconstrucción de talud inferior en los km 38+300 de la Carretera Saracay - Balsas - Río Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/11/2018 - 03:01 PM
<p>Septiembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Reconstrucción de talud inferior en los km 15+500 y 25+750 de la Carretera Saracay - Balsas - Río Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p>	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/10/2018 - 10:24 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Agosto 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de alcantarillas y derrumbes menores a máquina en las carretera La Avanzada - Saracay; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reconstrucción de talud inferior en el km 15+500 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/09/2018 - 11:21 AM
Julio 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reposición de señalización vertical en las carretera La Avanzada - Saracay, Reconstrucción de talud inferior en el km 15+500 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/08/2018 - 08:47 AM
Junio 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reposición de señalización vertical en las carreteras: Corralitos - Pasaje, Piñas - Zaruma, Arenillas - La Victoria.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/07/2018 - 08:50 AM
Mayo 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/06/2018 - 11:19 AM
Abril 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras: La Avanzada - Saracay, Saracay - Piñas, Piñas - Portovelo - Zaruma.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/05/2018 - 01:24 PM
Marzo 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras: Corralitos - Pasaje, Yee del Enano - Buenavista - Pasaje.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/04/2018 - 09:58 AM
Febrero 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo, Arenillas - La Victoria - Pte. Puyango.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	02/03/2018 - 03:48 PM
Enero 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reconfirmación de rasante con material de mejoramiento en el km 33+500 de la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango, Limpieza de espaldones, Bacheo asfáltico común, Limpieza de derrumbes a máquina.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	19/02/2018 - 04:37 PM

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Retraso en la Aprobación de Avales para la contratación de servicios de Mantenimiento y adquisición de Repuestos para la Maquinaria	05/05/2020	Jorge Antonio Barriga Loaiza	30	30	9	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>3- REGIONAL. Ambiental.</b> Presencia del Fenómeno del niño CAUSARÍA retraso en la ejecución de obra	05/05/2020	Jorge Antonio Barriga Loaiza	40 %	40	16	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Proyecto definido	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	10.0
2	PLANEACION:Justificativos-técnicos-económicos elaborados y aprobados	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	10.0
3	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	1.46
4	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	1.46
5	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	1.46
6	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	1.46
7	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	1.46
8	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	1.46
9	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	1.46
10	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	1.46
11	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.46
12	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	1.46
13	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.46
14	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.46

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Provincia de El Oro (Diciembre 2018) realizado							
15	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	1.46
16	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	1.46
17	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	1.46
18	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	1.46
19	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	1.46
20	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.46
21	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	1.46
22	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	1.46
23	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.46
24	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	1.46
25	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	1.46
26	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	1.46
27	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	1.46
28	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	29/02/2020		29/02/2020		Sí	1.46
29	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	1.46



**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Provincia de El Oro (Marzo 2020) realizado							
30	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	1.46
31	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2020	31/05/2020			No	1.46
32	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	1.46
33	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/07/2020			No	1.46
34	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2020	31/07/2020			No	1.46
35	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	1.46
36	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2020	31/10/2020			No	1.46
37	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	1.46
38	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	1.46
39	CIERRE: Acta de terminación de trabajos	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	10.0
40	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro Año 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	17.44

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de kilómetros mantenidos		90.00 %	212.61	191.35	01/01/2018	Abril

**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,850,355.41 **
Costo Total:	4,564,536.38
Total Devengado:	6,879,436.64
% Costo Total Devengado:	150.71 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 150.71 %

**Perfil Económico 2020**

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	8,314,429.38	9,170,836.63	0.00	17,485,266.01
Ppto. Externo Planeado	2,715,700.52	0.00	0.00	2,715,700.52
Ppto. Aprobado Inicial	7,717,368.84	1,999,652.03	0.00	9,717,020.87
Ppto. Codificado	9,903,447.30	1,999,652.03	0.00	11,903,099.33
Ppto. Comprometido	4,071,694.62	32,575.29	0.00	4,104,269.91
Planeado - Codificado (2020)		7,171,184.60		
Programado a Devengar	9,903,447.30	1,999,652.03	0.00	11,903,099.33
Ppto. Devengado	6,850,703.38	28,733.26	0.00	6,879,436.64
Pagado Real	3,135,506.44	0.00	0.00	3,135,506.44
Estimado a fin de año	* 6,850,703.38	2,000,000.00	0.00	8,850,703.38
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	3,052,743.92	-347.97	0.00	3,052,395.95
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 69.17 %	1.44 %	0.00 %	57.80 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020**

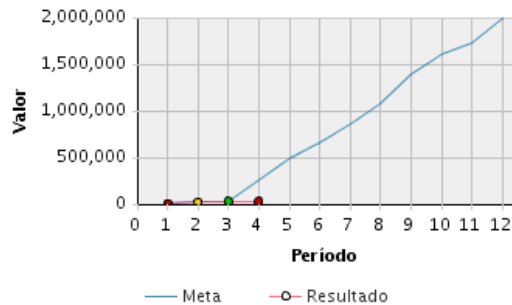

**Presupuesto Mensual 2020**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	9,539.38	8,034.08	9,539.38	8,034.08	84.22 %		0.40 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	9,539.42	8,644.42	19,078.80	16,678.50	87.42 %		0.83 %
Mar	9,539.42	11,444.42	28,618.22	28,122.92	98.27 %		1.41 %
Abr	236,117.81	610.34	264,736.03	28,733.26	10.85 %		1.44 %
May	226,428.04		491,164.07				
Jun	170,618.70		661,782.77				
Jul	198,974.19		860,756.96				
Ago	213,142.88		1,073,899.84				
Sep	311,118.71		1,385,018.55				
Oct	218,414.46		1,603,433.01				
Nov	125,414.46		1,728,847.47				
Dic	270,804.56		1,999,652.03				
<b>Total</b>	<b>1,999,652.03</b>	<b>28,733.26</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
20	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
21	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
22	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
23	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Enero 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_ENERO_2018.pdf	02/03/2018
2	A.2 Febrero 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_FEBRERO_2018.pdf	05/04/2018
3	A.3 Marzo 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	A_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTO_MARZO_2018.pdf	05/04/2018
4	A.4 Marzo 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
5	A.5 Abril 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	A_5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTO_ABRIL_2018.pdf	05/05/2018
6	A.6 Abril 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_6_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
7	A.7 Mayo 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_MAYO_2018.pdf	04/07/2018
8	A.8 Junio 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_JUNIO_2018.pdf	04/08/2018
9	A.9 Julio 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
10	B.1 Agosto 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	B_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_AGOSTO_2018.pdf	05/10/2018
11	B.2 Septiembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/09/2018
12	B.3 Octubre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTO_OCTUBRE_2018.pdf	05/09/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	B.4 Septiembre 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	B_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTORO_EL_ORO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
14	B.5 Noviembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_NOVIEMBRE_2018.pdf	05/12/2018
15	B.6 Diciembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_DICIEMBRE_2018.pdf	05/01/2019
16	B.7 Enero 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_ENERO_2019.pdf	05/02/2019
17	B.8 Febrero 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_8_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_FEBRERO_2019.pdf	05/03/2019
18	B.9 Marzo 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_9_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_MARZO_2019.pdf	05/04/2019
19	C.1 Abril 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_ABRIL_2019.pdf	05/05/2019
20	C.2 Mayo 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_MAYO_2019.pdf	05/06/2019
21	C.3 Mayo 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.3_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTORO_EL_ORO_MAYO_2018.pdf	03/07/2019
22	C.4 Junio 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.4_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_JUNIO_2019.pdf	05/07/2019
23	C.5 Junio 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.5_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTORO_EL_ORO_JUNIO_2018.pdf	05/08/2019
24	C.6 Julio 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
25	C.7 Julio 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTORO_EL_ORO_JULIO_2019.pdf	05/09/2019
26	C.8 Agosto 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.8_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_AGO_2019.pdf	05/09/2019
27	C.9 Agosto 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTORO_EL_ORO_AGO_2019.pdf	04/10/2019
28	D.1 Septiembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/10/2019
29	D.2 Septiembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	D.2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTORO_EL_ORO_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019
30	D.3 Octubre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_OCTUBRE_2019.pdf	05/12/2019
31	D.4 Octubre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	D.4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTORO_EL_ORO_OCTUBRE_2019.pdf	05/12/2019
32	D.5 Noviembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
33	D.6 Diciembre 2019 Respaldo Aprobacion Avales Mantenimiento Maquinaria	D.6_AVALES_APROBADOS_MANTENIMIENTO_MAQUINARIA_MTORO_DICIEMBRE_2019.pdf	01/01/2020
34	D.7 Diciembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_DICIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
35	D.8 Noviembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	D.8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTORO_EL_ORO_NOVIEMBRE_2019.pdf	30/01/2020
36	D.9 Diciembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	D.9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTORO_EL_ORO_DICIEMBRE_2019.pdf	30/01/2020
37	E.1 Enero 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_ENERO_2020.pdf	05/02/2020
38	E.2 Febrero 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTORO_FEBRERO_2020.pdf	05/03/2020
39	E.3 Perfil de Proyecto Mantenimiento Vial Formato SENPLADES 2017	E.3_PERFIL_DE_PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_2017.pdf	03/03/2020
40	E.4 Ficha Tecnica Proyecto Mantenimiento Vial Formato SENPLADES 2017	E.4_FICHA_TECNICA_PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_2017.pdf	11/03/2020

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
41	E.5 Marzo 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_03/2020	03/04/2020
42	E.6 ABRIL 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_04/2020	06/05/2020

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	SUBSECRETARIO REGION 7	Subsecretario Zonal 7	faltamirano@mtop.gob.ec	
Barriga Loaiza, Jorge Antonio	LIDER DEL PROYECTO	Analista de Infraestructura Provincial	jbarriga@mtop.gob.ec	023974600
Bazurto Orellana, Pedro	DIRECTOR DISTRITAL	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro	pbazurto@mtop.gob.ec	
González Villavicencio, Volter Hernel	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	Analista de Infraestructura Provincial 1	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
125216_1.jpg	02/03/2018
