

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 2**

**Dirección Provincial Orellana**

**PROYECTO: K020 MTOP- Mantenimiento Vial de la Provincia de Orellana**

Líder del Proyecto:	Navarrete Gilces, Silvia Katherine (snavarrete@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, Provincia - Orellana, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Lara Mendoza, Richard Patricio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3787	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,312,219.38
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/01/2012 - 30/12/2021
Fecha de última actualización:	24/06/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Farfán Quimi, Palmira Natalia	Fecha del siguiente Hito:	29/05/2020

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCION:**

En vista de la necesidad de dar el mantenimiento a la red estatal de la provincia y constatando las necesidades que esta amerita, nos es posible realizar los trabajos de mantenimiento rutinario, mejoramiento de las señalizaciones tanto horizontales como verticales, reparaciones de daños a la estructura de la vía causados por los fuertes temporales invernales que esta provincia soporta, para lo cual ha sido necesario mejorar las instalaciones del campamento de la Dirección Provincial para dar un mejor servicio a los usuarios, transportistas de dichas vías que están a menester de esta entidad.

**MICROEMPRESAS:**

Las microempresas que laboran dando el mantenimiento de la RVE en la Provincia de Orellana son: CONAPA, DAYUMA, AMAZONICA, NUEVO PARAISO, JUVENIL LORETO, UNION CONSTRUCTORA FLORESTA. AUCA LIBRE, INES ARANGO.

**LINEA BASE DEL PROYECTO:**

La red vial estatal de la Provincia de Orellana actualmente se encuentra asfaltada 214.90 km y tenemos 20.00 km que aun están lastrados y se espera realizar su construcción y así mejorar la movilidad del transporte.

**OBJETIVO GENERAL:**

Mejorar el mantenimiento de las vías a través de las Microempresas con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad permanente.

**PRODUCTO:**

A través de las microempresas se logra obtener que las carreteras estén en buenas condiciones de transitabilidad y de esta manera brindar al usuario un alto confort y seguridad.

**Año 2014: Microempresas contratadas:**

Vía Coca-Dayuma Microempresa Conapa Tramo 00+000 al 23+000 Monto del proyecto : Usd. 68.619.81

Vía Coca-Dayuma Microempresa Dayuma Tramo 23+000 al 46+000 Monto del proyecto : Usd. 68.619.81

Vía Coca -loreto-Huataraco-Limite Napo Tramo Huataraco-Limite Napo Microempresa Union Constructora Floresta Tramo 63+000 al 84+000 Monto del proyecto : Usd. 68.619.81

Vía Coca-Dayuma-Ines Arango -Tiguino-Microempresa Auca Libre Tramo 46+000 al 66+000 Monto del proyecto : Usd. 68.620.00

Vía Coca-Dayuma-Ines Arango -Tiguino Microempresa Ines Arango Tramo 66+000 al 86+000 Monto del proyecto : Usd. 68.620.00

Este proyecto no dispone de Prioridad Senplades porque a partir de este año se ha regularizado a proyectos de inversión y se realizó un Informe de Gestión y un perfil de mantenimiento para su aval y prioridad.

**Beneficios Cualitativos**

Mejorar la infraestructura de las carreteras, para dar un mejor servicio tanto a los usuarios como a los transportes en general de la provincia de Orellana y el país

**Tipo de Beneficiario**

usuarios y transportistas de las vías de la provincia de Orellana y el país

**Restricciones**


**TIEMPO:**  
Cumplir con los plazos establecidos en el contrato

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas ejecutor de la rehabilitación de los caminos de la Viabilidad en este caso de Red Vial Estatal, razón por la cual se procede con Contratacion de micropresas y proyectos de mantenimiento vial, con la finalidad de tener las vias en buenas condiciones de transitabilidad

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 84.99 %  
Fecha de Inicio: 03/01/2012 Fecha de Fin: 30/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

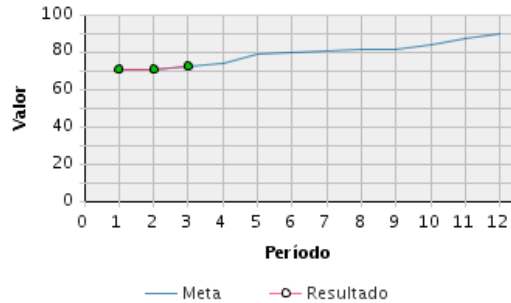

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	70 %	70 %	72 %	74 %	78 %	80 %	80 %	82 %	82 %	84 %	87 %	90 %
	Avance real acumulado											
	70 %	70 %	72 %									
Estado												
	●	●	●									

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo 2020: Durante el mes de mayo se ha procedido al pago de nominas, se están realizando la reformas para el el Pac a fin de poder realizar el proceso de contratación del Servicio de Mantenimiento Rutinario, tambien se estan realizando los avales para la colocación de juntas y construccion de cabezales en la RVE de Orellana.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/06/2020 - 01:08 PM
Abril 2020: Durante el mes de abril se ha procedido al pago de nominas, con fecha 30 de abril del 2020 se ha aprobado el aval para el servicios de mantenimiento rutinario con microempresas, para su proceso de contratación.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/05/2020 - 05:11 PM
Marzo 2020: Durante el mes de marzo se ha procedido al pago de nominas, se ha solicitado la reprogramacion del POA 2020, de la DDO, con el fin de solicitar el aval para el servicios de mantenimiento rutinario con microempresas, se han solicitado los avales de las demas actividades programadas en el POA 2020 y posteriormente su proceso de contratación.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	03/04/2020 - 04:31 PM
Febrero 2020: Durante el mes de febrero se ha procedido al pago de nominas, mediante memorando Nro. MTOP-DDO-2020-116-ME se solicito la autorización de aval para el servicios de mantenimiento rutinario con microempresas, se elaboran los informes técnicos para solicitar los avales de las demas actividades programadas en el POA 2020 y posteriormente su proceso de contratación.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	03/03/2020 - 12:29 PM
Enero 2020: Durante el mes de enero se ha procedido al pago de nominas, se encuentra en elaboracion los informes tecnicos para la contratación de los servicios de mantenimiento y demas actividades programadas en el POA 2020 de mantenimiento para la solicitud de avales	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/02/2020 - 12:42 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizaron las labores finales de mantenimiento rutinario con las microempresas, se trabajo en la colocación de señalización en varios sitios criticos, se realizo bacheo provisional en varios tramos de la RVE, con el personal operativo se trabajo en la limpieza de derrumbes, deslizamientos y además se realiza el monitoreo con la Patrulla de Caminos a fin de precautelar la integridad de los usuarios de la vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/01/2020 - 01:49 PM
Noviembre 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan las labores de mantenimiento rutinario con las microempresas, se trabaja con el personal operativo en la limpieza de derrumbes, deslizamientos y además se realiza el monitoreo con la Patrulla de Caminos a fin de precautelar la integridad de los usuarios de la vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/12/2019 - 12:17 PM
Octubre 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan las labores de mantenimiento rutinario con las microempresas, de igual manera se trabaja con el personal operativo en la limpieza de derrumbes, monitoreo con la Patrulla de Caminos a fin de precautelar la integridad de los usuarios de la vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/11/2019 - 02:04 PM
Septiembre 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan las labores de mantenimiento rutinario con las microempresas, de igual manera se trabaja con el personal operativo en la limpieza de derrumbes y cualquier novedad en las vías, monitoreo con la Patrulla de Caminos a fin de precautelar la integridad de los usuarios de la vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/10/2019 - 10:36 AM
Agosto 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan las labores de mantenimiento rutinario con las microempresas, de igual manera se trabaja con el personal operativo en la limpieza de derrumbes y cualquier novedad en las vías, monitoreo con la Patrulla de Caminos a fin de precautelar la integridad de los usuarios de la vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/09/2019 - 04:29 PM
Julio 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan las labores de mantenimiento rutinario con las microempresas, de igual manera se trabaja con el personal operativo en la limpieza de derrumbes y cualquier novedad en las vías, monitoreo con la Patrulla de Caminos a fin de precautelar la integridad de los usuarios de la vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	03/08/2019 - 08:35 PM
Junio 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan las labores de mantenimiento rutinario con las microempresas, de igual manera se trabaja con el personal operativo en la limpieza de deslizamientos, y cualquier novedad en las vías, monitoreo con la Patrulla de Caminos a fin de precautelar la integridad de los usuarios de la vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/07/2019 - 08:07 AM
Mayo 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan las labores de mantenimiento rutinario con las microempresas, de igual manera se trabaja con el personal operativo en la limpieza de deslizamientos, y cualquier novedad en las vías. Monitoreo con la Patrulla de Caminos.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/06/2019 - 08:19 AM
Abril 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizo la Orden de Compra a traves de Catalogo Electronico, para la Contratación de las microempresas, para el mantenimiento a las vías de la RVE-Orellana, se trabaja con el personal operativo en la limpieza de deslizamientos, y cualquier novedad en las vías. Monitoreo con la Patrulla de Caminos	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	02/05/2019 - 07:23 AM
Marzo 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se cuenta con el aval correspondiente para la Contratación de las microempresas, se estan realizando las respectivas resoluciones para realizar el proceso a través de Catalogo Electrónico y de esta manera dar el mantenimiento a las vías de la RVE-Orellana, pero de igual manera se trabaja con el personal operativo para realizar la limpieza de deslizamientos, y cualquier novedad en las vías. Monitoreo con la Patrulla de Caminos	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/04/2019 - 08:11 AM
Febrero 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se esta realizando los informes técnicos a fin de realizar los procesos de Contratación de las microempresas y de esta manera dar el mantenimiento a las vías de la RVE-Orellana, pero de igual manera se trabaja con el personal operativo para realizar la limpieza de deslizamientos, y cualquier novedad en las vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	06/03/2019 - 08:44 AM
Enero 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se esta realizando los informes técnicos a fin de realizar los procesos de Contratación de las microempresas y de esta manera dar el mantenimiento a las vías de la RVE-Orellana, pero de igual manera se trabaja con el personal operativo para realizar la limpieza de deslizamientos, y cualquier novedad en las vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/02/2019 - 02:12 PM
Diciembre 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la Red Vial Estatal de la Provincia de Orellana, se realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demás actividades, con las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo de los eventos y cualquier novedad en las vías con la patrulla de caminos	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/01/2019 - 03:54 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Noviembre 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la Red Vial Estatal de la Provincia de Orellana, se realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demás actividades, con las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo de los eventos y cualquier novedad en las vías con la patrulla de caminos	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/12/2018 - 01:37 PM
Octubre 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la Red Vial Estatal de la Provincia de Orellana, se realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demás actividades, con las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo de los eventos y cualquier novedad en las vías con la patrulla de caminos.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/11/2018 - 11:33 AM
Septiembre 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la Red Vial Estatal de la Provincia de Orellana, se realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demás actividades, con las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos.	Pita Suarez, Esteban Alejandro	04/10/2018 - 12:53 PM
Julio 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la Red Vial Estatal de la Provincia de Orellana, se realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demás actividades, con las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos, s.e realizo el bacheo del tramo Huataraco-limite Napo	Lara Mendoza, Richard Patricio	01/08/2018 - 02:33 PM
Junio 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demás actividades, con las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos.	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/07/2018 - 09:52 AM
Mayo 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demás actividades, con las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos, se ha realizado trabajos de señlaización en varios tramos asi como el mantenimiento de tramo lastrado Ines Arango-Tigüino.	Lara Mendoza, Richard Patricio	04/06/2018 - 01:41 PM
Abril 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, con los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demás actividades, se contrato a las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos, se ha realizado trabajos de señlaización en varios tramos asi como el mantenimiento de tramo lastrado Ines Arango-Tigüino	Lara Mendoza, Richard Patricio	04/05/2018 - 01:20 PM
Marzo 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se contrato a las microempresas con el fin de dar mantenimiento a las vías de la RVE-Orellana.	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/04/2018 - 05:02 PM
febrero 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se ha solicitado la emision de aval a fin de contratar las microempresas y de esta manera dar el mantenimiento a las vías de la RVE-Orellana	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/04/2018 - 05:02 PM
Enero 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se ha solicitado la emision de aval a fin de contratar las microempresas y de esta manera dar el mantenimiento a las vías de la RVE-Orellana	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/03/2018 - 08:39 PM
Diciembre 2017: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realiza el mantenimiento rutinario con las microempresas, de la misma manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías asi mismo se realizan reparaciones provisionales en la RVE.	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/01/2018 - 12:46 PM
Noviembre 2017: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realiza el mantenimiento rutinario con las microempresas, de la misma manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías asi mismo se realizan reparaciones provisionales en la RVE.	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/12/2017 - 04:20 PM
Octubre 2017: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizo la nueva contratacion por 5 meses de las micropempresas, a fin de que se continue con el mantenimiento rutinario, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.	Lara Mendoza, Richard Patricio	03/11/2017 - 04:07 PM
Septiembre 2017: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizo la nueva contratacion por 5 meses de las micropempresas, a fin de que se continue con el mantenimiento rutinario, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/10/2017 - 03:58 PM
Agosto 2017: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizo la nueva contratacion por 5 meses de las micropempresas, a fin de que se continue con el mantenimiento rutinario, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/09/2017 - 06:09 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de solventar cualquier eventualidades en las vías, se esta realizando bacheos en la via Coca-Dayuma-Ines Arango, Huataraco-Limite Napo.		
Julio 2017: Se realiza el mantenimiento rutinario de las vías que conforman la RVE de Orellana, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, se esta realizando bacheos en la via Coca-Dayuma-Ines Arango, Huataraco-Limite Napo.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/08/2017 - 07:28 PM
Junio 2017: Con fecha 06 de marzo de 2017, se realizo las ordenes de compra para la contratacion de ocho microem presas, a fin de realizar el mantenimiento rutinario de las vías que conforman la RVE de Orellana,, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, se esta realizando bacheos en la via Coca-Dayuma-Ines Arango.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/07/2017 - 11:57 AM
Mayo 2017: Con fecha 06 de marzo de 2017, se realizo las ordenes de compra para la contratacion de ocho microem presas, a fin de realizar el mantenimiento rutinario de las vías que conforman la RVE de Orellana,, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, se han realizado limpieza de derrumbes.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/06/2017 - 03:51 PM
Abril 2017: Con fecha 06 de marzo de 2017, se realizo las ordenes de compra para la contratacion de ocho microem presas, a fin de realizar el mantenimiento rutinario de las vías que conforman la RVE de Orellana,, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, se han realizado limpieza de derrumbes.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/05/2017 - 09:56 PM
Marzo 2017: Con fecha 06 de marzo de 2017, se realizo las ordenes de compra para la contratacion de ocho microem presas, a fin de realizar el mantenimiento rutinario de las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizaron trabajos de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, se han realizado limpieza de derrumbes.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/04/2017 - 09:40 AM
Febrero 2017: se realizaron trabajos de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, se han realizado limpieza de derrumbes.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/03/2017 - 02:23 PM
Enero 2017: se realizaron los trabajos de mantenimiento rutinario con una microempresa, limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/02/2017 - 03:09 PM
Diciembre 2016: se realizaron los trabajos de mantenimiento rutinario con una microempresa, limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, ademas se realizaron trabajos de bacheo en los puentes de la Via Coca Dayuma, asi como trabajos de mantenimiento en asentamientos. bacheo de accesos a puentes y varios tramos de la vi.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/01/2017 - 06:50 AM
Noviembre 2016: Durante este mes se realizaron los trabajos de mantenimiento rutinario con una microempresa, limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/01/2017 - 06:43 AM
Diciembre 2016:Durante el mes de Noviembre se realizaron los trabajos de mantenimiento rutinario con una microempresa, limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/12/2016 - 04:18 PM
Octubre 2016:Durante el mes se realizaron los trabajos de mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías. Por parte de la DDO, se realizo la contratación de Microempresas para realizar el mantenimiento rutinario para las vías Coca-Dayuma-Ines Arango-Tiguino y Coca-Joya de los Sachas y tramo Huataraco-Galeras -limite Napo.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/11/2016 - 03:12 PM
Noviembre 2016:Durante el mes se realizaron los trabajos de mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías. Por parte de la DDO, se realizo la contratación de Microempresas para realizar el mantenimiento rutinario para las vías Coca-Dayuma-Ines Arango-Tiguino y Coca-Joya de los Sachas y tramo Huataraco-Galeras -limite Napo.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/11/2016 - 03:10 PM
Septiembre 2016:Se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías. Por parte de la DDO, se realizo la contratación de Microempresas para realizar el mantenimiento rutinario para las vías Coca-Dayuma-Ines Arango-	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/10/2016 - 04:12 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Tiguino y Coca-Joya de los Sachas y tramo Huataraco-Galeras -limite Napo. Se realizan trabajos de señalización horizontal en la vía Coca-Dayuma.		
Agosto 2016: Se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías. Por parte de la DDO, se realizo la contratación de Microempresas para realizar el mantenimiento rutinario para las vías Coca-Dayuma-Ines Arango-Tiguino y Coca-Joya de los Sachas y tramo Huataraco-Galeras -limite Napo a traves del Catalogo Electronico.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/09/2016 - 01:50 PM
Julio 2016: Se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías. Por parte de la DDO, se realizo la contratación de Microempresas para realizar el mantenimiento rutinario para las vías Coca-Dayuma-Ines Arango-Tiguino y Coca-Joya de los Sachas y tramo Huataraco-Galeras -limite Napo a traves del Catalogo Electronico.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/08/2016 - 02:14 PM
Junio 2016: Se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías. Por parte de la DDO se estan tomando las acciones pertinentes a fin de realizar la contratación de las microempresas para el Mantenimiento Rutinario.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/07/2016 - 02:26 PM
Mayo 2016: Por parte de la DPO se ha realizado la gestion a fin de que las microempresas ingresen dentro del Catalogo Electronico a fin de que sean contratadas para realizar el mantenimiento rutinario de las vías, se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/06/2016 - 11:02 AM
Abril 2016: Por parte de la DPO se ha realizado la gestion a fin de que las microempresas ingresen dentro del Catalogo Electronico a fin de que sean contratadas para realizar el mantenimiento rutinario de las vías, se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	06/05/2016 - 11:13 AM
Marzo 2016: Por parte de la DPO se estan realizando las gestiones para realizar la contratacion de las microempresas y asi mantener con mantenimiento rutinario las vías, para el año 2016. , tambien se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/04/2016 - 03:43 PM
Febrero 2016: Por parte de la DPO se estan realizando las gestiones para realizar la contratacion de las microempresas y asi mantener con mantenimiento rutinario las vías, para el año 2016. Al momento estan trabajando micorempresas por medio de convenio de pago, tambien se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	02/03/2016 - 04:43 PM
Enero 2016: Por parte de la DPO se estan realizando las gestiones para realizar la contratacion de las microempresas y asi mantener con mantenimiento rutinario las vías, para el año 2016. Al momento tambien se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	11/02/2016 - 10:51 AM
Diciembre 2015: Por parte de la DPO se tomaron las acciones pertinentes para realizar la contratacion d elas microempresas por el lapso de un mes para asi mantener con mantenimiento rutinario las vías, se esta a la espera que el ministerio de finanzas emita su aval para realizar este proceso de contratación para el año 2016. Al momento tambien se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/01/2016 - 12:17 PM
Noviembre 2015: Por parte de la DPO se tomaron las acciones pertinentes para realizar la contratacion d elas microempresas por el lapso de un mes para asi mantener con mantenimiento rutinario las vías, se esta a la espera que el ministerio de finanzas emita su aval para realizar este proceso de contratación Al momento tambien se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/12/2015 - 11:09 AM
Octubre 2015: labores el 01 de julio de 2015, y 01 de Octubre de 2015, por parte de la DPO se estan tomando las acciones pertinentes para realizar las nuevas contrataciones y de esta manera lograr contratar para asi mantener con mantenimiento rutinario las vías, se esta a la espera que el ministerio de finanzas emita su aval para realizar este proceso de contratación Al momento tambien se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/11/2015 - 04:12 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Agosto 2015: Los trabajos que corresponden a las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y Huataraco-Limite Provincial Napo terminarán sus labores el 01 de julio de 2015, y 01 de Octubre de 2015, por parte de la DPO se están tomando las acciones pertinentes para realizar las nuevas contrataciones y de esta manera lograr contratar para así mantener con mantenimiento rutinario las vías, se está a la espera que el ministerio de finanzas emita su aval para realizar este proceso de contratación. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>07/10/2015 - 04:29 PM</p>
<p>Agosto 2015: Al momento se realizan los trabajos de mantenimiento con dos microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino tramo Dayuma-Inés Arango, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagües y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, cabe indicar que las microempresas que laboran en los tramos Coca-Dayuma y Huataraco-Limite Provincial Napo terminarán sus labores el 01 de julio de 2015, por parte de la DPO se están tomando las acciones pertinentes para realizar las nuevas contrataciones y de esta manera lograr contratar para así mantener con mantenimiento rutinario las vías, se está a la espera que el ministerio de finanzas emita su aval para realizar este proceso de contratación.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>08/09/2015 - 06:03 PM</p>
<p>Julio 2015: Al momento se realizan los trabajos de mantenimiento con dos microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino tramo Dayuma-Inés Arango, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagües y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, limpieza de derrumbes en varios sitios de la Red Vial Estatal, mantenimiento de señalización. cabe indicar que las microempresas que laboran en los tramos Coca-Dayuma y Huataraco-Limite Provincial Napo terminarán sus labores el 01 de julio de 2015, por parte de la DPO se están tomando las acciones pertinentes para realizar las nuevas contrataciones y de esta manera lograr contratar para así mantener con mantenimiento rutinario las vías.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>12/08/2015 - 12:02 PM</p>
<p>Junio 2015: Se realizaron los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagües y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, limpieza de derrumbes en varios sitios de la Red Vial Estatal, mantenimiento de señalización. cabe indicar que las microempresas que laboran en los tramos Coca-Dayuma y Huataraco-Limite Provincial Napo terminarán sus labores el 01 de julio de 2015, por parte de la DPO se están tomando las acciones pertinentes para realizar las nuevas contrataciones.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>09/07/2015 - 03:47 PM</p>
<p>Mayo 2015: Se realizaron los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagües y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, limpieza de derrumbes en varios sitios de la Red Vial Estatal, mantenimiento de señalización.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>05/06/2015 - 02:13 PM</p>
<p>Abril 2015: Se realizaron los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagües y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, derrumbes y reparación de baches, mantenimiento de señalización.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>09/05/2015 - 11:47 AM</p>
<p>Marzo 2015: Durante este mes realizaron los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagües y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, derrumbes y reparación de baches por parte del equipo caminero y personal de la Dirección Provincial y de esta manera mantener en buen estado estas paradas para beneficio de los usuarios.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>06/04/2015 - 03:20 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Febrero 2015: En este mes se realizaron los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagues y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento tambien se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener en buen estado estas paradas para beneficio de los usuarios.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>09/03/2015 - 09:04 AM</p>
<p>Enero 2015: En este mes se realizaron los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagues y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener en buen estado estas paradas para beneficio de los usuarios.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>09/02/2015 - 11:42 AM</p>
<p>Diciembre 2014: En este mes se realizaron los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagues y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener en buen estado estas paradas para beneficio de los usuarios.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>05/01/2015 - 07:14 PM</p>
<p>Noviembre 2014: Los trabajos de mantenimiento con las microempresas de los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, se realizan con normalidad en lo que son las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagues y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener en buen estado estas paradas para beneficio de los usuarios.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>01/12/2014 - 10:56 AM</p>
<p>Octubre 2014: Los trabajos de mantenimiento con las microempresas de los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagues y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener en buen estado estas paradas para beneficio de los usuarios.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>05/11/2014 - 10:10 AM</p>
<p>Septiembre 2014: Los trabajos de mantenimiento con las microempresas de los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma , Y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, se realizan sus labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagues y todas las acciones necesarias para mejorar las vías de la red vial estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener la vía para beneficio de los usuarios, se realizo la adjudicacion de la contratacion de dos microempresas para el tramo Dayuma-Ines Arango.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>07/10/2014 - 09:07 AM</p>
<p>Agosto 2014: Los trabajos de mantenimiento con las microempresas de los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma , Y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, se estan realizando sus labores de mantenimiento rutinario como son roza a mano., limpieza de cunetas, alcantarillas, desagues, limpieza de taludes y todas las acciones necesarias para mejorar las vías de la red vial estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener la vía para beneficio de los usuarios, se encuentra en proceso de contratacion la construccion de 11 paradas de buses en la red vial estatal de la provincia de Orellana y la contratacion de dos microempresas para el tramo Dayuma-Ines Arango.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>05/09/2014 - 02:28 PM</p>
<p>Julio 2014: Los trabajos de mantenimiento con las microempresas estan ya Adjudicados para de esta manera inicien las labores de mantenimiento rutinario desde el 02/07/2014 y todas las acciones necesarias para mejorarlas vías de la red estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener la vía para beneficio</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>06/08/2014 - 03:18 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de los usuarios, se estan preparando los pliegos para la construccion de 11 paradas de buses en la red vial estatal de la provincia de Orellana.		
Junio 2014: Los trabajos de mantenimiento con las microempresas estan ya Adjudicados para de esta manera inicien las labores de mantenimiento rutinario desde el 02/07/2014 y las que se consideren necesarias para mantener las vias de la red estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo camineroy personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener la via para beneficio de los usuarios.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	08/07/2014 - 03:19 PM
Mayo 2014: Los trabajos de mantenimiento con las microempresas estan ya en el portal de Compras Publicas para de esta manera continuar con las labores de mantenimiento rutinario y las que se consideren necesarias para mantener las vias de la red estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo camineroy personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener la via para beneficio de los usuarios.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	09/06/2014 - 09:38 AM
Abril 2014: Se culminaron con los trabajos de mantenimiento con las microempresas el 15 de Febrero de 2014 para lo cual se esta preparando los pliegos de los procesos de mantenimiento para su nueva contratacion y asi continuar con las labores de mantenimiento rutinario y las que se consideren necesarias para mantener las vias de la red estatal de Orellana Cabe indicar tambien que debido a que se hubo que realizar el pago de un proyecto como es Accesos al nuevo hospital de Puerto Francisco de Orellana, el cual fue es de USD. 863.733.25, lo que sumado con lo anterior supera el monto asignado para este proyecto de mantenimiento vial por lo tanto se debe preveer.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	15/05/2014 - 11:43 AM
Marzo 2014: Se culminaron con los trabajos de mantenimiento con las microempresas el 15 de febrero de 2014 para lo cual se esta preparando una nueva contratacion , los trabajos de desmontajes continuan segun el cronograma de trabajos.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	29/04/2014 - 11:44 AM
Febrero 2014: Se culminaron con los trabajos de mantenimiento con las microempresas el 15 de febrero de 2014 para lo cual se esta preparando una nueva contratacion , los trabajos de desmontajes continuan segun el cronograma de trabajos, la colocacion de guardavias culminaron, los trabajos de pintura del puente majestuoso rio Napo culminaron . Enero de 2014: Se continuan con los trabajos de mantenimiento con las microempresas cabe indicar que estas terminan su periodo de trabajos en 15 de febrero de 2014 para lo cual se esta preparando una nueva contratacion , los trabajos de desmontajes continuan segun el cronograma de trabajos. Diciembre 2013: Los trabajos de mantenimiento vial, con microempresas se realizan con normalidad, se continuan los trabajos de igual manera dentro del proyecto de mantenimiento vial se contrato la pintura y limpieza del Puente Nacional Majestuoso Rio Napo, la Colocacion de Guardavias en los accesos a los nueve puentes de la via Coca-Dayuma Noviembre 2013: Los trabajos de mantenimiento vial, con microempresas se realizan con normalidad, se continuan los trabajos del desmontaje del Puente Napo viejo, de igual manera dentro del proyecto de mantenimiento vial se contrato la pintura y limpieza del Puente Nacional Majestuoso Rio Napo, la Colocacion de Guardavias en los accesos a los nueve puentes de la via Coca-Dayuma ya que estos puentes solo son de un solo carril y al momento representan un peligro para los transportistas y usuario de esta via , por lo que se espera la contratacion de los mismos. Octubre 2013: Los trabajos de mantenimiento vial se realizan con normalidad cumpliendo con los cronogramas establecidos, como lo son las microempresas. se realizó la contratación del Desmontaje del Puente Napo viejo el cual se esta ejecutando para seguir con el cronograma establecido y cumplir los trabajos.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/04/2014 - 04:03 PM
Septiembre 2013: Dentro de los proyectos de mantenimiento vial tenemos el mantenimiento rutinario de las vias con las microempresas con el roza a mano, limpieza de cunetas , alcantarillas, desagues, al momento se esta por adjudicar un contrato para la colocacion de guardavias en los 9 puentes de la via Coca-Dayuma.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/11/2013 - 09:13 AM
Agosto 2013: En los proyectos que tenemos de mantenimiento vial tenemos el mantenimiento rutinario de las vias con las microempresas con el roza a mano, limpieza de cunetas , alcantarillas, desagues, se terminaron la reparacion y pintura de dos puentes el Puente Payamino y Coca en la Provincia de Orellana se culminaron los trabajos de colocacion de cinco paradas de buses en la Provincia de Orellana.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	06/09/2013 - 11:38 AM
Julio 2013: Con el fin de precautelar la via se sigue con los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos Coca-Dayuma , Huatraco-Limite Napo, de la misma manera se realizaron los trabajos de mantenimiento y pintura de los puentes coca y payamino , tambien se continuan con la construccion de 5 paradas de buses con el fin de precautelar el transito vehicular y para el buen uso del usuario de la via.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	06/08/2013 - 09:41 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/07/2013 - 10:01 AM
<p>Junio 2013: En los proyectos que tenemos de mantenimiento vial seguimos con el mantenimiento rutinario de las vías con las microempresas con el roza a mano, limpieza de cunetas , alcantarillas, desagües, de la misma manera estamos con la reparación y pintura de dos puentes el Puente Payamino y Coca en la Provincia de Orellana los cuales esta abanzando los trabajos para de esta manera cumplir con lo establecido en los cronogramas.</p> <p>Mayo 2013: En los proyectos que tenemos de mantenimiento vial seguimos con el mantenimiento rutinario de las vías con las microempresas con el roza a mano, limpieza de cunetas , alcantarillas, desagües, de la misma manera estamos con la reparación y pintura de dos puentes el Puente Payamino y Coca en la Provincia de Orellana.</p>	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	02/07/2013 - 11:18 AM
	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	03/06/2013 - 12:03 PM
<p>Abril 2013: Se siguen con los trabajos de mantenimiento vial en las vías con las microempresas: Conapa, Dayuma en la vía Coca-Dayuma y la Floresta en el tramo Huataraco-limite Provincial Napo de la vía Coca-Loreto-Limite Provincial Napo, estas microempresas tambien al momento realizan los trabajos de mantenimiento del Puente Nacional Majestuoso Rio Napo en vista de que es una obra emblematica y necesita de este mantenimiento los trabajos de reparacion en la via coca-dayuma estan terminados.</p> <p>Marzo 2013: Se siguen con los trabajos de mantenimiento vial en las vías con las microempresas: Conapa, Dayuma en la vía Coca-Dayuma y la Floresta en el tramo Huataraco-limite Provincial Napo de la vía Coca-Loreto-Limite Provincial Napo, estas microempresas tambien al momento realizan los trabajos de mantenimiento del Puente Nacional Majestuoso Rio Napo en vista de que es una obra emblematica y necesita de este mantenimiento</p> <p>De la misma manera se continuan con los trabajos de reparacion en los sitios inestables de la via Coca Dayuma</p>	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/05/2013 - 09:12 AM
<p>Febrero 2013: En este proyecto se contrato para un nuevo periodo a las microempresas Conapa, Dayuma en la vía Coca -Dayuma y la microempresa Floresta en la vía Coca-Loreto ,tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, para el periodo febrero 2013-febrero 2014.</p> <p>Se sigue con los trabajos de reparacion de los sitios inestables en la vía Coca -Dayuma, ya esta terminado el del km 11+840y 12+140, los demas siguen su cronograma de trabajos</p>	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	01/04/2013 - 03:33 PM
<p>Enero 2013 : :Dentro de los proyectos de mantenimiento vial tenemos se continua con los trabajos de reparacion de los sitios inestables de la vía Coca -Dayuma en los tramos 11+840 se ,en el tramo 12+180 de igual manera en el tramo 25+500 se sigue con los trabajos de construccion de los muros de hormigon tenemos tambien el tramo 27+050 y el tramo 27+170 dentro del cual se esta realizando movimientos de tierra , excavacion topografia de igual manera los trabajos de mantenimiento de las microempresas se cumplen</p> <p>Diciembre 2012: Dentro de los proyectos de mantenimiento vial tenemos la reparaciones de los sitios inestables de la vía Coca -Dayuma en los tramos 11+840 se empezo con la construcción del campamento, adecuación de letrinas, pozo séptico. se realizaron trabajos de excavación y relleno para estructuras , colocación de geotextil, se coloco material filtrante , tuberías para subdrenes ,en el tramo 12+180 se realizo excavación de material existente, para la colocación y construcción de los muros de gaviones se realizo excavación y relleno para estructuras, de igual manera en el tramo 25+500 se sigue con los trabajos de construccion de los muros de hormigon en este tramo tambien tenemos los trabajos de mantenimiento de las microempresas las cuales cumplen con su cronograma de trabajos .</p> <p>Noviembre 2012: Al momento se encuentran trabajando las microempresas encargadas del mantenimiento rutinario de la RVE de Orellana tanto en la vía Coca-Dayuma como en el tramo Huataraco Limite Provincial Napo, de igual manera se empezo a realizar los trabajos de reparacion en los sitios inestables de la vía Coca-Dayuma en las abscisas 11+840 y 12+180, 25+500</p>	Molina Larco, Diego Fernando	23/02/2013 - 09:11 AM
<p>Octubre 2012: Al momento se encuentran laborando en el mantenimiento de la Provincia de Orellana las microempresas realizando las labores de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, desagües, tambien se estan realizando trabajos de mantenimiento en el aeropuerto del coca, se esta realizando una estabilizacion y drenajes para la zona de reflexion , ademas se contrato la construccion de muros y gaviones en la vía coca- dayuma 11+840 y 12+180</p> <p>Septiembre 2012: las microempresas continúan con sus labores de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y así mantener las vías de la RVE en buen estado.</p> <p>Agosto 2012: las microempresas continúan con sus labores de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y así mantener las vías de la RVE en buen estado, la señalizacion estan terminados los trabajos.</p> <p>julio 2012: Se continuan con los trabajos de mantenimiento rutinario con las microempresas contratadas para cada tramo de via, realizando los trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas,</p>	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	08/11/2012 - 11:51 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>desagues, roza a mano .Tambien tenemos los avances de los trabajos de señalizacion en la via Coca- Loreto -Limite Provincial , en el tramo Huataraco-Galeras , de igual manera la señalizacion de la via Coca-Dayuma estan avanzando los trabajos.</p> <p>Junio 2012: Se continuan con los trabajos de mantenimiento vial , realizando el mantenimiento rutinario de limpieza de cunetas, alcantarillas, desagues, roza a mano y cualquier eventualidad que se presente en la via .Tambien tenemos los avances de los trabajos de señalizacion en la via Coca- Loreto -Limite Provincial , en el tramo Huataraco-Galeras el cual registra un avance de 30% de igual manera la señalizacion de la via Coca-Dayuma estan avanzando los trabajos.</p> <p>Mayo 2012: Se continuan con los trabajos de mantenimiento vial el cual es realizado por la microempresas contratadas para realizar estos trabajos como son roza a mano, limpieza de cunetas , desagues, alcantarillas, y en caso de deslizamientos tambien colaboran con la limpieza de ellos.. En cuanto a lo de las señalizacion de la via , Huataraco-Galeras , ya se encuentra realizando los trabajos , y la via Coca-Dayuma de igual manera se encuentra realizando los trabajos.</p> <p>Abril 2012 : Se continuan con los trabajos de mantenimiento vial el cual es realizado por la microempresas contratadas para realizar estos trabajos como son roza a mano, limpieza de cunetas , desagues, alcantarillas, y en caso de deslizamientos tambien colaboran con la limpieza de ellos. Los trabajos referente a la Adecuacion del Campamento al momento se encuentran paralizados los trabajos debido a que no contamos con informacion de si la obra continuara o no. En cuanto a lo de las señalizacion de la via , Huataraco-Galeras , ya se encuentra adjudicada para su contratacion , y la via Coca-Dayuma de igual manera se encuentra al momento realizando la adjudicacion para su debida contratacion.</p> <p>Marzo 2012: continuan las labores de mantenimiento vial con las microempresas que realizan estos trabajos en la Provincia de Orellana, en los tramos coca-dayuma , coca-loreto-huataraco-limite provincial napo. coca jivino verde, en cuanto al desmontaje del puente bailey sobre el rio suno, ya se encuentra terminado al momento ya presentaron la ultima planilla para su debida aprobacion y para asi realizar la recepcion provisional de dichos trabajos .</p> <p>Las microempresas que laboran dando el mantenimiento de las vias son: CONAPA , DAYUMA. NUEVO PARAISO. JUVENIL LORETO, AMAZONICA, NUEVA FLORESTA.</p> <p>Febrero 2012: en este mes se continuo con los trabajos de mantenimiento rutinario de los tramos de las vias coca-loreto-huataraco-limite provincial,coca- jivino verde, via coca- dayuma , de la misma manera se continua con los trabajos de la adecuacion del campamento de la Direccion Provincial de Orellana para de esta manera poder brindarle un mejor servicio al usuario , tambien se continua con el desmontaje del puente bailey sobre el rio suno,</p>		

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
3- REGIONAL. Ambiental. Condiciones Climaticas CAUSARÍAN inconvenientes a las vías	28/01/2020	Silvia Katherine Navarrete Gilces	20 %	20	4	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida:	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Documento entregado	1-Solicitud de Información	03/01/2012		03/01/2012		Sí	3.0
2	PLANEACION: Proceso en el incop realizado	2-Publicación de Pliegos	24/01/2012		24/01/2012		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	PLANEACION: Contrato adjudicado	3-Adjudicación	03/02/2012		03/02/2012		Sí	4.0
4	EJECUCION:desmontaje del Puente Bailey sobre el rio Suno realizado	4-Inicio de Trabajo	27/02/2012		27/02/2012		Sí	0.5
5	EJECUCION:adecuacion del campamento de la Direccion Provincial de Orellana (construccion de oficinas ) 40% realizado	5-Entregables Intermedios	29/02/2012		29/02/2012		Sí	0.5
6	EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 40.3+00de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 50%, realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/06/2012		Sí	0.5
7	EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 45+000 de la via coca-jivino verde (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 50%, realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/06/2012		Sí	0.5
8	EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 83+000 de la via coca-limite provincial con Napo (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 50%, realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/06/2012		Sí	0.5
9	EJECUCION:adecuacion del campamento de la Direccion Provincial de Orellana (construccion de oficinas ) 70%, realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2012		30/08/2012		Sí	0.5
10	EJECUCION:señalizacion horizontal de la via coca - dayuma longitud 40.3 km (pinturas dos franjas blancas y una amarilla ,colocacion de las valizas, tachas reflectivas ), realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.5
11	EJECUCION:señalizacion horizontal de la via Huataraco-Limite Provincial con Napo longitud 20 km (pinturas dos franjas blancas y una amarilla ,colocacion de las valizas, tachas reflectivas ) realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.5
12	EJECUCION:Mantenimiento, Estabilizacion y Drenaje de las Zonas de Seguridad de la Pista del Aeropuerto del Coca (100%) realizado	5-Entregables Intermedios	20/10/2012		25/11/2012		Sí	0.5
13	EJECUCION:Construccion de Muros de Gaviones y Obras Anexas en la Via Coca Dayuma Provincia de	1-Solicitud de Información	15/11/2012		15/12/2012		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Orellana Abscisas 11+840 y 12+180 ( CONTRATISTA : ROSERO LUCERO AQUILES REINALDO) 50% realizado							
14	EJECUCION:Construccion de Muros de Hormigon y Obras Anexas de Drenaje en la Via Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 25+500 ( CONTRATISTA : JOEL ARIOSTO GONZALEZ CASTRO 25% realizado	5-Entregables Intermedios	06/12/2012		06/01/2013		Sí	0.5
15	EJECUCION:Construccion de Muros de Gaviones y Obras Anexas en la Via Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 11+840 y 12+180 ( CONTRATISTA : ROSERO LUCERO AQUILES REINALDO) 50% realizado	1-Solicitud de Información	16/12/2012		16/01/2013		Sí	0.5
16	EJECUCION:adecuacion del campamento de la Direccion Provincial de Orellana (construccion de oficinas ) 100% ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		30/12/2012		Sí	0.5
17	EJECUCION: Elaboracion e Hincado de Micro Pilotes y otras Obras en la Via Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 27+050 y 27+170 ( CONTRATISTA : INGENIERO JOSE CLIMACO GARCIA GARCIA 50%, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.5
18	EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 40.3+00de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 100%, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.5
19	EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 45+000 de la via coca-jivino verde (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 100%, ejecutado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.5
20	EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 83+000 de la via coca-limite provincial con Napo (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 100%, ejecutado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.5
21	EJECUCION:Construccion de Muros de Hormigon y Obras Anexas de Drenaje en la Via Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 25+500 ( CONTRATISTA :	1-Solicitud de Información	03/01/2013		22/02/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	JOEL ARIOSTO GONZALEZ CASTRO 50%, ejecutado							
22	EJECUCION: Construccion de Muros de Hormigon y Obras Anexas de Drenaje en la Via Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 25+500 ( CONTRATISTA : JOEL ARIOSTO GONZALEZ CASTRO 75%, ejecutado	5-Entregables Intermedios	06/01/2013		06/02/2013		Sí	0.5
23	EJECUCION: Elaboracion e Hincado de Micro Pilotes y otras Obras en la Via Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 27+050 y 27+170 ( CONTRATISTA : INGENIERO JOSE CLIMACO GARCIA GARCIA 100%, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	18/02/2013		30/03/2013		Sí	0.5
24	EJECUTADO: Construccion de Muros de Hormigon y Obras Anexas de Drenaje en la Via Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 25+500 ( CONTRATISTA : JOEL ARIOSTO GONZALEZ CASTRO 100%, ejecutado	1-Solicitud de Información	22/04/2013		22/04/2013		Sí	0.5
25	EJECUCION: Reparacion y mantenimiento del Puente sobre el Rio Coca ,Provincia de Orellana ( CONTRATISTA VAZGO CONSTRUCCIONES ) 50% , relizado	5-Entregables Intermedios	26/04/2013		26/04/2013		Sí	0.5
26	EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 63+000 al 83+000 de la via coca-loreto, tramo Huataraco-Limite Provincial Napo (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 50%, realizado.	1-Solicitud de Información	29/06/2013		29/06/2013		Sí	0.5
27	EJECUCION: Reparacion y mantenimiento del Puente sobre el Rio Payamino,Provincia de Orellana ( CONTRATISTA ING. ARTEMIO TORRES ) 50%, realizado	1-Solicitud de Información	29/06/2013		29/06/2013		Sí	0.5
28	EJECUCION: Reparacion y mantenimiento del Puente sobre el Rio Coca ,Provincia de Orellana ( CONTRATISTA VAZGO CONSTRUCCIONES ) 100 % , ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/06/2013		Sí	0.5
29	EJECUCION: Construccion de cinco paradas de buses en la Provincia de Orellana (CONTRATISTA VAZQUEZ MALDONADO GUILLERMO OSWALDO 100%), ejecutado	1-Solicitud de Información	15/08/2013		15/08/2013		Sí	0.5
30	EJECUCION: Reparacion y mantenimiento del Puente sobre el Rio	1-Solicitud de Información	15/08/2013		15/08/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Payamino, Provincia de Orellana ( CONTRATISTA ING. ARTEMIO TORRES ) 100%, ejecutado							
31	EJECUCION: Mantenimiento y Pintura del Majestuoso Puente sobre el Rio Napo(Contratista Ingeniero Jaime Acosta 50%), realizado.	1-Solicitud de Información	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.5
32	EJECUCION: Servicio de Desmontaje del puente Acrow ddr de 292 metros sobre el Rio Napo cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana ( Contratista: Ingeniero Honorato Vazquez Guerrón 40%), realizado	5-Entregables Intermedios	15/12/2013		15/12/2013		Sí	0.5
33	EJECUCION: Colocacion de Guardavias en los Accesos a los nueve puentes de la via Coca-Dayuma ( Contratista Ingeniero Milton Lascano 50%), realizado	1-Solicitud de Información	23/12/2013		30/03/2014		Sí	0.5
34	EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 63+000 al 83+000 de la via coca-loreto, tramo Huataraco-Limite Provincial Napo (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 88%, realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2013		29/12/2013		Sí	0.5
35	EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 20+000 de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria)88%, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		30/12/2013		Sí	0.5
36	EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 20+000 de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria)100%, ejecutado	1-Solicitud de Información	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.5
37	EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 40+300de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 88%, ejecutado	1-Solicitud de Información	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.5
38	EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 40+300de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 100%, ejecutado	1-Solicitud de Información	17/02/2014		17/02/2014		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
39	EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo 63+000 al 83+000 de la via coca-loreto, tramo Huataraco-Limite Provincial Napo (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 100%, ejecutado	1-Solicitud de Información	30/05/2014		30/05/2014		Sí	0.5
40	EJECUCION:Servicio de Desmontaje del puente Acrow ddr de 292 metros sobre el Rio Napo cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana ( Contratista: Ingeniero Honorato Vazquez Guerrón 100%), realizado	1-Solicitud de Información	30/05/2014		30/05/2014		Sí	0.5
41	EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo desde 23+000 al 43+000 de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 50 %, ejecutado.	1-Solicitud de Información	02/07/2014		02/07/2014		Sí	0.5
42	EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo desde 23+000 al 43+000 de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria)100 % realizado	1-Solicitud de Información	02/07/2014		31/12/2015		Sí	0.5
43	EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo desde 63+000 al 84 +000 de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 100 %, realizado.	1-Solicitud de Información	02/07/2014		02/07/2015		Sí	0.5
44	EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo desde 63+000 al 84 +000 de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 50 %, ejecutado.	1-Solicitud de Información	02/07/2014		02/07/2015		Sí	0.5
45	EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo desde la Y del Coca tramo 00+000 al 23+000 de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 100 %, ejecutado.	1-Solicitud de Información	02/07/2014		31/12/2014		Sí	0.5
46	.EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde el tramo 46+000 al 66+000 de la via coca-dayuma tramo Dayuma-Ines Arango(roza a mano, limpieza de cunetas,	1-Solicitud de Información	14/07/2014		31/12/2014		Sí	0.5



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	limpieza de alcantarillas y desagües,jardinería) 100 %, ejecutado.							
47	EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde la Y del Coca tramo 00+000 al 23+000 de la vía coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües,jardinería) 50 %, ejecutado	1-Solicitud de Información	14/07/2014		14/07/2015		Sí	0.5
48	EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde el tramo 46+000 al 66+000 de la vía coca-dayuma tramo Dayuma-Ines Arango(roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües,jardinería) 50 %, ejecutado.	1-Solicitud de Información	08/10/2014		08/10/2015		Sí	0.5
49	EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde el tramo 66+000 al 86+000 de la vía coca-dayuma - tiguino tramo Ines Arango-Comunidad Andina (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües,jardinería) 50 %, ejecutado	1-Solicitud de Información	08/10/2014		08/10/2015		Sí	0.5
50	.EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde el tramo 66+000 al 86+000 de la vía Coca-Dayuma-Tiguino- tramo Ines Arango-Comunidad Andina (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües,jardinería) 100 %, ejecutado.	1-Solicitud de Información	14/10/2014		14/10/2015		Sí	0.5
51	EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 23+000 de la vía coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües,jardinería) 100%, ejecutado.	1-Solicitud de Información	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.5
52	EJECUCION: Servicio de mantenimiento rutinario y conservación vial de la vía coca-Loreto-Huataraco, desde el tramo 31+500 hasta el km 63+000 en una longitud de 31,5 km.Ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.5
53	EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde el tramo 46+000 al 66+000 de la vía coca-dayuma tramo Dayuma-Ines Arango(roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües,jardinería) ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
54	EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde el tramo 63+000 al 84+000 de la via Coca-Loreto-Huataraco-Limite Napo tramo Huataraco-Limite Provincia Napo (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues)ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.5
55	EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde el tramo 66+000 al 86+000 de la via coca-dayuma - tiguino tramo Ines Arango-Comunidad Andina (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.5
56	EJECUCIÓN: servicio de mantenimiento rutinario y conservación vial de la vía Coca-Joya de los Sachas - Limite Provincia Sucumbíos, desde el tramo00+000 hasta el km 45+000 en una longitud de 45 km, Ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.5
57	EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 23+000 al 46+00de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 100%, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.5
58	EJECUCION: Servicio de mantenimiento rutinario y conservación vial de la vía coca-Loreto-Huataraco, desde el tramo 00+000 hasta el km 31+500 en una longitud de 31,5 km.Ejecutado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.5
59	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Abril , realizado	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.5
60	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de mayo , realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.5
61	EJECUCIÓN:Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Junio , realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.5
62	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas,	5-Entregables Intermedios	28/07/2017		28/07/2017		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de julio , realizado							
63	EJECUCIÓN; Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de para vehículos de la Dirección distrital Orellana para el 2017, mes de julio realizado	5-Entregables Intermedios	29/07/2017		29/07/2017		Sí	0.5
64	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Agosto , realizado	5-Entregables Intermedios	29/08/2017		29/08/2017		Sí	0.5
65	EJECUCION: Mantenimiento de Señalización demarcadores retroreflectivos bidireccional lentes rojo -blanco, mes de septiembre realizado	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.5
66	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Noviembre , realizado	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.5
67	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Septiembre , realizado	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.5
68	EJECUCIÓN: Reparación de hundimientos en las abscisas 40+300, 46+100, 76+500 en la Vía Coca Dayuma - Inés Arango-Tiguino, mes de septiembre realizado	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.5
69	EJECUCION: Mantenimiento de Señalización demarcadores retroreflectivos bidireccional lentes rojo -blanco, mes de octubre realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.5
70	EJECUCIÓN: Reparación de hundimientos en las abscisas 79+900, 79+500, 82+300 en la Vía Coca Dayuma -Inés Arango-Tiguino, Octubre realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.5
71	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Octubre , realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.5
72	EJECUCION: Mantenimiento del tramo Inés rango-Tiguino de 20 km lastrado, realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.5
73	EJECUCION: Mantenimiento de Señalización pintura de	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	tráfico acrílica a base de agua amarilla y blanco para la señalización horizontal de la rve de Orellana, realizado							
74	EJECUCIÓN: Mantenimiento y reparación de maquinaria de la Dirección Distrital Orellana para el 2017, realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.5
75	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Diciembre , realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.5
76	EJECUCION: Reparación de hundimientos en las abscisas 35+200, 36+100, 38+500 en la Vía Coca Dayuma -Inés Arango-Tiguino, realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.5
77	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Enero , realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2017		30/12/2017		Sí	0.5
78	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Marzo , realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2017		30/12/2017		Sí	0.5
79	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de marzo, realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/03/2018		30/03/2018		Sí	1.0
80	EJECUCION: Reparación de hundimientos en las abscisas 17+600, 17+900, 34+300 en la Vía Coca Dayuma -Inés Arango-Tiguino, realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2018		30/03/2018		Sí	1.0
81	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	1.0
82	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2018		30/05/2018		Sí	1.0
83	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado	9-Entregables Formales	30/06/2018		30/06/2018		Sí	1.0
84	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-	5-Entregables Intermedios	30/07/2018		30/07/2018		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado							
85	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2018		30/08/2018		Sí	1.0
86	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.0
87	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2018		30/10/2018		Sí	1.0
88	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.0
89	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de mayo , realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2018		30/12/2018		Sí	1.0
90	EJECUCION: Servicios Personales por Contrato (Contratacion Tecnico grupo 71) mes de Diciembre , realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2018		30/12/2018		Sí	1.0
91	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de marzo , realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		01/05/2019		Sí	1.0
92	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado	5-Entregables Intermedios	01/05/2019		01/05/2019		Sí	1.0
93	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de mayo , realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	1.0
94	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de junio , realizado	5-Entregables Intermedios	01/07/2019		01/07/2019		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
95	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de julio , realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	1.0
96	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de agosto , realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	1.0
97	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de septiembre , realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.0
98	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de octubre , realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2019		30/10/2019		Sí	1.0
99	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de noviembre , realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	1.0
100	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de diciembre , realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2019		30/12/2019		Sí	1.0
101	EJECUCION: Servicios Personales por Contrato (Contratacion Tecnico grupo 71) mes de Diciembre , realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2019		30/12/2019		Sí	1.0
102	EJECUCION: Reparacion y mantenimiento del Puente sobre el Rio Payamino ,Provincia de Orellana , relizado	5-Entregables Intermedios	18/03/2020		18/03/2020		Sí	2.0
103	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril 2020 , realizado	9-Entregables Formales	30/04/2020	29/05/2020			No	1.0
104	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite	9-Entregables Formales	29/05/2020	29/05/2020			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Napo mes de mayo 2020 , realizado							
105	EJECUCION: Contrato De Asfaltado De La Vía Loreto Puerto Murialdo Km 0+00 Al 10+000, REALIZADO	5-Entregables Intermedios	30/05/2020	30/05/2020			No	4.0
106	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de junio 2020 , realizado	9-Entregables Formales	30/06/2020	30/06/2020			No	1.0
107	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de julio 2020 , realizado	9-Entregables Formales	31/07/2020	31/07/2020			No	1.0
108	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de agosto 2020 , realizado	9-Entregables Formales	31/08/2020	31/08/2020			No	1.0
109	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de septiembre 2020 , realizado	9-Entregables Formales	01/10/2020	01/10/2020			No	1.0
110	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de octubre 2020 , realizado	9-Entregables Formales	30/10/2020	30/10/2020			No	1.0
111	EJECUCION: Contrato De Reparación de Puntos Críticos, en Varios Tramos Coca Dayuma, Coca-Loreto-Huataraco-Limite Napo, Realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	2.5
112	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de noviembre 2020 , realizado	9-Entregables Formales	30/11/2020	30/11/2020			No	1.0
113	EJECUCION: Contrataciones Varias, realizadas	5-Entregables Intermedios	30/12/2020	30/12/2020			No	1.0
114	EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de diciembre 2020 , realizado	9-Entregables Formales	30/12/2020	30/12/2020			No	1.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
115	EJECUCION: Reparacion y mantenimiento del Puente sobre el Suno, Coca, Provincia de Orellana, realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2020	30/12/2020			No	1.0
116	CIERRE: Acta de Entrega de Recepción Definitiva, Suscrita	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	1.0
117	CIERRE: Acta de Entrega de Recepción Provisional, Suscrita	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	1.0
118	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago, Suscrito.	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	1.0
119	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, Suscrito.	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	1.0
120	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios contables o de tesorería pendientes por liquidar, Suscrito.	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	1.5
121	CIERRE: Cierre de proyecto según formato SENPLADES, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	2.0
122	CIERRE: Informes de Fiscalización, aprobados	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	1.0
123	CIERRE: Liquidación Económica, aprobada	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	1.0
124	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.5
125	COMPLETADO	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	24/12/2015
2	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	22/10/2015
3	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	24/09/2015
4	OBRA EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	20/07/2015
5	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	18/08/2015
6	PROYECTO EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	21/05/2015
7	TRAMO COCA - DAYUMA VIA EN MAL ESTADO	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	12/12/2014
8	MANTENIMIENTO DEL TRAMO COCA-DAYUMA	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	26/08/2014
9	PROYECTO NO EJECUTADO AL 100%	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	03/06/2014



**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
10	Verificar el avance de la obra.	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	17/03/2014
11	Verificación del proyecto en el tramo Coca-Dayuma.	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	01/04/2014
12	Avance de los obras	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	29/12/2013
13	Rosario Cortez	Cortez Rodriguez, Doriz Rosario	{PR} - Provincia - ORELLANA	06/08/2013
14	Historico - En la visita realizada el día de ayer 25 de julio de 2012 en la vía Coca-Lago Agrio se constato el grupo de trabajo que se encuentra cerrando grietas y fisuras en la capa asfáltica,	Cortez Rodriguez, Doriz Rosario	{PR} - Provincia - ORELLANA	25/07/2012
15	Historico - Avanza el rebacheo de la vía coca- limite provincial con Napo, sin embargo faltan algunos baches que ya estan preparados para ser parchados..	Cortez Rodriguez, Doriz Rosario	{PR} - Provincia - ORELLANA	10/03/2012

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentajes de mantenimiento de la Red Vial Estatal de Orellana en buen estado.	▼	88.54 %	65	57.55	01/01/2014	Mayo


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,312,219.38 **
Costo Total:	46,713,335.47
Total Devengado:	16,614,628.78
% Costo Total Devengado:	35.57 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 35.57 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	13,636,735.69	5,302,129.29	0.00	18,938,864.98
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	17,227,965.24	2,000,000.00	0.00	19,227,965.24
Ppto. Codificado	19,711,797.56	2,000,219.15	0.00	21,712,016.71
Ppto. Comprometido	18,388,367.31	466,142.94	0.00	18,854,510.25
Planeado - Codificado (2020)		3,301,910.14		
Programado a Devengar	18,450,957.36	2,000,219.15	0.00	20,451,176.51
Ppto. Devengado	16,312,000.23	302,628.55	0.00	16,614,628.78
Pagado Real	13,038,276.05	267,665.53	0.00	13,305,941.58
Estimado a fin de año	* 16,312,000.23	0.00	0.00	16,312,000.23
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	2,138,957.13	2,000,219.15	0.00	4,139,176.28
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 88.41 %	15.13 %	0.00 %	81.24 %
Ppto. Codificado 998	1,767,834.78	0.00	0.00	1,767,834.78
Ppto. Devengado 998	1,575,571.50	0.00	0.00	1,575,571.50

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

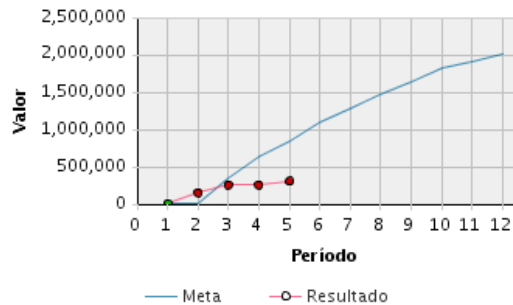

Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	3,411.22	3,411.22	3,411.22	3,411.22	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.17 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	3,670.38	152,591.33	7,081.60	156,002.55	2,202.93 %		7.80 %
Mar	343,116.26	102,537.72	350,197.86	258,540.27	73.83 %		12.93 %
Abr	290,643.91	259.16	640,841.77	258,799.43	40.38 %		12.94 %
May	194,911.27	43,829.12	835,753.04	302,628.55	36.21 %		15.13 %
Jun	268,320.87		1,104,073.91				
Jul	174,415.74		1,278,489.65				
Ago	190,843.86		1,469,333.51				
Sep	162,295.73		1,631,629.24				
Oct	182,550.37		1,814,179.61				
Nov	88,455.23		1,902,634.84				
Dic	97,584.31		2,000,219.15				
<b>Total</b>	<b>2,000,219.15</b>	<b>302,628.55</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
17	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
18	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
19	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Fotografías Señalización Coca-Dayuma	C.9.pdf	08/04/2014
2	Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de mantenimiento vial	G.8.pdf	28/12/2016
3	Actividades de las Microempresas	D.1.pdf	08/04/2014
4	Actividades de las Microempresas	A.8.pdf	08/04/2014
5	Actividades y fotografías de microempresas	C.5.pdf	08/04/2014
6	Actividades y fotografías Señalización	A.7.pdf	08/04/2014
7	Asociación de Hitos 6,7,8,18,19,20 Actividades de las Microempresas	A.3.pdf	08/04/2014
8	Asociación Hito 10 Fotografías Señalización	A.5.pdf	08/04/2014
9	Asociación Hito 11 Fotografías Señalización Huataracolímite provincial Napo	A.6.pdf	08/04/2014
10	Asociación Hito 4 Fotografías Desmontaje Suno	A.2.pdf	08/04/2014
11	Asociación Hito 4 Informes Sitop Desmontaje Suno	A.1.PDF	08/04/2014
12	Asociado con el hito 13.15 Actividades trabajos 11+180	A.9.pdf	08/04/2014
13	Asociado con el hito 13.15 Actividades trabajos 11+840	C.1.pdf	08/04/2014
14	Asociado con el hito 14.22.23.25 Actividades trabajos 25+500	C.2.pdf	08/04/2014
15	Asociado con el hito 14.22.23.25 Actividades trabajos 25+500	D.2.pdf	08/04/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	Asociado con el hito 26.29 Actividades trabajos pintura Rio Coca	C.6.pdf	08/04/2014
17	Asociado con el hito 26.29 Actividades trabajos pintura Rio Coca	C.8.pdf	08/04/2014
18	Asociado con el hito 26.29 Actividades trabajos pintura Rio Coca	C.3.pdf	08/04/2014
19	Asociado con el hito 27.30 Actividades trabajos de Pintura Rio Payamino	C.4.pdf	08/04/2014
20	Asociado con el hito 32.Actividades trabajos pintura Puente Napo	D.3.pdf	08/04/2014
21	Asociado con el hito 33.41 Actividades trabajos desmontaje napo	D.4.PDF	08/04/2014
22	Autorización para ampliación de fecha fin año 2020	MTOP-CGP-2020-75-ME_autorizacion_ampliar_fecha_de_fin_proyectos_PAI_2020_Orellana_con_anexos.pdf	27/01/2020
23	AVAL APROBADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO RVE 2020	J.3.pdf	05/05/2020
24	Cedula Presupuestaria Abril 2020	J.1.pdf	05/05/2020
25	Cedula presupuestaria enero 2020	I.7.pdf	05/02/2020
26	Cedula Presupuestaria febrero 2020	I.8.pdf	03/03/2020
27	Cedula Presupuestaria Mantenimiento Vial Orellana.	H.2.PDF	12/06/2019
28	Cedula Presupuestaria Marzo 2020	I.9.pdf	03/04/2020
29	Cedula presupuestaria mayo 2020	J.2.pdf	05/06/2020
30	Cedula Presupuestaria Noviembre 2019	H.4.pdf	16/12/2019
31	Cedula Presupuestaria OCTUBRE 2019	Cedula_presupuestaria_octubre_2019_orellana.pdf	05/11/2019
32	Cedula Presupuestaria Orellana 2012 Mensualizada	devengado_mantenimiento_vial_orellana_2012.pdf	09/01/2020
33	Cedula Presupuestaria Orellana 2013 Mensualizada	devengado_mantenimiento_vial_orellana_2013.pdf	09/01/2020
34	Cedula Presupuestaria Orellana 2014 Mensualizada	devengado_mantenimiento_vial_orellana_2014.pdf	09/01/2020
35	Cedula Presupuestaria Orellana 2015 Mensualizada_programa 25	devengado_mantenimiento_vial_orellana_2015_programa_25.pdf	09/01/2020
36	Cedula Presupuestaria Orellana 2015 Mensualizada_programa 56	devengado_mantenimiento_vial_orellana_2015_programa_56.pdf	09/01/2020
37	Cedula Presupuestaria Orellana 2016 Mensualizada	devengado_mantenimiento_vial_orellana_2016.pdf	09/01/2020
38	Cedula Presupuestaria Orellana 2017 Mensualizada	devengado_mantenimiento_vial_orellana_2017.pdf	09/01/2020
39	Cedula Presupuestaria Orellana 2018 Mensualizada	devengadado_mantenimiento_vial_orellana_2018.pdf	09/01/2020
40	Cedula Presupuestaria Orellana 2019 Mensualizada	cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_orellana_2019_mensualizada.pdf	09/01/2020
41	Cedulas presupuestarias mantenimiento vial septiembre 2019	H.3.PDF	04/10/2019
42	CERTIFICACION APROBADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO RVE 2020	J.5.pdf	05/05/2020
43	CERTIFICACIÓN DE PLANIFICACIÓN (CP-104-2020) SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ORELLANA MTOP-CGP-2020-586-ME	J.2.pdf	05/05/2020
44	Contratos de Mantenimiento Vial	G.6.pdf	28/12/2016
45	Cronograma valorado por componentes y sus devengados desde eel año 2009	G.2.xls	05/09/2015
46	Ficha del Proyecto Mantenimiento vial	F.9.doc	05/09/2015
47	Fotografías de los trabajos realizados Pintura Puente Napo	D.6.pdf	08/04/2014
48	Fotografías de trabajos de Mantenimiento Rutinario microempresas Julio 2014	E.2.pdf	06/08/2014
49	Gestion de Contratación de Microempresas Riesgo cumplido	H.5.pdf	04/01/2020
50	Informe de Gestión Mantenimiento vial para aval del MCPEC	G.1.PDF	05/09/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
51	Informe de los trabajos de Mantenimiento vial Agosto 2016	G.5.PDF	07/09/2016
52	Informe de Mantenimiento Vial Diciembre 2016.	H.1.1	05/01/2017
53	Informe de mantenimiento vial septiembre 2016	G.6.PDF	05/10/2016
54	Informe de microempresas 2019	H.1.pdf	04/10/2019
55	Informe de Sitop Abril 2015	F.5.PDF	09/05/2015
56	Informe de Sitop Agosto 2015	G.3.PDF	08/09/2015
57	Informe de Sitop Julio 2015	F.8.PDF	05/09/2015
58	Informe de Sitop Junio 2015	F.7.PDF	09/07/2015
59	Informe de Sitop Mayo 2015	F.6.PDF	05/06/2015
60	Informe de Sitop Septiembre 2014.	E.3.PDF	09/10/2014
61	Informe de Sitop Septiembre 2015	G.4.PDF	07/10/2015
62	Informe de Termino de Mutuo Acuerdo con las Microempresas JUVENIL LORETO, AMAZONICA, NUEVO PARAISO	C.7.pdf	08/04/2014
63	Informe de trabajos de Mantenimiento Vial RVE-Orellana 2016	H.1.pdf	28/12/2016
64	Informe Ejecutivo Sitop Noviembre 2014.	E.5.PDF	03/12/2014
65	Informe Sitop 2012	A.4.PDF	08/04/2014
66	Informe Sitop 2013	D.5.PDF	08/04/2014
67	Informe Sitop 2014	D.8.PDF	08/04/2014
68	Informe Sitop año 2014	D.9.pdf	29/05/2014
69	Informe Sitop Diciembre 2014 Mantenimiento Vial Auca Libre	F.1.pdf	05/01/2015
70	Informe Sitop Diciembre 2014 Mantenimiento Vial Conapa	E.6.pdf	05/01/2015
71	Informe Sitop Diciembre 2014 Mantenimiento Vial Dayuma	E.7.pdf	05/01/2015
72	Informe Sitop Diciembre 2014 Mantenimiento Vial Floresta	E.8.pdf	05/01/2015
73	Informe Sitop Diciembre 2014 Mantenimiento Vial Ines Arango	E.9.pdf	05/01/2015
74	Informe Sitop Febrero 2015	F.3.PDF	10/03/2015
75	Informe Sitop Marzo 2015	F.4.PDF	06/04/2015
76	Informes de Sitop Agosto 2014 mantenimiento vial Microempresas	E.2.PDF	05/09/2014
77	Informes de Sitop Julio 2014	E.1.PDF	06/08/2014
78	Informes Sitop Mantenimiento vial enero 2015.	F.2.PDF	09/02/2015
79	Informes Sitop mes de Octubre 2014	E.4.PDF	05/11/2014
80	Memorando MTOP-FINAN _ORE-2020-20-ME, CERTIFICACION MANTENIMIENTO MICROEMPRESAS 2020	J.4.pdf	05/05/2020
81	Oredenes de Compra para realizar el Mantenimiento Rutinario de la RVE-Orellana	G.7.pdf	28/12/2016
82	Oredenes de Compra para realizar el Mantenimiento Rutinario de la RVE-Orellana Dcbre 2016	G.9.pdf	28/12/2016

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Lara Mendoza, Richard Patricio	Administrador del Proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras	rlara@mtop.gob.ec	023974600

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
		Públicas de Orellana, Encargado		
Navarrete Gilces, Silvia Katherine	Supervisor del proyecto - Lider Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	snavarrete@mtop.gob.ec	023974600
Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Zonal 2	rramirez@mtop.gob.ec	
VALENCIA CORRALES, RUBEN DARIO	Supervisor Financiero	SUPERVISOR FINANCIERO	rvalencia@mtop.gob.ec	062860951 ext. 23805

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
30004_1.jpg	05/07/2018
