

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 5**

**Dirección Provincial Los Ríos**

**PROYECTO: K017 MTOP - Mantenimiento Vial de la provincia de Los Ríos**

|                                |   |                                 |                         |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan (mmayorga@mtop.gob.ec) |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Bastidas Izurieta, Álvaro Sebastián                   | Programas Relacionados:         | Provincia - Los Ríos    |
| Titular:                       | Zambrano Montes, Ian Carlos                           | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura                                       | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 175200000.506.3668                                    | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 4   | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Media   | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 25,723,248.30           |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                      |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |   | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 15/02/2012 - 31/12/2021 |
| Fecha de última actualización: | 25/05/2021  | Fecha de Fin Base:              | 28/03/2013              |
| Modificado por:                | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan                        | Fecha del siguiente Hito:       | 31/05/2021              |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Se realiza la contratación de dos Microempresas para la ejecución de trabajos de mantenimiento rutinaria y atención de emergencias en las vías:

\* San Juan-Vinces con una longitud de 32Km

Contratista: Microempresa de Conservación vial "San Lorenzo de Vinces"

Fiscalizador: MARCILLO GAVILANEZ DANNY ORLANDO

\* Quevedo- El Empalme en una longitud de 17 Km.

Contratista: Microempresa de Conservacion vial " El Guayacan"

Fiscalizador: QUEZADA CABRERA VICENTE HERMOGENES

**Beneficios Cualitativos**

El mejoramiento de una carretera ocasionará el surgimiento del denominado Tráfico, el cual se produce fundamentalmente por la reducción de los costos del transporte, disminución del tiempo de viaje, desarrollo de mayores velocidades y confort o seguridad en el viaje.

**Tipo de Beneficiario**

Aumento de los ingresos promedio en aquellas poblaciones donde se ha cumplido con las actividades de conservación de carreteras; Agricultores, Ganaderos, Comerciantes, Turísticos.

**Restricciones**

Deben ser especificadas al menos en términos de TIEMPO, COSTO, RECURSOS y ALCANCE, y deben ser cuantificables. Éstas se refieren a factores limitantes existentes en el presente, sujetos a certidumbre, que restringen el campo de trabajo en los aspectos mencionados. Son limitantes y son redactadas en positivo. Generalmente se las identifica en la fase de planificación. Se sugiere considerar el punto 5.1 del Proyecto de Inversión aprobado por la Senplades.

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 2 años.

COSTO: Valor monetario del presupuesto límite previsto para su realización.


ALCANCE: Hace referencia a especificaciones técnicas de lo que se espera obtener, por ejemplo en equipos, sistemas a implementar, cantidad de personas a ser capacitadas, entre otros.

RECURSOS: Tales como humanos, materiales, equipos o cualquier otro factor(es) con los cuales se cuente para la ejecución del proyecto; al ser los recursos limitados y no infinitos, éstos implican una restricción

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 94.07 %  
 Fecha de Inicio: 15/02/2012 Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

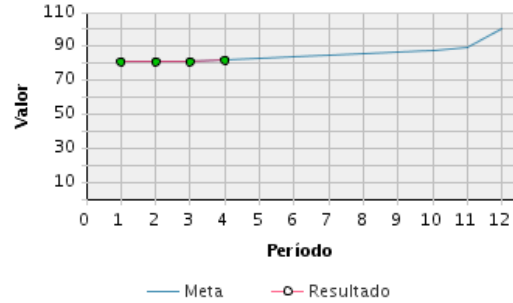

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2021                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 81 %                        | 81 % | 81 % | 82 % | 83 % | 84 % | 85 % | 86 % | 87 % | 88 % | 89 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 81 %                        | 81 % | 81 % | 82 % |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Estado               |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    |      |      |      |      |      |      |      |       |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                                | Fecha de última actualización    |
|--|---|----------------------------------|
| <p>MAYO 2021</p> <p>CAUSAS: ES NECESARIO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS PARA LAS REDES VIALES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, CORTE DE MALEZA, ROZA A MANO, LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICALES, HORIZONTALES, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BACHEO MENOR Y MAYOR, SELLO DE FISURAS; ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR CONTRATACIONES POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO MEDIANTE CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL Y CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE MEZCLA ASFÁLTICA Y SUMINISTROS PARA INSTALACIÓN DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL</p> <p>ACCIONES: REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP LOS RIOS CONSTANDO EN Memorando Nro. MTOP-DDR-2021-668-ME Y Memorando Nro. MTOP-DDR-2021-669-ME DE FECHA 12 DE MAYO DE 2021 DONDE SE SOLICITA AL SUBSECRETARIO ZONAL 5 LA VIABILIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LA OBTENCIÓN DE AVALES; SUBSECRETARIA ZONAL 5 EMITE LOS Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2021-1213-ME Y Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2021-1219-ME DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021 PARA LA CERTIFICACIONES DE PLANIFICACIÓN; DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL MTOP LOS RÍOS REALIZA LA COMUNICACIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LOS AVALES PARA LA CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL DE LA ZONA NORTE Y SUR DE LA PROVINCIA MEDIANTE Memorando Nro. MTOP-FINAN_RIO-2021-71-ME Y Memorando Nro. MTOP-FINAN_RIO-2021-72-ME DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021.</p> | <p>Mayorga<br/>Reinoso, Marcos<br/>Hernan</p> | <p>25/05/2021 -<br/>10:19 AM</p> |
| <p>ABRIL 2021</p> <p>CAUSAS: ES NECESARIO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS PARA LAS REDES VIALES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, CORTE DE MALEZA, ROZA A MANO, LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICALES, HORIZONTALES, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BACHEO MENOR Y MAYOR, SELLO DE FISURAS; ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR CONTRATACIONES POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO MEDIANTE CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL Y CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE MEZCLA ASFÁLTICA Y SUMINISTROS PARA INSTALACIÓN DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL</p> <p>ACCIONES: SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRAMITES PRELIMINARES INFORMES DE LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PARA REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL Y MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS</p>  | <p>Mayorga<br/>Reinoso, Marcos<br/>Hernan</p> | <p>05/05/2021 -<br/>08:53 AM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                                | Fecha de última actualización    |
|---|---|----------------------------------|
| <p>REDES VIALES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS; Dirección Distrital de Los Ríos mediante Memorando Nro. MTOP-DDR-2021-545-ME del 23 de abril de 2021 solicita al Sr. Ing. Erwin Nicolás Montalván Rodríguez Subsecretario Zonal 5 la reprogramación del POA en base a nuevos saldos disponibles y Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2021-1047-ME de fecha 29 de abril de 2021 suscrito por el Ing. Nicolas Montalvan, Subsecretario Zonal 5 solicito al Señor Viceministro, su aprobación de la reprogramación del POA 2021 de la Dirección Los Ríos, revisada y validada por esta Subsecretaria Zonal 5, de acuerdo a lo solicitado por la Coordinación General de Planificación.</p>  |   |                                  |
| <p>MARZO 2021</p> <p>CAUSAS: ES NECESARIO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS PARA LAS REDES VIALES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. CORTE DE MALEZA, ROZA A MANO, LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICALES, HORIZONTALES, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BACHEO MENOR Y MAYOR, SELLO DE FISURAS; ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR CONTRATACIONES POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO MEDIANTE CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL Y CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE MEZCLA ASFÁLTICA Y SUMINISTROS PARA INSTALACIÓN DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL</p> <p>ACCIONES: SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRAMITES PRELIMINARES INFORMES DE LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRTIAL PARA REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL Y MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS REDES VIALES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS; MEDIANTE Memorando Nro. MTOP-DDR-2021-399-ME DE FECHA 31 DE MARZO DE 2021 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DISTRTIAL DEL MTOP LOS RÍOS DIRIGIDO AL SUBSECRETARIO ZONAL 5, DONDE SE SOLICITA A LA AUTORIDAD SE REALICE LAS GESTIONES PARA LA REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS ITEM 730216 Y 730417 CON EL FIN DE PROCEDER CON LO SOLICITUD DE AVALES EN LA DIRECCIÓN DISTRTIAL DEL MTOP LOS RÍOS, DANDO ATENCIÓN A LAS DIRECTRICES EN VIDEOCONFERENCIA ZOOM MANTENIDA EL DÍA VIERNES 26 DE MARZO CONVOCADA POR EL ING. RICARDO PAULA LOPEZ, VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.</p> | <p>Mayorga<br/>Reinoso, Marcos<br/>Hernan</p> | <p>04/04/2021 -<br/>06:18 PM</p> |
| <p>FEBRERO 2021</p> <p>CAUSAS: ES NECESARIO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS PARA LAS REDES VIALES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. CORTE DE MALEZA, ROZA A MANO, LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICALES, HORIZONTALES, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BACHEO MENOR Y MAYOR, SELLO DE FISURAS; ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR CONTRATACIONES POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO MEDIANTE CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL Y CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE MEZCLA ASFÁLTICA Y SUMINISTROS PARA INSTALACIÓN DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL</p> <p>ACCIONES: SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRAMITES PRELIMINARES INFORMES DE LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRTIAL PARA REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL Y MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS REDES VIALES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS.</p>   | <p>Mayorga<br/>Reinoso, Marcos<br/>Hernan</p> | <p>05/03/2021 -<br/>02:32 PM</p> |
| <p>FEBRERO 2021:</p> <p>SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRAMITES PRELIMINARES PARA REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL Y MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS REDES VIALES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS.</p>   | <p>Mayorga<br/>Reinoso, Marcos<br/>Hernan</p> | <p>02/03/2021 -<br/>01:41 PM</p> |
| <p>ENERO 2021:</p> <p>SE HA REALIZADO LOS TRAMITES PRELIMINARES PARA REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL Y MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS REDES VIALES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS.</p>  | <p>Mayorga<br/>Reinoso, Marcos<br/>Hernan</p> | <p>02/02/2021 -<br/>10:45 AM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS SE REALIZARON LOS TRABAJOS FINALES DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188, CE20200001838451, CE20200001872362 Y CE-20200001884608; CONTRATOS CULMINARON EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CIERRE DE AÑO FISCAL.</p>  | <p>Mayorga<br/>Reinoso, Marcos<br/>Hernan</p> | <p>04/01/2021 -<br/>02:39 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                                | Fecha de última actualización    |
|---|---|----------------------------------|
| <p>NOVIEMBRE 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO MES; CON FECHA 07 DE JULIO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE20200001872362 Y CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20200001884608.</p>  | <p>Mayorga<br/>Reinoso, Marcos<br/>Hernan</p> | <p>03/12/2020 -<br/>03:17 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451 CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO MES; CON FECHA 07 DE JULIO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE20200001872362 Y CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20200001884608.</p>   | <p>Mayorga<br/>Reinoso, Marcos<br/>Hernan</p> | <p>05/11/2020 -<br/>04:47 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451 CORRESPONDIENTE AL SEXTO MES; CON FECHA 07 DE JULIO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE20200001872362 Y CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20200001884608.</p>  | <p>Mayorga<br/>Reinoso, Marcos<br/>Hernan</p> | <p>01/10/2020 -<br/>08:57 AM</p> |
| <p>AGOSTO 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PERIODO; CON FECHA 07 DE JULIO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE20200001872362 Y CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20200001884608.</p> | <p>Mayorga<br/>Reinoso, Marcos<br/>Hernan</p> | <p>04/09/2020 -<br/>09:03 AM</p> |
| <p>JULIO 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PERIODO; CON FECHA 07 DE JULIO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE20200001872362.</p>   | <p>Mayorga<br/>Reinoso, Marcos<br/>Hernan</p> | <p>02/08/2020 -<br/>11:32 AM</p> |
| <p>JUNIO 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188</p>   | <p>Mayorga<br/>Reinoso, Marcos<br/>Hernan</p> | <p>01/07/2020 -<br/>07:39 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Y CE20200001838451 CORRESPONDIENTE AL TERCER PERIODO; SE CONTINÚA GESTIONANDO TRÁMITES PARA CONTRATACIONES ADICIONALES.  |                                      |                               |
| MAYO 2020:<br><br>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO; SE CONTINÚA GESTIONANDO TRÁMITES PARA CONTRATACIONES ADICIONALES. | Mayorga<br>Reinoso, Marcos<br>Hernan | 02/06/2020 -<br>02:18 PM      |
| ABRIL 2020:<br><br>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451; SE CONTINÚA GESTIONANDO TRÁMITES PARA CONTRATACIONES ADICIONALES.                                  | Mayorga<br>Reinoso, Marcos<br>Hernan | 01/05/2020 -<br>11:27 AM      |
| MARZO 2020:<br>Dirección Distrital presentó necesidades para la contratación 2020 de microempresas para mantenimientos rutinarios de las redes viales estatales de la provincia de Los Ríos, se continúa gestionando el trámite para las contrataciones.   | Mayorga<br>Reinoso, Marcos<br>Hernan | 01/04/2020 -<br>12:06 PM      |
| FEBRERO 2020:<br>Dirección Distrital presentó necesidades para la contratación 2020 de microempresas para mantenimientos rutinarios de las redes viales estatales de la provincia de Los Ríos, se continúa gestionando el trámite para las contrataciones.   | Mayorga<br>Reinoso, Marcos<br>Hernan | 05/03/2020 -<br>05:27 PM      |
| ENERO 2020:<br>Se acreditaron planillas de los trabajos realizados en diciembre de 2019, Dirección Distrital presenta necesidades para la contratación 2020 de microempresas para mantenimiento rutinarios.  | Mayorga<br>Reinoso, Marcos<br>Hernan | 05/03/2020 -<br>05:24 PM      |
| DICIEMBRE2019:<br>La Dirección Distrital procedió a la contratación de las microempresas y actualmente da mantenimiento rutinario en la red vial estatal de la provincia de Los Rios   | Mayorga<br>Reinoso, Marcos<br>Hernan | 02/01/2020 -<br>11:53 AM      |
| NOVIEMBRE2019:<br>La Dirección Distrital procedió a la contratación de las microempresas y actualmente da mantenimiento rutinario en la red vial estatal de la provincia de Los Rios   | Mayorga<br>Reinoso, Marcos<br>Hernan | 02/12/2019 -<br>08:27 AM      |
| OCTUBRE - 2019: La Dirección Distrital se procedió a la contratación de las microempresas y actualmente da mantenimiento rutinario en la red vial estatal de la provincia de Los Rios  | Mayorga<br>Reinoso, Marcos<br>Hernan | 05/11/2019 -<br>04:38 PM      |
| SEPTIEMBRE - 2019: La Dirección Distrital se procedió a la contratación de las microempresas y actualmente da mantenimiento rutinario en la red vial estatal de la provincia de Los Rios   | Mayorga<br>Reinoso, Marcos<br>Hernan | 05/10/2019 -<br>06:16 AM      |
| AGOSTO - 2019: La Dirección Distrital se procedió a la contratación de las microempresas y actualmente da mantenimiento rutinario en la red vial estatal de la provincia de Los Rios.  | Mayorga<br>Reinoso, Marcos<br>Hernan | 05/09/2019 -<br>03:46 PM      |
| JULIO - 2019: La Dirección Distrital se procedió a la contratación de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario en la red vial estatal  | Mayorga<br>Reinoso, Marcos<br>Hernan | 03/09/2019 -<br>09:03 AM      |
| JUNIO - 2019: La Dirección Distrital una vez que cuenta con la partida presupuestaria para el mantenimiento vial de la Red Estatal, se procedió a la contratación de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario  | Mayorga<br>Reinoso, Marcos<br>Hernan | 02/08/2019 -<br>09:46 AM      |
| MAYO- 2019: La Dirección Distrital una vez que cuenta con la partida presupuestaria para el mantenimiento vial de la Red Estatal, se procedió a la contratación de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario  | Mayorga<br>Reinoso, Marcos<br>Hernan | 01/07/2019 -<br>09:27 AM      |
| ABRIL- 2019: La Dirección Distrital envió la solicitud para la reforma para el mantenimiento vial de la Red Estatal, para la contratación de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario  | Mayorga<br>Reinoso, Marcos<br>Hernan | 03/06/2019 -<br>01:16 PM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                      | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| MARZO- 2019: La Dirección Distrital envió la solicitud para la reforma ara el mantenimiento vial de la Red Estatal, para la contratacion de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario  | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 03/05/2019 - 01:10 PM         |
| FEBRERO- 2019: La Dirección Distrital envió la solicitud para la reforma ara el mantenimiento vial de la Red Estatal, para la contratacion de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario  | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 01/04/2019 - 02:34 PM         |
| ENERO- 2019: La Dirección Distrital envió la solicitud para la reforma ara el mantenimiento vial de la Red Estatal, para la contratacion de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario  | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 06/03/2019 - 09:04 AM         |
| DICIEMBRE- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas.          | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 02/01/2019 - 09:45 AM         |
| NOVIEMBRE- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas.          | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 02/01/2019 - 09:07 AM         |
| OCTUBRE- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.    | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 03/12/2018 - 08:59 AM         |
| SEPTIEMBRE- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo. | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 05/11/2018 - 08:30 AM         |
| AGOSTO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.     | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 03/10/2018 - 08:09 AM         |
| JULIO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.      | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 04/09/2018 - 08:17 AM         |
| JUNIO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.      | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 02/08/2018 - 10:09 AM         |
| MAYO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.       | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 03/07/2018 - 09:13 AM         |
| ABRIL- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.      | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 04/06/2018 - 08:31 AM         |
| MARZO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.      | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 02/05/2018 - 10:40 AM         |
| FEBRERO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario a la red vial estatal.   | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 03/04/2018 - 04:03 PM         |
| ENERO- 2018: La Dirección Distrital envió la solicitud del aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, para la cobtratacion de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario  | Mayorga Reinoso, Marcos Hernan      | 05/03/2018 - 09:05 AM         |
| DICIEMBRE- 2017: La Dirección Distrital continúa realizando el mantenimiento vial de la Red Estatal, con las microempresas dando mantenimiento rutinario  | Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes | 07/12/2017 - 09:26 AM         |
| NOVIEMBRE- 2017: La Dirección Distrital continúa realizando el mantenimiento vial de la Red Estatal, con las microempresas.   | Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes | 01/11/2017 - 10:42 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                      | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| SEPTIEMBRE 2017: SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO VIAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  | Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes | 31/10/2017 - 03:55 PM         |
| OCTUBRE-2017<br>El Ing. Vicente Quezada Cabrera no tiene a cargo este proyecto.  | Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes | 01/10/2017 - 05:05 PM         |
| 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017:<br>El Ing. Vicente Quezada sólo tuvo a cargo el mantenimiento del Anillo Vial de Quevedo-Tramo II ejecutado por parte del constructor, durante el periodo de la recepción provisional a la definitiva, lo cual terminó en Diciembre del 2016, el Proyecto actualmente se encuentra a cargo de la Dirección Distrital-Los Ríos, no tengo a cargo otro mantenimiento vial.. | Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes | 02/09/2017 - 03:43 PM         |
| Mayo - Agosto 2017<br>Se procedió a la contratación de 7 microempresas para que realicen trabajos de mantenimiento en toda la red vial estatal de Los Ríos.  | Marcillo Gavilánez, Danny Orlando   | 07/08/2017 - 03:28 PM         |
| enero - abril 2017<br>Se procedió a la firma del acta de Recepción Definitiva para las dos Microempresas.  | Alvarez Villacres, Hernán Roberto   | 05/05/2017 - 09:29 AM         |
| MARZO 2013: Se procedió a la firma del acta de Recepción Definitiva para las dos Microempresas.  | Valle Zuñiga, Hugo Arturo           | 08/04/2013 - 01:36 PM         |
| FEBRERO 2012: Se realizó el relleno de huecos; sellado de pequeñas áreas agrietadas en superficies asfálticas con la aplicación de asfalto líquido y agregado fino, para evitar la entrada del agua superficial y otro material ajeno que causara daño a la base.  | Valle Zuñiga, Hugo Arturo           | 08/03/2013 - 06:43 PM         |
| ENERO 2012: Se trabajo en la reparación a mano de áreas pequeñas de superficie pavimentada o mezcla asfáltica.   | Valle Zuñiga, Hugo Arturo           | 08/03/2013 - 06:41 PM         |

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo  | Fecha de última actualización | Responsable                   | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>4- ORGANIZACIONAL. Seguridad.</b><br>La falta de avales para contratación de reparación de maquinarias para el mantenimiento rutinario en las vías causaría inseguridad vial | 05/05/2021                    | Marcos Hernan Mayorga Reinoso | 40 %         | 50      | 20           | 0/0                         |

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |   |
|----------------------|---|
| 1                    | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos |

## HITOS

|   | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado | 1-Solicitud de Información | 15/02/2012         |                | 15/02/2012 |          | Sí            | 8.0           |
| 2 | DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado                         | 1-Solicitud de Información | 15/02/2012         |                | 15/02/2012 |          | Sí            | 2.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 3  | PLANEACIÓN: Acta de constitución del proyecto aprobada                   | 1-Solicitud de Información | 15/02/2012         |                | 15/02/2012 |          | Sí            | 4.5           |
| 4  | PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida                               | 1-Solicitud de Información | 15/02/2012         |                | 15/02/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 5  | PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados                   | 1-Solicitud de Información | 15/02/2012         |                | 15/02/2012 |          | Sí            | 3.0           |
| 6  | PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido                                     | 1-Solicitud de Información | 15/02/2012         |                | 15/02/2012 |          | Sí            | 0.5           |
| 7  | EJECUCIÓN : Inspección y mantenimiento de puentes realizado.             | 5-Entregables Intermedios  | 20/06/2012         |                | 20/06/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 8  | EJECUCIÓN : Poda, corte y retiro de árboles y arbustos realizado.        | 5-Entregables Intermedios  | 18/07/2012         |                | 18/07/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 9  | EJECUCIÓN : Roza a mano realizado.                                       | 5-Entregables Intermedios  | 18/07/2012         |                | 18/07/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 10 | EJECUCIÓN : Mantenimiento y señalización horizontal realizado.           | 5-Entregables Intermedios  | 02/08/2012         |                | 02/08/2012 |          | Sí            | 5.0           |
| 11 | EJECUCIÓN : Mantenimiento y señalización vertical realizado.             | 5-Entregables Intermedios  | 02/08/2012         |                | 02/08/2012 |          | Sí            | 5.0           |
| 12 | EJECUCIÓN : Limpieza de calzadas, espaldones y derecho de vía realizado. | 5-Entregables Intermedios  | 23/09/2012         |                | 23/09/2012 |          | Sí            | 5.0           |
| 13 | EJECUCIÓN : Limpieza de derrumbes a mano realizado.                      | 5-Entregables Intermedios  | 23/09/2012         |                | 23/09/2012 |          | Sí            | 7.0           |
| 14 | EJECUCIÓN : Reparación de cunetas realizado.                             | 5-Entregables Intermedios  | 23/09/2012         |                | 23/09/2012 |          | Sí            | 7.0           |
| 15 | EJECUCIÓN : Arborización realizado.                                      | 5-Entregables Intermedios  | 28/10/2012         |                | 28/10/2012 |          | Sí            | 8.0           |
| 16 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado                      | 5-Entregables Intermedios  | 29/05/2020         |                | 29/05/2020 |          | Sí            | 2.0           |
| 17 | EJECUCIÓN: Contrato con Microempresas, suscrito                          | 9-Entregables Formales     | 31/05/2020         |                | 31/05/2020 |          | Sí            | 2.0           |
| 18 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado                      | 5-Entregables Intermedios  | 31/05/2020         |                | 31/05/2020 |          | Sí            | 2.0           |
| 19 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado                      | 5-Entregables Intermedios  | 31/05/2020         |                | 31/05/2020 |          | Sí            | 2.0           |
| 20 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado                      | 5-Entregables Intermedios  | 31/05/2020         |                | 31/05/2020 |          | Sí            | 2.0           |
| 21 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado                      | 5-Entregables Intermedios  | 30/06/2020         |                | 30/06/2020 |          | Sí            | 2.0           |
| 22 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado                      | 5-Entregables Intermedios  | 30/07/2020         |                | 30/07/2020 |          | Sí            | 2.0           |
| 23 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado                      | 5-Entregables Intermedios  | 31/08/2020         |                | 31/08/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 24 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado                      | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2020         |                | 30/09/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 25 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado                      | 5-Entregables Intermedios  | 31/10/2020         |                | 31/10/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 26 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado                      | 5-Entregables Intermedios  | 30/11/2020         |                | 30/11/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 27 | EJECUCIÓN: Contrato con Microempresas, suscrito                          | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2021         |                | 30/04/2021 |          | Sí            | 1.0           |



**HITOS**

|    | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 28 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado  | 5-Entregables Intermedios  | 31/05/2021         | 31/05/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 29 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado  | 5-Entregables Intermedios  | 30/06/2021         | 30/06/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 30 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado  | 5-Entregables Intermedios  | 31/07/2021         | 31/07/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 31 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado  | 5-Entregables Intermedios  | 31/08/2021         | 31/08/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 32 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado  | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2021         | 30/09/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 33 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado  | 5-Entregables Intermedios  | 31/10/2021         | 31/10/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 34 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado  | 5-Entregables Intermedios  | 30/11/2021         | 30/11/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 35 | EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado  | 5-Entregables Intermedios  | 20/12/2021         | 20/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 36 | CIERRE: Liquidación Económica aprobada   | 5-Entregables Intermedios  | 30/12/2021         | 30/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 37 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita   | 5-Entregables Intermedios  | 30/12/2021         | 30/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 38 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita  | 5-Entregables Intermedios  | 30/12/2021         | 30/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 39 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito | V - Verificación ejecutiva | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 40 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita  | V - Verificación ejecutiva | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 2.0           |
| 41 | CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF   | V - Verificación ejecutiva | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 42 | CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado  | V - Verificación ejecutiva | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 43 | CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados  | 5-Entregables Intermedios  | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 1.5           |
| 44 | CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado  | V - Verificación ejecutiva | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 0.5           |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador                                       | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Numero de informes técnicos de control de obra. |        | 100.00 %          | 1    | 1                     | 01/01/2017      | Ene-Jun                    |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 25,723,248.30 ** |
| Costo Total:                  | 35,352,256.39    |
| Total Devengado:              | 24,145,998.36    |
| % Costo Total Devengado:      | 68.30 %          |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 68.30 %

Perfil Económico 2021

|   | Años Previos    | Año Actual (2021) | Años Futuros | Total         |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado  | 25,303,224.82   | 1,037,404.41      | 0.00         | 26,340,629.23 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 13,279,217.77   | 2,339,810.77      | 0.00         | 15,619,028.54 |
| Ppto. Codificado  | 28,915,194.43   | 1,037,404.41      | 0.00         | 29,952,598.84 |
| Ppto. Comprometido                                      | 15,828,938.46   | 0.00              | 0.00         | 15,828,938.46 |
| Planeado - Codificado (2021)                            |                 | 0.00              |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 24,198,368.97   | 1,637,152.52      | 0.00         | 25,835,521.49 |
| Ppto. Devengado   | 24,086,095.78   | 59,902.58         | 0.00         | 24,145,998.36 |
| Pagado Real   | 3,210,422.98    | 0.00              | 0.00         | 3,210,422.98  |
| Estimado a fin de año                                   | * 24,086,095.78 | 0.00              | 0.00         | 24,086,095.78 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 112,273.19      | 1,637,152.52      | 0.00         | 1,749,425.71  |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 99.54 %       | 3.66 %            | 0.00 %       | 93.46 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 102,406.36      | 0.00              | 0.00         | 102,406.36    |
| Ppto. Devengado 998                                     | 102,406.36      | 0.00              | 0.00         | 102,406.36    |

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

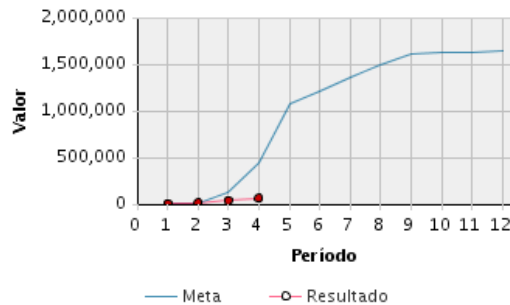

Presupuesto Mensual 2021

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 6,334.04                   | 5,346.55            | 6,334.04                     | 5,346.55              | 84.41 %          |        | 0.33 %       |

| Presupuesto Mensual 2021 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 6,334.04                   | 11,099.28           | 12,668.08                    | 16,445.83             | 129.82 %         |        | 1.00 %       |
| Mar                      | 112,705.54                 | 18,852.01           | 125,373.62                   | 35,297.84             | 28.15 %          |        | 2.16 %       |
| Abr                      | 321,050.25                 | 24,604.74           | 446,423.87                   | 59,902.58             | 13.42 %          |        | 3.66 %       |
| May                      | 623,269.75                 |                     | 1,069,693.62                 |                       |                  |        |              |
| Jun                      | 132,705.54                 |                     | 1,202,399.16                 |                       |                  |        |              |
| Jul                      | 158,705.54                 |                     | 1,361,104.70                 |                       |                  |        |              |
| Ago                      | 122,705.54                 |                     | 1,483,810.24                 |                       |                  |        |              |
| Sep                      | 122,705.60                 |                     | 1,606,515.84                 |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 17,968.61                  |                     | 1,624,484.45                 |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 6,334.04                   |                     | 1,630,818.49                 |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 6,334.03                   |                     | 1,637,152.52                 |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>1,637,152.52</b>        | <b>59,902.58</b>    |                              |                       |                  |        |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |   |
|----------------------|---|
| 13                   | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 14                   | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.   |
| 15                   | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.                      |
| 16                   | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.                                    |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                  | Archivo                                     | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 1  | A1.- 2012-01 CEDULA PRESUPUESTARIA      | A1.-_2012-01_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 2  | A1.- K017 MTOP - COSTO TOTAL 27-11-2019 | A1.-_K017_MTOP_-_COSTO_TOTAL_27-11-2019.pdf | 27/11/2019    |
| 3  | A2.- 2012-02 CEDULA PRESUPUESTARIA      | A2.-_2012-02_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 4  | A3.- 2012-03 CEDULA PRESUPUESTARIA      | A3.-_2012-03_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 5  | A4.- 2012-04 CEDULA PRESUPUESTARIA      | A4.-_2012-04_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 6  | A5.- 2012-05 CEDULA PRESUPUESTARIA      | A5.-_2012-05_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 7  | A6.- 2012-06 CEDULA PRESUPUESTARIA      | A6.-_2012-06_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 8  | A7.- 2012-07 CEDULA PRESUPUESTARIA      | A7.-_2012-07_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 9  | A8.- 2012-08 CEDULA PRESUPUESTARIA      | A8.-_2012-08_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 10 | A9.- 2012-09 CEDULA PRESUPUESTARIA      | A9.-_2012-09_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 11 | B1.- 2012-10 CEDULA PRESUPUESTARIA      | B1.-_2012-10_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 12 | B2.- 2012-11 CEDULA PRESUPUESTARIA      | B2.-_2012-11_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 13 | B3.- 2012-12 CEDULA PRESUPUESTARIA      | B3.-_2012-12_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 14 | B4.- 2013-01 CEDULA PRESUPUESTARIA      | B4.-_2013-01_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 15 | B5.- 2013-02 CEDULA PRESUPUESTARIA      | B5.-_2013-02_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 16 | B6.- 2013-03 CEDULA PRESUPUESTARIA      | B6.-_2013-03_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 17 | B7.- 2013-04 CEDULA PRESUPUESTARIA      | B7.-_2013-04_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 18 | B8.- 2013-05 CEDULA PRESUPUESTARIA      | B8.-_2013-05_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 19 | B9.- 2013-06 CEDULA PRESUPUESTARIA      | B9.-_2013-06_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 20 | C1.- 2013-07 CEDULA PRESUPUESTARIA      | C1.-_2013-07_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo                                     | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 21 | C2.- 2013-08 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | C2.-_2013-08_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 22 | C3.- 2013-09 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | C3.-_2013-09_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 23 | C4.- 2013-11 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | C4.-_2013-11_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 24 | C5.- 2013-12 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | C5.-_2013-12_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 25 | C6.- 2014-01 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | C6.-_2014-01_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 26 | C7.- 2014-02 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | C7.-_2014-02_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 27 | C8.- 2014-03 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | C8.-_2014-03_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 28 | C9.- 2014-04 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | C9.-_2014-04_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 29 | D1.- 2014-05 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | D1.-_2014-05_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 30 | D2.- 2014-06 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | D2.-_2014-06_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 31 | D3.- 2014-07 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | D3.-_2014-07_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 32 | D4.- 2014-08 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | D4.-_2014-08_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 33 | D5.- 2014-09 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | D5.-_2014-09_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 34 | D6.- 2014-10 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | D6.-_2014-10_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 35 | D7.- 2014-11 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | D7.-_2014-11_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 36 | D8.- 2014-12 CEDULA PRESUPUESTARIA                                   | D8.-_2014-12_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf      | 02/04/2020    |
| 37 | D9.- 1ENERO 2015   | D9.-_1ENERO_2015.pdf                        | 02/04/2020    |
| 38 | E1.- 2FEBRERO 2015   | E1.-_2FEBRERO_2015.pdf                      | 02/04/2020    |
| 39 | E2.- 3MARZO 2015   | E2.-_3MARZO_2015.pdf                        | 02/04/2020    |
| 40 | E3.- 4ABRIL 2015   | E3.-_4ABRIL_2015.pdf                        | 02/04/2020    |
| 41 | E4.- 5MAYO 2015  | E4.-_5MAYO_2015.pdf                         | 02/04/2020    |
| 42 | E5.- 6JUNIO 2015   | E5.-_6JUNIO_2015.pdf                        | 02/04/2020    |
| 43 | E6.- 7JULIO 2015   | E6.-_7JULIO_2015.pdf                        | 02/04/2020    |
| 44 | E7.- 8AGOSTO 2015  | E7.-_8AGOSTO_2015.pdf                       | 02/04/2020    |
| 45 | E8.- 9SEPTIEMBRE 2015  | E8.-_9SEPTIEMBRE_2015.pdf                   | 02/04/2020    |
| 46 | E9.- 10OCTUBRE 2015  | E9.-_10OCTUBRE_2015.pdf                     | 02/04/2020    |
| 47 | F1.- R2019-12-10_12-58-16-octubre 2015                               | F1.-_R2019-12-10_12-58-16-octubre_2015.pdf  | 02/04/2020    |
| 48 | F2.- 11NOVIEMBRE 2015  | F2.-_11NOVIEMBRE_2015.pdf                   | 02/04/2020    |
| 49 | F3.- R2019-12-10_12-59-00-noviembre2015                              | F3.-_R2019-12-10_12-59-00-noviembre2015.pdf | 02/04/2020    |
| 50 | F4.- .- 12DICIEMBRE 2015   | F4.-._- 12DICIEMBRE_2015.pdf                | 02/04/2020    |
| 51 | F5.- R2019-12-10_12-59-23-diciembre2015                              | F5.-_R2019-12-10_12-59-23-diciembre2015.pdf | 02/04/2020    |
| 52 | F6.- 1ENERO 2016   | F6.-_1ENERO_2016.pdf                        | 02/04/2020    |
| 53 | F7.- 2FEBRERO 2016   | F7.-_2FEBRERO_2016.pdf                      | 02/04/2020    |
| 54 | F8.- 3MARZO 2016   | F8.-_3MARZO_2016.pdf                        | 02/04/2020    |
| 55 | F9.- 4ABRIL 2016   | F9.-_4ABRIL_2016.pdf                        | 02/04/2020    |
| 56 | G1.- 5MAYO 2016  | G1.-_5MAYO_2016.pdf                         | 02/04/2020    |
| 57 | G2.- 6JUNIO 2016   | G2.-_6JUNIO_2016.pdf                        | 02/04/2020    |
| 58 | G3.- 7JULIO 2016   | G3.-_7JULIO_2016.pdf                        | 02/04/2020    |
| 59 | G4.- 8AGOSTO 2016  | G4.-_8AGOSTO_2016.pdf                       | 02/04/2020    |
| 60 | G5.- 9SEPTIEMBRE 2016  | G5.-_9SEPTIEMBRE_2016.pdf                   | 02/04/2020    |
| 61 | G6.- 10OCTUBRE 2016  | G6.-_10OCTUBRE_2016.pdf                     | 02/04/2020    |
| 62 | G7.- 11NOVIEMBRE 2016  | G7.-_11NOVIEMBRE_2016.pdf                   | 02/04/2020    |
| 63 | G8.- 12DICIEMBRE 2016  | G8.-_12DICIEMBRE_2016.pdf                   | 02/04/2020    |
| 64 | G9.- Acta de Recepción Definitiva Microempresa San Lorenzo de Vinces | Acta_Recepcion_Definitiva.pdf               | 18/03/2013    |
| 65 | G9.- ENERO 2017  | G9.-_ENERO_2017.pdf                         | 02/04/2020    |
| 66 | H1.- FEBRERO 2017  | H1.-_FEBRERO_2017.pdf                       | 02/04/2020    |
| 67 | H2.- MARZO 2017  | H2.-_MARZO_2017.pdf                         | 02/04/2020    |
| 68 | H3.- ABRIL 2017  | H3.-_ABRIL_2017.pdf                         | 02/04/2020    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo   | Archivo                                    | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 69  | H4.- MAYO 2017   | H4.-_MAYO_2017.pdf                         | 02/04/2020    |
| 70  | H5.- JUNIO 2017  | H5.-_JUNIO_2017.pdf                        | 02/04/2020    |
| 71  | H6.- JULIO 2017  | H6.-_JULIO_2017.pdf                        | 02/04/2020    |
| 72  | H7.- AGOSTO 2017   | H7.-_AGOSTO_2017.pdf                       | 02/04/2020    |
| 73  | H8.- SEPTIEMBRE 2017   | H8.-_SEPTIEMBRE_2017.pdf                   | 02/04/2020    |
| 74  | H9.- OCTUBRE 2017  | H9.-_OCTUBRE_2017.pdf                      | 02/04/2020    |
| 75  | I1.- NOVIEMBRE 2017  | I1.-_NOVIEMBRE_2017.pdf                    | 02/04/2020    |
| 76  | I2.- DICIEMBRE 2017  | I2.-_DICIEMBRE_2017.pdf                    | 02/04/2020    |
| 77  | I3.- ENERO 2018  | I3.-_1ENERO_2018.pdf                       | 07/04/2020    |
| 78  | I4.- 2FEBRERO 2018   | I4.-_2FEBRERO_2018.pdf                     | 07/04/2020    |
| 79  | I5.- 3MARZO 2018   | I5.-_3MARZO_2018.pdf                       | 07/04/2020    |
| 80  | I6.- 4ABRIL 2018   | I6.-_4ABRIL_2018.pdf                       | 07/04/2020    |
| 81  | I7.- 5MAYO 2018  | I7.-_5MAYO_2018.pdf                        | 07/04/2020    |
| 82  | I8.- 6JUNIO 2018   | I8.-_6JUNIO_2018.pdf                       | 07/04/2020    |
| 83  | I9.- 7JULIO 2018   | I9.-_7JULIO_2018.pdf                       | 07/04/2020    |
| 84  | J1.- 8AGOSTO 2018  | J1.-_8AGOSTO_2018.pdf                      | 07/04/2020    |
| 85  | J2.- 9SEPTIEMBRE 2018  | J2.-_9SEPTIEMBRE_2018.pdf                  | 07/04/2020    |
| 86  | J3.- 10OCTUBRE 2018  | J3.-_10OCTUBRE_2018.pdf                    | 07/04/2020    |
| 87  | J4.- 11NOVIEMBRE 2018  | J4.-_11NOVIEMBRE_2018.pdf                  | 07/04/2020    |
| 88  | J5.- 12DICIEMBRE 2018  | J5.-_12DICIEMBRE_2018.pdf                  | 07/04/2020    |
| 89  | J6.- 1enero2019  | J6.-_1enero2019.pdf                        | 07/04/2020    |
| 90  | J7.- 2febrero2019  | J7.-_2febrero2019.pdf                      | 07/04/2020    |
| 91  | J8.- 3marzo2019  | J8.-_3marzo2019.pdf                        | 07/04/2020    |
| 92  | J9.- 4abril2019  | J9.-_4abril2019.pdf                        | 07/04/2020    |
| 93  | K1.- 5mayo2019   | K1.-_5mayo2019.pdf                         | 07/04/2020    |
| 94  | K2.- 6junio2019  | K2.-_6junio2019.pdf                        | 07/04/2020    |
| 95  | K3.- 7julio2019  | K3.-_7julio2019.pdf                        | 07/04/2020    |
| 96  | K4.- 8agosto2019   | K4.-_8agosto2019.pdf                       | 07/04/2020    |
| 97  | K5.- 9septiembre2019   | K5.-_9septiembre2019.pdf                   | 07/04/2020    |
| 98  | K6.- 10octubre2019   | K6.-_10octubre2019.pdf                     | 07/04/2020    |
| 99  | K7.- 11noviembre2019   | K7.-_11noviembre2019.pdf                   | 07/04/2020    |
| 100 | K8.- 12diciembre2019   | K8.-_12diciembre2019.pdf                   | 07/04/2020    |
| 101 | K9.- ENERO 2020  | K9.-_frmReportePDF-enero2020_-_3668.pdf    | 07/04/2020    |
| 102 | L1.- FEBRERO 2020  | L1.-_frmReportePDF-febrero_2020_-_3668.pdf | 07/04/2020    |
| 103 | L2.- MARZO 2020  | L2.-_frmReportePDF-marzo_2020_-_3668.pdf   | 07/04/2020    |
| 104 | L3. ABRIL 2020   | cedula_presu._mant_abril_2020.pdf          | 30/04/2020    |
| 105 | L4.- Informe Ejecutivo Sitop - Abril 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces     | GestionReporteFN-04-2012.pdf               | 08/03/2013    |
| 106 | L5.- zInforme Ejecutivo Sitop - Febrero 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces  | GestionReporteFN-02-2012.pdf               | 08/03/2013    |
| 107 | L6.- zInforme Ejecutivo Sitop - Marzo 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces    | GestionReporteFN-03-2012.pdf               | 08/03/2013    |
| 108 | L7.- Informe Ejecutivo Sitop - Agosto 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces    | GestionReporteFN-08-2012.pdf               | 08/03/2013    |
| 109 | L8.- Informe Ejecutivo Sitop - Diciembre 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces | GestionReporteFN-12-2012.pdf               | 08/03/2013    |
| 110 | L8.- Informe Ejecutivo Sitop - Julio 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces     | GestionReporteFN-07-2012.pdf               | 08/03/2013    |
| 111 | L9.- Informe Ejecutivo Sitop - Junio 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces     | GestionReporteFN-06-2012.pdf               | 08/03/2013    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo  | Archivo   | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 112 | M1.- Informe Ejecutivo Sitop - Mayo 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces       | GestionReporteFN-05-2012.pdf                              | 08/03/2013    |
| 113 | M2.- Informe Ejecutivo Sitop - Noviembre 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces  | GestionReporteFN-11-2012.pdf                              | 08/03/2013    |
| 114 | M3.- Informe Ejecutivo Sitop - Octubre 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces    | GestionReporteFN-10-2012.pdf                              | 08/03/2013    |
| 115 | M4.- Informe Ejecutivo Sitop - Septiembre 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces | GestionReporteFN-09-2012.pdf                              | 08/03/2013    |
| 116 | M5.- Contrato Original - Microempresa "Guayacan"                                    | Contrato_Original-_Microempresa_Guayacan.pdf              | 08/03/2013    |
| 117 | M6.- Contrato Original - Microempresa "San Lorenzo de Vinces"                       | Contrato_Original-_Microempresa_San_Lorenzo_de_Vinces.pdf | 08/03/2013    |
| 118 | M7.- hito 24 liquidacion  | hito_24__liquidacion.pdf                                  | 02/01/2019    |
| 119 | M8.-AÑO 2020 - CE20200001838446 - MICRO EL PIREO                                    | ORDEN_DE_COMPRA_MICRO_EL__PIREO.pdf                       | 01/05/2020    |
| 120 | M9.-AÑO 2020 - CE20200001838449 - PATRONO BABAHOYO                                  | ORDEN_DE_COMPRA_MICRO_PATRONO_BABAHOYO.pdf                | 01/05/2020    |
| 121 | N1.-AÑO 2020 - CE20200001838447 - TRABAJADORES VIALES DE QUEVEDO                    | ORDEN_DE_COMPRA_MICRO_TRABAJADORES_VIALES_DE_QUEVEDO.pdf  | 01/05/2020    |
| 122 | N2.- AÑO 2020 - CE20200001838451 - MICROEMPRESA SAN LORENZO DE VINCES               | CE20200001838451.pdf                                      | 02/06/2020    |
| 123 | N3.- AÑO 2020 - CE20200001838445 - MICROEMPRESA BABAHOYO                            | CE20200001838445.pdf                                      | 02/06/2020    |
| 124 | N4.- AÑO 2020 - CE20200001839188 - MICROEMPRESA URDANETA                            | CE20200001839188.pdf                                      | 02/06/2020    |
| 125 | N5.- AÑO 2020 - CE20200001838448 - MICROEMPRESA VIAS LOS RIOS                       | CE20200001838448.pdf                                      | 02/06/2020    |
| 126 | N6.- AÑO 2020 - CE20200001838450 - MICROEMPRESA PATRONO VENTANAS                    | CE20200001838450.pdf                                      | 02/06/2020    |
| 127 | N7.- MAYO 2020  | cedula_presu._mant_mayo_2020-3668.pdf                     | 02/06/2020    |
| 128 | N8.- AÑO 2019 - ce-20190001578490 - MICROEMPRESA EL MAMEY                           | ce-20190001578490.pdf                                     | 03/06/2020    |
| 129 | N9.- AÑO 2019 - ce-20190001578490 - ACTA DEFINITIVA                                 | 23833_ACTA_DEFINITIVA.pdf                                 | 03/06/2020    |
| 130 | O1.- AÑO 2019 - ce-20190001581815 - MICROEMPRESA EL TEJAL                           | ce-20190001581815.pdf                                     | 03/06/2020    |
| 131 | O2.- AÑO 2019 - ce-20190001581815 - ACTA DEFINITIVA                                 | 23835_ACTA_DEFINITIVA.pdf                                 | 03/06/2020    |
| 132 | O3.- AÑO 2019 - ce-20190001580365 - MICROEMPRESA TRABAJADORES VIAL DE QUEVEDO       | ce-20190001580365.pdf                                     | 03/06/2020    |
| 133 | O4.- AÑO 2019 - ce-20190001580365 - ACTA DEFINITIVA                                 | 23837_ACTA_DEFINITIVA.pdf                                 | 03/06/2020    |
| 134 | O5.- AÑO 2019 - ce-20190001582440 - MICROEMPRESA URDANETA                           | ce-20190001582440.pdf                                     | 03/06/2020    |
| 135 | O6.- AÑO 2019 - ce-20190001582440 - ACTA DEFINITIVA                                 | 23838_ACTA_DEFINITIVA.pdf                                 | 03/06/2020    |
| 136 | O7.- AÑO 2019 - ce-20190001582025 - MICROEMPRESA PATRONO MONTALVO                   | ce-20190001582025.pdf                                     | 03/06/2020    |
| 137 | O8.- AÑO 2019 - ce-20190001582025 - ACTA DEFINITIVA                                 | 23839_ACTA_DEFINITIVA.pdf                                 | 03/06/2020    |
| 138 | O9.- AÑO 2019 - ce-20190001584028 - MICROEMPRESA PATRONO BABAHOYO                   | ce-20190001584028.pdf                                     | 04/06/2020    |
| 139 | P1.- AÑO 2019 - ce-20190001584028 - ACTA DEFINITIVA                                 | 23840_ACTA_DEFENITIVA.pdf                                 | 04/06/2020    |
| 140 | P2.- AÑO 2019 - ce-20190001580364 - MICROEMPRESA EL PIREO                           | ce-20190001580364.pdf                                     | 04/06/2020    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo   | Archivo                                | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 141 | P3.- AÑO 2019 - ce-20190001580364 - ACTA DEFINITIVA                      | 23841_ACTA_DEFINITIVA.pdf              | 04/06/2020    |
| 142 | P4.- AÑO 2019 - ce-20190001608059 - MICROEMPRESA EL MAMEY                | ce-20190001608059.pdf                  | 04/06/2020    |
| 143 | P5.- AÑO 2019 - ce-20190001608059 - ACTA DEFINITIVA                      | 23978_ACTA_DEFINITIVA.pdf              | 04/06/2020    |
| 144 | P6.- AÑO 2019 - ce-20190001604536 - MICROEMPRESA PATRONO VENTANAS        | ce-20190001604536.pdf                  | 04/06/2020    |
| 145 | P7.- AÑO 2019 - ce-20190001604536 - ACTA DEFINITIVA                      | 23979_ACTA_DEFINITIVA.pdf              | 04/06/2020    |
| 146 | P8.- AÑO 2019 - ce-20190001604525 - MICROEMPRESA SAN LORENZO DE VINCES   | ce-20190001604525.pdf                  | 04/06/2020    |
| 147 | P9.- AÑO 2019 - ce-20190001604525 - ACTA DEFINITIVA                      | 23980_ACTA_DEFINITIVA.pdf              | 04/06/2020    |
| 148 | Q1.- AÑO 2018 - CE-20180001113000 - MICROEMPRESA EL MAMEY                | ID20833-CE-20180001113000.pdf          | 04/06/2020    |
| 149 | Q2.- AÑO 2018 - CE-20180001113000 - ACTA DEFINITIVA                      | ID20833_ACTA_RECEPCIÓNNo.10.pdf        | 04/06/2020    |
| 150 | Q3.- AÑO 2018 - CE-20180001113004 - MICROEMPRESA URDANETA                | ID20834CE-20180001113004.pdf           | 06/06/2020    |
| 151 | Q4.- AÑO 2018 - CE-20180001113004 - ACTA DEFINITIVA                      | 20834_ACTA-DEFINITIVA.pdf              | 06/06/2020    |
| 152 | Q5.- AÑO 2018 - CE-20180001113007 - MICROEMPRESA PASTRONO MONTALVO       | ID20835-CE-20180001113007.pdf          | 06/06/2020    |
| 153 | Q6.- AÑO 2018- CE-20180001113007 - ACTA DEFINITIVA                       | 20835_acta-definitiva.pdf              | 06/06/2020    |
| 154 | Q7.- AÑO 2018 - CE-20180001113006 - MICROEMPRESA PATRONO BABAHOYO        | ID20836-CE-20180001113006.pdf          | 06/06/2020    |
| 155 | Q8.- AÑO 2018 - CE-20180001113006 - ACTA DEFINITIVA                      | 1.-_id20836-acta_recepcion_archivo.pdf | 06/06/2020    |
| 156 | Q9.- AÑO 2018 - CE-20180001113001 - MICROEMPRESA EL TEJAL                | ID20837-CE-20180001113001.pdf          | 06/06/2020    |
| 157 | R1.- AÑO 2018 - CE-20180001113001 - ACTA DEFINITIVA                      | 20837_acta-definitiva.pdf              | 06/06/2020    |
| 158 | R2.- AÑO 2018 - CE-20180001113005 - MICROEMPRESA VIAS LOS RÍOS           | ID20929-CE-20180001113005.pdf          | 06/06/2020    |
| 159 | R3.- AÑO 2018 - CE-20180001113005 - ACTA DEFINITIVA                      | 20929_acta-definitiva.pdf              | 06/06/2020    |
| 160 | R4.- AÑO 2018 - CE-20180001113003 - MICROEMPRESA TRABAJADORES DE QUEVEDO | ID20930-CE-20180001113003.pdf          | 06/06/2020    |
| 161 | R5.- AÑO 2018 - CE-20180001113003 - ACTA DEFINITIVA                      | 1.-_id20930-acta_recepcion_archivo.pdf | 06/06/2020    |
| 162 | R6.- AÑO 2018 - CE-20180001112999 - MICROEMPRESA BABAHOYO                | ID20931-CE-20180001112999.PDF          | 06/06/2020    |
| 163 | R7.- AÑO 2018 - CE-20180001112999 - ACTA DEFINITIVA                      | id_20931-acta-def..pdf                 | 06/06/2020    |
| 164 | R8.- AÑO 2018 - CE-20180001113008 - MICROEMPRESA PATRONO VENTANAS        | ID20933-CE-20180001113008.PDF          | 06/06/2020    |
| 165 | R9.- AÑO 2018 - CE-20180001113008 - ACTA DEFINITIVA                      | 20933_acta_no.11.pdf                   | 06/06/2020    |
| 166 | S1.- AÑO 2018 - CE-20180001113009 - MICROEMPRESA SAN LORENZO DE VINCES   | ID20934-CE-20180001113009.PDF          | 06/06/2020    |
| 167 | S2.- AÑO 2018 - CE-20180001113009 - ACTA DEFINITIVA                      | 20934_acta_no.11.pdf                   | 06/06/2020    |
| 168 | S3.- cedula_presu.mant_junio_2020-3668                                   | cedula_presu.mant_junio_2020-3668.pdf  | 01/07/2020    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo  | Archivo  | Fecha de Alta |
|-----|---|--|---------------|
| 169 | S4.- REPORTES DE TRABAJOS JUNIO 2020 - HITO 21 AÑO 2020   | REPORTE_DE_TRABAJOS_DEL_MES_DE_JUNIO_2020.pdf              | 07/07/2020    |
| 170 | S5.- PRIMER INFORME TÉCNICO CONSOLIDADO CONTROL DE OBRA - ENERO A JUNIO DE 2020                     | INFORME_CONSOLIDADO_ENERO-JUNIO2020.pdf                    | 15/07/2020    |
| 171 | S6.- REPORTES DE TRABAJOS JULIO 2020 - HITO 22-AÑO2020  | REPORTES_DE_TRABAJOS_JULIO_2020_-_HITO_22-AÑO2020.pdf      | 02/08/2020    |
| 172 | S7.- cedula-presu-julio2020-3668  | cedula-presu-julio2020-3668.pdf                            | 02/08/2020    |
| 173 | S8.- CEDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO2020   | cedula_presu._mant.08_2020-3668.pdf                        | 01/09/2020    |
| 174 | S9.- REPORTE DE TRABAJOS AGOSTO 2020 - HITO 23 - AÑO 2020   | REPORTE_DE_TRABAJOS_DEL_MES_DE_AGOSTO_2020-HITO23-2020.pdf | 04/09/2020    |
| 175 | T1.- CE20200001872362-AÑO 2020  | 25286-CE20200001872362.pdf                                 | 04/09/2020    |
| 176 | T2.- 25393-CE-20200001884608  | 25393-CE-20200001884608.pdf                                | 04/09/2020    |
| 177 | T3.- CÉDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2020  | cedula_presu._mant.09_2020-3668.pdf                        | 01/10/2020    |
| 178 | T4.- REPORTE DE TRABAJOS DEL MES DE SEPT 2020-HITO24-2020   | REPORTE_DE_TRABAJOS_DEL_MES_DE_SEPT_2020-HITO24-2020.pdf   | 23/10/2020    |
| 179 | T5.- REPORTE OCTUBRE 2020 -HITO25-2020  | cedula_presu._mant.10_2020-3668.pdf                        | 06/11/2020    |
| 180 | T6.- cedula_presu._mant.11_2020-3668  | cedula_presu._mant.11_2020-3668.pdf                        | 03/12/2020    |
| 181 | T7.- cedula presupuestaria enero-diciembre 2020   | cedula_presupuestaria-enero-diciembre2020.pdf              | 06/01/2021    |
| 182 | T8.- REPORTE NOVIEMBRE 2020   | T8.- REPORTE_NOVIEMBRE_2020.pdf                            | 07/01/2021    |
| 183 | T9.- ACTAS DEFINITIVAS-2020   | T9.- ACTAS_DEFINITIVAS2020.pdf                             | 07/01/2021    |
| 184 | U1.- cedula_presu.mant_enero_2021   | U1.-cedula_presu.mant_enero_2021.pdf                       | 30/03/2021    |
| 185 | U2.- cedula_presu.mant_febrero_2021   | U2.-cedula_presu.mant_febrero_2021.pdf                     | 30/03/2021    |
| 186 | U3.- cedula_presu.mant_marzo_2021   | U3.-cedula_presu.mant_marzo_2021.pdf                       | 04/04/2021    |
| 187 | U4.- MTOP-DDR-2021-399-ME   | U4.-_MTOP-DDR-2021-399-ME.pdf                              | 04/04/2021    |
| 188 | U5.- cedula_presu.mant_abril_2021   | U4.-cedula_presu.mant_ABRIL_2021.pdf                       | 02/05/2021    |
| 189 | U6.- MTOP-SUBZ5-2021-1047-ME  | U6.-_MTOP-SUBZ5-2021-1047-ME.pdf                           | 05/05/2021    |
| 190 | U7.- GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE AVALES PARA CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL LOS RÍOS | 202105MAYO25.-_GESTION_DE_AVALES_DE_MICROEMPRESA.pdf       | 25/05/2021    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                         | Rol                        | Puesto  | Correo Electrónico    | Teléfono(s) |
|--------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-------------|
| Alvarado, Gabriela             | Supervisora de Financiero  | Analista Financiera   | galvarado@mtop.gob.ec | 52312       |
| Mayorga Reinoso, Marcos Hernan | Líder de Proyecto          | Analista de Infraestructura Provincial 2- MTOP                | mmayorga@mtop.gob.ec  | 023974600   |
| Zambrano Montes, Ian Carlos    | Administrador del proyecto | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Los Rios | izambrano@mtop.gob.ec | 023974600   |

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

| Archivo     | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 39728_1.jpg | 03/04/2020    |
