

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 5
Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Guayas
PROYECTO: K064 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia del Guayas

Líder del Proyecto:	Rocohano Granados, Maritza Alexandra (mrocohano@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santamaria Loor, Kiura Ninoska	Programas Relacionados:	Provincia - Guayas, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Berrezueta Velez, Gustavo David	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3844	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	48,747,240.89
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2011 - 31/12/2030
Fecha de última actualización:	04/08/2022	Fecha de Fin Base:	02/07/2015
Modificado por:	Berrezueta Velez, Gustavo David	Fecha del siguiente Hito:	31/10/2021

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Por las características del programa de Mantenimiento de la Red Vial del Guayas, el campo de acción es a nivel de la provincia del Guayas y las provincias que la limitan, por lo que los beneficiarios tanto directos, como indirectos, son los pobladores que se encuentran en el área de influencia de los 242,16 km de la Red Vial del Guayas, que son administrados por la DDG.

PRODUCTO:

Manteniendo una red vial en óptimas condiciones durante toda su vida útil, fomentara la productividad de la Provincia del Guayas en los principios de equidad, equivalencia, excelencia, sostenibilidad ambiental y competitividad, que hace posible el cumplimiento del plan nacional de desarrollo y los principios del buen vivir.

LINEA BASE:

La Red Vial del Guayas esta propensa a un proceso de alta vulnerabilidad debido a la permanente circulación vehicular, exposición al ambiente, clima, etc., siendo necesario que se mantenga un control permanente de la estructura de la misma, para lo cual, el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, por medio de la Dirección Distrital de Guayas, supervisará frecuentemente la Obra, notificará y tomará decisiones si hubiere alguna novedad en cuanto al deterioro, daño o destrucción de alguna de las estructuras, de manera que inmediatamente se den soluciones de reparación o mantenimiento del mismo.

OBJETIVO GENERAL

- . Brindar un buen nivel de servicio, seguridad y confort a los usuarios, manteniendo en estado óptimo la infraestructura de la Red Vial correspondiente a la DDG.
- . Facilitar el transporte de la producción agrícola, manteniendo en estado óptimo la infraestructura de todas las modalidades de transporte, que tiene como competencia la DDG.
- . Mejorar las condiciones de movilidad, conectividad entre poblaciones que atraviesan la Provincia, implementando un proceso de movilidad continua, cubriendo requerimientos de infraestructura adecuada a primer nivel, garantizando el desarrollo socio económico de las poblaciones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Ejecutar obras Preliminares
- Realizar Accesos a los puentes
- Construcción de Estructuras
- Construcción de obras de Protección
- Realizar Medidas ambientales

DATOS GENERALES

Descripción

Aplicar Señalización Vial
 Instalación de Iluminación
 Ejecución de los Estudio de suelos y de Resistencia de materiales
 Realizar trabajos de Consultoría y Fiscalización

Beneficios Cualitativos

Los beneficios : ahorro en los costos de operación de vehículos, ahorro del costo de operación de vehículos y tiempo de viaje del tráfico existente que son trasladados en forma directa a los usuarios de las vías de la Red Vial del Guayas.

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de movilidad de los usuarios de la Red Vial del Guayas administrada por el MTOP:

+NARANJAL-ENTRADA ESPERANZALIMITE GUAYAS-EL ORO
 +LIM(GYE -LOS RIOS) -EMPALME
 +EMPALME -PICHINCHA
 +PROGRESO -KM 19.4 VIA GUAYAQUIL/PROGRESO
 +KM 19.4 VIA GUAYAQUIL/PROGRESO -GUAYAQUIL
 +PERIMETRAL DE GUAYAQUIL. (VIA DAULE -LA AURORA -LA PUNTILLA/LOOP NORTE Y LOOP ORIENTAL)
 +LA PUNTILLA-DURAN (PUENTE RMA)
 +PUERTO INCA-PANCHO NEGRO(LIMITE GUAYAS-CAÑAR)
 +GUAYAQUIL-LA PUNTILLA
 +LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS-PALESTINA
 +SALITRE-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS
 +PROGRESO-PLAYAS
 +PLAYAS-POSORJA
 +PUERTO AYORA - CANAL DE ITABACA (GALAPAGOS)

Tipo de Beneficiario

Usuarios de las vías de la Red Vial del Guayas.

El siguiente perfil tiene como beneficiarios directos a los habitantes de toda la provincia de Guayas (Estos datos son de acuerdo al último censo realizado en el año 2010. Fuente: INEC.):

MUJERES 1´ 829.569
 HOMBRES 1´ 815.914
 TOTAL 3´ 645.483

Beneficiarios Directos: La población beneficiada es la de la provincia del Guayas y sus cantones, además de las Provincias que la limitan.

Beneficiarios por área de influencia: La provincia del Guayas (área de influencia).

Restricciones

TIEMPO: este proyecto tiene un tratamiento diferente a otros, ya que al ser de mantenimiento constante año a año se incluye en el Plan anual de inversión (2011 al vigente)

COSTO: desde el año 2011 al 2019 se ha presupuestado \$52.832.570,56

ALCANCE: La operación se refiere a los trabajos de eliminación selectiva de vegetación existente dentro de la faja vial. La limpieza comprende además la eliminación de ramaje aéreo y el retiro de cualquier desecho, escombros u otro material en desuso que se encuentre dentro del área prescrita, cualquiera sea su procedencia. La vegetación en muchos casos resulta beneficiosa para el camino y mejora la estética general, permitiendo un viaje más placentero; por lo tanto, no es conveniente programar talas removidas indiscriminadas de toda vegetación existente dentro de la faja, si no que se debe realizar un estudio para establecer áreas o especies individuales deben ser taladas. Los principales factores que se deben considerar para definir los requerimientos del trabajo son:

#Las señales camineras deben encontrarse completamente libres de cualquier vegetación que impida su visión desde, a lo menos, 100 m de distancia.

#La velocidad de diseño de la carretera y los radios de las curvas horizontales definen un despeje lateral mínimo, que asegure la distancia de visibilidad de parada o adelantamiento, tal como se especifica en los numerales 3.202.2 y 3.203.3 del Volumen 3 del NEVI - 12 La vegetación que arraiga en taludes de cortes y terraplenes es esencial para evitar deslizamientos y desprendimientos, por lo tanto sólo debe cortarse a una altura adecuada para que no obstruya la visibilidad en los términos anteriormente señalados.

#En áreas de seguridad, o encauzamiento del tránsito que vira o ingresa a la carretera, ninguna vegetación deberá quedar con una altura mayor que 0,20 m.

#Los arbustos que arraiguen dentro de elementos de drenaje, tales como fosos, contrafosos y otros deben retirarse completamente.

Restricciones

#Deben talarse los árboles o arbustos de tronco de 150 mm o más de diámetro, en la mediana y en las circunstanciales zonas despejadas, pues aumentan la severidad de un eventual accidente.

#La operación puede incluir también la aplicación de mata-malezas. Se hará en los sectores definidos en los antecedentes del contrato o donde indique la Fiscalización y en los que previamente se efectuó una limpieza de faja manual o mecanizada.

RECURSOS: Este proyecto está compuesto por componentes: Infraestructura, Servicios de microempresas, Gastos operacionales, fiscalizaciones; dentro de estos componentes se ejecutan contratos por administración directa en donde interviene personal del MTOP y contratos de proveedores externos que cuentan con su personal

CALIDAD: Los trabajos de cada una de las microempresas contratadas son supervisadas y administradas por 2 técnicos del MTOP-Guayas, a fin de garantizar que se cumplan cada uno de los items del contrato.

RIESGO: La falta de pago por parte del Ministerio de Finanzas ocasionaría la paralización de los trabajos.

VIALIDAD TÉCNICA:

Operaciones de Conservación Periódica: Las tareas de mantenimiento periódico, son las requeridas para recuperar las condiciones originales del proyecto, especialmente las que corresponden a la rodadura que se ha perdido por la acción del tráfico y de los agentes climáticos como son el viento y la lluvia.


A1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO sin proyecto (carpeta asfáltica dos carriles)

En éstas condiciones, la carretera deberá recibir un adecuado mantenimiento para que aún con la superficie de rodadura asfáltica, de 2 carriles, el nivel de servicio sea el mejor que se pueda brindar a los usuarios; para ello, luego de realizar el inventario de las actuales características viales a mantener, se diseñaron las normas de cantidad (nivel de servicio), cantidades de obra y presupuesto anual de mantenimiento rutinario.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 58.33 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2030

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

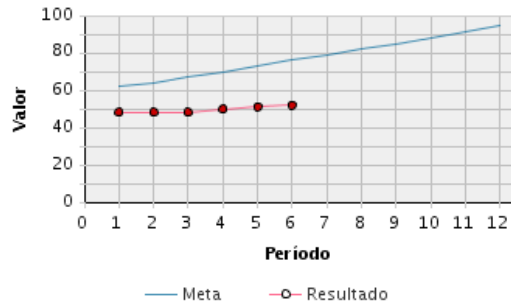

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	62 %	64 %	67 %	70 %	73 %	76 %	79 %	82 %	85 %	88 %	91 %	95 %
	Avance real acumulado											
	48 %	48 %	48 %	50 %	51 %	52 %						
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO DEL 2022	Berrezueta Velez, Gustavo David	04/08/2022 - 03:38 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se contrataron 8 microempresas para mantenimiento vial, por un plazo de tres meses en la RVE-Guayas. Considerando las vías: Puentes de la Unidad Nacional, Salitre-Vernaza-Tres Marías, La Aurora-Puente VR, Palestina-Macul, Playas-Posorja, Triunfo-Dos Bocas, Empalme-Pichincha.		
JUNIO DEL 2022 Se contrataron 8 microempresas para mantenimiento vial, por un plazo de tres meses en la RVE-Guayas. Considerando las vías: Puentes de la Unidad Nacional, Salitre-Vernaza-Tres Marías, La Aurora-Puente VR, Palestina-Macul, Playas-Posorja, Triunfo-Dos Bocas, Empalme-Pichincha.	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	05/07/2022 - 10:48 AM
MAYO 2022 No se realizaron pagos en el presente mes.	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	03/06/2022 - 02:13 PM
ABRIL 2022 Se realizaron pagos pendientes del 2021, por concepto de colocación de guardavías.	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	03/05/2022 - 11:08 AM
Marzo 2022. No se realizaron pagos por mantenimiento vial.	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	04/04/2022 - 02:45 PM
FEBRERO 2022. No se realizaron pagos por concepto de este proyecto.	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	04/03/2022 - 10:59 AM
ENERO 2022 No se han realizado pagos por concepto de este proyecto.	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	02/02/2022 - 10:29 AM
DICIEMBRE 2021 En este mes se han realizados los sig. Pagos por concepto de gastos operacionales: Servicios personales por contrato: \$ 11,367.70 (ingresos) Aporte Patronal: \$ 1,097.01 Fondos de Reserva: \$ 592.68 (ingresos). Décimo tercer sueldo \$ 7,865.54 Décimo cuarto \$ 1,666.63 Compensación por Vacaciones no Gozadas por cesación de funciones \$ 3,926.10	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	03/01/2022 - 12:11 PM
NOVIEMBRE 2021 En este mes se han realizados los sig. Pagos por concepto de gastos operacionales: Servicios personales por contrato: \$ 11,367.70 (ingresos) Aporte Patronal: \$ 1,097.01 Fondos de Reserva: \$ 320.46 (ingresos).	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	02/12/2021 - 12:51 PM
OCTUBRE 2021 En este mes se han realizados los sig. Pagos por concepto de gastos operacionales: Servicios personales por contrato: \$ 9,705.70 (ingresos) Aporte Patronal: \$ 936.62 Fondos de Reserva: \$ 320.46 (ingresos). Décimo cuarto sueldo: \$ 115.55 (ingresos). Décimo tercer sueldo: \$ 290.48 (ingresos) Infraestructura \$ 182,394.28 Mantenimiento de áreas verdes y vías internas \$ 38,118.88	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	04/11/2021 - 01:30 PM
SEPTIEMBRE 2021 En este mes se han realizados los sig. Pagos por concepto de gastos operacionales: Servicios personales por contrato: \$ 10,800.00 (ingresos)	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	01/10/2021 - 06:28 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Aporte Patronal: \$ 1,042.22 Fondos de Reserva: \$ 270.90 (ingresos). Décimo cuarto sueldo: \$ 133.32 (ingresos). Décimo tercer sueldo: \$ 381.67 (ingresos) Servicio de voluntariado (microempresas \$ 108,905.63 Mantenimiento de áreas verdes y vías internas \$ 88,868.16		
AGOSTO 2021 En este mes se han realizados los sig. Pagos por concepto de gastos operacionales: Servicios personales por contrato: \$ 11,915.63 (ingresos) Aporte Patronal: \$ 1,149.88 Fondos de Reserva: \$ 1,647.72 (ingresos). Décimo cuarto sueldo: \$ 433.29 (ingresos). Décimo tercer sueldo: \$ 1,192.75 (ingresos) Servicio de voluntariado (microempresas) \$ 175,439.16	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	03/09/2021 - 08:18 AM
JULIO 2021 En este mes se han realizados los siguientes pagos por concepto de gastos operacionales: Servicios personales por contrato: \$ 12,144.00 (ingresos) Aporte Patronal: \$ 1,171.93 Décimo tercer sueldo \$596.42 Decimocuarto sueldo \$199.98 Por concepto de pagos a microempresas (servicio de voluntariado) se canceló \$129,270.93. Se ha cumplido con lo programado en el POA 2021 de gastos operacionales (pago al personal) y servicio de voluntariado (contratación de microempresas).	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	02/08/2021 - 11:25 PM
JUNIO 2021 En este mes se han realizados los siguientes pagos por concepto de gastos operacionales : Servicios personales por contrato: \$ 12,228.00 (ingresos) Aporte Patronal: \$ 1,180.04 Por concepto de pagos a microempresas se canceló \$28,657.11. Se ha cumplido con lo programado en el POA 2021 de gastos operacionales (pago al personal) y servicio de voluntariado (contratación de microempresas).	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	02/07/2021 - 11:41 AM
MAYO 2021 En este mes se han realizados los sig. pagos por concepto de gastos operacionales : Servicios personales por contrato: \$ 12,228.00 (ingresos) Aporte Patronal: \$ 1,180.04 Fondos de Reserva: \$688.41 (ingresos). Décimo cuarto sueldo: \$ 166.65 (ingresos). Décimo tercer sueldo: \$ 423.59 (ingresos) Se contrataron las microempresas conforme el POA aprobado, las cuales están en las diferentes vías del Guayas.	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	02/06/2021 - 04:36 PM
ABRIL 2021 En este mes se han realizados los sig. pagos por concepto de gastos operacionales, conforme el POA aprobado: Servicios personales por contrato: \$ 12,228.00 (ingresos) Aporte Patronal: \$ 1,180.04 Fondos de Reserva: \$688.41 (ingresos). Décimo cuarto sueldo: \$ 166.65 (ingresos). Décimo tercer sueldo: \$ 423.59 (ingresos)	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	03/05/2021 - 04:00 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se están gestionando la contratación de microempresas para el mantenimiento vial Guayas, conforme los memorándums MTOP-DDG-2021-680-ME, del 31 de marzo del 2021 y el MTOP-DDG-2021-681-ME-del 23 de abril del 2021.</p>		
<p>MARZO 2021</p> <p>En este mes se han realizados los sig. pagos por concepto de gastos operacionales, conforme el POA aprobado:</p> <p>Servicios personales por contrato: \$ 12,228.00 (ingresos) Aporte Patronal: \$ 1,180.04 Fondos de Reserva: \$688.41 (ingresos). Décimo cuarto sueldo: \$ 166.65 (ingresos). Décimo tercer sueldo: \$ 423.59 (ingresos)</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>01/04/2021 - 05:35 PM</p>
<p>FEBRERO 2021</p> <p>En este mes se han realizados los sig. pagos por concepto de los gastos operacionales, conforme el POA aprobado:</p> <p>Servicios personales por contrato \$ 11,259.67 Aporte patronal \$ 1,086.59</p> <p>En enero 2021 se pagó: Servicios personales por contrato \$ 12,228.00 Aporte patronal \$ 1,180.04</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>02/03/2021 - 11:31 AM</p>
<p>ENERO 2021</p> <p>Hasta la presente fecha no está activo el nuevo programa financiero SINAFIP, motivo por el cual, no se puede registrar la información mensual de GPR-mantenimiento vial. Esta información será presentada en el mes de febrero del 2021.</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>02/02/2021 - 02:04 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2020.</p> <p>Se han contratado 7 microempresas para el mantenimiento vial de la provincia del Guayas, son:</p> <p>Trabajadores del progreso, fecha de contrato 14 de octubre del 2020. San Isidro, fecha de contrato 14 de octubre del 2020. Ecuavías, fecha de contrato 14 de octubre del 2020. Vías Guayas, fecha de contrato 14 de octubre del 2020. Los Sauces, fecha de contrato 16 de octubre del 2020. Unidad Nacional, fecha de contrato 14 de octubre del 2020. Tracto Vial Guayas, fecha de contrato 23 de octubre del 2020.</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>05/01/2021 - 10:16 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2020.</p> <p>Se han contratado 7 microempresas para el mantenimiento vial de la provincia del Guayas, son:</p> <p>Trabajadores del progreso, fecha de contrato 14 de octubre del 2020. San Isidro, fecha de contrato 14 de octubre del 2020. Ecuavías, fecha de contrato 14 de octubre del 2020. Vías Guayas, fecha de contrato 14 de octubre del 2020. Los Sauces, fecha de contrato 16 de octubre del 2020. Unidad Nacional, fecha de contrato 14 de octubre del 2020. Tracto Vial Guayas, fecha de contrato 23 de octubre del 2020.</p> <p>Servicios personales-Recursos humanos: Servicios personales por contrato: \$ 11,436.15 Aporte Patronal: \$ 1,297.00 Décimo cuarto sueldo: \$ 166.65 Décimo tercer sueldo: \$ 432.59 Fondos de Reserva: \$ 676.58</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>02/12/2020 - 07:53 PM</p>
<p>OCTUBRE 2020.</p> <p>Se han contratado 7 microempresas para el mantenimiento vial de la provincia del Guayas, son:</p> <p>Trabajadores del progreso, fecha de contrato 14 de octubre del 2020. San Isidro, fecha de contrato 14 de octubre del 2020. Ecuavías, fecha de contrato 14 de octubre del 2020. Vías Guayas, fecha de contrato 14 de octubre del 2020.</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>05/11/2020 - 02:13 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Los Sauces, fecha de contrato 16 de octubre del 2020. Unidad Nacional, fecha de contrato 14 de octubre del 2020. Tracto Vial Guayas, fecha de contrato 23 de octubre del 2020.</p> <p>Servicios personales-Recursos humanos:</p> <p>Por contrato: \$ 20852.04 (ingresos) Aporte patronal: \$ 2360.08 Fondos de reserva: \$ 676.58 (ingresos). Décimo cuarto sueldo: \$ 166.65 (ingresos). Décimo tercer sueldo: \$ 432.59 (ingresos)</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2020 .</p> <p>CAUSA: Debido a la situación económica del país no se han asignado recursos económicos para la contratación de los servicios de mantenimiento vial.</p> <p>ACCIONES: Las autoridades superiores están realizando los tramites correspondiente sin que se les entreguen los recursos económicos pertinentes.</p> <p>Servicios personales-Recursos humanos:</p> <p>Por contrato: \$ 9250.72 (ingresos) Aporte patronal: \$ 1071.20 Fondos de reserva: \$ 812.70 (ingresos). Décimo cuarto sueldo: \$ 889.99 (ingresos). Décimo tercer sueldo: \$ 258.67 (ingresos)</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>04/10/2020 - 10:28 PM</p>
<p>AGOSTO 2020 .</p> <p>CAUSA: DEBIDO A LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS NO SE HAN ASIGNADO RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL.</p> <p>ACCIONES: LAS AUTORIDADES SUPERIORES ESTÁN REALIZANDO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTE SIN QUE SE LES ENTREGUEN LOS RECURSOS ECONÓMICOS PERTINENTES.</p> <p>Servicios personales-Recursos humanos:</p> <p>Por contrato: \$ 9250.72 (ingresos) Aporte patronal: \$ 1071.20 Fondos de reserva: \$ 744,64 (ingresos). Décimo cuarto sueldo: \$ 99.99 (ingresos). Décimo tercer sueldo: \$ 258.57 (ingresos)</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>02/09/2020 - 08:55 PM</p>
<p>JULIO 2020 .</p> <p>CAUSA: Debido a la situación económica del país no se han asignado recursos económicos para la contratación de los servicios de mantenimiento vial (microempresas).</p> <p>ACCIONES: Las autoridades superiores están realizando los trámites correspondientes sin que se les entreguen los recursos económicos pertinentes.</p> <p>Servicios personales-Recursos humanos:</p> <p>Por contrato: \$ 10275.02 (ingresos) Aporte patronal: \$ 1189.81 Fondos de reserva: \$ 744,64 (ingresos). Décimo cuarto sueldo: \$ 133.32 (ingresos). Décimo tercer sueldo: \$ 398.34 (ingresos)</p> <p>Servicio de seguridad y vigilancia: \$2093.48</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>03/08/2020 - 10:27 PM</p>
<p>JUNIO-2020</p> <p>1.- Pago de personal-Sueldos de personal -Proyecto de Inversión- Contrato Ocasional: Servicios personales por contrato: \$ 10,275.05(ingresos) Aporte Patronal: \$ 1,411.70 Fondos de Reserva: \$788.54 (ingresos). Décimo cuarto sueldo: \$ 99.99 (ingresos). Décimo tercer sueldo: \$ 258.67 (ingresos)</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>02/07/2020 - 02:43 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.-Seguridad y vigilancia: No se han realizado contrataciones. 3.- Servicio de voluntariado: No se han realizado contrataciones. 4.- Maquinarias y equipos: No se han realizado contrataciones. 5.- Infraestructura (micro-empresas): No se han realizado contrataciones, en virtud que se está re-programando el POA 2020. 6.-Repuestos y accesorios: No se han realizado contrataciones. 7.-Seguros: No se han realizado contrataciones.</p>		
<p>MAYO 2020</p> <p>No se han contratado microempresas para el mantenimiento vial de la provincia del Guayas, en virtud que se está reprogramando el POA 2020.</p> <p>Servicios personales-Recursos humanos: por contrato: \$ 12,776.00(ingresos) aporte patronal: \$ 1,232.93 fondos de reserva: \$788.54 (ingresos). décimo cuarto sueldo: \$ 99.99 (ingresos). décimo tercer sueldo: \$ 258.67 (ingresos)</p> <p>Mantenimiento rutinario-Empalme Pichincha: obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p> <p>Mantenimiento rutinario de la carretera Salitre limite Guayas - Los Ríos a cargo de la Dirección Distrital del MTOP- Guayas: en etapa de prueba.</p> <p>Mantenimiento rutinario vía Palestina-limite Guayas-Los Ríos, trabajos realizados a cargo de la Dirección Distrital del MTOP Guayas: en etapa de prueba.</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>03/06/2020 - 09:09 PM</p>
<p>ABRIL 2020</p> <p>NO SE HAN CONTRATADO MICROEMPRESAS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EN VIRTUD QUE SE ESTA RE PROGRAMANDO EL POA 2020.</p> <p>NO SE HAN REALIZADO PAGOS AL PERSONAL EN GASTOS DE INVERSIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO RUTINARIO-EMPALME PICHINCHA: Obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p> <p>MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RÍOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS: En etapa de prueba.</p> <p>MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS: En etapa de prueba</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>05/05/2020 - 02:36 PM</p>
<p>MARZO 2020</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINÁI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS Se aprobó el proyecto en SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO). No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL Servicios personales por contrato: \$ 11,100.00(ingresos) Aporte Patronal: \$ 1,071.20</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS. No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA Fondos de Reserva: \$695.63 (ingresos).</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA. Obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En etapa de prueba.</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>03/04/2020 - 11:26 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL. No hay procesos.</p> <p>11.- ADMINISTRACIÓN, COBRO Y RECAUDACIÓN DE Y DEPOSITO DE LA ESTACIÓN DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS- No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú. Consorcio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: En etapa de prueba. Galibo de Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO CUARTO SUELDO. Décimo cuarto sueldo: \$ 99.99 (ingresos).</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. No existen procesos.</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En etapa de prueba.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIÓ 7. Se firmó la Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSIÓN DE 17.80 KM. Ya se firmó el Acta Definitiva.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO. Servicios personales por contrato: \$ 11,100.00(ingresos) Aporte Patronal: \$ 1,071.20</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. No existen procesos.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO TERCER SUELDO. Décimo tercer sueldo: \$ 258.67 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL Ya se firmó el acta definitiva.</p> <p>23.- AUN NO SE CONTRATA LAS MICROEMPRESAS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL 2020, DEBIDO A QUE ESTA</p>		
<p>INFORME EJECUTIVO-FEBRERO- 2020-MANTENIMIENTO VÍAS GUAYAS</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS Se aprobó el proyecto en SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO). No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL Servicios personales por contrato: \$ 11,100.00(ingresos) Aporte Patronal: \$ 1,071.20</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS. No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA Fondos de Reserva: \$695.63 (ingresos).</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA. Obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>04/03/2020 - 08:39 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En etapa de prueba.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL. No hay procesos.</p> <p>11.- ADMINISTRACIÓN, COBRO Y RECAUDACIÓN DE Y DEPOSITO DE LA ESTACIÓN DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS- No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú. Consortio ciclovias Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>Galibo de Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO CUARTO SUELDO. Décimo cuarto sueldo: \$ 99.99 (ingresos).</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. No existen procesos.</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En etapa de prueba.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIÓ 7. Se firmó la Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSIÓN DE 17.80 KM. Ya se firmó el Acta Definitiva.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO. Servicios personales por contrato: \$ 11,100.00(ingresos) Aporte Patronal: \$ 1,071.20</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. No existen procesos.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO TERCER SUELDO. Décimo tercer sueldo: \$ 258.67 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL. Ya se firmó la recepción definitiva.</p>		
<p>RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE 2019</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINÁI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS Se aprobó el proyecto en SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO). No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos) Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS. No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA Fondos de Reserva: \$676,06 (ingresos).</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>04/01/2020 - 10:39 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA. Obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En etapa de prueba.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL.</p> <p>11.- ADMINISTRACION, COBRO Y RECAUDACION DE Y DEPOSITO DE LA ESTACION DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS- No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú. Consortio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>Galibo de Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO CUARTO SUELDO. Décimo cuarto sueldo: \$ 65,66 (ingresos).</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. Se realizó la adjudicación del contrato, por subasta inversa electrónica, por un monto de \$19500 más IVA, al Sr. García Mendoza Jorge Andy.</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En etapa de prueba.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIO 7. En proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSION DE 17.80 KM. Ya se firmó el Acta Definitiva.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO. Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos) Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES). Se adjudicó el contrato por subasta inversa electrónica, por un valor de \$52000 mas IVA, a POTENZZA SA ,por un plazo de 60 días.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO TERCER SUELDO. Décimo tercer sueldo: \$190,59 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL. Ya se firmó la recepción definitiva.</p>		
<p>INFORME DE NOVIEMBRE 2019.</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS Se aprobó el proyecto en SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO). No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos) Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS. No se paga en gastos de inversión.</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>02/12/2019 - 09:42 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA Fondos de Reserva: \$676,06 (ingresos).</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA. Obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En etapa de prueba.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL.</p> <p>11.- ADMINISTRACION, COBRO Y RECAUDACION DE Y DEPOSITO DE LA ESTACION DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS- No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú. Consorcio ciclovias Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>Galibo de Progreso: En etapa de prueba.</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO CUARTO SUELDO. Décimo cuarto sueldo: \$ 65,66 (ingresos).</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. Se realizó la adjudicación del contrato, por subasta inversa electrónica, por un monto de \$19500 más IVA, al Sr. García Mendoza Jorge Andy.</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En etapa de prueba.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIO 7. En proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSION DE 17.80 KM. Ya se firmó el Acta Definitiva.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO. Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos) Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. Se adjudicó el contrato por subasta inversa electrónica, por un valor de \$52000 mas IVA, a POTENZZA SA ,por un plazo de 60 días.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO TERCER SUELDO. Décimo tercer sueldo: \$190,59 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL. Ya se firmó la recepción definitiva.</p>		
<p>RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE-2019.</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS La obra aún no se encuentra en ejecución debido a que se está tramitando la viabilidad con SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO). No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos), \$1176.70 (9,15% patronal), \$64,34 (0,50% IECE) Aporte Patronal: \$1241,04</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>06/11/2019 - 10:06 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS. No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA Fondos de Reserva: \$1115,14 (ingresos).</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA. Obra terminada, en proceso de recepción provisional.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. Ya se realizó la recepción provisional.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL.</p> <p>11.- ADMINISTRACION, COBRO Y RECAUDACION DE Y DEPOSITO DE LA ESTACION DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS- No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú. Consorcio ciclovias Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: Ya se firmó el acta de recepción provisional.</p> <p>Galibo de Progreso: la obra está terminada y en funcionamiento dando servicio a la comunidad</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO CUARTO SUELDO. Décimo cuarto sueldo: \$ 426,79 (ingresos).</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. Se realizó la adjudicación del contrato, por subasta inversa electrónica, por un monto de \$19500 más IVA, al Sr. García Mendoza Jorge Andy.</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. Ya se firmó el Acta de recepción provisional.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIO 7. En proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSION DE 17.80 KM. Ya se firmó el Acta Provisional.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO. Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos), \$1176.70 (9,15% patronal), \$64,34(0,50% IECE). Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES). Se adjudicó el contrato por subasta inversa electrónica, por un valor de \$52000 mas IVA, a POTENZA SA ,por un plazo de 60 días.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO TERCER SUELDO. Décimo tercer sueldo: \$1115,59 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL. Ya se firmó la recepción definitiva.</p>		
<p>AGOSTO-2019</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINÁI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS .La obra aún no se encuentra en ejecución debido a que se está tramitando la viabilidad con SENPLADES.</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>03/09/2019 - 03:38 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO).No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL .Servicios personales por contrato: \$ 12,860.00 (ingresos).Aporte Patronal: \$ 1,241.04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS. No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA .Fondos de Reserva: \$ 744.14</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA. Obra terminada, en espera de la recepción provisional.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En proceso de recepción provisional.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-.No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL. El contrato tiene acta de recepción.</p> <p>11.- ADMINISTRACION, COBRO Y RECAUDACION DE Y DEPOSITO DE LA ESTACION DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS- Esta en procesos de contratación mediante el portal de compras públicas.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú. Consorcio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: La obra se encuentra terminada con fecha 12 de junio de 2019 ya tiene el acta de recepción provisional. Galibo de Progreso: Tiene el acta de recepción provisional.</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO CUARTO SUELDO. Décimo cuarto sueldo: \$ 65.66.</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. No se ha realizado el contrato todavía del servicio</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La obra se concluyó el 13 mayo 2019, en trámite Acta recepción provisional.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIO 7.Se firmó el Acta de Recepción Provisional el 14 de febrero del 2019, y actualmente se halla en proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSION DE 17.80 KM. En ejecución, se termina la primera semana de agosto.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO.Servicios personales por contrato: \$ 12,860.00, Aporte Patronal: \$ 1,241.04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO TERCER SUELDO. Décimo tercer sueldo: \$ 190.59</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL. Ya se firmó la recepción definitiva.</p> <p>23.- MICROEMPRESAS-PROVINCIA DEL GUAYAS.</p>		
<p>JUNIO 2019</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS La obra aún no se encuentra en ejecución debido a que se está tramitando la viabilidad con SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO). No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>02/07/2019 - 01:57 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL . Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos), \$1176.70 (9,15% patronal), \$64,34 (0,50% IECE) Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS. No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA . Fondos de Reserva: \$1115,14 (ingresos).</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA. Al momento la obra se encuentra suspendida por lluvias desde el 03/03/2019, y con un avance del 25%.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En proceso de recepción provisional.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VÍAS DE LA RED VIAL ESTATAL.</p> <p>11.- ADMINISTRACIÓN, COBRO Y RECAUDACIÓN DE Y DEPOSITO DE LA ESTACIÓN DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS- No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú. Consorcio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: Los trabajos finalizaron el 17 de junio de 2019 al 100 %, se han presentado hasta la fecha 2 planillas por un monto de 844844.68 dólares. Galibo de Progreso: la obra está terminada y en funcionamiento dando servicio a la comunidad</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO CUARTO SUELDO. Décimo cuarto sueldo: \$ 426,79 (ingresos).</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. No se ha realizado el contrato todavía del servicio</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RÍOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La obra se concluyó el 13 mayo 2019, en trámite planilla 3 y Acta recepción provisional.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIÓ 7. Se firmó el Acta de Recepción Provisional el 14 de febrero del 2019, y actualmente se halla en proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSIÓN DE 17.80 KM. En ejecución, se termina la primera semana de agosto.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO. Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos), \$1176.70 (9,15% patronal), \$64,34(0,50% IECE). Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES). No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO TERCER SUELDO. Décimo tercer sueldo: \$1115,59 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL. Ya se firmó la recepción definitiva.</p>		
<p>Mayo 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.</p>	<p>Salas Aragundi, Daniel Antonio</p>	<p>05/06/2019 - 09:16 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.		
Abril 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.	Salas Aragundi, Daniel Antonio	06/05/2019 - 04:42 PM
Marzo 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.	Salas Aragundi, Daniel Antonio	05/04/2019 - 01:16 PM
Febrero 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.	Salas Aragundi, Daniel Antonio	06/03/2019 - 08:12 AM
Enero 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.		
Diciembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.	Salas Aragundi, Daniel Antonio	04/01/2019 - 12:39 PM
Noviembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.	Salas Aragundi, Daniel Antonio	05/12/2018 - 08:16 AM
OCTUBRE 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.	Salas Aragundi, Daniel Antonio	05/11/2018 - 07:58 AM
Septiembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.	Salas Aragundi, Daniel Antonio	05/10/2018 - 05:16 PM
Agosto 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.	Salas Aragundi, Daniel Antonio	04/09/2018 - 09:04 AM
Julio 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.	Salas Aragundi, Daniel Antonio	06/08/2018 - 09:46 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Junio 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador	Salas Aragundi, Daniel Antonio	05/07/2018 - 08:43 AM
Mayo 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador	Salas Aragundi, Daniel Antonio	05/06/2018 - 09:22 AM
Abril 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador		
Enero 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Salas Aragundi, Daniel Antonio	05/04/2018 - 04:56 PM
Febrero 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad		
Marzo 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad		
Diciembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Salas Aragundi, Daniel Antonio	04/01/2018 - 08:48 AM
Noviembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad		
Octubre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Salas Aragundi, Daniel Antonio	01/11/2017 - 02:59 PM
Septiembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Salas Aragundi, Daniel Antonio	10/10/2017 - 09:21 AM
Agosto 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Mendoza Cedeno, José Eugenio	06/09/2017 - 11:58 AM
Julio 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	02/08/2017 - 04:04 PM
Junio 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	04/07/2017 - 02:14 PM
Mayo 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/06/2017 - 03:23 PM
Abril 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/06/2017 - 03:23 PM
Marzo 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	04/04/2017 - 11:21 AM
Febrero 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	06/03/2017 - 07:27 AM
Enero 2017.- Se terminan los trabajos relacionados con la señalización y el proyecto está terminado al 100% dando servicio a la comunidad.	Salas Aragundi, Daniel Antonio	06/02/2017 - 09:10 AM
Diciembre 2016.- Se realizan trabajos de señalización horizontal y vertical en los diferentes enlaces del distribuidor de tráfico. Se tiene en trámite Orden de cambio 7 y contrato complementario	Salas Aragundi, Daniel Antonio	05/01/2017 - 02:59 PM
Noviembre 2016.- Se realizan trabajos de señalización horizontal y vertical en los diferentes enlaces del distribuidor de tráfico	Salas Aragundi, Daniel Antonio	05/12/2016 - 04:03 PM
OCTubre 2016: Se terminan realizar el asfaltado dentro de todos los enlaces del distribuidor de tráfico, se comienza a colocar la pintura de tráfico para la señalización	Salas Aragundi, Daniel Antonio	07/11/2016 - 12:07 AM
Septiembre 2016: Se terminan de realizar los trabajos de movimiento de tierras, se procede a realizar asfaltado del enlace 2 3 4 5 6 7. Terminación de cunetas enlace 5		
Agosto 2016: Se terminan de realizar los trabajos de movimiento de tierras, se procede a realizar asfaltado del enlace 4 lado derecho; se terminan trabajos en el enlace 5. Terminación de cunetas enlace 3	Salas Aragundi, Daniel Antonio	09/09/2016 - 08:39 AM
JuLIO 2016: Una vez entregado el porcentaje de anticipo faltante, se procedió a realizar los trabajos de sub-base - base en los enlaces 3, 6 y 7; se comenzo a realizar la imprimación de el enlace 4 y 8.	Salas Aragundi, Daniel Antonio	09/09/2016 - 08:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Junio 2016: Según comunicación de las autoridades se ha entregado el 35% faltante del anticipo con credito chino, la contratista a partir del día lunes 11 de Julio de 2016, entrará a trabajar al 100% con su personal y maquinaria.	Salas Aragundi, Daniel Antonio	06/07/2016 - 11:09 AM
MAYO 2016: Continuan con los trabajos de fundición del hormigón de las alas del puente, que servirán para contener relleno adicional como resultado de la elevación de 1 m del puente existente.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	07/06/2016 - 10:41 AM
ABRIL 2016: Continuan con los trabajos de fundición de los incrementos de los estribos en ambos lados del puente, producto de la elevación de 1 m del puente existente	Calderón Cañar, Edgar Miguel	06/05/2016 - 02:01 PM
MARZO 2016: Se han ejecutado trabajos de fundición de los incrementos de los estribos en ambos lados del puente, producto de la elevación de 1 m del puente existente	Calderón Cañar, Edgar Miguel	06/05/2016 - 01:56 PM
FEBRERO 2016: Los trabajos se encuentran suspendidos por la contratista por diferentes causas, entre ellas la etapa invernal y el no pago de planillas de obra.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/03/2016 - 09:04 AM
ENERO 2016: Colocación del material en los enlaces 6 y 7	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/03/2016 - 09:03 AM
DICIEMBRE 2015: Se realizaron trabajos de imprimación en el enlace 8 y se colocó material de base en el enlace 4	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/03/2016 - 09:01 AM
NOVIEMBRE 2015: La obra se encuentra con un ritmo bajo de avance de obra por motivos de pago de planillas, el MTOP no ha pagado ninguna de las 6 planillas presentadas por la contratista.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	24/12/2015 - 11:15 AM
OCTUBRE 2015: Levantamiento de los dos tramos del puente, colocación de mejoramiento, sub base y base en los ocho ramales del distribuidor de tráfico.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	24/12/2015 - 11:14 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PROVOCARA LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.	03/02/2022	Maritza Alexandra Rocohano Granados	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PROVOCARA LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.	03/02/2022	Maritza Alexandra Rocohano Granados	10 %	10	1	0/0

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Empalme
2	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Triunfo
3	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal
4	Zona 5 - Litoral > Guayas > Playas

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	4-Inicio de Trabajo	02/07/2014		01/03/2021		Sí	5.0
2	DEFINICIÓN: Documento del proyecto en formato SENPLADES elaborado	4-Inicio de Trabajo	02/07/2014		01/01/2022		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Pago de personal realizado	5-Entregables Intermedios	29/01/2021		29/01/2021		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados	9-Entregables Formales	28/02/2021		28/02/2021		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN:Contratación de microempresas	9-Entregables Formales	31/03/2021		31/03/2021		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN:Pago de personal realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Pagos realizados	9-Entregables Formales	30/04/2021		30/04/2021		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN:Contratación de microempresas realizados	9-Entregables Formales	30/04/2021		30/04/2021		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Pagos de personal	9-Entregables Formales	31/05/2021		31/05/2021		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN:Contratación de microempresas	9-Entregables Formales	31/05/2021		31/05/2021		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN : Contratación de microempresas realizados.	9-Entregables Formales	30/06/2021		30/06/2021		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	30/06/2021		30/06/2021		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN:Contratación de microempresas realizados	5-Entregables Intermedios	31/07/2021		31/07/2021		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN:Pago de personal	5-Entregables Intermedios	31/07/2021		31/07/2021		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN:Contratación de microempresas realizados	5-Entregables Intermedios	31/08/2021		31/08/2021		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN:Pagos de personal realizados	9-Entregables Formales	31/08/2021		31/08/2021		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN:Contratación de microempresas realizados	5-Entregables Intermedios	30/09/2021		30/09/2021		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN:Pagos de personal realizados	5-Entregables Intermedios	30/09/2021		30/09/2021		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Contratación de microempresas realizados	9-Entregables Formales	31/10/2021	31/10/2021			No	1.0
20	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	31/10/2021		31/10/2021		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	30/11/2021		30/11/2021		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN:Contratación de microempresas realizados	5-Entregables Intermedios	30/11/2021	30/11/2021			No	1.0
23	EJECUCIÓN: Contratación de microempresas realizados	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	2.0
24	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	31/12/2021		31/12/2021		Sí	2.0
25	CIERRE: Aprobación del Ministro de Obras Públicas, suscrita	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	1.0
26	CIERRE: Certificación de la Coordinación General	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago, suscrita							
27	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021		▼	No	0.5
28	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar, suscrito por el MEF	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021		▼	No	0.5
29	CIERRE: Documentos habilitantes para cierre del proyecto conforme Instructivo, a la Coordinación General de Planificación entregados.	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021		▼	No	0.5
30	CIERRE: Formatos de CIERRE/BAJA del proyecto según Acuerdo Nro. 025, elaborados	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021		▼	No	0.5
31	CIERRE: Información registrada del proyecto en los sistemas GPR, SIPeP y SITOP actualizada	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021		▼	No	0.5
32	CIERRE: Informe de cierre de Proyectos (Secretaría Técnica Planifica Ecuador) aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021		▼	No	0.5
33	CIERRE: Solicitud a la Secretaría Técnica Planifica Ecuador para el registro de cierre/baja, suscrita	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021		▼	No	0.5
34	PLANEACION: Proyecto con recursos económicos asignados	4-Inicio de Trabajo	25/01/2022		01/05/2021	●	Sí	5.0
35	PLANEACIÓN:Proyectos con recursos económicos asignados.	4-Inicio de Trabajo	25/01/2022	25/01/2022		▼	No	5.0
36	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	29/01/2022		29/01/2022	●	Sí	2.0
37	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	28/02/2022	28/02/2022		▼	No	2.0
38	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	28/03/2022	28/03/2022		▼	No	2.0
39	EJECUCIÓN: Contratación de microempresas realizados	9-Entregables Formales	28/03/2022	28/03/2022		▼	No	1.0
40	EJECUCIÓN: Contratación de microempresas realizados	9-Entregables Formales	30/04/2022	30/04/2022		▼	No	1.0
41	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	30/04/2022		30/04/2022	●	Sí	2.0
42	EJECUCIÓN: Contratación de microempresas realizados	9-Entregables Formales	31/05/2022		31/05/2022	●	Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	31/05/2022	31/05/2022		▼	No	2.0
44	EJECUCIÓN: Contratación de microempresas realizados	9-Entregables Formales	30/06/2022		30/06/2022	●	Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/06/2022		▼	No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
46	EJECUCIÓN: Contratación de microempresas realizados	9-Entregables Formales	31/07/2022	31/07/2022			No	1.0
47	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	31/07/2022	31/07/2022			No	2.0
48	EJECUCIÓN: Contratación de microempresas realizados	9-Entregables Formales	31/08/2022	31/08/2022			No	1.0
49	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	31/08/2022	31/08/2022			No	2.0
50	EJECUCIÓN: Contratación de microempresas realizados	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022			No	1.0
51	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022			No	2.0
52	EJECUCIÓN: Contratación de microempresas realizados	9-Entregables Formales	31/10/2022	31/10/2022			No	1.0
53	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	31/10/2022	31/10/2022			No	2.0
54	EJECUCIÓN: Contratación de microempresas realizados	9-Entregables Formales	30/11/2022	30/11/2022			No	1.0
55	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	30/11/2022	30/11/2022			No	2.0
56	EJECUCIÓN: Contratación de microempresas realizados	9-Entregables Formales	31/12/2022	31/12/2022			No	2.0
57	EJECUCIÓN: Pagos de personal realizados.	9-Entregables Formales	31/12/2022	31/12/2022			No	2.0
58	CIERRE: Aprobación del Ministro de Obras Públicas, suscrita	9-Entregables Formales	31/12/2030	31/12/2030			No	1.0
59	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago, suscrita	9-Entregables Formales	31/12/2030	31/12/2030			No	0.5
60	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	31/12/2030	31/12/2030			No	0.5
61	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar, suscrito por el MEF	9-Entregables Formales	31/12/2030	31/12/2030			No	0.5
62	CIERRE: Documentos habilitantes para cierre del proyecto conforme Instructivo, a la Coordinación General de Planificación entregados.	9-Entregables Formales	31/12/2030	31/12/2030			No	0.5
63	CIERRE: Formatos de cierre/baja según acuerdo N 25 elaborados.	9-Entregables Formales	31/12/2030	31/12/2030			No	0.5
64	CIERRE: Informe de cierre de Proyectos (Secretaría Técnica Planifica Ecuador) aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2030	31/12/2030			No	0.5
65	CIERRE: Solicitud a a la Secretaría Técnica Planifica Ecuador para el registro de cierre/baja, suscrita	9-Entregables Formales	31/12/2030	31/12/2030			No	0.5


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
66	CIERRE:Información registrada del proyecto en los sistemas GPR,SIPPEIP y SITOP actualizado	9-Entregables Formales	31/12/2030	31/12/2030			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Se han realizado las reparaciones necesarias para tener en optimas condiciones la via, sin embargo hay desprendimientos de hitos de via en el tramo 4	Monge Espinel, Luis Humberto	{PR} - Provincia - GUAYAS	30/06/2017
2	La obra presenta grandes daños, por tal razon solicitamos al MTOP oficie inmediatamente a la Contratista para que realice las reparaciones necesarias	Monge Espinel, Luis Humberto	{PR} - Provincia - GUAYAS	26/05/2017
3	La obra tiene un 99% de avance se espera que culmine los trabajos el 15 de enero de 2017	Monge Espinel, Luis Humberto	{PR} - Provincia - GUAYAS	13/01/2017
4	La obra presenta retrasos, la fecha de término de acuerdo a la ampliación era 30 de Nov. de 2016	Monge Espinel, Luis Humberto	{PR} - Provincia - GUAYAS	21/12/2016
5	Se cumplió el plazo que era el 31 de octubre de 2016 y la obra no está finalizada aun quedan rubros por ejecutar	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	10/11/2016
6	La obra presenta un gran avance, se espera que esté lista para el 31 de Octubre de 2016	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	14/10/2016
7	La obra presenta retrasos de acuerdo a la programación de la ficha GPR, se espera que la obra termine el 31 de octubre de 2016	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	25/08/2016
8	La obra permanece paralizada no se encontró personal en obra	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	23/05/2016
9	La obra se encuentra paralizada	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	19/02/2016
10	Debido a la etapa invernal los trabajos se han retrasado, se espera que la obra culmine el 15 de abril del 2016	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	28/01/2016
11	Debido a la etapa invernal los trabajos se han retrasado, se espera que la obra culmine el 15 de abril del 2016	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	28/01/2016
12	Los trabajos se ejecutan según lo programado, la obra culminaría a finales de diciembre del 2015	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	26/11/2015
13	Los trabajos se ejecutan según lo programado por la contratista, se solicita actualizar la ficha de GPR para conocer fechas de cumplimiento de hitos	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	11/09/2015
14	Se retoman los trabajos, se espera que la obra culmine el 15 de noviembre del 2015	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	24/06/2015
15	La obra se encuentra suspendida hasta que se realice la declaratoria de utilidad pública	Panchana Farra, Rolando José	{PR} - Provincia - GUAYAS	17/04/2015

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de mantenimiento de la RVE-Guayas (microempresas)		56.30 %	1	0.563	01/04/2020	Abr-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	48,747,240.89 **
Costo Total:	57,664,176.82
Total Devengado:	48,674,696.51
% Costo Total Devengado:	84.41 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 84.41 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	58,956,237.15	0.00	0.00	58,956,237.15
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	22,543,558.14	285,127.32	0.00	22,828,685.46
Ppto. Codificado	25,180,070.00	315,531.71	0.00	25,495,601.71
Ppto. Comprometido	55,416,543.68	0.00	0.00	55,416,543.68
Planeado - Codificado (2022)		-315,531.71		
Programado a Devengar	49,978,285.61	72,544.38	0.00	50,050,829.99
Ppto. Devengado	48,674,696.51	0.00	0.00	48,674,696.51
Pagado Real	41,852,969.81	813.11	0.00	41,853,782.92
Estimado a fin de año	* 48,674,696.51	0.00	0.00	48,674,696.51
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,303,589.10	72,544.38	0.00	1,376,133.48
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 97.39 %	0.00 %	0.00 %	97.25 %
Ppto. Codificado 998	0.00	30,404.39	0.00	30,404.39
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

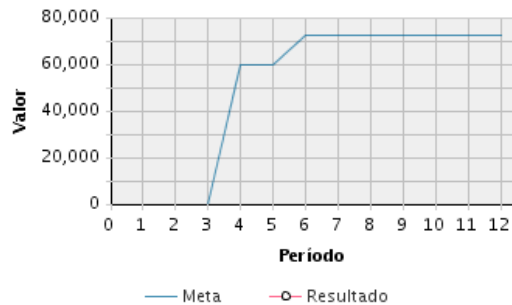

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	59,896.41		59,896.41				
May	0.00		59,896.41				
Jun	12,647.97		72,544.38				
Jul	0.00		72,544.38				
Ago	0.00		72,544.38				
Sep	0.00		72,544.38				
Oct	0.00		72,544.38				
Nov	0.00		72,544.38				
Dic	0.00		72,544.38				
Total	72,544.38						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
19	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Corrección geométrica.- orden de cambio	orden_de_cambio_no._1_varios_proyectos.pdf	06/07/2016
2	A.2 Corrección geométrica.-Orden de cambio 2	ORDEN_DE_CAMBIO_No._2_FIRMADA.pdf	06/07/2016
3	A.3 Corrección geométrica.-Orden de cambio 3	orden_de_cambio_nO._3.pdf	06/07/2016
4	A.4 Corrección geométrica.-orden de cambio 4	orden_de_cambio_no._4_sinohydro_con_fecha.pdf	06/07/2016
5	A.5 Corrección geométrica.-Orden de Cambio 5 Aumento de PLazo 30/11/2016	Orden_de_Cambio_5.pdf	11/11/2016
6	A.6 Corrección geométrica.-Orden de cambio 6 - 30/01/2017	ORDEN_DE_CAMBIO_No._6_SINOHYDRO.pdf	06/02/2017
7	A.7 Corrección geométrica.-Reanudación de trabajos	Reanudación_de_Trabajos.pdf	05/12/2017
8	A.8 Corrección geométrica.-Acta de suspensión	Acta_de_Suspensión_Temporal_Galibo.pdf	05/12/2017
9	A.9 Corrección geométrica.-Contrato complementario	CONtrato_complementario.pdf	05/12/2017
10	AA. 1 VERIFICABLE DEL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021	MANTENIMIENTO_VIAL_GUAYAS- MICROEMPRESAS_Y_CEDULAS_PRESUPUESTARIAS_2021.xlsx	04/07/2021
11	AA. 2 INFORME TRIMESTRAL ABRIL- JUNIO 2021	INFORME_DE_GPR-ABRIL-JUNIO-signed.pdf	05/07/2021
12	AA. 3 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2021	CED._PRES._MTTO._VIAL_PROV._GUAYAS_JULIO2021.pdf	02/08/2021
13	AA. 4 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE SEPTIEMBRE 2021	ced._pres._mto._vial_guayas_sept2021.pdf	01/10/2021
14	AA. 5 VERIFICABLE CONTRATO DE PODA DE ARBOLES-OCTUBRE 2021	GestionReporteRH- CONTRATO_DE_PODA_DE_ARBOLES_- OCTUBRE_2021.pdf	18/10/2021
15	AA. 6 VERIFICABLE ACTA DE LA MICROEMPRESA FORTALEZA-VIA PALESTINA-MACUL-SEP 2021	ACTA_DE_ENTREGA_LIQUIDACION_DE_TRABAJO- signed-signed-signed-PALESTINA-MACUL-2021.pdf	28/10/2021
16	AA. 7 VERIFICABLE- ACTA MICROEMPRES GUAYAS- VIA PLAYAS-POSORJA-SEPTIEMBRE 2021.	ACTA_DE_RECEPCION_SERVICIOS_PLAYAS_POSORJA- signed-1-signed-signed_(1).pdf	28/10/2021
17	AA. 8 VERIFICABLE ACTA DEL CONTRATO DE PODA DE ARBOLES-OCTUBRE 2021	GestionReporteRH-ACTA_DE_PODA_DE_ARBOLES- OCTUBRE_2021.pdf	18/10/2021
18	AA. 9 VERIFICABLES-ACTA DE MICROEMPRESAS- GUAYAS- VIA EL TRIUNFO-SEPT 2021.	ACTA_DE_RECEPCION_SERVICIOS_TRIUNFO- signed-3-signed-signed_(1).pdf	28/10/2021
19	B.1 JUNIO 2019- RECURSOS HUMANOS-GRUPO GASTO 71 INVERSIÓN.	Copia_de_MATRIZ_GRUPO_GASTO_71_INVERSIÓN-1.pdf	01/07/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
20	B.2 JUNIO 2019-INFORME EJECUTIVO-VÍA NARANJAL-RIÓ SIETE.	NARANJAL_-RIO_SIETE-JUNIO-2019..pdf	01/07/2019
21	B.3 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA- VALORES DEVENGADOS EN JUNIO.	CEDULA_PRESUPUESTARIA-JUNIO-2019-MANTENIMIENTO_VIAL_GUAYAS..pdf	01/07/2019
22	B.4 JUNIO 2019-ACTA DEFINITIVA DE LOS PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL.	ACTA_DEFINITIVA_DE_LOS_PUENTES_DE_LA_UNIDAD_NACIONAL-2019..pdf	02/07/2019
23	B.5 JUNIO 2019-INFORME EJECUTIVO-VÍA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS.	GestionReporteFN-1-VIA_PALESTINA-LIMITE_GUAYAS-LOS_RIOS-2019..pdf	02/07/2019
24	B.6 JUNIO 2019-INFORME EJECUTIVO-VÍA PUNTILLA-LA AURORA.	GestionReporteFN-PUNTILLA-LA-AURORA-JUNIO-2019..pdf	02/07/2019
25	B.7 JUNIO 2019-CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL-GUAYAS-2011 HASTA 2019.	CRONOGRAMA_DE_MANTENIMIENTO_VIAL-GUAYAS_DESDE_EL_2011_HASTA_EL_2019..xls	02/07/2019
26	B.8 VERIFICABLE JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2011.	CP_2011-1.pdf	02/07/2019
27	B.9 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2012.	CP_2012.pdf	02/07/2019
28	BB. 1 VERIFICABLES ACTA MICROEMPRESA ECUAVIAS- VIA PUERTO AZUL-SEPT-2021	ACTA_ECUAVIAS-PUERTO_AZUL-PEAJE-2021.pdf	28/10/2021
29	BB. 2 VERIFICABLE MICROEMPRESA SAUCES-VIA PUNTILLA -LA AURORA-PUENTE VR- SEPT2021	ACTA_SAUCES-PUNTILLA-AURORA-PUENTES-2021.pdf	28/10/2021
30	BB. 3 VERIFICABLE MICROEMPRESA EL ROBLE-VIA EMPALME- PICHINCHA	EMPALME-PICHINCHA-2021.pdf	28/10/2021
31	BB. 4 VERIFICABLE MICROEMPRESA SA ISIDRO- VIA PEAJE-CRISTAL-SEPT 2021.	PEAJE-CRISTAL-2021.pdf	28/10/2021
32	BB. 5 VERIFICABLE MICROEMPRESA TRABAJADORES DEL PROGRESO- VIA PROGRESO-CRISTAL-2021.	PROGRESO-CRISTAL-2021.pdf	28/10/2021
33	BB. 6 VERIFICABLE MICROEMPRESA CONSERVACION VIAL-PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL-SEPT 2021.	PUENTES_DE_LA_UNIDAD_NACIONAL-2021.pdf	28/10/2021
34	BB. 7 VERIFICABLE MICROEMPRESA TRACTOVIAL- VIA SALITRE-VERNAZA-3 MARIAS-SPT 2021.	TRACTOVIAL-signed-signed.pdf	28/10/2021
35	BB. 8 VERIFICABLE CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2021	ced._pres._mto._vial_guayas_octubre21.pdf	04/11/2021
36	BB.9 DOCUMENTOS DE CORRECCION DE INDICADOR -OCTUBRE 2021	QUIPUX_DE_CORRECCION_DE_INDICADOR_MANTENIMIENTO_OCTUBRE_2021.pdf	02/07/2021
37	C.1 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2013.	CP_2013.pdf	02/07/2019
38	C.2 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2014.	CP_2014.pdf	02/07/2019
39	C.3 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2015.	CP_2015_PROGRAMA_25_Y_56.pdf	02/07/2019
40	C.4 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2016.	CP_2016.pdf	02/07/2019
41	C.5 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2017.	CP_2017.pdf	02/07/2019
42	C.6 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2018.	CP_2018.pdf	02/07/2019
43	C.7 JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2019.	CP_2019.pdf	02/07/2019
44	C.8 JUNIO 2019-DICTAMEN DE PRIORIDAD-MANTENIMIENTO VÍAS GUAYAS..	dictamen_de_prioridad_mant._guayas.pdf	02/07/2019
45	C.9 JUNIO 2019-INFORME DE MANTENIMIENTO VIAL-ACTUALIZACIÓN A MARZO 2017.	INFORMEINVERSIENMANTENIMIENTOVIALDELA PROVINCIA DEL GUAYAS ACTUALIZACION_A_MARZO_2017..pdf	02/07/2019
46	C.C.9 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2022	ced._pres._mto._vial_guayas_mayo2022.pdf	03/06/2022
47	C.C6. VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2022	ced._pres._mto._vial_guayas_feb2022.pdf	04/03/2022
48	C.C7 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2022	ced._pres._mto._vial_provincia_del_guayas_mar2022_(1).pdf	04/04/2022
49	C.C8 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2022.	ced._pres._mto._vial_guayas_abr2022.pdf	03/05/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
50	CC 3.- CÉDULA PRESUPUESTARIA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	ced._pres._mto._vial_guayas_nov2021.pdf	02/12/2021
51	CC 4 CEDULA PRESUPUESTARIA DE DICIEMBRE 2021	ced._pres._mto._vial_guayas_DICIEMBRE_2021.pdf	23/12/2021
52	CC1 .- ACCION DE RIESGOS-CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS 2021.	MTOP-SUBZ5-2021-2253-ME_ACCION_DE_RIESGOS_-2021-GESTION_DE_NECESIDAD_DE_CONTRATACION_DE_MICROEMPRESAS..pdf	01/12/2021
53	CC2.- ACCIONES DE RIESGOS-SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS 2021.	MTOP-SUBZ5-2021-2840-ME-ACCIONES_DE_SOLICITUD_DE_CONTRATACION_DE_MICROEMPRESAS_-OCTUBRE_2021-ACCIONES_DE_RIEGOS..pdf	01/12/2021
54	CC5 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2022	ced._pres._al_31.01.2022.pdf	02/02/2022
55	D.1 JUNIO 2019-CONTRATO VÍA SALITRE-VERNAZA.	Contrato_Salitre_-_Vernaza-2019..pdf	04/07/2019
56	D.2 JUNIO 2019-CONTRATO-VÍA PALESTINA-MACUL.	GestionReporteRH-CONTRATO-PALESTINA_-MACUL-2019..pdf	04/07/2019
57	D.3 JUNIO 2019-CONTRATO-PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL.	GestionReporteRH-CONTRATO-PUENTES_DE_LA_UNIDAD_NACIONAL-2019..pdf	04/07/2019
58	D.4 JUNIO 2019-CONTRATO-VÍA LA PUNTILLA.	GestionReporteRH-CONTRATO-VIA_LA_PUNTILLA_2019..pdf	04/07/2019
59	D.5 JUNIO 2019-CONTRATO VÍA NARANJAL RIO 7.	contrato_protocolizado_naranjal_rio_siete.pdf	04/07/2019
60	D.6 JULIO-2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-ENERO-2019	MTTOGUAYASENERO19.pdf	02/08/2019
61	D.7 JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA - FEBRERO-2019.	MTTOGUAYASFEBRERO19.pdf	02/08/2019
62	D.8 JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-MARZO-2019.	MTTOGUAYASMARZO19.pdf	02/08/2019
63	D.9 JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-ABRIL-2019.	MTTOGUAYASABRIL19.pdf	02/08/2019
64	DD 8 .- VERIFICABLE-CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESA-EL TRIUNFO	vias_guayas_-_el_triunfo-13-06-22.pdf	03/06/2022
65	DD1 VERIFICABLE CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS-ECUAVIAS	ecuavias0501255001653514354-6-05-22.pdf	03/06/2022
66	DD2.- VERIFICABLE CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS-EL ROBLE	el_roble0167535001653514355-6-05-22.pdf	03/06/2022
67	DD3.- VERIFICABLE -CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESA-SAUCE	los_sauces0709681001653514355-10-05-22.pdf	03/06/2022
68	DD4.- VERIFICABLE CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESA-TRACTO VIAL	tracto_vial-6-5-22.pdf	03/06/2022
69	DD5.- VERIFICABLE-CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS-UNIDAD NACIONAL	unidad_nacional0391404001653588532-23-5-22.pdf	03/06/2022
70	DD6.- VERIFICABLE-CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESA-VERDE VIA	verde_via-13-5-22.pdf	03/06/2022
71	DD7.- VERIFICABLE-CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESA-EL EMPALME	vias_guayas_-_el_empalme-23-5-22.pdf	03/06/2022
72	DD8.- VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE JUNIO 2022	ced._pres._mto_vial_guayas_junio2022_(1).pdf	05/07/2022
73	DD9 VERIFICABLE CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS 2022	MICROEMPRESAS_2022-DATOS_DE_TECNICOS-ING_VEINTIMILLA.xlsx	05/07/2022
74	E.1 JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-MAYO-2019.	MTTOGUAYASMAYO19.pdf	02/08/2019
75	E.2 JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-JUNIO-2019.	MTTOGUAYASJUNIO19.pdf	02/08/2019
76	E.3 JULIO 2019-CEDULA PRESUPUESTARIA-JULIO-2019.	MTTOGUAYASJULIO19.pdf	02/08/2019
77	E.4 JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA JULIO-998	MTTO_GUAYAS_JUL19_998.pdf	05/08/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
78	E.5 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019-INCL. MICROEMPRESAS.	Copia_de_INFORMACION_DE_MICROEMPRESAS_AGOSTO-CAMPAMENTO.xls	08/09/2019
79	E.6 CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019.	CEDULA_PRESUPUESTARIA-MANTENIMIEMNTO_VIAS_GUAYAS-AGOSTO_2019..pdf	04/09/2019
80	E.7 CÉDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE -2019	MTTOGUAYASSEPT19-CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	04/10/2019
81	E.8 CÉDULA PRESUPUESTARIA 998-SEPTIEMBRE 2019.	MTTO_GUAYAS_SEPT19_998-CEDULA_PRESUPUESTARIA-998-SEPTIEMBRE_2019.pdf	04/10/2019
82	E.9 INFORME DE LAS MICROEMPRESAS-SEPTIEMBRE 2019.	INFORMACION_DE_MICROEMPRESAS_SEPTIEMBRE-CAMPAMENTO.xls	04/10/2019
83	EE 2,. VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2022	ced._pres._mto_vial_prov.guayas_julio2022.pdf	04/08/2022
84	EE1.- VERIFICABLE INDICADOR SEGUNDO TRIMESTRE 2022	ABRIL-JUNIO-2022-MANTENIMIENTO_VIAL_GUAYAS-signed.pdf	05/07/2022
85	F.1 CÉDULA PRESUPUESTARIA-OCTUBRE 2019	MTTO_GUAYAS_OCT19-CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	05/11/2019
86	F.2 CED PRESU NOV 2019	MTTO_GUAYAS_NOV19.pdf	12/12/2019
87	F.3 CÉDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2011	ENERO2011.pdf	05/12/2019
88	F.4 INFORMACIÓN DE GASTOS EN SIPEIP-NOVIEMBRE 2019.	DATOS_SIPEIP-NOVIEMBRE_2019.docx	21/11/2019
89	F.5 CÉDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2011	OCT2011.pdf	05/12/2019
90	F.6 CÉDULA PRESUPUESTARIA NOV 2011	NOV_2011.pdf	05/12/2019
91	F.7 CÉDULA PRESUPUESTARIA DIC 2011	DIC2011.pdf	05/12/2019
92	F.8 CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2011	FEB_2011.pdf	05/12/2019
93	F.9 CÉDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2011	MZO2011.pdf	05/12/2019
94	G.1 CÉDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2011	ABRL2011.pdf	05/12/2019
95	G.2 CÉDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2011	MYO2011.pdf	05/12/2019
96	G.3 CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2011	JN2011.pdf	05/12/2019
97	G.4 CÉDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2011	JL2011.pdf	05/12/2019
98	G.5 CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2011	AGOST2011.pdf	05/12/2019
99	G.6 CÉDULA PRESUPUESTARIA SEPT 2019	SEPTIEMBRE2011.pdf	05/12/2019
100	G.7 CÉDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2012	enero.pdf	05/12/2019
101	G.8 CÉDULA PRESUPUESTARIA NOV 2012	nov.pdf	05/12/2019
102	G.9 CÉDULA PRESUPUESTARIA OCT 2012	oct.pdf	05/12/2019
103	H.1 CÉDULA PRESUPUESTARIA DIC 2012	dic.pdf	05/12/2019
104	H.2 CÉDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2013	enero.pdf	05/12/2019
105	H.3 CED PRES OCT 2013	oct.pdf	05/12/2019
106	H.4 CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2012	ago.pdf	05/12/2019
107	H.5 CÉDULA PRESUPUESTARIA FEB 2012	febrero.pdf	05/12/2019
108	H.6 CÉDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2012	marzo.pdf	05/12/2019
109	H.7 CÉDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2012	abril.pdf	05/12/2019
110	H.8 CÉDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2012	nayo.pdf	05/12/2019
111	H.9 CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2012	junio.pdf	05/12/2019
112	I.1 CÉDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2012	julio.pdf	05/12/2019
113	I.2 CÉDULA PRESUPUESTARIA SEPT 2012	sept.pdf	05/12/2019
114	I.3 CED PRES NOV 2013	nov.pdf	05/12/2019
115	I.4 CED PRES DIC 2013	dic.pdf	05/12/2019
116	I.5 CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2013	febrero.pdf	05/12/2019
117	I.6 CÉDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2013	marzo.pdf	05/12/2019
118	I.7 CÉDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2013	abril.pdf	05/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
119	I.8 CÉDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2013	mayo.pdf	05/12/2019
120	I.9 CED PRESUP JUNIO 2013	junio.pdf	05/12/2019
121	J.1 CED PRES AGOSTO 2013	agosto.pdf	05/12/2019
122	J.2 CED PRES JULIO 2013	julio.pdf	05/12/2019
123	J.3 CED PRES ENERO 2014	enero2014.pdf	05/12/2019
124	J.4 CED PRES SEPT 2013	sept.pdf	05/12/2019
125	J.5 CED PRES OCT 2014	oct2014.pdf	05/12/2019
126	J.6 CED PRES NOV 2014	nov2014.pdf	05/12/2019
127	J.7 CED PRES OCT 2015	oct2015.pdf	12/12/2019
128	J.8 CED PRES DIC 2014	dic2014.pdf	05/12/2019
129	J.9 CED PRES FEB 2014	feb2014.pdf	05/12/2019
130	K.1 CED PRES MAR 2014	mzo2014.pdf	05/12/2019
131	K.2 CED PRES ABRIL 2014	abril.pdf	05/12/2019
132	K.3 CED PRES MAYO 2014	mayo2014.pdf	05/12/2019
133	K.4 CED PRES JUNIO 2014	junio2014.pdf	05/12/2019
134	K.5 CED PRES JULIO 2014	julio2014.pdf	05/12/2019
135	K.6 CED PRES AGOSTO 2014	agosto2014.pdf	05/12/2019
136	K.7 CED PRES SEPT 2014	sept2014.pdf	05/12/2019
137	K.8 CED PRES ENE 2017	enero17.pdf	12/12/2019
138	K.9 CED PRES NOV 2019	nov2015.pdf	12/12/2019
139	L.1 CED PRES DIC 2015	dic2015.pdf	12/12/2019
140	L.2 CED PRES ENERO 2015	enero2015.pdf	05/12/2019
141	L.3 CED PRES SEPT 2015	sept2015.pdf	12/12/2019
142	L.4 CED PRES FEBR 2015	feb2015.pdf	05/12/2019
143	L.5 CED PRES MARZO 2015	marzo.pdf	12/12/2019
144	L.6 CED PRE MAYO 2016	myo16.pdf	12/12/2019
145	L.7 CED PRES ABRIL 2015	abril2015.pdf	12/12/2019
146	L.8 CED PRES JUNIO 2016	jn16.pdf	12/12/2019
147	L.9 CED PRES MAYO 2015	mayo2015.pdf	12/12/2019
148	M.1 CED PRES JUNIO 2015	junio2015.pdf	12/12/2019
149	M.2 CED PRES JULIO 2015	julio2015.pdf	12/12/2019
150	M.3 CED PRES AGOST 2016	ago2016.pdf	12/12/2019
151	M.4 CED PRES AGOST 2015	ago2015.pdf	12/12/2019
152	M.5 CED PRES SEPT 2016	sept2016.pdf	12/12/2019
153	M.6 CED PRES ENE 2016	enero16.pdf	12/12/2019
154	M.7 CED PRES OCT 2016	oct16.pdf	12/12/2019
155	M.8 CED PRES OCT 2017	oct17.pdf	12/12/2019
156	M.9 CED PRES NOV 2016	nov.pdf	12/12/2019
157	N.1 CED PRES NOV 2019	nov.pdf	12/12/2019
158	N.2 CED PRES DIC 2016	dic16.pdf	12/12/2019
159	N.3 CED PRES FEB 2016	feb16.pdf	12/12/2019
160	N.4 CED PRES MAR 2016	mzo16.pdf	12/12/2019
161	N.5 CED PRE abril 2016	abr16.pdf	12/12/2019
162	N.6 CED PRES JULIO 2016	jl16.pdf	12/12/2019
163	N.7 CED PRES ENERO 2017	enero17.pdf	12/12/2019
164	N.8 CED PRES NOV 2017	nov17.pdf	12/12/2019
165	N.9 CED PRES DIC 2017	dic17.pdf	12/12/2019
166	O.1 CED PRES FEB 2017	feb17.pdf	12/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
167	O.2 CED PRES MARZ 2017	mzo17.pdf	12/12/2019
168	O.3 CED PRES ABRIL 2017	abril17.pdf	12/12/2019
169	O.4 CED PRES MAYO 2017	mayo17.pdf	12/12/2019
170	O.5 CED PRES JUNIO 207	junio17.pdf	12/12/2019
171	O.6 CED PRES JULIO 2017	julio17.pdf	12/12/2019
172	O.7 CED PRES AGOSTO 2017	ago17.pdf	12/12/2019
173	O.8 CED PRES SEPT 2017	sept17.pdf	12/12/2019
174	O.9 CED PRES ABRIL 2018	abril2018.pdf	12/12/2019
175	P.1 CED PRES MAYO 2018	mayo2018.pdf	12/12/2019
176	P.2 CED PRES JUNIO 2018	jn2018.pdf	12/12/2019
177	P.3 CED PRES JULIO 2018	jl18.pdf	12/12/2019
178	P.4 CED PRES AGOST 2018	ago2018.pdf	12/12/2019
179	P.5 CED PRES SEPT 2018	sep2018.pdf	12/12/2019
180	P.6 CED PRES ENER 2018	enero2018.pdf	12/12/2019
181	P.7 CED PRES OCT 2018	oct2018.pdf	12/12/2019
182	P.8 CED PRES NOV 2018	nov2018.pdf	12/12/2019
183	P.9 CED PRES DIC 2018	dic2018.pdf	12/12/2019
184	Q.1 CED PRE FEBR 2018	feb2018.pdf	12/12/2019
185	Q.2 CED PRES MARZO 2018	mzo2018.pdf	12/12/2019
186	Q.3 CÉDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2020	CED._PRES._AL_31.01.2020_MTTO._VIAL_GUAYAS-ENERO.pdf	31/01/2020
187	Q.4 CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2020	CED.PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_FEB-2020.pdf	04/03/2020
188	Q.5 PROYECTO SENPLADES	2019-07-22_05-08-30_DICTAMENPRIORIDADPROYECTOMANTENIMIENTO VIAL 2020	19/03/2020
189	Q.6 CONTRATO DE GALIBU DE PROGRESO-PRIMERA PARTE	GestionReporteRH-CONTRATO_DEL_GALIBU_DE_PROGRESO.pdf	20/03/2020
190	Q.7 CONTRATO DE GALIBU DE PROGRESO.	GestionReporteRH-CONTRATO_DEL_GALIBU_DE_PROGRESO_-SEGUNDA_PARTE_.pdf	20/03/2020
191	Q.8 FICHA SIPeIP (COSTO TOTAL DEL PROYECTO)	Ficha_Proyecto-MANTENIMIENTO_VIAL-2020.pdf	20/03/2020
192	Q.9 ACTA DEFINITIVA NARANJAL RIO SIETE-2020	ACTA_DEFINITIVA_DEL_PROYECTO_NARANJAL-RIO_SIETE-2020.pdf	25/03/2020
193	R.1 MARCO LOGICO MANTENIMIENTO VIAL GUAYAS-2020	ML_GUAYAS_1-MANTENIMIENTO_-GUAYAS_2020.JPG	27/03/2020
194	R.2 MARCO LÓGICO MANTENIMIENTO VIAL GUAYAS 2020-2	ML_GUAYAS_2-MANTN-GUAYAS_2020.JPG	27/03/2020
195	R.3 MARCO LOGICO MANTENIMIENTO VIAL GUAAYAS 2020-3	ML_GUAYAS_3-MANTN-GUAYAS-2020.JPG	27/03/2020
196	R.4 MARCO LÓGICO MANTENIMIENTO VIAL GUAYAS 2020-4	ML_GUAYAS_4-MARCO_LOGICO_MANTEN-_GUAYAS.JPG	27/03/2020
197	R.5 CEDULA PRESUPUESTARIA DE MARZO 2020	CP_MANTENIMIENTO_VIAL-MARZO_2020.pdf	02/04/2020
198	R.6 CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2020	CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2020-MANTENIMIENTO_VIAL_GUAYAS.pdf	03/05/2020
199	R.7 CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2020	CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_MAY2020.pdf	03/06/2020
200	R.8 REPROGRAMACION DEL POA 2020	MTOP-DDG-2020-655-ME-REPROGRAMACION_DEL_POA-_2020.pdf	03/06/2020
201	R.9 CEEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2020	CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_JUN2020.pdf	02/07/2020
202	S.1 CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2020	CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_JUN2020.pdf	02/07/2020
203	S.2 MEMORANDUM DE REPROGRAMACION DE HITOS 2020	Hitos_de_proyectos_GPR_mantenimiento_vial_GUAYAS-CORREGIDO-QUITO.xls	03/08/2020
204	S.3 CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2020.	CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_JUL2020.pdf	03/08/2020
205	S.4 INSISTENCIA EN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN MANTENIMIENTO VIAL	MTOP-DDG-2020-872-ME-INSISTENCIA_DEL_DIRECTOR_SOLICITANDO_RECURSOS.pdf	13/08/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
206	S.5 INSISTENCIA EN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN MANTENIMIENTO VIAL AGOSTO 2020	MTOP-DDG-2020-1155-ME-INSISTENCIA_DEL_DIRECTOR_SOLICITANDO_RECURSOS-AGOSTO_2020..pdf	13/08/2020
207	S.6 GESTIÓN DE RIESGO-5 DE JULIO DEL 2020	DOCUMENTO_ZIMBRA-SOLITUD_PARA_GESTION_DE_RIESGO-5_DE_JULIO_DEL_2020.docx	01/09/2020
208	S.7 CEDULA DE AGOSTO 2020	CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_AGO2020.pdf	02/09/2020
209	S.8 CÉDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2020	CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_SEPT2020.pdf	04/10/2020
210	S.9 RESPALDO RIESGO TRIM-JUL-SEPT	MTOP-DDG-2020-1387-ME.pdf-SOLICITUD_DE_AVAL.pdf	08/10/2020
211	T.1 RIESGO TRIM-JUL-SEPT	MTOP-DDG-2020-1441-ME.pdf-JUSTIFICACION_DE_SALDOS_DISPONIBLES.pdf	08/10/2020
212	T.2 INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPT-2020	INFORME_DEL_TRIMESTRE_JULIO-SEPTIEMBRE-2020-MANTENIMIENTO_VIAL._(1)-signed.pdf	20/10/2020
213	T.3 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE OCTUBRE 2020	CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_OCT2020.pdf	05/11/2020
214	T.4 RESPALDO RIESGO OCT-DIC- ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESA 2020-ECUAVIAS	ASOCIACION_ECUAVIAS-signed-signed-signed.pdf	05/11/2020
215	T.5 RESPALDO RIESGO OCT-DIC - ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS-LOS SAUCES	ASOCIACION_LOS_SAUCES-signed-signed-signed.pdf	05/11/2020
216	T.6 RESPALDO RIESGO OCT-DIC- ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESA SAN ISIDRO	ASOCIACION_SAN_ISIDRO-signed-signed-signed.pdf	05/11/2020
217	T.7 RESPALDO RIESGO OCT-DIC- ORDEN DE COMPRA- TRABAJADORES DEL PROGRESOS	ASOCIACION_TRAB_DEL_PROGRESO-signed-signed-signed.pdf	05/11/2020
218	T.8 RESPALDO RIESGO OCT-DIC- ORDEN DE COMPRA DE MICROEMPRESAS TRACTO VIAL GUAYAS	ASOCIACION_TRACTO_VIAL_GUAYAS-signed-signed-signed.pdf	05/11/2020
219	T.9 RESPALDO RIESGO OCT-DIC-ORDEN DE COMPRA DE MICROEMPRESA-UNIDAD NACIONAL	ASOCIACION_UNIDAD_NACIONAL-signed-signed-signed.pdf	05/11/2020
220	U.1 RESPALDO RIESGO OCT-DIC- ORDEN DE COMPRA MICROEMPRES-VIAS GUAYAS	ASOCIACION_VIAS_GUAYAS-signed-signed-signed.pdf	05/11/2020
221	U.2 RESPALDO RIESGO OCT-DIC- DATOS DE MICROEMPRESAS 2020	MICROEMPRESAS-DATOS.xls	05/11/2020
222	U.3 CEDULA PRESUPUESTARIA-NOVI-2020-MANTENIMIENTO VIAL.	R2020-12-01_14-03-42-cedula_noviembre_2020-mantenimiento_vial.pdf	02/12/2020
223	U.4 INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE-2020.	INFORME_TRIMESTRAL_OCTUBRE-DICIEMBRE_2020-signed-2-1.txt	04/02/2021
224	U.5 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2021	CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_ENERO2021.pdf	02/03/2021
225	U.6 CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2021	CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_FEBRERO2021.pdf	02/03/2021
226	U.6 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2021	CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_FEBRERO2021.pdf	02/03/2021
227	U.7 VERIFICABLE CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2021	CED._PRES._MTTO_VIAL_GUAYAS_MAR2021.pdf	01/04/2021
228	U.8 INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2021	INFORME_DE_GPR-ENERO-MARZO-signed.pdf	01/04/2021
229	U.9. MEMORANDUM DE APROBACION DE HITOS 2021 -MANTENIMIENTO VIAL GUAYAS	MTOP-CGP-2021-435-ME_(1)-APROBACION_DE_HITO_2021-29_DE_ABRIL_2021.pdf	02/05/2021
230	V.1 MATRIZ DE APROBACIÓN DE HITOS ABRIL 2021	Hitos_de_proyectos_GPR_mantenimiento_vial_GUAYAS-ABRIL-2021.pdf	02/05/2021
231	V.2 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2021	CED._PRES._MTTO_VIAL_PROV._GUAYAS_ABRIL2021.pdf	03/05/2021
232	V.3 VERIFICABLE DE CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS-31 DE MARZO DEL 2021	MTOP-DDG-2021-681-ME-VERIFICABLE_PETICION_DE_RECURSOS_PARA_MICROEMPRESAS_31_DE_MARZO_D	03/05/2021
233	V.4 VERIFICABLE DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS-SUBSECRETARIA ZONAL 5	MTOP-SUBZ5-2021-789-ME-VERIFICABLE_DE_LA_SUBSECRETARIA-GESTION_DE_CONTRATACION_DE_MICROEMPRESAS_2021.pdf	03/05/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
234	V.5 VERIFICABLE DE GESTION DE CONTRATACION DE MICROEMPRESAS-DIRECCION GUAYAS-23 DE ABRIL DEL 2021	MTOP-DDG-2021-681-ME-VERIFICABLE_PETICION_DE_RECURSOS_PARA_MICROEMPRESAS_23_DE_ABRIL_DE	03/05/2021
235	V.6 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS ECUAVIAS	ORDEN_ECUAVIAS-signed-signed-signed.pdf	02/06/2021
236	V.7 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS ROBLE	ORDEN_EL_ROBLE-signed-signed-signed.pdf	02/06/2021
237	V.8 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS FORTALEZA	ORDEN_LA_FORTALEZA-signed-signed-signed.pdf	02/06/2021
238	V.9 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS SAUCES	ORDEN_LOS_SAUCES-signed-signed-signed.pdf	02/06/2021
239	W. 9 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2021	CED._PRES._MTTO._VIAL_GUAYAS_JUNIO_2021.pdf	02/07/2021
240	W.2 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS TRABAJADORES DEL PROGRESO	ORDEN_TRABAJADORES_DEL_PROGRESO-signed-signed-signed.pdf	02/06/2021
241	W.3 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS TRACTOVIAL	ORDEN_TRACTO_VIAL_GUAYAS-signed-signed-signed.pdf	02/06/2021
242	W.4 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS UNIDAD NACIONAL	ORDEN_UNIDAD_NACIONAL-signed-signed-signed.pdf	02/06/2021
243	W.5 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS GUAYAS	ORDEN_VIAS_GUAYAS_1-signed-signed-signed.pdf	02/06/2021
244	W.6 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS GUAYAS-2	ORDEN_VIAS_GUAYAS_2-signed-signed-signed.pdf	02/06/2021
245	W.7 VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2021	CED._PRES._MTTO._VIAL_GUAYAS_MAY2021.pdf	02/06/2021
246	W.8 DESIGNACIÓN DE TÉCNICOS PARA LA SUPERVISIÓN DE MICROEMPRESAS 2021	MTOP-DDG-2021-1103-ME-contratacion_de_microempresas_2021.pdf	06/06/2021
247	W9. VERIFICABLE CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2021	ced._pres._mto._vial_guayas_agosto_2021.pdf	03/09/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Berrezueta Velez, Gustavo David	Director Distrital del Guayas	Director/a Distrital del Guayas	gberrezueta@mtop.gob.ec	
Rocohano Granados, Maritza Alexandra	Lider GPR	Experto de Infraestructura Provincial	mrocohan@mtop.gob.ec	
Rogel García, Genner Lautaro	Administrador de microempresas	Coordinador Unidad Socio Ambiental Zonal 5	grogel@mtop.gob.ec	023974600
Sanchez Briones, Ghislaine Auxiliadora	Financiero	Asistente Financiero Provincial	gasanchez@mtop.gob.ec	52215
Santamaria Loor, Kiura Ninoska	Subsecretario Regional 5	Subsecretaria de Obras Publicas / Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte, Encargada	ksantamaria@mtop.gob.ec	
Véliz Alcivar, Carlos Alfredo	Supervisor de microempresas	Administrador	cveliz@mtop.gob.ec	0959124214

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
86622_1.jpg	25/03/2020
