

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte**  
**Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte**  
**PROYECTO: K010 MTOP.- Programa Nacional de Conservación de la Red Vial Estatal**

Líder del Proyecto:	Barahona Dos Santos, María Cristina (mbarahona@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Izquierdo Socola, Ismael Alex	Programas Relacionados:	
Titular:	Medina Galarza, César Augusto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.387265	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,115,974.91
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	14/11/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Barahona Dos Santos, María Cristina	Fecha del siguiente Hito:	30/08/2022

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas "MTOP" cuenta con 6.732,72 kilómetros de carreteras que el administra en forma Directa desde las Direcciones Distritales. Mediante este programa se pretende dar mantenimiento a la red vial estatal administrada a fin de que no disminuyan sus niveles de servicio y se garantice la conectividad durante cuatro años fiscales.

**Beneficios Cualitativos**

- Brindar conservación rutinaria evita el deterioro excesivo de las carreteras y la reconstrucción de nuevos sitios críticos.
- Brindar el mantenimiento rutinario evita desgaste de vehículos y previene el aumento del tiempo de traslado de usuarios e insumos entre poblaciones y ciudades.
- Desarrollo y crecimiento del comercio interno y externo.
- Se previene el incremento en el número de accidentes y por ende menor número de muertes y de lesionados causados por daños en infraestructura.
- Mantiene la transitabilidad y conectividad por lo tanto mantener en desarrollo las actividades económicas del sector transporte, así como permite las actividades de comercio de los productos agrícolas del país, fomentando la economía de distintos sectores productivos y generación del turismo.
- Fuentes de trabajo ocasional durante la ejecución del proyecto (especialmente con microempresas)

**Tipo de Beneficiario**

Beneficiarios directos, población, La red vial estatal permite brindar la conectividad a la totalidad de la población ecuatoriana y de acuerdo los datos de INEC al año inicial a implementar el proyecto para el año 2022 la población total es de 18.061.453 habitantes y para el año de fin del proyecto vial es tomada en cuenta la población total como demanda efectiva, en lo cual para el año 2025 es de 18.693.140 habitantes.

Beneficiarios indirectos, población nacional y turistas, para el año 2022 la población total es de 18.061.453 habitantes y para el año de fin del proyecto vial es tomada en cuenta la población total como demanda efectiva, en lo cual para el año 2025 es de 18.693.140 habitantes.


**Restricciones**

TIEMPO: El proyecto durará xx años  
 COSTO: El valor asignado para la ejecución de este proyecto es de \$ xxxxxxxx  
 CALIDAD:  
 La principal restricción del proyecto es en relación al presupuesto, ya que con el monto asignado se intentara mantener los niveles de servicio sin disminución.  
 RECURSOS: personal, tecnologica, material (asfalto, cemento, señales, combustible)  
 RIESGOS: de caracter climatológico, ciertas politicas estatales  
 ALCANCE: EL ALCANCE ES LIMITADO YA QUE NO ESTA CONSIDERADO UN COMPONENTE DE MANTENIMIENTO PERIODICO

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 22.86 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

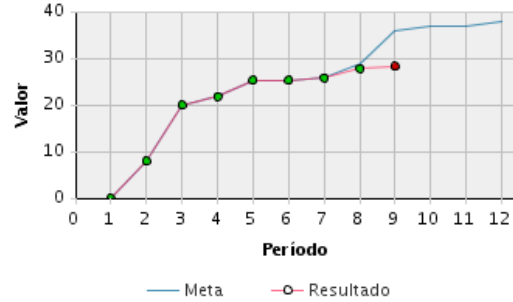

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	0 %	8 %	20 %	22 %	25 %	25 %	26 %	29 %	36 %	37 %	37 %	38 %
	Avance real acumulado											
	0 %	8 %	20 %	22 %	25 %	25 %	26 %	28 %	28 %			
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>Octubre</b></p> <p>Se solicitó información respecto al indicador del programa que corresponde a porcentaje de kilómetros mantenidos por administración directa. Lo que fue respondido mediante memorandos MTOP-SUBZ1-2022-1917-ME, MTOP-SUBZ2-2022-1539-M, MTOP-SUBZ3-2022-2052-ME, MTOP-DPM-GI-CONSV-2022-1660-ME, MTOP-DDSCH-Z4-2022-2074-ME, MTOP-SUBZ5-2022-2777-ME, MTOP-SUBZ6-2022-1608-ME, MTOP-SUBZ7-2022-1979-M, el promedio de lo reportado resulta en 71% considerando que no fue reportado Cotopaxi, Santa Elena y Los Rios. El devengado corresponde a 9.307.785,03 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 46.40%.</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	02/11/2022 - 04:17 PM
<p><b>SEPTIEMBRE:</b></p> <p>Se realizó la gestión ante SNP para el incremento correspondiente a los 5'000.000 solicitados el mes anterior, consolidación del POA y trámites internos y externos para la acreditación del monto. Al momento se ha devengado USD 8'098.640,20. En el mes de septiembre se realizaron actividades de mantenimiento en el 82% de la red vial estatal.</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/10/2022 - 05:52 PM
<p><b>JULIO:</b></p> <p>Se ha contratado las microempresas en las provincias de azuay y cañar, se tiene cubierto el 81.14 % de los kilometros conservados por administracion directa. Se ha devengado 4.231.234.91 USD</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/08/2022 - 02:59 PM
<p><b>MAYO 2022</b></p> <p>1.Se crearon las actividades de "Seguros para maquinaria y patrullas de caminos " y "Seguridad y vigilancia para campamentos " por parte de las autoridades.                  2.Se continua con la contratación de microempresas en otros tramos de la RVE de varias provincias.</p> <p>El devengado a 31 de mayo de 2022 es de 874,382.75</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/06/2022 - 04:46 PM
<p><b>ABRIL 2022</b></p> <p>1.Se contrataron algunas microempresas para algunos tramos de la RVE de varias provincias                  2.Se creo la actividad de "Alquiler de maquinaria" con la finalidad de resolver los deslizamientos en la RVE causados por las fuertes precipitaciones que superaron la capacidad operativa del MTOP</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/06/2022 - 04:44 PM
<p><b>MARZO 2022</b></p> <p>1.Se mantuvo reuniones con la Coordinación de planificación del MTOP y Con la Secretaria Nacional de Planificación, se modifico el documento con la finalidad de absolver ciertas observaciones                  2.Se obtuvo el Dictamen de prioridad con oficio SNP-SPN-2022-0332-OF de 7 de marzo de 2022</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/06/2022 - 04:40 PM

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3. Se elaboro el anexo para inclusión del proyecto en PAI 4. Se asignaron recursos económicos al proyecto		
FEBRERO 2022 1. Se elaboro el Documento Proyecto y sus anexos para postular para obtención del dictamen de Prioridad	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/06/2022 - 04:40 PM

### PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Asignación parcial de presupuesto no permite continuidad de contratos de asociaciones de conservación vial	21/10/2022	María Cristina Barahona Dos Santos	30	40	12	0/1
Asignación parcial de recursos disminuye ejecución	21/10/2022	María Cristina Barahona Dos Santos	20	30	6	0/1
El alcance del Programa se limita al mantenimiento rutinario	21/10/2022	María Cristina Barahona Dos Santos	20	30	6	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 3

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2022		28/02/2022		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	9-Entregables Formales	07/03/2022		07/03/2022		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	9-Entregables Formales	07/03/2022		07/03/2022		Sí	5.0
4	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	5-Entregables Intermedios	23/03/2022		23/03/2022		Sí	2.0
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	5-Entregables Intermedios	30/03/2022		30/03/2022		Sí	3.0
6	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Bolivar	3-Adjudicación	10/04/2022		10/04/2022		Sí	0.2
7	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Los Rios	3-Adjudicación	10/04/2022		10/04/2022		Sí	0.2
8	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	13/04/2022		13/04/2022		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
9	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas El Oro	3-Adjudicación	20/04/2022		20/04/2022		Sí	0.2
10	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Manabi	3-Adjudicación	22/04/2022		22/04/2022		Sí	0.2
11	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Carchi	3-Adjudicación	26/04/2022		26/04/2022		Sí	0.2
12	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Santo Domingo	3-Adjudicación	27/04/2022		27/04/2022		Sí	0.2
13	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Imbabura	3-Adjudicación	29/04/2022		04/04/2022		Sí	0.2
14	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Chimborazo	3-Adjudicación	30/04/2022		25/04/2022		Sí	0.2
15	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Tungurahua	3-Adjudicación	01/05/2022		01/05/2022		Sí	0.2
16	C1.17. EJECUCIÓN: Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion contratados	5-Entregables Intermedios	02/05/2022		02/05/2022		Sí	1.5
17	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Pastaza	3-Adjudicación	03/05/2022		03/05/2022		Sí	0.2
18	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Santa Elena	3-Adjudicación	10/05/2022		10/05/2022		Sí	0.2
19	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Guayas	3-Adjudicación	12/05/2022		12/05/2022		Sí	0.2
20	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Sucumbios	3-Adjudicación	24/05/2022		24/05/2022		Sí	0.02
21	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Loja	3-Adjudicación	30/05/2022		30/05/2022		Sí	0.2
22	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Morona Santiago	3-Adjudicación	30/05/2022		30/05/2022		Sí	0.2
23	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Orellana	3-Adjudicación	30/05/2022		18/05/2022		Sí	0.2
24	C1.18. EJECUCIÓN: Conservacion a traves de	3-Adjudicación	31/05/2022		23/05/2022		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	microempresas Esmeraldas contratadas							
25	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Cotopaxi	3-Adjudicación	31/05/2022		03/05/2022		Sí	0.2
26	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Napo	3-Adjudicación	31/05/2022		20/05/2022		Sí	0.2
27	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Cañar	3-Adjudicación	15/07/2022		15/07/2022		Sí	0.1
28	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Pichincha	3-Adjudicación	15/07/2022		15/07/2022		Sí	0.1
29	C1.19. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Esmeraldas	3-Adjudicación	29/07/2022		29/07/2022		Sí	0.25
30	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Pichincha	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.1
31	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Sucumbios	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.1
32	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Pichincha	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.05
33	C1.13. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Imbabura	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
34	C1.13. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Carchi	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
35	C1.13. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Chimborazo	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
36	C1.13. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cotopaxi	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
37	C1.13. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Esmeraldas	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
38	C1.13. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Orellana	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
39	C1.13. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pichincha	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
40	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santa Elena	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
41	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Sucumbios	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
42	C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Azuay	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.2
43	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Carchi	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.1
44	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Esmeraldas	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.1
45	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Imbabura	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.1
46	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Esmeraldas	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
47	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Imbabura	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
48	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Sucumbios	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
49	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Bolivar	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
50	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos El Oro	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
51	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Guayas	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
52	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Loja	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
53	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Los Rios	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
54	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Manabi	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
55	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Morona Santiago	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
56	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Napo	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
57	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pastaza	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
58	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Tungurahua	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
59	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
60	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Pichincha	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.25
61	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria El Oro	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.25
62	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Loja	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.25
63	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Sucumbios	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.25
64	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.25
65	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
66	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Bolivar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
67	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
68	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
69	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
70	C1.1.1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.1
71	C1.1.1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Guayas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
72	C1.1.1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Loja	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
73	C1.1.1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Los Rios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
74	C1.1.1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Manabi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
75	C1.1.1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
76	C1.1.1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Napo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
77	C1.1.1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
78	C1.1.1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Pastaza	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
79	C1.1.1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Santo Domingo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
80	C1.1.1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
81	C1.1.1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
82	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
83	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Bolívar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
84	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
85	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
86	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
87	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
88	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Guayas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
89	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Loja	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05
90	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Los Rios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
91	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Manabi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
92	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
93	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Napo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
94	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
95	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Pastaza	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
96	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
97	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
98	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
99	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
100	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	maquinaria pesada y patrulla de caminos Azuay							
101	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Bolivar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
102	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Carchi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
103	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
104	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
105	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
106	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
107	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Esmeraldas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
108	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Guayas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
109	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Imbabura	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
110	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Loja	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
111	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Los Rios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
112	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Manabi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
113	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
114	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
115	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	maquinaria pesada y patrulla de caminos Pastaza							
116	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pichincha	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.04
117	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santa Elena	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
118	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santo Domingo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
119	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Sucumbios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
120	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
121	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
122	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
123	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Bolívar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
124	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Carchi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
125	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
126	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
127	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
128	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.04
129	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Esmeraldas	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.04
130	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	maquinaria pesada y patrulla de caminos Guayas							
131	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Imbabura	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
132	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Loja	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
133	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Los Rios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
134	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Manabi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
135	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
136	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Napo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
137	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
138	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pastaza	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
139	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pichincha	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
140	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santa Elena	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
141	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santo Domingo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
142	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Sucumbios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
143	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
144	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
145	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Azuay							
146	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Bolívar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
147	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Carchi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
148	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
149	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
150	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
151	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05
152	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Esmeraldas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
153	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Guayas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
154	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Imbabura	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
155	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Loja	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
156	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Los Rios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
157	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Manabi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
158	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
159	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Napo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
160	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
161	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Pastaza	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
162	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Pichincha	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
163	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Santa Elena	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
164	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Santo Domingo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
165	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Sucumbios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
166	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
167	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
168	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.25
169	C2.I1. EJECUCIÓN: Calibración de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.5
170	C2.I2. EJECUCIÓN: Calibración de equipos DELFECTOMETRIA	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.5
171	C2.I3. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica	5-Entregables Intermedios	31/10/2022	31/10/2022		▼	No	1.0
172	C2.I1. EJECUCIÓN: Medición IRI	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022		●	No	0.5
173	C2.I2. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022		●	No	0.5
174	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores.	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023		●	No	2.0
175	C1.I10. EJECUCIÓN: Contratación Seguros para	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023		●	No	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	maquinaria pesada y patrulla de caminos							
176	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Seguridad y vigilancia de campamentos	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	0.01
177	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	0.75
178	C1.13. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.75
179	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.0
180	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.0
181	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.0
182	C1.17. EJECUCIÓN: Contratación Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.5
183	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	3.0
184	C1.19. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	2.0
185	C2.11. EJECUCIÓN: Calibracion de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL)	4-Inicio de Trabajo	31/12/2023	31/12/2023			No	0.5
186	C2.11. EJECUCIÓN: Medición IRI	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.5
187	C2.12. EJECUCIÓN: Calibracion de equipos DELFECTOMETRIA	4-Inicio de Trabajo	31/12/2023	31/12/2023			No	0.5
188	C2.12. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.5
189	C2.13. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.85
190	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores.	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	2.0
191	C1.110. EJECUCIÓN: Contratación Seguros para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	0.1
192	C1.111. EJECUCIÓN: Contratación Seguridad y vigilancia de campamentos	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	0.1



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
193	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	0.75
194	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.75
195	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.0
196	C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.0
197	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.0
198	C1.I7. EJECUCIÓN: Contratación Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.5
199	C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	3.0
200	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	2.0
201	C2.I1. EJECUCIÓN: Calibracion de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL)	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.5
202	C2.I1. EJECUCIÓN: Medición IRI	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.5
203	C2.I2. EJECUCIÓN: Calibracion de equipos DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.5
204	C2.I2. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.5
205	C2.I3. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.8
206	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores.	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	2.0
207	C1.I10. EJECUCIÓN: Contratación Seguros para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	0.1
208	C1.I11. EJECUCIÓN: Contratación Seguridad y vigilancia de campamentos	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	0.1
209	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	0.75
210	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.75

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	maquinaria pesada y patrulla de caminos							
211	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
212	C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
213	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
214	C1.I7. EJECUCIÓN: Contratación Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.5
215	C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	3.0
216	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	2.0
217	C2.I1. EJECUCIÓN: Calibración de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL)	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5
218	C2.I1. EJECUCIÓN: Medición IRI	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5
219	C2.I2. EJECUCIÓN: Calibración de equipos DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5
220	C2.I2. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5
221	C2.I3. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.2
222	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	2.0
223	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
224	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	2.0
225	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
226	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendietes por liquidar - suscrito MEF	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.5

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
227	CIERRE: Cierre de proyecto según Informe Formato SNP aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
228	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
229	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
230	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,115,974.91 **
Costo Total:	15,002,829.43
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	15,115,974.91	0.00	15,115,974.91
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	15,115,974.91	0.00	15,115,974.91
Ppto. Comprometido	0.00	5,459,541.98	0.00	5,459,541.98
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	15,115,974.91	0.00	15,115,974.91
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	2,228,858.33	0.00	2,228,858.33
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	15,115,974.91	0.00	15,115,974.91
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	615,576.98		615,576.98				
May	1,401,555.29		2,017,132.27				
Jun	2,758,929.04		4,776,061.31				
Jul	2,732,724.74		7,508,786.05				
Ago	2,796,744.03		10,305,530.08				
Sep	1,997,233.27		12,302,763.35				
Oct	1,553,066.67		13,855,830.02				
Nov	733,831.73		14,589,661.75				
Dic	526,313.16		15,115,974.91				
<b>Total</b>	<b>15,115,974.91</b>						

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
19	Incrementar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos en la fase de conservación de los proyectos de infraestructura del transporte MEDIANTE la supervisión de planes, programas y proyectos institucionales para la gestión de conservación en los procesos desconcentrados

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	HITO105_REPUESTOS COTOPAXI	orden_de_compra_repuestos_para_maquinaria0917645001667227012022.rar	08/11/2022
2	HITO110_REPUESTOS LOJA	orden_de_compra_bomba_REPUESTOS_LOJA.pdf	14/11/2022
3	HITO116_REPUESTOS PICHINCHA	13.2_No_DPP-ORD-20220708-0010-neumaticosmini_signed.pdf	08/11/2022
4	HITO11_ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) CARCHI CONTRATADAS	micros.rar	08/11/2022
5	HITO128_LUBRICANTES EL ORO	CONTRATO_LUBRICANTES.pdf	14/11/2022
6	HITO129_LUBRICANTES ESMERALDAS	lubricantes_esmeraldas.rar	08/11/2022
7	HITO13_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) IMBABURA	MICROS_IMBAURA.rar	08/11/2022
8	HITO151_CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO EL ORO	conservacion_maquinaria_y_equipo.rar	14/11/2022
9	HITO1_formato senplades	PNCRVE_07-03-2022.pdf	17/10/2022
10	HITO20_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) SUCUMBOS	MICROS.rar	08/11/2022
11	HITO21_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) LOJA	MICROS_LOJA.rar	14/11/2022
12	HITO24_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) ESMERALDAS	micro_esmeraldas.rar	08/11/2022
13	HITO25_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) COTOPAXI	ordenes_de_compra_microempresas_20220124973001667227012022.rar	08/11/2022
14	HITO28_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) PICHINCHA	16.1_ORDEN_DE_COMPRA_PROVEEDOR_microempresa-signed-signed.pdf	08/11/2022
15	HITO29_ALQUILERMAQUINARIA ESMERALDAS	alquiler_maquinaria_esmeraldas.rar	08/11/2022
16	HITO2_Dictamen de prioridad	SNP-SPN-2022-0332-OF.pdf	17/10/2022

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
17	HITO30_MATERIALES PICHINCHA	35.1_No._DPP-ORD-20220930-0012-cemento_signed.pdf	08/11/2022
18	HITO36_COMBUSTIBLES COTOPAXI	orden_de_compra_combustible_2022039421600166722770314	14/11/2022
19	HITO37_COMBUSTIBLES ESMERALDAS	combustibles_esmeraldas.rar	08/11/2022
20	HITO41_COMBUSTIBLES SUCUMBIOS	COMBUSTIBLES.rar	08/11/2022
21	HITO52_COMBUSTIBLES LOJA	orden_de_compra_combustible_LOJA.pdf	14/11/2022
22	HITO5_ASIGNACION RECURSOS	SNP-SPN-2022-0366-OF_(MTOPI-MTOP-2022-0590-EXT).pdf	14/11/2022
23	HITO61_ALQUILERMAQUINARIA EL ORO	CONTRATO_ALQUILER_DE_MAQUINARIA.pdf	14/11/2022
24	HITO70_MATERIALES EL ORO	materiales.rar	14/11/2022
25	HITO87_SEÑALIZACION EL ORO	NIC-0760026220001-2022-00022_MATERIALES_DE_CONSTRUCCION_y_señalización.pn	14/11/2022
26	HITO89_SEÑALIZACION LOJA	orden_de_compra_delineadores_SEÑALIZACION_LOJA.pdf	14/11/2022
27	HITO9_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) EI ORO	asociaciones_conservacion_el_oro.rar	14/11/2022
28	RIESGO1_ SE MITIGA EL RIESGO CLIMATICO CON EL ALQUILER DE MAQUINARIA SE AJUNTA LA CREACION DE ACTIVIDAD Y CONTRATOS	MITIGACION_RIESGO_1_ALQUILER_DE_MAQUINARIA.rar	14/11/2022
29	RIESGO2_ SE MITIGA EL RIESGO AL HABERSE ASIGNADO LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA	MITIGACION_RIESGO_2_ASIGNACION_RECURSOS.rar	14/11/2022
