

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 3**  
**Dirección Provincial Tungurahua**

**PROYECTO: K017** MTOP - Mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua.

Líder del Proyecto:	Anchaluisa Abril, Alex Moisés (aanchaluisa@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gamboa López, Enma Katherine	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, Provincia - Tungurahua, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Galarza García, Diego Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3799	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,107,007.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	05/09/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Galarza García, Diego Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2018

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Producto: Mantener la red vial estatal provincial en óptimas condiciones de servicio, mediante el mantenimiento vial con la contratación de microempresas y la utilización de maquinaria de la Dirección Provincial de Tungurahua, contratación de obras de mejoramiento, señalización vial que aporten a tener un alto nivel de seguridad.

Contratistas:  
 Asociación de Conservación Vial Ramo de Girasoles  
 Asociación de Conservación Vial Nuevo día

**Beneficios Cualitativos**

El tiempo de desplazamiento se reducirá.  
 El comercio va a mejorar en la provincia.  
 Se va a contar con mayor seguridad vial en las carreteras.  
 Se contribuye con la interconexión provincial y nacional.

**Tipo de Beneficiario**

- Turístico
- Industrial
- Agrícola
- Ganadero


**Restricciones**

La caída de ceniza volcán Tungurahua causa un mantenimiento permanente de calzada y cunetas

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 96.40 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

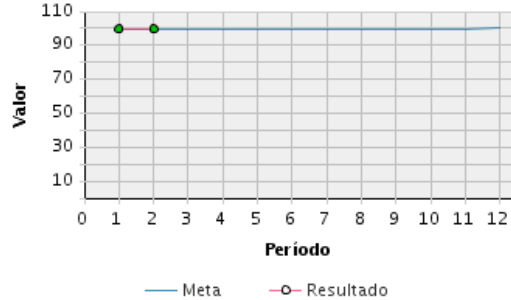

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	100 %	100 %										
	Estado											
	●	●										

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>AGOSTO 2018:</b>                      Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT.</p> <p>Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el quinto mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/09/2018 - 06:48 PM
<p><b>JUNIO 2018:</b>                      Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT.</p> <p>Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el cuarto mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	Galarza García, Diego Fernando	02/08/2018 - 10:00 PM
<p><b>JUNIO 2018:</b>                      Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT.</p> <p>Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el segundo mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/07/2018 - 05:52 PM
<p><b>MAYO 2018:</b>                      Actualmente se encuentran 9 Asociaciones de Conservación Vial, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/06/2018 - 11:34 AM
<p><b>ABRIL 2018:</b>                      1. Se realizó la contratación de microempresas para atender la RVE de Tungurahua en los tramos corrspndientes.                      2. Los trabajos de las asociaciones de Conservación Vial, iniciaron el 2 de abril del 2018.</p>	Galarza García, Diego Fernando	04/05/2018 - 05:19 PM
<p><b>FEBRERO 2018:</b>                      1. Se realizó la contratación de microempresas para atender la RVE de Tungurahua en los tramos corrspndientes.                      2. Lo strabajos iniciaron el 2 de abril del 2018</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/04/2018 - 12:38 PM
<p><b>FEBRERO 2018:</b>                      1. El mantenimiento selo esta realizando con lepersonal del MTOP.                      2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/03/2018 - 07:23 PM
<p><b>ENERO 2018:</b>                      1. El mantenimiento selo esta realizando con lepersonal del MTOP.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/03/2018 - 07:22 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018		
ENERO 2018: 1. El mantenimiento selo esta realizando con lepersonal del MTOP. 2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018	Galarza García, Diego Fernando	28/02/2018 - 05:54 PM
DICIEMBRE 2017: Las microempresas contratadas trabajaron en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), hasta el 29 de Diciembre del 2017.	Galarza García, Diego Fernando	05/01/2018 - 05:09 PM
NOVIEMBRE 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza),.	Galarza García, Diego Fernando	05/12/2017 - 04:31 PM
OCTUBRE 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a traves del catálogo electrónico del portal de compras públicas.	Galarza García, Diego Fernando	01/11/2017 - 01:31 PM
SEPTIEMBRE 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a traves del catálogo electrónico del portal de compras públicas.	Valencia Vasconez, Jairo David	05/10/2017 - 06:40 PM
AGOSTO 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a traves del catálogo electrónico del portal de compras públicas.	Valencia Vasconez, Jairo David	05/09/2017 - 05:23 PM
JULIO 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a traves del catálogo electrónico del portal de compras públicas.	Valencia Vasconez, Jairo David	04/08/2017 - 07:54 PM
JUNIO 2017: Se realizo el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a traves del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017, y actualmente se encuentran trabajando en la red estatal.	Gamboa López, Enma Katherine	05/07/2017 - 04:38 PM
MAYO 2017: Se realizo el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a traves del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017, y actualmente se encuentran trabajando en la red estatal.	Gamboa López, Enma Katherine	05/06/2017 - 04:09 PM
ABRIL 2017: Se realizo el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a traves del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017	Gamboa López, Enma Katherine	05/05/2017 - 10:02 AM
MARZO 2017: Se comenzó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de	Gamboa López, Enma Katherine	05/04/2017 - 06:50 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017.		
<b>FEBRERO 2017:</b> No se han contratado Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que se contrataran por catalogo electrónico del portal de compras publicas, una vez que se cuente con el aval del ministerio de finanzas.	Gamboa López, Enma Katherine	05/03/2017 - 10:18 AM
<b>ENERO 2017:</b> Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas, y concluyeron sus trabajos el 15 de Enero del 2017, actualmente en recepción de los trabajos	Gamboa López, Enma Katherine	06/02/2017 - 10:16 AM
<b>DICIEMBRE 2016:</b> Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas, y concluyen sus trabajos el 15 de Enero del 2017.	Gamboa López, Enma Katherine	04/01/2017 - 06:28 PM
<b>NOVIEMBRE 2016:</b> Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas, y concluyeron sus trabajos el 02 de Noviembre, actualmente en tramite de recepción de trabajos y a la espera de recursos para proceder a contratar mas microempresas	Gamboa López, Enma Katherine	05/12/2016 - 06:55 PM
<b>OCTUBRE 2016:</b> Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	05/11/2016 - 04:30 PM
<b>SEPTIEMBRE 2016:</b> Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	01/10/2016 - 02:23 PM
<b>AGOSTO 2016:</b> Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotalo-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	04/09/2016 - 11:36 AM
<b>JULIO 2016:</b> Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Cahuaji- Pillate Cotalo), mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 01 de Junio del 2016 y rigen hasta el 30 de Junio del 2016, adicional a ello se procedio a realizar la contratación de la misma forma de dos microempresas para el trámo Pelileo- Baños- Limite provincial con Pastaza, misma que rigen hasta finales de Julio del 2016, luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado, el 15 de Julio se procedio a la compra por catalogo electronico de la microempresa Ramo de Girasol, misma que concluye su trabajo el 15 de Agosto del 2016	Moya Medina, Dillon German	03/08/2016 - 04:24 PM
<b>JUNIO 2016:</b> Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Cahuaji- Pillate Cotalo), mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por	Moya Medina, Dillon German	05/07/2016 - 05:51 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
el portal de compras publicas el 01 de Junio del 2016 y rigen hasta el 30 de Junio del 2016, adicional a ello se procedio a realizar la contratación de la misma forma de dos microempresas para el trámite Pelileo- Baños- Limite provincial con Pastaza, misma que rigen hasta finales de Julio del 2016, luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.		
<b>MAYO 2016:</b> Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo)., mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 22 de Abril del 2016 y rigen hasta el 24 de Mayo del 2016 Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.	Moya Medina, Dilon German	05/06/2016 - 05:01 PM
<b>ABRIL 2016:</b> Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo)., mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 22 de Abril del 2016 y rigen hasta el 24 de Mayo del 2016 Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.	Moya Medina, Dilon German	05/05/2016 - 07:35 PM
<b>MARZO 2016:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.	Moya Medina, Dilon German	10/04/2016 - 08:41 PM
<b>FEBRERO 2016:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.	Moya Medina, Dilon German	04/03/2016 - 01:53 PM
<b>ENERO 2016:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.	Moya Medina, Dilon German	11/02/2016 - 04:22 PM
<b>DICIEMBRE 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.	Moya Medina, Dilon German	11/02/2016 - 04:21 PM
<b>NOVIEMBRE 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.		
<b>OCTUBRE 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.	Moya Medina, Dilon German	06/11/2015 - 03:51 PM
<b>SEPTIEMBRE 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.	Moya Medina, Dilon German	06/11/2015 - 03:51 PM
<b>AGOSTO 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.	Moya Medina, Dilon German	09/09/2015 - 03:32 PM
<b>JULIO 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo).	Moya Medina, Dilon German	07/08/2015 - 03:40 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado		
JUNIO 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado	Moya Medina, Dilon German	09/07/2015 - 02:35 PM
MAYO 2015:  Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado  ABRIL 2015:  Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado  Marzo 2015:  Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado	Moya Medina, Dilon German	03/06/2015 - 03:20 PM
DICIEMBRE 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas de coronación, roza a mano, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato, limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo	Valencia Vasconez, Jairo David	07/01/2015 - 04:58 PM
NOVIEMBRE 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas de coronación, roza a mano, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato, limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.	Valencia Vasconez, Jairo David	05/12/2014 - 08:31 AM
AGOSTO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.	Valencia Vasconez, Jairo David	03/09/2014 - 12:16 PM
JULIO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.	Valencia Vasconez, Jairo David	08/08/2014 - 12:05 PM
JUNIO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	09/07/2014 - 05:17 PM
MAYO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	08/07/2014 - 07:41 PM
JUNIO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.		
ABRIL 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas,	Guevara Rodríguez, Luis	30/04/2014 - 03:36 PM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos.		
MARZO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodríguez, Luis	01/04/2014 - 09:13 AM
FEBRERO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodríguez, Luis	05/03/2014 - 03:55 PM
ENERO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodríguez, Luis	06/02/2014 - 09:10 AM
DICIEMBRE 2013: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodríguez, Luis	06/02/2014 - 09:09 AM
Noviembre 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodríguez, Luis	28/11/2013 - 01:45 PM
Octubre 2013: Se trabaja con personal y equipo de la Dirección Provincial de Tungurahua en el mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; se procedio adjudicar los procesos en el portal de compras públicas a dos Asociaciones de Conservación vial para el mantenimiento rutinario del paso lateral de Ambato y del tramo desde el redondel de Terremoto hasta Pelileo. Estos contratos inician el 1 de noviembre de 2013, el plazo es de un año.	Guevara Rodríguez, Luis	05/11/2013 - 02:54 PM
Septiembre 2013: Se trabaja con personal y equipo de la Dirección Provincial de Tungurahua en el mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; se ha elevado al portal de compras públicas dos procesos para contratar Asociaciones de Conservación vial patra el mantenimiento rutinario de el paso lateral de ambato y del tramo desde el redondel de terremoto hasta Pelileo.	Guevara Rodríguez, Luis	05/11/2013 - 02:51 PM
Agosto 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	05/09/2013 - 03:33 PM
Julio 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	07/08/2013 - 08:58 AM
Julio 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	07/08/2013 - 08:58 AM
Mayo 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	04/06/2013 - 05:24 PM
Abril 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a	Proaño Paredes, Marco Antonio	02/05/2013 - 11:55 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo		
Marzo 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	02/05/2013 - 11:55 AM
Febrero 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	06/03/2013 - 03:53 PM
Enero 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	06/03/2013 - 03:52 PM
Diciembre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	06/03/2013 - 03:51 PM
<p>Noviembre 2012:</p> <p>Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos.</p>	Proaño Paredes, Marco Antonio	07/12/2012 - 02:25 PM
<p>Octubre 2012:</p> <p>Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos.</p> <p>Septiembre 2012:</p> <p>Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos en el tramo Redondel de Terremoto Pelileo.</p> <p>Agosto 2012:</p> <p>Se trabaja con personal y Equipo de DPT en la limpieza de cunetas, , limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo. Se ha contratado a través del Portal de Compras Públicas dos Asociaciones de Conservación Vial para em mantenimiento rutinario y atención de emergencias en dos tramos de la Red Vial Estatal. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta vía.</p> <p>Julio 2012:</p> <p>Se trabaja con 2 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo y culmina el contrato el 31 de julio de 2012, actualmente se elaborán los pliegos para la contratación de las microempresas por un año. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta vía.</p> <p>Junio 2012:</p> <p>Se trabaja con 2 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta vía.</p>	Proaño Paredes, Marco Antonio	21/11/2012 - 09:27 AM



## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mayo 2012: Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo: en la carretera Ambato - Guaranda.</p> <p>Abril 2012: Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo: en la carretera Ambato - Guaranda.</p> <p>Marzo 2012: Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Se concluye la señalización de las vías; Paso lateral de Ambato; Redondel de terremoto - Totoras; Totoras - Pelileo Tisaleo-Cevallos-Totoras y Rita Vincés.</p> <p>Febrero 2012: Se trabaja con las microempresas en la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Atención de emergencias. Se contrata señalización para las vías; Paso lateral de Ambato; Redondel de terremoto - Totoras; Totoras - Pelileo Tisaleo-Cevallos-Totoras y Rita Vincés.</p> <p>Enero 2012: Se trabaja con las microempresas en la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Atención de emergencias.</p>		

## PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Temporada Invernal	05/09/2018	Alex Moisés Anchaluisa Abril	50	50	25	0/1

*Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1*

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. * General.</b> Deslaves y derrumbes CAUSARÍA la interrupción y posible destrucción de la vía.	05/09/2018	Alex Moisés Anchaluisa Abril	20 %	10	2	0/1

*Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1*

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2012		31/01/2012		Sí	2.0
2	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2012		29/02/2012		Sí	1.0
3	EJECUCION: Señalización vial de Tungurahua ejecutado.	9-Entregables Formales	15/03/2012		15/03/2012		Sí	1.0
4	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2012		31/03/2012		Sí	1.0
5	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2012		30/04/2012		Sí	1.0
6	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2012		31/05/2012		Sí	1.0
7	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/06/2012		Sí	1.0
8	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2012		30/07/2012		Sí	2.0
9	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2012		31/08/2012		Sí	2.0
10	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	2.0
11	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2012		31/10/2012		Sí	4.0
12	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	4.0
13	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		30/12/2012		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
14	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	2.0
15	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
16	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
17	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
18	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
19	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
20	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	1-Solicitud de Información	30/07/2013		30/07/2013		Sí	2.0
21	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	1-Solicitud de Información	30/08/2013		30/08/2013		Sí	2.0
22	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.0
23	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/10/2013		Sí	2.0
24	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	2.0
25	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		30/12/2013		Sí	2.0
26	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.							
27	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.0
28	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.0
29	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.0
30	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	1.0
31	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.0
32	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.0
33	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	1.0
34	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
35	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	1.0
36	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	1.0
37	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
38	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estatal de Tungurahua ejecutado.							
39	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	2.0
40	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
41	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.0
42	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	1.0
43	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
44	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.0
45	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	1.0
46	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
47	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	1.0
48	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	1.0
49	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
50	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
51	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	1.0
52	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.0
53	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	1.0
54	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	1.0
55	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.0
56	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	1.0
57	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	1.0
58	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	1.0
59	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	1.0
60	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	1.0
61	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
62	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	1.0
63	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	1.0



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.							
64	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	1.0
65	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	1.0
66	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	1.0
67	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	1.0
68	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	1.0
69	EJECUCION: El informe anual respecto al Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua elaborado.	1-Solicitud de Información	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.39
70	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. Fase I	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.3
71	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	1.0
72	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	1.0
73	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	1.0
74	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	1.0
75	Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I	5-Entregables Intermedios	15/03/2018		28/02/2018		Sí	0.1

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
76	Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase II	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018	31/12/2018			No	0.02
77	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	9-Entregables Formales	31/12/2018	31/12/2018			No	0.1
78	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	0.01
79	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	0.01
80	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	0.01
81	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	0.01
82	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	0.01
83	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	0.01
84	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	0.01
85	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	0.01
86	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	0.01

### SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	TRABAJO EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	29/09/2014

### INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de mantenimiento vial tungurahua.		100.00 %	55	55	01/01/2012	Agosto

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,107,007.00 **
Costo Total:	2,396,994.24
Total Devengado:	4,484,655.61
% Costo Total Devengado:	187.09 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 187.09 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,832,389.62	0.00	0.00	1,832,389.62
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	4,040,358.42	2,575,000.00	0.00	6,615,358.42
Ppto. Codificado	3,671,049.49	4,597,574.10	0.00	8,268,623.59
Ppto. Comprometido	3,121,847.41	1,476,183.61	0.00	4,598,031.02
Planeado - Codificado (2018)		-4,597,574.10		
Programado a Devengar	2,541,126.42	0.00	0.00	2,541,126.42
Ppto. Devengado	3,107,007.00	1,377,648.61	0.00	4,484,655.61
Pagado Real	1,739,420.68	428,656.07	0.00	2,168,076.75
Estimado a fin de año	* 3,107,007.00	0.00	0.00	3,107,007.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-565,880.58	0.00	0.00	-565,880.58
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 122.27 %	-	0.00 %	176.48 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

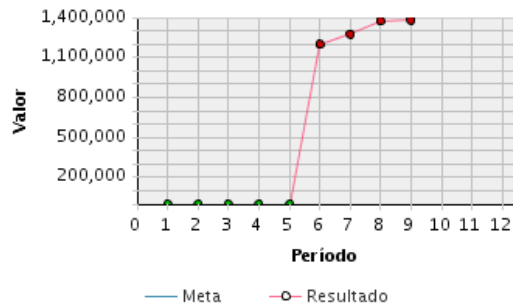

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	100.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	1,196,773.12	0.00	1,196,773.12	115.00 %		115.00 %
Jul	0.00	77,324.23	0.00	1,274,097.35	115.00 %		115.00 %
Ago	0.00	101,051.26	0.00	1,375,148.61	115.00 %		115.00 %
Sep	0.00	2,500.00	0.00	1,377,648.61	115.00 %		115.00 %
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,648.61</b>					

## OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
18	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
19	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1 informe ejecutivo enero	nuevo_dia_enero.pdf	08/01/2014
2	A2 informe ejecutivo enero	girasoles_enero.pdf	08/01/2014
3	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA NUEVO DÍA MAYO 2016	A6.pdf	05/06/2016
4	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2016	A7.pdf	05/06/2016
5	Asociación de Conservación Vial Nuevo Dia Informe Ejecutivo Septiembre	nuevoDia.pdf	10/10/2012
6	Asociación de Conservación Vial Ramo de Girasoles Informe Ejecutivo Septiembre	GIRASOLES.pdf	10/10/2012
7	ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00598.JPG	16/01/2012
8	ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00595.JPG	16/01/2012
9	AYUDA MEMORIA ABRIL 2016	A2.pdf	11/05/2016
10	AYUDA MEMORIA CHAUPI DICIEMBRE 2016	D2.pdf	04/01/2017
11	AYUDA MEMORIA CHAUPI ENERO 2017	D7.pdf	06/02/2017
12	AYUDA MEMORIA CHAUPI FEBRERO 2017	D8.pdf	05/03/2017
13	AYUDA MEMORIA CHAUPI JULIO 2016	B2.pdf	03/08/2016
14	AYUDA MEMORIA CHAUPI JUNIO 2017	F3.pdf	05/07/2017
15	AYUDA MEMORIA CHAUPI MAYO2017	E4.pdf	05/06/2017

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	AYUDA MEMORIA CHAUPI NOVIEMBRE 2016	C8.pdf	05/12/2016
17	AYUDA MEMORIA CHAUPI OCTUBRE 2016	C1.pdf	05/11/2016
18	AYUDA MEMORIA CHAUPI SEPTIEMBRE 2016	B9.pdf	05/10/2016
19	AYUDA MEMORIA NUEVO AMANECER QUISAPINCHA JUNIO 2017	F4.pdf	05/07/2017
20	AYUDA MEMORIA NUEVO AMANECER QUISAPINCHA MAYO 2017	E5.pdf	05/06/2017
21	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA DICIEMBRE 2016	D1_(2).pdf	04/01/2017
22	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA ENERO 2017	D4.pdf	06/02/2017
23	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA FEBRERO 2017	E2.pdf	05/03/2017
24	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JULIO 2016	B1.pdf	03/08/2016
25	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JUNIO 2016	A7.pdf	05/07/2016
26	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JUNIO 2017	F1.pdf	05/07/2017
27	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA MAYO 2016	A5.pdf	05/06/2016
28	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA MAYO 2017	E6.pdf	05/06/2017
29	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA NOVIEMBRE 2016	C7.pdf	05/12/2016
30	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA OCTUBRE 2016	C2.pdf	05/11/2016
31	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA S'PTIEMBRE 2016	B8.pdf	05/10/2016
32	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES ABRIL 2017	RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/05/2017
33	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES AGOSTO 2016	B4.pdf	05/09/2016
34	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES DICIEMBRE 2016	C9.pdf	04/01/2017
35	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES ENERO 2017	D5.pdf	06/02/2017
36	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES FEBRERO 2017	D9.pdf	05/03/2017
37	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JULIO 2016	A9.pdf	03/08/2016
38	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JUNIO 2016	A8.pdf	05/07/2016
39	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JUNIO 2017	F5.pdf	05/07/2017
40	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MARZO 2017	E3.pdf	05/04/2017
41	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2016	A6.pdf	05/06/2016
42	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2017	E7.pdf	05/06/2017
43	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES NOVIEMBRE 2016	C6.pdf	05/12/2016
44	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES OCTUBRE 2016	C4.pdf	05/11/2016
45	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES SEPTIEMBRE 2016	B7.pdf	05/10/2016
46	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO DICIEMBRE 2016	D3.pdf	04/01/2017
47	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO ENERO 2017	D6.pdf	06/02/2017
48	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO FEBRERO 2017	E1.pdf	05/03/2017
49	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO JULIO 2016	B3.pdf	03/08/2016
50	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO JUNIO 2017	F6.pdf	05/07/2017
51	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO MAYO 2017	E8.pdf	05/06/2017
52	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO NOVIEMBRE 2016	C5.pdf	05/12/2016
53	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO OCTUBRE 2016	C3.pdf	05/11/2016
54	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO SEPTIEMBRE 2016	F1.pdf	05/10/2016
55	AYUDA MEMORIA SAHUATO A MAYO 2017	E9.pdf	05/06/2017
56	AYUDA MEMORIA SAHUATO A JUNIO 2017	F2.pdf	05/07/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
57	B1 INFORME EJECUTIVO ENERO 2013	NUEVO_DIA_ENERO.pdf	07/03/2013
58	B2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013	nuevo_dia_febrero.pdf	12/03/2013
59	B3 Informe ejecutivo Abril 2013	PASO_LATERAL_ABRIL.pdf	02/05/2013
60	B4 Informe ejecutivo Abril 2013	TOTORAS-PELILEO.pdf	02/05/2013
61	B5 Informe ejecutivo Mayo 2013	NUEVO_DIA_MAYO.pdf	04/06/2013
62	B6 Informe ejecutivo Mayo 2013	GIRASOLES_MAYO.pdf	04/06/2013
63	B7 INFORME EJECUTIVO JUN 2014 Nuevo día	B7_GestiónReporte_JUN_2014.pdf	10/07/2014
64	B7 INFORME EJECUTIVO JUN 2014 Ramo Girasoles	B7_GestiónReporte_JUN_2014.pdf	10/07/2014
65	BACHEO REALIZADO EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00505.JPG	16/01/2012
66	BACHEO REALIZADO EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00508.JPG	16/01/2012
67	C1 Informe Ejecutivo Enero 2015	InformeEjecutivoEnero2015.pdf	14/04/2015
68	C10_Informe_Ejecutivo_Octubre_2015	C10_Informe_Ejecutivo_Octubre_2015.pdf	06/11/2015
69	C2 Informe Ejecutivo Febrero 2015	InformeEjecutivoFebrero2015.pdf	14/04/2015
70	C6 Informe Ejecutivo JUNIO 2015	Informe_Ejecutivo_JUNIO_2015_.pdf	09/07/2015
71	C7 Informe Ejecutivo JULIO 2015	C7_Informe_Ejecutivo_JULIO_2015.pdf	05/08/2015
72	C7 Informe Ejecutivo JULIO 2015	C8_Informe_Ejecutivo_AGOSTO_2015.pdf	11/09/2015
73	C9 Informe Ejecutivo SEPTIEMBRE 2015	C9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2015.pdf	07/10/2015
74	D02_Informe_Ejecutivo_Febrero_2016	FEBRERO_2016_.pdf	04/03/2016
75	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAN_JOSE.pdf	05/01/2018
76	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_LOS_CAMINANTES.pdf	05/01/2018
77	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_KAUSAY.pdf	05/01/2018
78	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/01/2018
79	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_CHAUPI.pdf	05/01/2018
80	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_NUEVO_AMANECER_QUISAPINCHA.pdf	05/01/2018
81	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_RIO_NEGRO.pdf	05/01/2018
82	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAHUATO.A.pdf	05/01/2018
83	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAN_ANTONIO_DE_COTALO.pdf	05/01/2018
84	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Los_Caminates_2017.PDF	05/12/2017
85	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Nuevo_Amanecer_Quisapincha2017.PDF	05/12/2017
86	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Nuevo_Dia2017.PDF	05/12/2017
87	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Ramo_de_Girasoles_2017.PDF	05/12/2017
88	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Rio_Negro_2017.PDF	05/12/2017
89	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Sahuatoa_2017.PDF	05/12/2017
90	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_San_Antonio_de_Cotalo_2017.PDF	05/12/2017
91	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_San_Jose_2017.PDF	05/12/2017
92	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_NUEVO_DÍA.pdf	05/01/2018
93	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Chaupi_abril_2017.PDF	05/12/2017
94	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Chaupi.PDF	05/11/2017
95	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Nuevo_Dia_.PDF	05/11/2017
96	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Ñukanchik_Kawsay.PDF	05/11/2017



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
97	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Ramo_de_Girasoles.PDF	05/11/2017
98	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Río_Negro.PDF	05/11/2017
99	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Sahuatoa.PDF	05/11/2017
100	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_San_Antonio_de_Cotaló.PDF	05/11/2017
101	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_San_José.PDF	05/11/2017
102	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (CHAUPI)	Acta_entrega_recepcion_Chaupi.pdf	05/04/2018
103	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (LOS CAMINANTES)	Acta_entrega_recepcion_Los_Caminantes.pdf	05/04/2018
104	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (NUEVO AMANECER QUISAPINCHA)	Acta_entrega_recepcion_Nuevo_Amanecer_Quisapincha.pdf	05/04/2018
105	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (NUEVO DIA)	Acta_entrega_recepcion_Nuevo_Dia.pdf	05/04/2018
106	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (Ramo de Girasoles)	Acta_entrega_recepcion_Ramo_de_Girasoles.pdf	05/04/2018
107	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (RIO NEGRO)	Acta_entrega_recepcion__Rio_Negro.pdf	05/04/2018
108	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (SAHUATOA)	Acta_entrega_recepcion_Sahuatoa.pdf	05/04/2018
109	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (San Antonio de Cotalo)	Acta_entrega_recepcion_San_Antonio_de_Cotalo.pdf	05/04/2018
110	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (SAN JOSE)	Acta_entrega_recepcion_San_Jose.pdf	05/04/2018
111	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (Ñukanchik Kawsay)	Acta_entrega_recepcion_Ñukanchik_Kawsay.pdf	05/04/2018
112	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	GestionReporteFN(24).pdf	05/09/2013
113	Informe ejecutivo abril 2014	B3.-_Informe_ejecutivo.pdf	30/04/2014
114	Informe Ejecutivo correspondiente al mes de Julio 2013	IE_RamoGirasoles_Julio_2013.pdf	07/08/2013
115	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	A.1.1.pdf	11/03/2014
116	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013	girasoles_febrero.pdf	12/03/2013
117	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	A.2.1.pdf	11/03/2014
118	Informe Ejecutivo julio 2014	InformeEjecutivo_julio_2014.pdf	01/08/2014
119	INFORME EJECUTIVO JUNIO PASO LATERAL	paso_junio.pdf	08/07/2013
120	Informe ejecutivo marzo 14	A3._Informe_ejecutivo_marzo14.pdf	07/04/2014
121	Informe ejecutivo microempresas abril 2012.	INforme_ejecutivo_micro_abril.pdf	08/06/2012
122	INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESAS ENERO 2012	INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_ENE-2012.pdf	16/03/2012
123	INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESAS FEBRERO 2012	INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_FEB-2012.pdf	16/03/2012
124	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE	conse_novie.pdf	10/12/2012
125	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2	conv_nuev.pdf	10/12/2012
126	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE	informe_octu_gi.pdf	22/11/2012
127	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE NUEVO DIA	informe_octubre_nuevo.pdf	22/11/2012
128	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESTATAL REALIZADO EN EL MES AGOSTOO 2015	PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_AGOSTO_2015_GPR_17109/2015	07/09/2015
129	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESTATAL REALIZADO PARA EN EL MES JULIO 2015.	PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_JULIO_2015_GPR_17109/2015	07/08/2015
130	MICROEMPRESA CHAUPI JULIO 2017	MICRO_CHAUPI_JULIO_201718220.pdf	30/08/2017
131	MICROEMPRESA NUEVO AMANECER JULIO 2017	NUEVO_AMANECER_JULIO_2017_-_18235.pdf	30/08/2017
132	MICROEMPRESA NUEVO DIA JULIO 2017	MICRO_NUEVO_DIA_JULIO_2017_-_17932.pdf	30/08/2017
133	MICROEMPRESA RAMO DE GIRASOLES JULIO 2017	RAMO_DE_GIRASOLES_JULIO_2017_-_18216.pdf	30/08/2017
134	MICROEMPRESA RIO NEGRO JULIO 2017	RIO_NEGRO_JULIO_2017-_18237.pdf	30/08/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
135	MICROEMPRESA SAHUATO A JULIO 2017	SAHUATO A_JULIO_2017_-_18238.pdf	30/08/2017
136	NUEVO DIA JULIO 2017	17932.pdf	04/08/2017
137	ORDEN DE COMPRA NUEVO DIA	A3.pdf	11/05/2016
138	ORDEN DE COMPRA NUEVO DIA	A9.pdf	05/07/2016
139	ORDEN DE COMPRA RAMO DE GIRASOL	A4.pdf	11/05/2016
140	ORDEN DE COMPRA RAMO DE GIRASOLES	B1.pdf	05/07/2016
141	REPORTE ESIGEF JULIO 2016	B6.pdf	05/08/2016
142	REPORTE ESIGEF JUNIO 2016	B5.pdf	05/08/2016
143	REPORTE ESIGEF MAYO 2016	B4.pdf	05/08/2016
144	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 1	SAN_JOSE.pdf	05/10/2017
145	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 10	NUEVO_DIA.pdf	05/10/2017
146	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 2	ÑUKANCHIK_KAWSAY.pdf	05/10/2017
147	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 3	LOS_CAMINANTES.pdf	05/10/2017
148	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 4	COTALO.pdf	05/10/2017
149	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 5	SAHUATO A.pdf	05/10/2017
150	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 6	RIO_NEGRO.pdf	05/10/2017
151	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 8	CHAUPI.pdf	05/10/2017
152	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 9	RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/10/2017
153	T- INFORME EJECUTIVO MES DE AGOSTO RAMO DE GIRASOL	INFORME_EJECUTIVO-planilla_10.GIRASOLES.pdf	01/09/2014
154	T2- INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE MICROEMPRESA RAMO DE GIRASOLES	INF._EJECUTIVO._11.SEPT.girasoles.pdf	06/10/2014
155	T3- microempresa ramo de girasoles, septiembre 2014	INF._EJECUTIVO._11.SEPT.girasoles.pdf	06/10/2014
156	T4- Informe Ejecutivo de la Microempresa del mes de Octubre 2014	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_microempresa_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/10/2014
157	T5- Mantenimiento Vial de la Microempresa Ramo de Girasoles-Noviembre 2014	Noviembre_Microempresas_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/12/2014

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Valencia Vásquez, Jairo David	Director Provincial	Director	jvalencia@mtop.gob.ec	
GAMBOA LÓPEZ, ENMA KATHERINE	Lider técnico	Coordinadora de Infraestructura Provincial (E)	egambo@mtop.gob.ec	0992606859
Paula López, Ricardo Octavio	Subsecretario Regional 3	Subsecretario de Infraestructura del Transporte	rpaula@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
30442_1.jpg	04/09/2016
