

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 4
Dirección Provincial Manabí

PROYECTO: K018 MTOP - Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera Pedernales - San Vicente, corredor Arterial E-15, de 111,08 Km, Incluye Paso Lateral de Canoa

Líder del Proyecto:	Palma Chiquito, Fernando Abrahan (fapalma@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES-SAN VICENTE - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE C, MTOP - RUTA DE SPONDYLUS, Provincia - Manabí, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Macias Fuentes, Alberto Fabrizio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	1752.0000.641.4041	TIR:	1.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	12.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	137,889,823.34
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/11/2008 - 14/11/2018
Fecha de última actualización:	05/11/2018	Fecha de Fin Base:	15/10/2017
Modificado por:	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	Fecha del siguiente Hito:	14/11/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: Proyecto anterior a formato SENPLADES, no se tiene toda la información requerida.

Mantenimiento Pedernales - San Vicente (Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Pedernales - San Vicente, Corredor Arterial E-15, incluye Paso Lateral Canoa), con una longitud total de 111.08 Km., ubicada en la Provincia de Manabí. (Contratista Equitesa).

Este tramo de vía de 111.08 km. de longitud pertenece a la Ruta del Espondylus, en este proyecto se suscribió un contrato complementario en el que además de mejorar el ancho de la vía en varios tramos se contemplaron la construcción de tres puentes nuevos y la reparación y ampliación de 14 puentes.

* Con Memorando No. MTOP-SUBSZ4-12-489-O, del 22 de Agosto de 2012, se aprueba la orden de cambio No. 5 donde amplía el plazo en 4 meses.

Contratista: Equitesa Equipos y Terrenos S.A

Monto Original \$76'517262,51

Beneficios Cualitativos

Mejorar el desplazamiento y comunicación entre los Cantones San Vicente - Jama - Pedernales.

Tipo de Beneficiario

Agricultores
Pescadores
Turistas
y Operadores Turísticos


Restricciones

Tiempo.- Debido a los cambios e incrementos de cantidades para la terminación total de la vía el plazo existente tiene que ser incrementado.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 99.73 %
 Fecha de Inicio: 01/11/2008 Fecha de Fin: 14/11/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre 2018.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2018, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/11/2018 - 11:37 AM
Septiembre 2018.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2018, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	01/10/2018 - 08:02 AM
Agosto 2018.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2018, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/09/2018 - 03:36 PM
Julio 2018.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2018, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	03/08/2018 - 12:06 PM
Junio 2018.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2018, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe absc 74+000.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	06/07/2018 - 08:26 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo 2018.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2018, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	07/06/2018 - 03:55 PM
Abril 2018.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2018, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	09/05/2018 - 09:00 AM
Marzo 2018.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2018, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	09/04/2018 - 09:03 AM
Febrero 2018.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2018, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	13/03/2018 - 09:17 AM
Enero 2018.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2018, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Bacheo Menor, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	08/02/2018 - 07:56 AM
Diciembre 2017.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2017, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Bacheo Menor, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	09/01/2018 - 12:06 PM
Noviembre 2017.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2017, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Bacheo Menor, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	05/12/2017 - 09:30 AM
Octubre 2017.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2017, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	01/11/2017 - 04:29 PM
Septiembre 2017.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2017, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Molina Ormaza, Carlos Ignacio	05/10/2017 - 04:16 PM
Agosto 2017.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2017, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/09/2017 - 04:03 PM
Julio 2017.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2017, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/08/2017 - 02:47 PM
Junio 2017.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2017, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Pita Asan, Arturo Sebastian	07/07/2017 - 08:07 AM
Mayo 2017.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2017, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista	Pita Asan, Arturo Sebastian	05/06/2017 - 04:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.		
Abril 2017.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2017, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/05/2017 - 11:04 AM
Marzo 2017.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2017, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/04/2017 - 02:16 PM
Febrero 2017.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2017, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/03/2017 - 11:24 AM
Enero 2017.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2017, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/02/2017 - 10:03 AM
Diciembre 2016.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2016, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe, Bacheo asfáltico menor, sello de fisuras.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/01/2017 - 10:09 AM
Noviembre 2016.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2016, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe, Bacheo asfáltico menor, sello de fisuras.	Pita Asan, Arturo Sebastian	06/12/2016 - 10:37 AM
Octubre 2016.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2016, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe, Bacheo asfáltico menor, sello de fisuras.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/11/2016 - 10:16 AM
Septiembre 2016.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2016, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe, Bacheo asfáltico menor, sello de fisuras.	Pita Asan, Arturo Sebastian	05/10/2016 - 09:18 AM
Agosto 2016.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2016, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe, Bacheo asfáltico menor.	Pita Asan, Arturo Sebastian	05/09/2016 - 09:28 AM
Julio 2016.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2016, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe, Bacheo asfáltico menor.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/08/2016 - 09:01 AM
Junio 2016.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2016, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe, limpieza de encauzamiento de puentes aguas arriba y aguas abajo. El 16 de Abril de 2016 la Provincia de Manabí fue afectada por un terremoto lo que provocó en algunos sitios la vía fuera afectada. La Cía contratista inmediatamente intervino con las limpiezas de derrumbes de gran magnitud, sellos de fisuras y limpieza de material en la vía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/07/2016 - 10:54 AM
Mayo 2016.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2016, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/06/2016 - 09:44 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe, limpieza de encauzamiento de puentes aguas arriba y aguas abajo. El 16 de Abril de 2016 la Provincia de Manabí fue afectada por un terremoto lo que provocó en algunos sitios la vía fuera afectada. La Cía contratista inmediatamente intervino con las limpiezas de derrumbes de gran magnitud, sellos de fisuras y limpieza de material en la vía.		
Abril 2016.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2016, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe, limpieza de encauzamiento de puentes aguas arriba y aguas abajo. El 16 de Abril de 2016 la Provincia de Manabí fue afectada por un terremoto lo que provocó en algunos sitios la vía fuera afectada. La Cía contratista inmediatamente intervino con las limpiezas de derrumbes de gran magnitud, sellos de fisuras y limpieza de material en la vía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	05/05/2016 - 10:29 AM
Marzo 2016.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2016, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe, limpieza de encauzamiento de puentes aguas arriba y aguas abajo.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/04/2016 - 10:01 AM
Febrero 2016.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2016, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe, limpieza de encauzamiento de puentes aguas arriba y aguas abajo.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/03/2016 - 08:34 AM
Enero 2016.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2015, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano, limpieza de derrumbe y limpieza de encauzamiento.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/02/2016 - 09:16 AM
Diciembre 2015.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2015, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, roza a mano.	Pita Asan, Arturo Sebastian	05/01/2016 - 09:06 AM
Noviembre.- El proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2015, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo con la programación vigente, los trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de encauzamiento, roza a mano y sellado de fisuras.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/12/2015 - 08:57 AM
Este proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2015, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo de acuerdo a la programación vigente trabajos que se ejecutan en el presente mes: Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de encauzamiento, roza a mano.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/11/2015 - 11:02 AM
Septiembre 2015(Alcance): Este proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, y el Hito es Mantenimiento por el año 2015, y de acuerdo a los trabajos que tiene que realizar la Contratista CIA EQUITESA mensualmente lo viene cumpliendo de acuerdo a la programación vigente(Limpieza de cunetas, Limpieza de la Ciclovía, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de encauzamiento, roza a mano).	Pita Asan, Arturo Sebastian	08/10/2015 - 08:12 AM
Septiembre 2015.-La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de encauzamiento, limpieza de alcantarillas, limpieza de espaldones, limpieza de la ciclovía y riego de áreas verdes.	Pita Asan, Arturo Sebastian	05/10/2015 - 09:21 AM
Agosto 2015.-La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de encauzamiento, limpieza de alcantarillas, limpieza de espaldones, limpieza de la ciclovía y riego de áreas verdes.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/09/2015 - 03:19 PM
Julio 2015.-La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de encauzamiento, limpieza de alcantarillas, limpieza de espaldones y limpieza de la ciclovía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/08/2015 - 01:48 PM
Junio 2015.-La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de encauzamiento, limpieza de alcantarillas, limpieza de espaldones y limpieza de la ciclovía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/07/2015 - 03:17 PM
Mayo 2015.-La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de encauzamiento, limpieza de alcantarillas, limpieza de espaldones y limpieza de la ciclovía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/06/2015 - 03:41 PM
Abril 2015.-La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de encauzamiento, limpieza de alcantarillas, limpieza de espaldones y limpieza de la ciclovía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/05/2015 - 11:25 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo 2015.-La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de encauzamiento, limpieza de alcantarillas, limpieza de espaldones y limpieza de la ciclovía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/04/2015 - 09:15 AM
Febrero 2015.-La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de encauzamiento, limpieza de alcantarillas, limpieza de espaldones y limpieza de la ciclovía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/03/2015 - 08:43 AM
Enero 2015.-La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de encauzamiento, limpieza de alcantarillas, limpieza de espaldones y limpieza de la ciclovía, se realizan trabajos de adcentamiento de los redondeles de la vía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/02/2015 - 02:14 PM
Diciembre 2014.-La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de encauzamiento, limpieza de alcantarillas, limpieza de espaldones y limpieza de la ciclovía, se realizan trabajos de adcentamiento de los redondeles de la vía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	06/01/2015 - 03:54 PM
Noviembre 2014.-La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de encauzamiento, limpieza de alcantarillas, limpieza de espaldones y limpieza de la ciclovía, Por disposición del Director Provincial se realizan trabajos de adcentamiento de los redondeles de la vía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/12/2014 - 09:14 AM
Octubre 2014.-La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de encauzamiento, limpieza de alcantarillas, limpieza de espaldones y limpieza de la ciclovía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/11/2014 - 09:54 AM
Septiembre 2014.-La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de encauzamiento, limpieza de alcantarillas, limpieza de espaldones y roza a mano.	Pita Asan, Arturo Sebastian	06/10/2014 - 09:12 AM
Agosto 2014(ALCANCE): De acuerdo a lo programado para el presente mes no se programó pago, sin embargo en el presente mes fue cancelada una planilla de Costo mas porcentaje.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/09/2014 - 08:09 AM
Agosto 2014.- La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de encauzamiento, limpieza de alcantarillas, limpieza de espaldones y roza a mano.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/09/2014 - 09:59 AM
Julio 2014.- La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de la ciclovía, mantenimiento de las señales de tránsito, limpieza de cunetas y espaldones.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/08/2014 - 09:05 AM
Junio 2014.- La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento: Limpieza de la ciclovía; Limpieza de encauzamientos y limpieza de alcantarillas.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/07/2014 - 11:27 AM
Mayo 2014.- La Cía. Contratista realiza mantenimiento de la vía; limpieza de cunetas, espaldones y ciclovía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/06/2014 - 10:09 AM
Abril 2014.- La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/05/2014 - 09:53 AM
Marzo 2014 (Alcance).- Este proyecto se encuentra en proceso de liquidación económica.	Vera Vera, José Ricardo	14/04/2014 - 02:18 PM
Marzo 2014.- La Cía Contratista realiza trabajos de mantenimiento y limpieza de la vía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/04/2014 - 01:59 PM
Febrero 2014.- La Cía. Contratista realiza trabajos de mantenimiento y limpieza de la vía.- En trámite la recepción provisional.	Pita Asan, Arturo Sebastian	27/02/2014 - 11:13 AM
Enero 2014.- La Cía. EQUITESA realiza trabajos de limpieza de espaldones, limpieza de la ciclovía, limpieza de encauzamientos.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/02/2014 - 03:00 PM
Diciembre 2013.- Fundición de cunetas desde el km 3+500 al 5+700 L.D; Limpieza de la calzada desde el km 2+400 al 7+000; Colocación de carpeta asfáltica desde el 0+000 al 1+700.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/01/2014 - 10:40 AM
Noviembre 2013.- Colocación de carpeta asfáltica sobre el Puente El Palmar y fundición de la losa del Puente Cabuya.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/12/2013 - 10:29 AM
Octubre 2013.- Se continúa con los trabajos de señalización horizontal y vertical desde el km 41+500 al 82+300.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/11/2013 - 09:47 AM
Septiembre 2013.- Señalización horizontal y vertical desde el km 15+400 al 48+200	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/10/2013 - 10:44 AM
Agosto 2013.- Fundición del redondel de Briceño y colocación de la señalización horizontal en la variante de Briceño.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/09/2013 - 09:39 AM
Julio 2013.- Fundición de las losas de aproximación del Puente Briceño y fundición del distribuidor de transito de Briceño.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/08/2013 - 02:13 PM
Junio 2013.- Se realizan trabajos de señalización horizontal, km 19+000 al 25+000	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/07/2013 - 09:46 AM
Mayo 2013 (se encuentra en tramite el financiamiento de la orden de cambio para la terminacion de la obra en el 2013)	Pita Asan, Arturo Sebastian	30/05/2013 - 09:02 AM
Mayo 2013.- Fundición de un tramo de losa del Puente Briceño	Pita Asan, Arturo Sebastian	29/05/2013 - 11:50 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2013.- Lanzamiento de vigas en el Puente Briceño.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/05/2013 - 09:47 AM
Marzo 2013.- Lanzamiento de las vigas en el Puente Briceño.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/04/2013 - 01:16 PM
Febrero 2013.- Fundición de bordillos y cunetas en el distribuidor de trafico de Briceño.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/03/2013 - 10:07 AM
Enero 2013.- Fundación de la pila central del Puente Briceño.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/02/2013 - 10:16 AM
Diciembre 2012.- Fundición del redondel de ingreso a la población de Canoa. (Hormigón armado)	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/01/2013 - 01:51 PM
Noviembre 2012.- Colocación de hormigón rígido en los redondeles de acceso al Paso Lateral de Canoa.	Pita Asan, Arturo Sebastian	30/11/2012 - 11:12 AM
Octubre 2012.- Se realizan trabajos de hincado de pilotes en la pila central del Puente Briceño.	Pita Asan, Arturo Sebastian	05/11/2012 - 02:45 PM
Septiembre 2012.- Pavimento de cemento Km 34+150 al 34+620. Agosto 2012.- Excavación en suelo de 61+100 al 65+700 (Variante w) Julio 2012.- Colocación de carpeta asfáltica en el Paso Lateral de Canoa. Junio 2012.- Fundición de pilotes en el Puente Briceño. Mayo 2012.- Colocación de carpeta asfáltica de dos pulgadas en el sector de Briceño. Abril 2012.- Se fundió la losa en el Puente El Recreo. Marzo 2012.-Trabajos de pilotajes en el puente Briceño. Febrero 2012.- Se encofra y se arma el acero de refuerzo en el Puente El Recreo Enero 2012.- Se lanzaron las vigas del Puente El Recreo Diciembre 2011.- Fundición de pilotes y estribos del Puente El Recreo. Noviembre 2011.- Se trabaja en el hormigonado desde el Km. 37+000 al 45+000 Octubre 2011.- Se trabaja en la Construcción de los Puentes en el Paso Lateral Canoa. Septiembre 2011.- Se trabaja en el Puente de Briseño y se realizan trabajo de Hormigonado. Agosto 2001.- Se continua con los trabajos de Hormiginado. Julio 2001 .- Se empezaron los trabajo de Estabilización en la Falla de Napo. Junio 2011.- Evaluación de los 14 puentes existentes. Mayo 2001.- Ampliación de Taludes y desalojo de material de excavación. Abril 2011.- Se trabaja en Hormigonado y tendido de material de Base. Marzo 2011.- Trituración y colocación de material de Base. Febrero 2011.- Colocación de Hormigón en el tramo de Pedernales a Coaque. Enero 2011.- Se realizacion trabajos de colocación de Base Hormigonado. Año 2010.- Colocación de Material de Afirmado y realizarón trabajos en el Paso Lateral de Canoa Año 2009.- Durante este período se realizarón trabajos de limpieza total de la via y se repusieron Alcantarillas.	Pita Asan, Arturo Sebastian	17/10/2012 - 09:03 AM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jama
2	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales
3	Zona 4 - Pacífico > Manabí > San Vicente

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 PLANEACIÓN : Acta adjudicada.	4-Inicio de Trabajo	01/11/2008		01/11/2008		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria-Aprobada.	4-Inicio de Trabajo	01/11/2008		01/11/2008		Sí	3.0
3	EJECUCIÓN: Aprobación de Estudios-Terminados.	4-Inicio de Trabajo	02/11/2008		02/11/2008		Sí	3.0
4	EJECUCIÓN: Licencia Ambiental Paso Lateral Canoa-Terminado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2011		31/12/2011		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Licencia Ambiental San Vicente - Pedernales-Terminado.	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Rehabilitación Puente Rio Muchacho - Terminado.	1-Solicitud de Información	20/08/2012		20/08/2012		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Construcción Puente El Recreo - Terminado.	1-Solicitud de Información	03/09/2012		03/09/2012		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Construcción de la Calzada Paso Lateral Canoa - Terminado.	5-Entregables Intermedios	25/11/2012		25/11/2012		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Construcción Puente Canoa - Terminado.	1-Solicitud de Información	10/12/2012		10/12/2012		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Impactos Ambientales Paso Lateral Canoa - Terminado.	1-Solicitud de Información	30/12/2012		30/12/2012		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Instalación del Sistema de Drenaje Paso Lateral Canoa - Terminado	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		30/12/2012		Sí	3.0
12	EJECUCIÓN: Obra Básica o Plataforma San Vicente - Pedernales - Terminado	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		30/12/2012		Sí	20.0
13	EJECUCIÓN: Obra Básica Paso Lateral Canoa - Terminado	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		30/12/2012		Sí	4.0
14	EJECUCIÓN: Obras Complementarias Paso Lateral Canoa - Terminado	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		30/12/2012		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Construcción del Puente Briceño - Terminado	1-Solicitud de Información	03/05/2013		03/09/2013		Sí	3.0
16	EJECUCIÓN: Construcción de la Calzada Pedernales - San Vicente - Terminado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	26.0
17	EJECUCIÓN: Impactos Ambientales de la Construcción de la vía San Vicente-Pedernales - Terminado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Instalación Sistema de Drenaje Pedernales - San Vicente - Terminado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	4.0
19	EJECUCIÓN: Obras Complementarias en la vía San Vicente - Pedernales - Terminado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
20	CIERRE: Acta Recepción Provisional - Finalizado.	9-Entregables Formales	20/06/2014		31/12/2014		Sí	3.0
21	EJECUCIÓN: Mantenimiento 2014 - Realizado.	1-Solicitud de Información	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Mantenimiento 2015 - Realizado.	1-Solicitud de Información	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
23	EJECUCIÓN: Mantenimiento 2016 - Realizado.	1-Solicitud de Información	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Mantenimiento 2017 - Realizado.	1-Solicitud de Información	31/12/2017		31/12/2017		Sí	1.0
25	CIERRE: Liquidación del Contrato - Finalizado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	20/01/2018	14/11/2018			No	3.0
26	COMPLETADO: Acta Recepción Definitiva - Finalizado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	20/01/2018	14/11/2018			No	4.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	20/11/2015
2	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	21/09/2015
3	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	27/05/2015
4	Supervision de Proyecto	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	16/12/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Mantenimiento		100.00 %	97.24	97.24	01/01/2014	Octubre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	49,363,805.88
Estimado Al Fin Del Proyecto:	137,889,823.34 **
Costo Total:	135,419,056.37
Total Devengado:	137,727,899.59
% Costo Total Devengado:	101.70 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 101.70 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	130,787,898.15	0.00	0.00	130,787,898.15
Ppto. Externo Planeado	231,738.12	0.00	0.00	231,738.12
Ppto. Aprobado Inicial	83,880,318.63	0.00	0.00	83,880,318.63
Ppto. Codificado	137,426,114.09	1,732,053.73	0.00	139,158,167.82
Ppto. Comprometido	76,206,867.77	0.00	0.00	76,206,867.77
Planeado - Codificado (2018)		-1,732,053.73		
Programado a Devengar	110,438,100.53	1,732,053.73	0.00	112,170,154.26
Ppto. Devengado	136,157,769.61	1,570,129.98	0.00	137,727,899.59
Pagado Real	16,642,671.07	0.00	0.00	16,642,671.07
Estimado a fin de año	* 136,157,769.61	0.00	0.00	136,157,769.61
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-25,719,669.08	1,732,053.73	0.00	-23,987,615.35
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 123.29 %	90.65 %	0.00 %	122.78 %
Ppto. Codificado 998	22,292,539.83	0.00	0.00	22,292,539.83
Ppto. Devengado 998	21,717,952.17	0.00	0.00	21,717,952.17

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

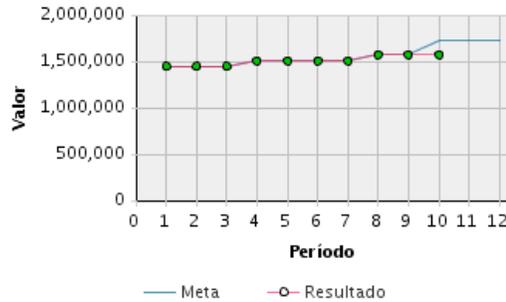

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	1,441,829.32	1,441,829.32	1,441,829.32	1,441,829.32	100.00 %	●	83.24 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	1,441,829.32	1,441,829.32	100.00 %		83.24 %
Mar	0.00	0.00	1,441,829.32	1,441,829.32	100.00 %		83.24 %
Abr	64,918.45	64,918.45	1,506,747.77	1,506,747.77	100.00 %		86.99 %
May	0.00	0.00	1,506,747.77	1,506,747.77	100.00 %		86.99 %
Jun	0.00	0.00	1,506,747.77	1,506,747.77	100.00 %		86.99 %
Jul	0.00	0.00	1,506,747.77	1,506,747.77	100.00 %		86.99 %
Ago	63,382.21	63,382.21	1,570,129.98	1,570,129.98	100.00 %		90.65 %
Sep	0.00	0.00	1,570,129.98	1,570,129.98	100.00 %		90.65 %
Oct	161,923.75	0.00	1,732,053.73	1,570,129.98	90.65 %		90.65 %
Nov	0.00		1,732,053.73				
Dic							
Total	1,732,053.73	1,570,129.98					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
18	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
19	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
20	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		PEDERNALES-SANVICENTE_MARZO.pdf	04/04/2012
2	Acta de Recepción Provisional.	Acta_Recepción_Provisional_Pedernales-San_vicente.pdf.pdf	17/07/2015
3	AYUDA DE MEMORIA	AYUDA_DE_MEMORIA_SAN_VICENTE_PEDERNALES.pdf	03/03/2017
4	AYUDA DE MEMORIA 1	AYUDA_DE_MEMORIA.pdf	03/04/2017
5	AYUDA DE MEMORIA 2	AYUDA_DE_MEMORIA_ABRIL_SAN_VICENTE.pdf	02/05/2017
6	Ayuda de Memoria 3	San_Vicente007.pdf	05/07/2017
7	AYUDA DE MEMORIA 4	AYUDA_DE_MEMORIA_PEDERNALES_AGOSTO.pdf	04/09/2017
8	AYUDA MEMORIA	AYUDA_MEMORIA_SAN_VICENTE-PEDERNALES-_MES_SEPTIEMBRE.pdf	05/10/2017
9	AYUDA MEMORIA ABRIL 2018	Ayuda_memoria_San_Vicente-Pedernales._-04-05-2018.xls	09/05/2018
10	AYUDA MEMORIA DICIEMBRE 2017	Ayuda_memoria_San_Vicente-Pedernales._-01-08-2018.xls	09/01/2018
11	AYUDA MEMORIA ENERO 2018	Ayuda_memoria_San_Vicente-Pedernales._-02-02-2018.xls	08/02/2018
12	AYUDA MEMORIA FEBRERO 2018	Ayuda_memoria_San_Vicente-Pedernales._-02-03-2018.xls	13/03/2018
13	AYUDA MEMORIA MARZO 2018	Ayuda_memoria_San_Vicente-Pedernales._-03-04-2018.xls	09/04/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	AYUDA MEMORIA MES DE OCTUBRE 2017	AYUDA_MEMORIA_SAN_VICENTE-_PEDERNALES.pdf	01/11/2017
15	AYUDA MEMORIA Noviembre 2017	Ayuda_Memoria_San_Vicente-Pedernales.pdf	05/12/2017
16	Contrato complementario	contrato_complementario.pdf	17/07/2015
17	Contrato Original	CONTRATO_ORIGINAL_SAN_VICENTE_PEDERNALES.pdf	17/07/2015
18	Costo más porcentaje	COSTO_+_%.pdf	17/07/2015
19	Croqui Abril 2013	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Abril_2013.pdf	02/05/2013
20	Croqui Agosto 2012	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Agosto2012.pdf	05/09/2012
21	Croqui Diciembre 2012	CROQUIS_DE_AVANCE_OBRA.pdf	04/01/2013
22	Croqui Febrero2013	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Febrero2013.pdf	04/03/2013
23	Croqui Julio 2012	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Julio2012.pdf	02/08/2012
24	Croqui Junio 2012	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Junio28.pdf	28/06/2012
25	Croqui Junio 28 2012	Croquis_de_Ubicacion_PEDERNALES-SAN_VICENTE.pdf	11/06/2012
26	Croqui Mayo 2013	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Mayo_2013.pdf	29/05/2013
27	Croqui Noviembre 2012	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE-Noviembre2012.pdf	30/11/2012
28	Croqui Septiembre 2012	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Septiembre2012.pdf	01/10/2012
29	CROQUIS ABRIL 2014	B.9.pdf	02/05/2014
30	Croquis Agosto 2013	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Agosto2013.pdf	02/09/2013
31	CROQUIS DICIEMBRE 2013	A.6.pdf	08/04/2014
32	Croquis Enero 2014	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Enero2014.pdf	03/02/2014
33	CROQUIS ENERO 2014	A.9.pdf	08/04/2014
34	CROQUIS FEBRERO DEL 2014	B.3.pdf	08/04/2014
35	Croquis Julio 2013	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Julio2013.pdf	31/07/2013
36	Croquis Junio 2013	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Junio2013.pdf	02/07/2013
37	Croquis Marzo 2013	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Marzo2013.pdf	03/04/2013
38	CROQUIS MARZO DEL 2014	B.6.pdf	08/04/2014
39	CROQUIS MAYO 2014	C.3.pdf	03/06/2014
40	CROQUIS NOVIEMBRE 2013	A.3.pdf	08/04/2014
41	Croquis Octubre 2013	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Octubre2013.pdf	04/11/2013
42	Croquis Octubre2012	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Octubre2012.pdf	05/11/2012
43	Croquis Septiembre 2013	Croquis_de_Ubicación_PEDERNALES-SAN_VICENTE_Septiembre2013.pdf	02/10/2013
44	Fotos Abril 2012	FOTOS.pdf	02/04/2012
45	Fotos Abril 2013	FOTOS-Pedernales-San_Vicente_Abril_2013.pdf	02/05/2013
46	FOTOS ABRIL 2014	B.8.pdf	02/05/2014
47	Fotos Agosto 2012	FOTOS_Agosto2012_Pedernales-San_Vicente.pdf	31/08/2012
48	Fotos Carretera Pedernales-San Vicente desde sus inicios	INF._FOTOS-desde_sus_inicios.pdf	30/03/2012

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
49	FOTOS DICIEMBRE 2013	A.5.pdf	08/04/2014
50	Fotos Enero 2013	Fotos_Enero2013-Pedernales-SanVicente.pdf	04/02/2013
51	FOTOS ENERO 2014	A.8.pdf	08/04/2014
52	Fotos Febrero 2013	Fotos_Febrero2013_Pederales-SanVicente.pdf	04/03/2013
53	FOTOS FEBRERO DEL 2014	B.2.pdf	08/04/2014
54	Fotos Julio 2012	fotos_pedernales-sanvicente_julio.pdf	27/07/2012
55	Fotos Julio 2013	FOTOS_Pedernales-San_Vicente-_Julio2013.pdf	31/07/2013
56	FOTOS JULIO 2014	C.7.pdf	04/08/2014
57	Fotos Junio 2012	FOTOS.pdf	28/06/2012
58	Fotos Junio 2013	FOTOS_Carretera_Pedernales-San_Vicente_Junio2013.pdf	02/07/2013
59	FOTOS JUNIO 2014	C.5.pdf	01/07/2014
60	Fotos Marzo 2013	FOTOS-PedernlesSanVicente-Marzo2013.pdf	03/04/2013
61	FOTOS MARZO DEL 2014	B.5.pdf	08/04/2014
62	Fotos Mayo 2012	FOTOS.docx	07/05/2012
63	Fotos Mayo 2013	FOTOS_Pedernales-San_Vicente_Mayo_2013.pdf	29/05/2013
64	FOTOS MAYO 2014	C.2.pdf	03/06/2014
65	FOTOS NOVIEMBRE 2013	A.2.pdf	08/04/2014
66	Fotos Octubre 2013	FOTOS_Pedernales-SanVicente_Octubre_2013.pdf	04/11/2013
67	Fotos Octubre2012-Carretera-Pedernales-SanVicente	FOTOS_Octubre2012-Carretera-Pedernales-San_Vicente.pdf	05/11/2012
68	Fotos Septiembre 2013	FOTOS_Pedernales-SanVicente_Sept2013.pdf	02/10/2013
69	Fotos Septiembre2012-Carretera-Pedernales-SanVicente	FOTOS_Septiembre2012.pdf	01/10/2012
70	Fotos_Noviembre-CarreteraPedernales-San Vicente2012	FOTOS_CarreteraPedernales-SanVicente_Noviembre2012.pdf	30/11/2012
71	INFORME DE FISCALIZACION	INFORME_DE_FISCALIZACION.pdf	25/01/2017
72	INFORME DE PROYECTO JUNIO	Informe_de_Proyecto_San_Vicente011.pdf	07/07/2017
73	INFORME DE PROYECTO No.1	INFORME_DE_PROYECTO_No.1_K18.pdf	23/11/2016
74	INFORME DE PROYECTO No.2	INFORME_DE_PROYECTO_No._2_K18.pdf	22/12/2016
75	INFORME DE PROYECTO No.3	INFORME_DE_PROYECTO_FEBRERO_SAN_VICENTE.pdf	06/03/2017
76	INFORME DE PROYECTO No.4	Informe_de_Proyecto_Mayo_San_Vicente.pdf	08/06/2017
77	INFORME DE PROYECTO No.5	INFORME_DE_PROYECTO_PEDERNALES_SAN_VICENTE	17/06/2017
78	INFORME DE PROYECTO No.6	INFORME_DE_PROYECTO_SAN_VICENTE_AGOSTO.pdf	04/09/2017
79	Informe Ejecutivo Abril 2013	Inf-Ejecutivo-CarreteraPedernales-SanVicente-Abril2013.pdf	01/05/2013
80	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	B.7.pdf	02/05/2014
81	Informe Ejecutivo Agosto 2013	Inf-Ejecutivo-PedernalesSanVicente-Agosto2013.pdf	02/09/2013
82	Informe Ejecutivo Diciembre 2012	Inf_Ejecutivo_Pedernales-SanVicente_Diciembre2013.pdf	02/01/2013
83	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	A.4.pdf	08/04/2014
84	Informe Ejecutivo Enero 2013	Inf_Ejecutivo-Pedernales-SanVicente_Enero2013.pdf	04/02/2013
85	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	A.7.pdf	08/04/2014
86	Informe Ejecutivo Febrero 2013	Inf_Ejecutiv_Pedernales-SanVicente-Febrero2013.pdf	04/03/2013
87	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	B.1.pdf	08/04/2014
88	Informe Ejecutivo Julio 2013	Informe-EjecutivoPedernales-San_Vicente-JULIO2013.pdf	31/07/2013
89	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	C.6.pdf	04/08/2014
90	Informe Ejecutivo Junio 2013	Inf_Ejecutivo_CarreteraPedernales-SanVicente_Junio2013.pdf	02/07/2013
91	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	C.4.pdf	02/07/2014
92	Informe Ejecutivo Marzo 2013	Inf-Ejecutivo-Pedernales-SanVicente-Marzo2013.pdf	03/04/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
93	Informe Ejecutivo Marzo 2015	E5.pdf	01/04/2015
94	INFORME EJECUTIVO MARZO DEL 2014	B.4.pdf	08/04/2014
95	Informe Ejecutivo Mayo 2013	Informe-Ejecutivo-PedernalesSanVicente-Mayo2013.pdf	29/05/2013
96	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	C.1.pdf	03/06/2014
97	Informe Ejecutivo Noviembre 2012	Inf.Ejecutivo.Pedernales-SanVicente-Noviembre2012.pdf	30/11/2012
98	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	A.1.pdf	08/04/2014
99	Informe Ejecutivo Octubre 2013	Inf._Ejec._Pedernales-SanVicente_OCTUBRE2013.pdf	04/11/2013
100	Informe Ejecutivo Septiembre 2013	Inf-Ejecivo-Perdenales-SanVicente-Sept2013.pdf	02/10/2013
101	Informe Ejecutivo Sitop Abril 2012	GestionReporteFNPedernalesMAYO.pdf	04/10/2012
102	Informe Ejecutivo Sitop Agosto 2012	Inf_Ejecutivo_Agosto2012_Pedernales-SanVicente.pdf	04/10/2012
103	Informe Ejecutivo Sitop Febrero 2012	GestionReporteFN.pdf	29/02/2012
104	Informe Ejecutivo Sitop Julio 2012	GestionReporteFNPedernalesJulio.pdf	04/10/2012
105	Informe Ejecutivo Sitop Junio 2012	GestionReporteFNPedernalesJunio.pdf	04/10/2012
106	Informe Ejecutivo Sitop Marzo 2012	GestionReporteFNPedernales-SanVicente.pdf	06/03/2012
107	Informe Ejecutivo Sitop Mayo 2012	GestionReporteFNPEDERNALES.pdf	07/05/2012
108	Informe Ejecutivo Sitop Octubre 2012	Informe_Ejecutivo_Sitop_Pedernales-San_Vicente_Octubre2012.pdf	05/11/2012
109	Informe Ejecutivo Sitop Septiembre 2012	Inf_Ejecutivo__SEPTIEMBRE_Pedernales-SanVicente.pdf	04/10/2012
110	INFORME SEMANAL A SEPT 30	SAN_VICENTE-PEDERNALES_SEPT_30.xls	08/10/2011
111	INFORME SEMANAL CON FOTOS A JUNIO 24	PEDERNALES-SAN_VICENTE_JUNIO_24.xls	02/07/2011
112	Justificación de plazo	JUSTIFICACION_DE_PLAZO.pdf	17/07/2015
113	Orden de cambio de la 1 a la 7	ORDENES_DE_CAMBIO_DE_LA_1_A_LA__7.pdf	17/07/2015
114	Orden de Cambio No. 5	orden_de_cambio_No.5.zip	19/09/2012
115	Orden de Cambio No. 6	ORDEN_DE_CAMBIO_No._6_San_Vicente-Pedernales.pdf	02/09/2013
116	P.1-Informe Ejecutivo Agosto 2014	C.8.pdf	05/09/2014
117	P.2- Fotos Agosto 2014	C.9.pdf	05/09/2014
118	P.3.- Informe Ejecutivo Septiembre 2014	D.01.pdf	06/10/2014
119	P.4.- Fotos Septiembre 2014	D.02.pdf	06/10/2014
120	P.5 Informe Ejecutivo Octubre 2014	D.03.pdf	04/11/2014
121	P.6.- Fotos Octubre 2014	D.04.pdf	04/11/2014
122	P.7 Informe Ejecutivo Noviembre 2014	D.5.pdf	03/12/2014
123	P.8 Fotos Noviembre 2014	D.6.pdf	03/12/2014
124	P.8 Informe Ejecutivo Diciembre 2014	D.7.pdf	06/01/2015
125	Q.1. Fotos Diciembre 2014	D.8.pdf	06/01/2015
126	Q.2 Informe Ejecutivo Enero 2015	D.9.pdf	03/02/2015
127	Q.3. Fotos Enero 2015	E.1.pdf	03/02/2015
128	Q.4 Informe Ejecutivo Febrero 2015	E.2.pdf	02/03/2015
129	Q.5. Fotos Febrero 2015	E.3.pdf	02/03/2015
130	Q.6 Acta de Recepción Provisional San Vicente-Pedernales	E.4.pdf	05/03/2015
131	Q.7 Informe Ejecutivo Marzo 2015	E5.pdf	01/04/2015
132	Q.8 Fotos Marzo 2015	E6.pdf	01/04/2015
133	Q.9 Informe Ejecutivo Abril 2015	E.7.pdf	04/05/2015
134	R.1 Fotos Abril 2015	E.8.pdf	04/05/2015
135	R.2 Informe Ejecutivo Mayo 2015	E.9.pdf	01/06/2015
136	R.3 Fotos Mayo 2015	F.1.pdf	01/06/2015
137	R.4.- Informe Ejecutivo Junio 2015	F.2.pdf	02/07/2015
138	R.5 Fotos Mayo 2015	F.3.pdf	02/07/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
139	R.6.- Informe Ejecutivo Julio 2015	R.6.pdf	03/08/2015
140	R.7 Fotos Julio 2015	R.7.pdf	03/08/2015
141	R.8.- Informe Ejecutivo Agosto 2015	R.8.pdf	01/09/2015
142	R.9 Fotos Agosto 2015	R.9.pdf	01/09/2015
143	S.1- Informe Ejecutivo Septiembre 2015	S.1.pdf	05/10/2015
144	S.2 Fotos Septiembre 2015	S.2.pdf	05/10/2015
145	S.3.- Informe Ejecutivo octubre 2015	S.3.pdf	04/11/2015
146	S.4 Fotos Octubre 2015	S.4.pdf	04/11/2015
147	S.5.- Informe Ejecutivo Noviembre 2015	S.5.pdf	01/12/2015
148	S.6 Fotos Noviembre 2015	S.6.pdf	01/12/2015
149	S.7.- Informe Ejecutivo Diciembre 2015	S.7.pdf	05/01/2016
150	S.8.- Fotos Diciembre 2015	S.8.pdf	05/01/2016
151	S.9.- Informe Ejecutivo Enero 2016	S.9.pdf	01/02/2016
152	T.1.- Fotos Enero 2016	S.9.pdf	01/02/2016
153	T.2.- Informe Ejecutivo Febrero 2016	T.2.pdf	02/03/2016
154	T.3.- Fotos Febrero 2016	T.3.pdf	02/03/2016
155	T.4.- Informe Ejecutivo Marzo 2016	T.4.pdf	04/04/2016
156	T.5.- Fotos Marzo 2016	T.5.pdf	04/04/2016
157	T.6. Informe Ejecutivo Abril 2016	T.6.pdf	05/05/2016
158	T.7. Fotos Abril	T.7.pdf	05/05/2016
159	T.8.- Informe Ejecutivo Mayo 2016	T.8.pdf	01/06/2016
160	T.9.- Fotos Mayo 2016	T.9.pdf	01/06/2016
161	U.1.- Informe Ejecutivo Junio 2016	U.1.pdf	04/07/2016
162	U.2.- Fotos Junio 2016	U.2.pdf	04/07/2016
163	U.3.- Informe Ejecutivo JuLio 2016	U.3.pdf	01/08/2016
164	U.4.- Fotos Julio 2016	U.4.pdf	03/08/2016
165	U.5.- Informe Ejecutivo Agosto 2016	U.5.pdf	05/09/2016
166	U.6.- Fotos Agosto 2016	U.6.pdf	05/09/2016
167	U.7.- Informe Ejecutivo Septiembre 2016	U.7.pdf	05/10/2016
168	U.8.- Fotos Septiembre 2016	U.8.pdf	05/10/2016
169	U.9.- Informe Ejecutivo Octubre 2016	U.9.pdf	01/11/2016
170	V.1.- Fotos Octubre 2016	V.1.pdf	01/11/2016
171	V.2.- Informe Ejecutivo Noviembre 2016	V.2.pdf	06/12/2016
172	V.3.- Fotos Noviembre 2016	V.3.pdf	06/12/2016
173	V.4.- Informe Ejecutivo Diciembre 2016	V.4.pdf	04/01/2017
174	V.5.- Fotos Diciembre 2016	V.5.pdf	04/01/2017
175	V.6.- Informe Ejecutivo Enero 2017	V.6.pdf	03/02/2017
176	V.7.- Fotos Enero 2017	V.7.pdf	03/02/2017
177	V.8.- Informe Ejecutivo Diciembre 2017	V.8.pdf	03/03/2017
178	V.9.- Fotos Febrero 2017	V.9.pdf	03/03/2017
179	W.1.- Informe Ejecutivo Marzo 2017	W.1.pdf	03/04/2017
180	W.2- Fotos Marzo 2017	W.2.pdf	03/04/2017
181	W.3.- Informe Ejecutivo Abril 2017	W.3.pdf	02/05/2017
182	W.4.- Fotos Abril 2017	W.4.pdf	02/05/2017
183	W.5.- Informe Ejecutivo Mayo 2017	W.5.pdf	05/06/2017
184	W.6.- Fotos Abril 2017	W.6.pdf	05/06/2017
185	W.7.- Informe Ejecutivo Junio 2017	W.7.pdf	04/07/2017
186	W.8.- Fotos Junio 2017	W.8.pdf	04/07/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
187	W.9.- Informe Ejecutivo Julio 2017	W.9.pdf	04/08/2017
188	Z.1.- Fotos Julio 2017	Z.1.pdf	04/08/2017
189	Z.2.- Informe Agosto 2017	Z.2.pdf	04/09/2017
190	Z.3.- Fotos Agosto 2017	Z.3.pdf	04/09/2017
191	Z.4.- Informe Sitop mes Septiembre 2017	Z.4.pdf	05/10/2017
192	Z.5.- Fotos Septiembre 2017	Z.5.pdf	05/10/2017
193	Z.6 - Informe Sitop Octubre 2017	Z.6.pdf	01/11/2017
194	Z.7 Fotos	Z.7.pdf	01/11/2017
195	Z.8 - Informe Sitop Noviembre 2017	Z.8.pdf	05/12/2017
196	Z.9 Fotos mes de Noviembre.	Z.9.pdf	05/12/2017
197	Z.A.1 - Informe Sitop Diciembre 2017	Z.A.1.pdf	09/01/2018
198	Z.A.2 - Fotos Diciembre 2017	Z.A.2.pdf	09/01/2018
199	Z.A.3 - Informe Sitop Enero 2018	Z.A.3.pdf	08/02/2018
200	Z.A.4 - Fotos Enero 2018	Z.A.4.pdf	08/02/2018
201	Z.A.5 - Informe Sitop Febrero 2018	Z.A.5.pdf	13/03/2018
202	Z.A.6 - Fotos Febrero 2018	Z.A.6.pdf	13/03/2018
203	Z.A.7 - Informe Sitop Marzo 2018	Z.A.7.pdf	09/04/2018
204	Z.A.8 - Fotos Marzo 2018	Z.A.8.pdf	09/04/2018
205	Z.A.9 - Informe Sitop Abril 2018	Z.A.9.pdf	09/05/2018
206	Z.B.1 - Fotos Abril 2018	Z.B.1.pdf	09/05/2018
207	Z.B.2 - Informe Sitop Mayo 2018	Z.B.2.pdf	07/06/2018
208	Z.B.3 - Fotos Mayo 2018	Z.B.3.pdf	07/06/2018
209	Z.B.4 - Informe Sitop Junio 2018	Z.B.4.pdf	06/07/2018
210	Z.B.5 - Fotos Junio 2018	Z.B.5.pdf	06/07/2018
211	Z.B.6 - Informe Sitop Julio 2018	Z.B.6.pdf	03/08/2018
212	Z.B.7 - Fotos Julio 2018	Z.B.7.pdf	03/08/2018
213	Z.B.8 - Informe Sitop Agosto 2018	Z.B.8.pdf	05/09/2018
214	Z.B.9 - Fotos Agosto 2018	Z.B.9.pdf	05/09/2018
215	Z.C.1 - Informe Sitop Septiembre 2018	Z.C.1.pdf	04/10/2018
216	Z.C.2 - Fotos Septiembre 2018	Z.C.2.pdf	04/10/2018
217	Z.C.3 - Informe Sitop mes de Octubre de 2018	Z.C.3.pdf	05/11/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Alcívar Arauz, Diofre Leonel	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Zonal 4	dialcivar@mtop.gob.ec	
Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Administrador del Contrato.	Subsecretario Zonal 4	iganchozo@mtop.gob.ec	023974600
Palma Chiquito, Fernando Abrahan	Lider de Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	fapalma@mtop.gob.ec	023974600
Romero Añazco, Rómulo	Coordinador Tecnico	Coordinador Técnico Dirección Provincial de Manabí	rromero@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
6329_1.jpg	01/10/2018
