

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 3**

**Dirección Provincial Chimborazo**

**PROYECTO: K009 MTOP - Mantenimiento vial de la Provincia de Chimborazo**

Líder del Proyecto:	Andrade Almache, Patricio (pandrade@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gamboa López, Enma Katherine	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, Provincia - Chimborazo, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3813	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	21,274,582.77
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	04/12/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Fecha del siguiente Hito:	15/12/2018

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

Evaluación y reparación del Puente Cornelio Dávalos.  
 Contratista: PATECA

**Microempresas Contratadas:**

Tramo Calpi - San Juan - El Arenal: Microempresa Patrono San Juan  
 Tramo Guasuntos Chunchi: Microempresa Nueva Camino  
 Tramo Huigra - Tomebamba: Microempresa Paquisha  
 Tramo Tomebamba - El Triunfo: Microempresa Asociación San Felipe  
 Tramo Riobamba - Penipe - Puela: Microempresa 9 de Febrero  
 Tramo Alausí - Huigra: Microempresa Asociación de Conservación Vial Alausí

**MONTO:** Para el año 2014, se tiene asignado a este proyecto 33'803.942,04 USD

**PRODUCTO/SERVICIO:**

Al termino de la ejecucion de trabajos de mantenimiento vial, las vias presentaran condiciones confortables y seguras

**LINEA BASE:** Mantenimiento por administración directa y contratada

**OBJETIVO GENERAL:** Realizar el Mantenimiento Vial de la Provincia De Chimborazo.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

Presntar las condiciones de la vía en óptimas condiciones  
 Mejorar la seguridad de los usuarios  
 Mejorar el servicio de las vías  
 Implementar obras complementarias que permitan facilitar el tráfico vehicular y proporcionar seguridad al tránsito vehicular y peatonal.  
 Contar con un plan de manejo ambiental que permita mitigar el impacto en la ejecución de proyectos.  
 Dotar de un sistema de señalización acorde a las especificaciones técnicas del MTOP e INEN, mediante la aplicación de señalética horizontal y vertical que permita a los usuarios de las vías el uso adecuado de las mismas.

**Beneficios Cualitativos**


Seguridad  
 Mejor servicio al ciudadano  
 Conservación de la infraestructura vial

<b>Tipo de Beneficiario</b>
Todos los usuarios de la vía
<b>Restricciones</b>
Condiciones climáticas

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 76.92 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2012      Fecha de Fin: 31/12/2020

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

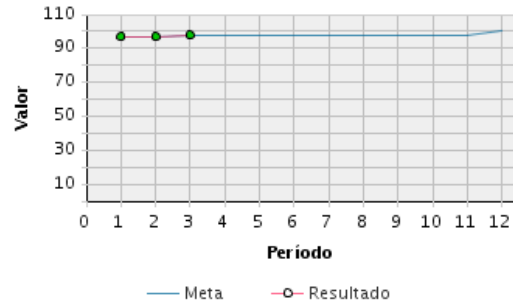

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	97 %	97 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
	97 %	97 %	98 %									
Estado												
	●	●	●									

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>NOVIEMBRE 2018:</b>                      Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos.                      Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:                      -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua                      -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis                      -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar                      -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales                      -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/12/2018 - 09:30 AM
<p><b>OCTUBRE 2018:</b>                      Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos.                      Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:                      -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua                      -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis                      -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar                      -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales                      -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/11/2018 - 11:05 AM
<p><b>SEPTIEMBRE 2018:</b>                      Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos.                      Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:                      -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua                      -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis                      -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/10/2018 - 10:13 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud		
<p><b>AGOSTO 2018:</b> Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</li> <li>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</li> <li>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</li> <li>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</li> <li>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</li> </ul>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/09/2018 - 05:03 PM
<p><b>JULIO 2018:</b> Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</li> <li>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</li> <li>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</li> <li>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</li> <li>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</li> </ul>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	02/08/2018 - 11:02 AM
<p><b>JUNIO 2018:</b> Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</li> <li>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</li> <li>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</li> <li>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</li> <li>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</li> </ul>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/07/2018 - 11:07 AM
<p><b>MAYO 2018:</b> Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</li> <li>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</li> <li>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</li> <li>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</li> <li>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</li> </ul>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/06/2018 - 09:14 AM
<p><b>ABRIL 2018:</b> Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</li> <li>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</li> <li>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</li> <li>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</li> <li>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</li> </ul>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/05/2018 - 09:20 AM
<p><b>MARZO 2018:</b> Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</li> <li>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</li> <li>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</li> <li>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</li> <li>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</li> </ul>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/04/2018 - 10:06 AM
<p><b>FEBRERO 2018:</b> Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</li> <li>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</li> <li>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</li> <li>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</li> </ul>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2018 - 03:10 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud		
<p><b>ENERO 2018:</b>                      Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos.                      Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:                      -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua                      -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis                      -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar                      -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales                      -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2018 - 03:09 PM
<p><b>DICIEMBRE 2017:</b>                      Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales                      Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:                      -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua                      -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis                      -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar                      -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales                      -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/01/2018 - 10:10 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2017:</b>                      Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales                      Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:                      -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua                      -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis                      -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar                      -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales                      -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/12/2017 - 10:27 AM
<p><b>OCTUBRE 2017:</b>                      Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales                      Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:                      -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua                      -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis                      -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar                      -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales                      -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	02/11/2017 - 08:24 AM
<p><b>SEPTIEMBRE 2017:</b>                      Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales                      Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:                      -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua                      -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis                      -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar                      -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales                      -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/10/2017 - 07:38 PM
<p><b>AGOSTO 2017:</b>                      CAUSAS: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vía a la Red Vial Estatal, dando un mantenimiento rutinario evitando la progresión de fallas y atención emergente a siniestros naturales.                      ACCIONES: Se realiza trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones, bacheo meno, etc en cada uno de los tramos asignados a cada Asociación de Conservación Vial.                      tramos:                      *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA                      *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS                      *CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/09/2017 - 01:50 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
*GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES *CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD		
<p><b>JULIO 2017:</b>                      CAUSAS: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial a la Red Vial Estatal, dando un mantenimiento rutinario evitando la progresión de fallas y atención emergente a siniestros naturales.                      ACCIONES: Se realiza trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones, bacheo menor, etc en cada uno de los tramos asignados a cada Asociación de Conservación Vial.                      tramos:                      *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA                      *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS                      *CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR                      *GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES                      *CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/08/2017 - 10:46 AM
<p><b>JUNIO 2017:</b>                      Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos:                      *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA                      *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS                      *CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR                      *GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES                      *CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD                      Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones.                      bacheo menor.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/07/2017 - 05:03 PM
<p><b>MAYO 2017:</b>                      Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos:                      *ALASÍ - PEPINALES                      +PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI                      *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR)                      *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO                      *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS                      *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO                      *CALPI - CASA CONDOR                      *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR                      *GUASUNTOS - CHUNCHI                      *SAN LUIS - SOCAVÓN                      *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA                      *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS                      Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones.                      bacheo menor.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/06/2017 - 03:11 PM
<p><b>ABRIL 2017:</b>                      Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos:                      *ALASÍ - PEPINALES                      +PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI                      *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR)                      *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO                      *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS                      *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO                      *CALPI - CASA CONDOR                      *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR                      *GUASUNTOS - CHUNCHI                      *SAN LUIS - SOCAVÓN                      *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA                      *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS                      Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones.                      bacheo menor, y pintura sobre la calzada</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/05/2017 - 12:30 PM
<p><b>MARZO 2017:</b>                      Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/04/2017 - 09:31 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>*ALASÍ - PEPINALES                      +PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI                      *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR)                      *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO                      *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS                      *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO                      *CALPI - CASA CONDOR                      *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR                      *GUASUNTOS - CHUNCHI                      *SAN LUIS - SOCAVÓN                      *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA                      *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS                      Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmote y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones.                      bacheo menor, y pintura sobre la calzada</p>		
<p>FEBRERO 2016                      Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos:                      *ALASÍ - PEPINALES                      *PEDERNALES - LA Y DE SAN JOSÉ - CHUNCHI                      *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR)                      *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS                      *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO                      *CALPI - CASA CONDOR                      *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR                      *GUASUNTOS - CHUNCHI                      *SAN LUIS - SOCAVÓN                      *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - RUNGURAHUA                      *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO/CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO                      Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmote y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones.                      bacheo menor, y pintura sobre la calzada</p>	<p>Santillan                      Morocho, Ingrid                      Pamela</p>	<p>04/03/2017 -                      09:25 PM</p>
<p>ENERO 2016                      Trabajos de mantenimiento realizados por administración directa, se realizó trabajos de limpieza de derrumbes en 124,36 Km de la RVE Chimborazo, en los siguientes tramos:                      * Riobamba - Penipe                      *Penipe - Puela - Cahuají Bajo                      * Cahuají Bajo - Lte. Prov. chimborazo / Tungurahua                      * Guamote - Socavón - Vía (Riobamba - Cebadas)                      * Socavón (Riobamba - Cebadas) - El Atillo - Km 54.6 (Vía Cebadas - Alshi)</p>	<p>Santillan                      Morocho, Ingrid                      Pamela</p>	<p>04/03/2017 -                      09:16 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2016                      Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:                      *Calpi - San Juan - El Arena,                      *Huigra - Piedrero.                      * Riobamba - Penipe - Cahuají                      * Riobamba - Cebadas                      * Guamote - Socavón                      * Guasuntos - Chunchi                      * Alausí - Huigra                      Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y cunetas.                      Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>	<p>Santillan                      Morocho, Ingrid                      Pamela</p>	<p>04/01/2017 -                      04:54 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2016                      Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:                      *Calpi - San Juan - El Arena,                      *Huigra - Piedrero.                      * Riobamba - Penipe - Cahuají                      * Riobamba - Cebadas                      * Guamote - Socavón                      * Guasuntos - Chunchi                      * Alausí - Huigra                      Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                      Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>	<p>Santillan                      Morocho, Ingrid                      Pamela</p>	<p>05/12/2016 -                      06:37 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>	<p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p>	<p>01/11/2016 - 04:26 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>	<p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p>	<p>03/10/2016 - 10:32 AM</p>
<p>AGOSTO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>	<p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p>	<p>01/09/2016 - 07:26 AM</p>
<p>JULIO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>	<p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p>	<p>03/08/2016 - 10:43 AM</p>
<p>JUNIO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>	<p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p>	<p>04/07/2016 - 12:35 PM</p>
<p>MAYO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>	<p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p>	<p>03/06/2016 - 11:37 AM</p>
<p>ABRIL 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>	<p>Paula López, Ricardo Octavio</p>	<p>05/05/2016 - 10:07 AM</p>
<p>MARZO 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p>	<p>Paula López, Ricardo Octavio</p>	<p>08/04/2016 - 11:38 AM</p>
<p>FEBRERO 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra,</p>	<p>Paula López, Ricardo Octavio</p>	<p>09/03/2016 - 10:44 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>*Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p>		
<p>ENERO 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p>	<p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p>	<p>10/02/2016 - 07:31 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p>	<p>Paula López, Ricardo Octavio</p>	<p>06/01/2016 - 05:35 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p>	<p>Paula López, Ricardo Octavio</p>	<p>07/12/2015 - 03:57 PM</p>
<p>OCTUBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p>	<p>Paula López, Ricardo Octavio</p>	<p>06/11/2015 - 12:25 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p>	<p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p>	<p>07/10/2015 - 03:28 PM</p>
<p>AGOSTO 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p>	<p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p>	<p>08/09/2015 - 11:59 AM</p>
<p>JULIO 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe,</p>	<p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p>	<p>06/08/2015 - 10:47 AM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
*Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Se realizó trabajos de bacheo en la carretera Riobamba - Penipe - Cahuají Bajo		
Junio 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Se realizó trabajos de bacheo en la carretera Riobamba - Penipe - Cahuají Bajo.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	06/07/2015 - 01:15 PM
Mayo 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Paula López, Ricardo Octavio	05/06/2015 - 01:14 PM
Abril 2015: En etapa precontractual para contratación de microempresas	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/05/2015 - 11:26 PM
Marzo 2015 Proyecto con microempresas terminado. Por contratar 6 microempresas.	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/04/2015 - 04:34 PM
Febrero 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	09/03/2015 - 01:27 PM
Enero 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	09/02/2015 - 09:40 AM
Diciembre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Solis Mazón , Nestor Rubén 01/12/2014 - 04:31 PM	Solis Mazón, Nestor Rubén	08/01/2015 - 08:31 AM
Noviembre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	01/12/2014 - 04:31 PM
Octubre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/11/2014 - 12:37 PM
Septiembre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	06/10/2014 - 11:51 AM
Agosto 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	11/09/2014 - 08:56 AM
Julio 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba	Solis Mazón, Nestor Rubén	03/08/2014 - 06:37 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.		
Junio 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	03/07/2014 - 03:24 PM
Mayo 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	05/06/2014 - 11:44 PM
Abril 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/05/2014 - 09:00 AM
Marzo 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/04/2014 - 09:20 AM
Febrero 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	10/03/2014 - 11:34 AM
Enero 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	10/02/2014 - 08:24 AM
Diciembre 2013: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	06/01/2014 - 11:28 AM
Noviembre 2013: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial. Construcción de sistemas bta's	Solis Mazón, Nestor Rubén	02/12/2013 - 04:20 PM
Enero - Octubre 2013: Contratación de Microempresas. Construcción de muros Alquiler de maquinaria	Solis Mazón, Nestor Rubén	13/11/2013 - 03:13 PM
Diciembre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/01/2013 - 10:34 AM
Noviembre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/12/2012 - 09:20 AM
Octubre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH Septiembre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Agosto 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.	Solis Mazón, Nestor Rubén	12/11/2012 - 06:15 PM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Julio 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.</p> <p>Junio 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.</p> <p>Mayo 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y Abril 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.</p> <p>Marzo 2012: Se inicia los trabajos el 9 de marzo de 2012 con las 4 microempresas en diferentes tramos de la Red vial Estatal de la Provincia.</p> <p>Febrero 2012: -Proceso de adjudicación para realizar trabajos con microempresa.</p> <p>Enero 2012: - Campamento Chunchi: % de Avance 20%</p>		

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p><b>5- PROYECTO. Recursos.</b> Falta de asignación de recursos, CAUSARÍA retraso de la ejecución de los trabajos.</p>	05/06/2018	Wilson Horna Sanipatín	30 %	10	3	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Continuación de trabajos del año pasado. Trabajos ejecutados	4-Inicio de Trabajo	01/01/2014		01/01/2014		Sí	1.0
2	EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempres. Trabajos terminados	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	22/01/2014		22/01/2014		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Inspección de Obra. Trabajos revisados	5-Entregables Intermedios	22/01/2014		22/01/2014		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Actas firmadas FASE 1: Realizado	5-Entregables Intermedios	23/01/2014		23/01/2014		Sí	1.0
5	PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada	1-Solicitud de Información	28/01/2014		28/01/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	PLANEACIÓN: Presupuesto Aprobado	1-Solicitud de Información	30/01/2014		30/01/2014		Sí	1.0
7	PLANEACIÓN: Elaboración de pliegos realizados	1-Solicitud de Información	31/01/2014		31/01/2014		Sí	1.0
8	PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado	2-Publicación de Pliegos	05/02/2014		05/02/2014		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Trabajos adjudicados	3-Adjudicación	13/02/2014		13/02/2014		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado	3-Adjudicación	20/02/2014		20/02/2014		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	21/02/2014		21/02/2014		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado	5-Entregables Intermedios	19/06/2014		19/06/2014		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Mantenimiento de señalización. Realizado	5-Entregables Intermedios	10/02/2015		10/02/2015		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado	5-Entregables Intermedios	20/02/2015		20/02/2015		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Ejecución de Planillas. Planillas ejecutadas	4-Inicio de Trabajo	21/02/2015		21/02/2015		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado	5-Entregables Intermedios	24/02/2015		24/02/2015		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 2: Realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 2.1: Realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	03/03/2015		03/03/2015		Sí	1.0
21	PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada	1-Solicitud de Información	17/04/2015		17/04/2015		Sí	1.0
22	PLANEACIÓN: Presupuesto Aprobado	1-Solicitud de Información	22/04/2015		22/04/2015		Sí	1.0
23	PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado	1-Solicitud de Información	29/04/2015		29/04/2015		Sí	1.0
24	PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado	2-Publicación de Pliegos	04/05/2015		04/05/2015		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Trabajos adjudicados	3-Adjudicación	11/05/2015		11/05/2015		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado	3-Adjudicación	18/05/2015		18/05/2015		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	25/05/2015		25/05/2015		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado	5-Entregables Intermedios	26/06/2015		26/06/2015		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado	5-Entregables Intermedios	26/06/2015		26/06/2015		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado	5-Entregables Intermedios	28/08/2015		28/08/2015		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado	5-Entregables Intermedios	25/09/2015		25/09/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
32	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 3: Realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2015		30/12/2015		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 3.1: Realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2015		30/12/2015		Sí	1.0
35	PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada	1-Solicitud de Información	09/03/2016		09/03/2016		Sí	1.0
36	PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado	2-Publicación de Pliegos	16/03/2016		16/03/2016		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Contratos adjudicados	3-Adjudicación	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado	3-Adjudicación	08/04/2016		08/04/2016		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	12/04/2016		12/04/2016		Sí	4.0
40	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	6.0
41	EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2015		Sí	6.0
42	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	6.0
43	EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		30/09/2016		Sí	6.0
44	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	6.0
45	EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 4: Realizado	5-Entregables Intermedios	27/12/2016		27/12/2016		Sí	1.0
46	EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 4.1: Realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		30/12/2016		Sí	1.0
47	EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado	3-Adjudicación	02/02/2017		02/02/2017		Sí	1.0
48	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	03/02/2017		03/02/2017		Sí	1.0
49	PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada	1-Solicitud de Información	06/02/2017		06/02/2017		Sí	1.0
50	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1	5-Entregables Intermedios	02/03/2017		02/03/2017		Sí	1.0
51	EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 5: Realizado	5-Entregables Intermedios	02/04/2017		02/04/2017		Sí	1.0
52	EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado	3-Adjudicación	02/04/2017		02/04/2017		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 5.1: Realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	02/04/2017		02/04/2017		Sí	1.0
54	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	03/04/2017		03/04/2017		Sí	1.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
55	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1	5-Entregables Intermedios	02/05/2017		02/05/2017		Sí	1.0
56	EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 6 Realizado	5-Entregables Intermedios	02/06/2017		02/06/2017		Sí	1.0
57	EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 6.1: Realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	02/06/2017		02/06/2017		Sí	1.0
58	EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado	3-Adjudicación	09/06/2017		09/06/2017		Sí	1.0
59	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	12/06/2017		12/06/2017		Sí	1.0
60	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1	5-Entregables Intermedios	11/07/2017		11/07/2017		Sí	1.0
61	EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE-Chimborazo. Planilla 2	5-Entregables Intermedios	12/08/2017		11/08/2017		Sí	1.0
62	EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE-Chimborazo. Planilla 3	5-Entregables Intermedios	11/09/2017		11/09/2017		Sí	1.0
63	EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE-Chimborazo. Planilla 4	5-Entregables Intermedios	20/10/2017		20/10/2017		Sí	1.0
64	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas, Derrumbes menores	5-Entregables Intermedios	25/10/2017		25/10/2017		Sí	1.0
65	EJECUCIÓN: Desmonte, roza a mano, ayuda emergente	5-Entregables Intermedios	01/11/2017		01/11/2017		Sí	1.0
66	EJECUCIÓN: Limpieza de todos los sistemas de drenaje	5-Entregables Intermedios	25/11/2017		25/11/2017		Sí	1.0
67	EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 7: Realizado	4-Inicio de Trabajo	21/12/2017		21/12/2017		Sí	1.0
68	EJECUCIÓN: limpieza de derrumbes y ayudas emergentes	5-Entregables Intermedios	25/12/2017		25/12/2017		Sí	1.0
69	EJECUCIÓN:Recepción definitiva. Firmada FASE 7.1 Realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	27/12/2017		27/12/2017		Sí	1.0
70	EJECUCIÓN: Inicio de trabajos	4-Inicio de Trabajo	15/03/2018		15/03/2018		Sí	1.0
71	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias	5-Entregables Intermedios	15/12/2018	15/12/2018			No	1.0
72	EJECUCIÓN: Recepción definitiva	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018	31/12/2018			No	1.0



**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	La obra esta en Curso	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	26/08/2016
2	Las obras estan en ejecución	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	29/09/2015
3	El mantenimiento esta en proceso	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	27/10/2015

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
4	Las obras siempre esta en constante mantenimiento	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	29/06/2015
5	El mantenimiento vial en la Provincia esta en ejecución	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	23/12/2014
6	la obra esta en ejecución	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	19/08/2014
7	Dr. Hermuy Calle V.	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	25/02/2014

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de microempresas contratadas		233.33 %	6	14	01/01/2012	Jul-Sep
2	Kilómetros Mantenidos		100.00 %	432.45	432.45	01/01/2012	Noviembre




**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	21,274,582.77 **
Costo Total:	20,000,000.00
Total Devengado:	16,274,772.11
% Costo Total Devengado:	81.37 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 81.37 %

**Perfil Económico 2018**

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	9,604,116.83	3,045,678.36	0.00	12,649,795.19
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	8,938,994.31	3,042,163.86	0.00	11,981,158.17
<b>Ppto. Codificado</b>	14,931,406.04	6,491,432.66	0.00	21,422,838.70
<b>Ppto. Comprometido</b>	11,818,200.79	1,522,918.71	0.00	13,341,119.50
Planeado - Codificado (2018)		-3,445,754.30		
<b>Programado a Devengar</b>	11,375,850.43	6,491,432.66	0.00	17,867,283.09
<b>Ppto. Devengado</b>	14,783,150.11	1,491,622.00	0.00	16,274,772.11
<b>Pagado Real</b>	11,425,574.86	1,332,317.21	0.00	12,757,892.07
Estimado a fin de año	* 14,783,150.11	0.00	0.00	14,783,150.11
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-3,407,299.68	6,491,432.66	0.00	3,084,132.98
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 129.95 %	22.98 %	0.00 %	91.09 %
<b>Ppto. Codificado 998</b>	27,690.38	0.00	0.00	27,690.38
<b>Ppto. Devengado 998</b>	27,690.38	0.00	0.00	27,690.38

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018**

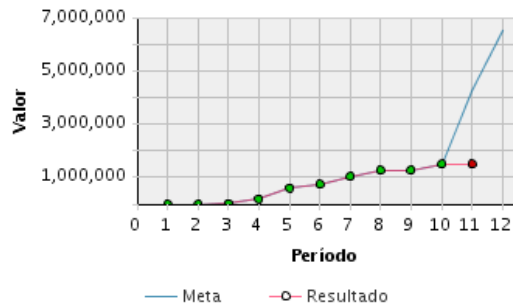

**Presupuesto Mensual 2018**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	14,655.98	14,655.98	14,655.98	14,655.98	100.00 %		0.23 %
Abr	174,049.95	174,049.95	188,705.93	188,705.93	100.00 %		2.91 %
May	415,462.98	415,462.98	604,168.91	604,168.91	100.00 %		9.31 %
Jun	129,912.38	129,912.38	734,081.29	734,081.29	100.00 %		11.31 %
Jul	307,905.68	307,905.68	1,041,986.97	1,041,986.97	100.00 %		16.05 %
Ago	225,472.88	225,472.88	1,267,459.85	1,267,459.85	100.00 %		19.53 %
Sep	14,013.99	14,013.99	1,281,473.84	1,281,473.84	100.00 %		19.74 %
Oct	209,798.63	209,798.63	1,491,272.47	1,491,272.47	100.00 %		22.97 %
Nov	2,750,088.10	349.53	4,241,360.57	1,491,622.00	35.17 %		22.98 %
Dic	2,250,072.09		6,491,432.66				
<b>Total</b>	<b>6,491,432.66</b>	<b>1,491,622.00</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
17	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, estudios de ingeniería de puntos críticos.
18	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
19	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2011	A.1.pdf	11/03/2014
2	A.2 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2012	A.2.pdf	11/03/2014
3	A.3 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2012	A.3.jpg	11/03/2014
4	A.4 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo febrero 2012 - Microempresa	A.4.pdf	13/03/2014
5	A.5 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo marzo 2012 - Microempresa	A.5.pdf	13/03/2014
6	A.6 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo abril 2012 - Microempresa	A.6.pdf	13/03/2014
7	A.7 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo mayo 2012	A.7.pdf	13/03/2014
8	A.8 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo junio 2012 - Microempresa	A.8.pdf	13/03/2014
9	A.9 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo julio 2012 - Microempresa	A.9.pdf	13/03/2014
10	Acta Definitiva Alausi Huigra 13-02-2015	Acta_Definitiva_Alausi_Huigra_13-02-2015.pdf	02/07/2015
11	Acta Definitiva Calpi San Juan El Arenal 13-02-2015	Acta_Definitiva_Calpi_San_Juan_El_Arenal_13-02-2015.pdf	02/07/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	Acta Definitiva Guasuntos Chunchi 13-02-2015	Acta_Definitiva_Guasuntos_Chunchi_13-02-2015.pdf	02/07/2015
13	Acta Definitiva Huigra Tomebamba 13-02-2015	Acta_Definitiva_Huigra_Tomebamba__13-02-2015.pdf	02/07/2015
14	Acta Definitiva Riobamba Penipe 13-02-2015	Acta_Definitiva_Riobamba_Penipe_13-02-2015.pdf	02/07/2015
15	Acta Definitiva Tomebamba El Triunfo 13-02-2015	Acta_Definitiva_Tomebamba_El_Triunfo__13-02-2015.pdf	02/07/2015
16	ASOCIACION HITO 25.- Firma de contrato	D.7.pdf	05/06/2015
17	ASOCIACIÓN HITO 71 INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	k009.pdf	03/04/2018
18	B.1 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo agosto 2012 - Microempresa	B.1.pdf	13/03/2014
19	B.2 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo septiembre 2012 - Microempresa	B.2.pdf	13/03/2014
20	B.3 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo octubre 2012 - Microempresa	B.3.pdf	13/03/2014
21	B.4 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo noviembre 2012 - Microempresa	B.4.pdf	13/03/2014
22	B.5 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo diciembre 2012 - Microempresa	B.5.pdf	13/03/2014
23	B.6 ASOCIACION HITO 1.- Acta recepción Definitiva Mantenimiento rutinario Calpi - San Juan - El Arenal	B.6.pdf	13/03/2014
24	B.6 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo octubre 2013 - Microempresa	B.6.pdf	13/03/2014
25	B.7 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo diciembre 2013 - Microempresa	B.7.pdf	13/03/2014
26	B.8 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo enero 2014- microempresas	B.8.pdf	13/03/2014
27	B.9 ASOCIACION HITO 4.- Acta recepción Definitiva Mantenimiento rutinario Calpi - San Juan - El Arenal	B.9.pdf	13/03/2014
28	C.1 ASOCIACION HITO 10.- Firma Contrato Mantenimiento Calpi San Juan El Arenal	C.1.pdf	13/03/2014
29	C.2 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo febrero 2014- microempresas	C.2.pdf	13/03/2014
30	C.3 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo marzo 2014- microempresas	C.3.pdf	07/04/2014
31	C.4 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo abril 2014- microempresas	C.4.pdf	07/05/2014
32	C.5 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo mayo 2014- microempresas	C.5.pdf	06/06/2014
33	C.6 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo junio 2014- microempresas	C.6.pdf	03/07/2014
34	C.7 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo julio 2014- microempresa	C.7.pdf	03/08/2014
35	C.8 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo agosto 2014- microempresa	C.8.pdf	11/09/2014
36	C.9 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo septiembre 2014- microempresa	C.9.pdf	06/10/2014
37	CEDULA PRESUPUESTARIA 2012 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO	cedula_presupuestaria_2012_mantenimiento_vial_provincia	30/07/2016
38	CEDULA PRESUPUESTARIA 2013 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO	cedula_presupuestaria_2013_mantenimiento_vial_provincia	30/07/2016
39	CEDULA PRESUPUESTARIA 2014 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO	cedula_presupuestaria_2014_mantenimiento_vial_provincia	30/07/2016
40	CEDULA PRESUPUESTARIA 2015 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO	cedula_presupuestaria_2015_mantenimiento_vial_provincia	30/07/2016
41	CEDULA PRESUPUESTARIA 2016 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO	cedula_presupuestaria_2016_mantenimiento_vial_provincia	30/07/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
42	Contrato Mantenimiento Alausi Huigra 15-05-2015	Contrato_Mantenimiento_Alausi_Huigra__15-05-2015.pdf	02/07/2015
43	Contrato Mantenimiento Calpi San Juan El Arenal 06-05-2015	Contrato_Mantenimiento_Calpi_San_Juan_El_Arenal_06-05-2015.pdf	02/07/2015
44	Contrato Mantenimiento Guasuntos Chunchi 15-05-2015	Contrato_Mantenimiento_Guasuntos_Chunchi__15-05-2015.pdf	02/07/2015
45	Contrato Mantenimiento Huigra Tomebamba 15-05-2015	Contrato_Mantenimiento_Huigra_Tomebamba__15-05-2015.pdf	02/07/2015
46	Contrato Mantenimiento Riobamba Penipe 15-05-2015	Contrato_Mantenimiento_Riobamba_Penipe__15-05-2015.pdf	02/07/2015
47	Contrato Mantenimiento Tomebamba El Triunfo 15-05-2015	Contrato_Mantenimiento_Tomebamba_El_Triunfo_15-05-2015.pdf	02/07/2015
48	D.1 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo octubre 2014- microempresa	D.1.pdf	07/11/2014
49	D.2 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo diciembre 2014- microempresa	D.2.pdf	08/01/2015
50	D.3 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo enero 2015- microempresa	D.3.pdf	09/02/2015
51	D.4 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo febrero 2015- microempresa	D.4.pdf	09/03/2015
52	D.5 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo marzo 2015- microempresa	D.5.pdf	07/04/2015
53	D.6. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo abril 2015- microempresa	D.6.pdf	08/05/2015
54	D.7. ASOCIACION HITO 26.- Contrato legalizado	D.7.pdf	09/06/2015
55	D.8. ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos	D.8.pdf	09/06/2015
56	D.9. ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos	D.9.pdf	08/07/2015
57	E.1 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos	E.1	06/08/2015
58	E.10 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Mayo 2016	E.10.pdf	03/06/2016
59	E.11 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Junio 2016	E.11.pdf	11/07/2016
60	E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Agosto 2016	E.12.pdf	01/09/2016
61	E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Julio 2016	E.12.pdf	03/08/2016
62	E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Octubre 2016	E.12...pdf	01/11/2016
63	E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Septiembre 2016	E.12..pdf	04/10/2016
64	E.2 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos	E.2.pdf	08/09/2015
65	E.3 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos	E.3.pdf	07/10/2015
66	E.4 ASOCIACIÓN HITO 32.- Limpieza de derrumbes	E.4	06/11/2015
67	E.5 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo noviembre 2015	E.5.pdf	07/12/2015
68	E.6 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo diciembre 2015	E.6	13/01/2016
69	E.7 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo enero 2016	E.7.pdf	10/02/2016
70	E.8 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo febrero 2016	E.8.pdf	09/03/2016
71	E.9 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo marzo 2016	E.9.pdf	08/04/2016
72	F.7. ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Noviembre 2016	F.7.pdf	05/12/2016
73	F.8 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Diciembre 2016	F.8.pdf	04/01/2017
74	F.9 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo FEBRERO 2017	F.9..pdf	04/03/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
75	G.1. ASOCIACIÓN HITO 51 Mantenimiento Administración Directa ENERO 2016	%_de_mantenimiento_de_la_RVE_de_Chimborazo.jpg	04/03/2017
76	G.2 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo ABRIL 2017	G.2.pdf	05/05/2017
77	G.3 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo MAYO 2017	G3.pdf	05/06/2017
78	G.4 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo JUNIO 2017	G.4..pdf	05/07/2017
79	G.5 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo JULIO 2017	K009.pdf	04/08/2017
80	G.6 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo AGOSTO 2017	K009.pdf	05/09/2017
81	G.7 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo SEPTIEMBRE 2017	K009.pdf	05/10/2017
82	G.7 ASOCIACIÓN HITO 64 Informe Ejecutivo OCTUBRE 20178	G.8.pdf	01/11/2017
83	G.9 ASOCIACIÓN HITO 66 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	K009.pdf	04/12/2017
84	H.1 ASOCIACIÓN HITO 67 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017	k009..pdf	04/01/2018

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Armijo Logroño, Angel Eduardo	Fiscalizador	Experto de Infraestructura Provincial	aarmijo@mtop.gob.ec	
Armijo Logroño, Angel Eduardo	Supervisor Conservación Vial	Experto de Infraestructura Provincial	aarmijo@mtop.gob.ec	
Horna Sanipatín, Wilson	Coordinador Técnico	Supervisor Construcciones	whorna@mtop.gob.ec	023974600
Narváez , Pablo	Supervisor Financiero			
Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Director Provincial de Chimborazo	Directora Provincial de Chimborazo, Encargada	isantillan@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
35904_1.jpg	05/06/2016
