

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Cañar

PROYECTO: K023 MTOP-Mantenimiento Vial de la Provincia del Cañar

Líder del Proyecto:	Dután Sanango, Italo Medardo (imдутan@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, Provincia - Cañar, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3657	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,797,233.31
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/03/2022
Fecha de última actualización:	05/03/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	Fecha del siguiente Hito:	01/04/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION:

MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR

EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA MTOP

SERVICIO: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las poblaciones que se encuentran en las vías que se dan mantenimiento vial permanente.

LINEA BASE: A lo largo del proyecto, Las viviendas están concentradas en las cercanías de los centros comunales y otras dispersas. Para la construcción de las viviendas se usa principalmente el cemento, ladrillo, bloque, techos de eternit, ardex, teja vidriada de fibra plástica. Las casas son de variados modelos y colores, en algunos casos modelos adoptados de las ciudades con espacios de parqueaderos, corredores amplios.

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la capacidad de circulación en la vía, imagen y seguridad, de las poblaciones que se encuentran en la vía con la dotación de infraestructura vial en buen estado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- 1.1 Limpieza de cunetas.
- 1.2 Limpieza de bordillos
- 1.3 Limpieza de Alcantarillas
- 1.4 limpieza de derrumbes.
- 1.5 Bacheo Asfáltico.
- 1.6 Estabilización de sitios críticos.

MICROEMPRESAS:

- Cantera Chauca
- Matapin
- Zhoray

Beneficios Cualitativos

Mediante el mantenimiento vial se reduce el costo del transporte, los tiempos de traslado, se extiende el tiempo de vida útil de la vía y se brinda seguridad al conductor y peatón.

Tipo de Beneficiario

Comerciantes
Agricultores
Sector Turístico
Población en general


Restricciones

Tiempo: El plazo para el mantenimiento es anual.
Costo: El valor total para el mantenimiento es aproximadamente de USD \$500.000,00 por año.
Alcance Se espera contar con la red vial estatal de la provincia del Cañar en condiciones óptimas para el Tránsito vehicular y peatonal.
Recursos: Personal y maquinaria del MTOP- Cañar, así como contratación de Asociación de Microempresarios.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 62.75 %
Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 31/03/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

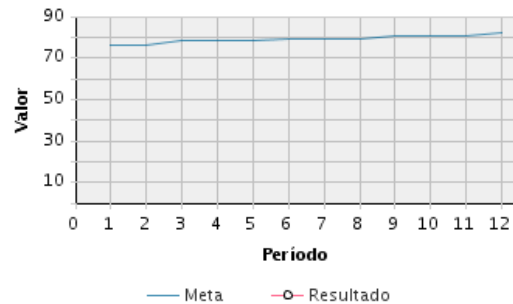

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	76 %	76 %	78 %	78 %	78 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	82 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián. Se ha contratado 2 microempresas desde el 26 y 27 de febrero de 2019, las mismas que atienden los tramos: Zhud Río Angas y Matrama Mazar.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/03/2019 - 10:29 AM
ENERO 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián. Se ha contratado 2 microempresas desde el 26 y 27 de febrero de 2019, las mismas que atienden los tramos: Zhud Río Angas y Matrama Mazar.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/03/2019 - 10:28 AM
ENERO 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	05/02/2019 - 08:14 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se ha iniciado la gestión para obtener recursos para la contratación de microempresas.		
DICIEMBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vía Zhud - Biblián. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Río Angas.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	04/01/2019 - 08:09 AM
NOVIEMBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; Y Zhud - Río Angas.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/12/2018 - 05:07 PM
OCTUBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; Y Zhud - Río Angas.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/11/2018 - 04:09 PM
SEPTIEMBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/10/2018 - 12:31 PM
AGOSTO 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Buestan Toral, José Remigio	05/09/2018 - 05:30 PM
JULIO 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Dután Sanango, Italo Medardo	03/08/2018 - 10:45 AM
JUNIO 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/07/2018 - 12:31 PM
Mayo2018 Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/06/2018 - 04:46 PM
Abril 2018 Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 4 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/05/2018 - 02:08 PM
Marzo 2018 Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 4 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/04/2018 - 04:18 PM
Febrero 2018	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:52 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Descanso - Azogues, y Troncal - Puerto Inca. No se ha logrado contratar a las microempresas por falta de aprobación del aval para el servicio de voluntariado.		
ENERO 2018 Se realiza mantenimiento de la vía matrama - Mazar por administración directa, puesto que no se ha podido contratar a las microempresas.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:50 AM
DICIEMBRE 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, con el propósito de mantener la vía en condiciones de transitabilidad confiable para los usuarios.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/01/2018 - 04:48 PM
NOVIEMBRE 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, con el propósito de mantener la vía en condiciones de transitabilidad confiable para los usuarios.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/12/2017 - 04:15 PM
OCTUBRE 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano. Además se coloca tachas en la vía Azogues - Matrama con la ayuda de los microempresarios.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 11:48 AM
SEPTIEMBRE 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/10/2017 - 03:38 PM
AGOSTO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/09/2017 - 05:53 PM
JULIO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano	García González, Mariana Alexandra	05/08/2017 - 09:29 AM
JUNIO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante la limpieza constante	García González, Mariana Alexandra	05/07/2017 - 10:29 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de derrumbes provocados debido a la fuerte época invernal en la red vial estatal.. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano.		
MAYO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte época invernal en la red vial estatal.. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar con tres microempresas de conservación vial contratadas	Guillen Luna, Andrés Ismael	01/06/2017 - 11:28 AM
ABRIL 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte época invernal en la red vial estatal.. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar con tres microempresas de conservación vial contratadas	García González, Mariana Alexandra	05/05/2017 - 12:37 PM
MARZO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte época invernal Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 02:13 PM
FEBRERO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte época invernal Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 02:12 PM
FEBRERO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/03/2017 - 01:35 PM
DICIEMBRE 2016 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes y bacheo en la carretera Matrama-Mazar, en la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana) Y en la carretera Zhud-Biblián se encuentran realizando limpieza de cunetas, bordillos y roza a mano	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/01/2017 - 07:03 PM
NOVIEMBRE 2016 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes y bacheo en la carretera Matrama-Mazar, en la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana) Y en la carretera Zhud-Biblián se encuentran realizando limpieza de cunetas, bordillos y roza a mano	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/12/2016 - 03:07 PM
OCTUBRE 2016 los contratos de las microempresas culmino por falta de recursos . Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazary la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana)	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/11/2016 - 06:33 PM
SEPTIEMBRE 2016 La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de alcantarillas desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/10/2016 - 07:46 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar		
<p>AGOSTO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de alcantarillas desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	01/09/2016 - 07:51 AM
<p>JULIO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 5+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/08/2016 - 12:30 PM
<p>JUNIO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 10+000 al 19+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/07/2016 - 02:32 PM
<p>MAYO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/06/2016 - 08:12 PM
<p>ABRIL 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 30+000 al Km 60+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/05/2016 - 07:43 AM
<p>MARZO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 00+000 al Km 30+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/04/2016 - 09:32 PM
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 30+000 al Km 50+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/03/2016 - 05:26 PM
<p>ENERO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 20+000 al Km 50+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2016 - 10:45 AM
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 30+000 al Km 69+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2016 - 07:38 AM
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 30+000 al Km 69+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/12/2015 - 10:21 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP continua con la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/11/2015 - 10:25 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP continua con la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/10/2015 - 04:22 PM
<p>AGOSTO 2015</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2015 - 10:24 AM
<p>JULIO 2015</p> <p>Por la fuerte temporada invernal En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de derrumbes y alcantarillas con personal y maquinaria del MTOP Km 30 +000 al 69+000..</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2015 - 09:28 PM
<p>JUNIO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños desde el Km 40 +000 al 69+000..</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/07/2015 - 03:42 PM
<p>MAYO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 10+000 al 19+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/06/2015 - 02:17 PM
<p>ABRIL 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 00+000 al 10+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/05/2015 - 07:48 AM
<p>MARZO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 10+000 al 19+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2015 - 03:35 PM
<p>FEBRERO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos. E la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/03/2015 - 09:41 AM
<p>ENERO 2014</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y limpieza del derecho de via. en la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando el bacheo asfaltico desde el Km 6+000 al 19+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/02/2015 - 03:21 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>Se esta realizando el bacheo asfaltico en la carretera Biblian-Azogues-Descanso, antigua panamericana, tambien la limioieza de cunetas y bordillos en la carretera Azogues-Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>06/01/2015 - 11:49 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos.</p> <p>Tambien se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos del tramo Azogues a Matrama.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>05/12/2014 - 03:21 PM</p>
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos.</p> <p>Tambien se esta realizando la limpieza de derrumbes pequeños en el tramo comprendido entre el Km 50 + 000 al 60 +000.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>09/11/2014 - 09:31 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de derrumbes pequeños.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>06/10/2014 - 12:09 PM</p>
<p>AGOSTO 2014</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta restituyendo una alcantarilla en el sector de Buenos Aires en la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>07/09/2014 - 08:44 PM</p>
<p>JULIO 2014</p> <p>En la carretera Matrama-mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos, como tambien de derrumbes pequeños con personal y maquinaria del MTOP y la microempresa.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>05/08/2014 - 10:39 PM</p>
<p>JUNIO 2014</p> <p>En la carretera Matrama-mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos, como tambine de derrumbes pequeños.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>10/07/2014 - 08:31 AM</p>
<p>MAYO 2014</p> <p>En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos y tambien alcantarillas. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos como tambien la limpieza de derrumbes pequeños.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>03/06/2014 - 02:34 PM</p>
<p>ABRIL 2014</p> <p>En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos como tambien la limpieza de alcantarillas.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>04/05/2014 - 08:05 PM</p>
<p>MARZO 2014</p> <p>En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando el sellado de fisuras. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos. Se esta limpiando alcantarillas con ayuda de la excavadora 320 en el sector de Buenos Aires.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>07/04/2014 - 07:40 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2014 En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando mla limpieza de cunetas, En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de Alcantarillas.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	28/02/2014 - 09:31 AM
ENERO 2014 En la carrtera Matrama-Mazar, en el tramo entre Buenos Aires y Rivera se esta realizando el bacheo con mezcla asfaltica.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2014 - 07:27 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. Falta de recursos CAUSARÍA el retraso del mantenimiento de la vía	05/12/2018		60 %	80	48	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2014	3-Adjudicación	10/01/2014		10/01/2014		Sí	2.0
2	PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2014	3-Adjudicación	10/01/2014		10/01/2014		Sí	2.0
3	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 30+000 al 60+000 en la carretera Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	15/05/2014		15/05/2014		Sí	2.0
4	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 00+000 al 19+000 en la carretera Descanso-Biblian	5-Entregables Intermedios	15/06/2014		15/06/2014		Sí	2.0
5	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	15/07/2014		15/07/2014		Sí	2.0
6	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-	5-Entregables Intermedios	15/07/2014		15/07/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP							
7	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera Azogues-Matrama-Mazar Realizado	5-Entregables Intermedios	15/08/2014		15/08/2014		Sí	3.0
8	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera biblian-Azogues-Descanso Realizado	5-Entregables Intermedios	15/09/2014		15/09/2014		Sí	3.0
9	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 00+000 al 30+000 en la carretera Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	15/10/2014		15/10/2014		Sí	2.0
10	EJECUCION: Limpieza de derrumbes en la carretera matrrama-mazar	5-Entregables Intermedios	15/11/2014		15/11/2014		Sí	3.0
11	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	3.0
12	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
13	PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2015	3-Adjudicación	10/01/2015		10/01/2015		Sí	2.0
14	PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2015	3-Adjudicación	10/01/2015		10/01/2015		Sí	2.0
15	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 30+000 al 60+000 en la carretera Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	15/05/2015		15/05/2015		Sí	2.0
16	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 00+000 al 19+000 en la carretera Descanso-Biblian	5-Entregables Intermedios	15/06/2015		15/06/2015		Sí	2.0
17	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2015 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	15/07/2015		15/07/2015		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2015 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	15/07/2015		15/07/2015		Sí	3.0
19	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera Azogues-Matrama-Mazar Realizado	5-Entregables Intermedios	15/08/2015		15/08/2015		Sí	3.0
20	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera biblian-Azogues-Descanso Realizado	5-Entregables Intermedios	15/09/2015		15/09/2015		Sí	3.0
21	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 00+000 al 30+000 en la carretera Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		15/10/2015		Sí	3.0
22	EJECUCION: Limpieza de derrumbes en la carretera matrama-mazar	5-Entregables Intermedios	15/11/2015		15/11/2015		Sí	3.0
23	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2015 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	3.0
24	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	3.0
25	EJECUCION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2016	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		16/05/2016		Sí	2.0
26	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	19/07/2016		19/07/2016		Sí	1.0
27	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	19/07/2016		19/07/2016		Sí	1.0
28	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP							
29	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
30	EJECUCION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2017	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/02/2017		Sí	1.0
31	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de enero a junio 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	24/07/2017		31/12/2017		Sí	1.0
32	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	24/07/2017		31/12/2017		Sí	1.0
33	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	1.0
34	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	1.0
35	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscritas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2017		31/12/2017		Sí	1.0
36	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a junio 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
37	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.5
38	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Diciembre del 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.0
39	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Troncal - Puerto Inca en el periodo de Enero a Diciembre del 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.0
40	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio - diciembre 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.0
41	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Febero a Marzo del 2019 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	29/03/2019	01/04/2019			No	2.0
42	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Abril a Junio del 2019 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	28/06/2019	01/07/2019			No	1.0
43	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Julio a Septiembre del 2019 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	01/10/2019			No	1.0
44	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2019	03/02/2020			No	0.5
45	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Octubre a Diciembre del 2019 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
46	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	01/04/2020			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Febero a Marzo del 2020 Realizado a satisfaccion del MTOP							
47	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Abril a Junio del 2020 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	01/07/2020		▼	No	1.0
48	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Julio a Septiembre del 2020 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	01/10/2020		▼	No	1.0
49	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscritas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2020	31/12/2020		●	No	0.5
50	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Octubre a Diciembre del 2020 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	01/01/2021		▼	No	1.0
51	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Febero a Marzo del 2021 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/03/2021	02/04/2021		▼	No	1.0
52	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Abril a Junio del 2021 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	02/07/2021		▼	No	1.0
53	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Julio a Septiembre del 2021 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	01/10/2021		▼	No	1.0
54	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2021	31/12/2021		●	No	0.5
55	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021		●	No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	en el periodo de Octubre a Diciembre del 2020 Realizado a satisfaccion del MTOP							
56	CIERRE: Informes del Supervisor aprobados	5-Entregables Intermedios	04/01/2022	06/01/2022			No	1.0
57	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	10/01/2022	14/01/2022			No	1.0
58	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	15/02/2022	15/02/2022			No	2.0
59	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	5-Entregables Intermedios	22/02/2022	22/02/2022			No	1.0
60	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	25/02/2022	25/02/2022			No	1.0
61	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	15/03/2022	15/03/2022			No	1.5
62	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/03/2022	31/03/2022			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión Positiva: Limpieza de cunetas y bordillos	Quishpi Vélez, Luis Manuel	{PR} - Provincia - CAÑAR	31/08/2017
2	Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza y mantenimiento	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	20/07/2016
3	Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza en la vía.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/04/2016
4	Supervisión Positiva- Se realizan mantenimientos en diferentes vías	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/11/2015
5	Limpieza de cunetas y lastrado de las vías en las Parroquias	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/05/2015
6	Verificación de la terminación del Proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2015
7	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/10/2014
8	Mantenimiento vial, limpieza de derrumbes	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/05/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Km de la Red Vial en buen estado		100.00 %	0.08	0.08	01/01/2014	Febrero
2	Porcentaje de cumplimiento economico del cronograma		90.00 %	0.02	0.018	01/01/2014	Febrero


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,797,233.31 **
Costo Total:	830,000.00
Total Devengado:	2,478,773.20
% Costo Total Devengado:	298.65 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 298.65 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,628,872.00	3,140,000.00	0.00	4,768,872.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	2,401,029.99	324,433.13	0.00	2,725,463.12
Ppto. Codificado	2,091,963.90	324,433.13	0.00	2,416,397.03
Ppto. Comprometido	1,643,552.68	5,973.02	0.00	1,649,525.70
Planeado - Codificado (2019)		2,815,566.87		
Programado a Devengar	2,732,384.37	324,433.13	0.00	3,056,817.50
Ppto. Devengado	2,472,800.18	5,973.02	0.00	2,478,773.20
Pagado Real	1,576,194.53	5,973.02	0.00	1,582,167.55
Estimado a fin de año	* 2,472,800.18	0.00	0.00	2,472,800.18
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	259,584.19	324,433.13	0.00	584,017.32
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 90.50 %	1.84 %	0.00 %	81.09 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

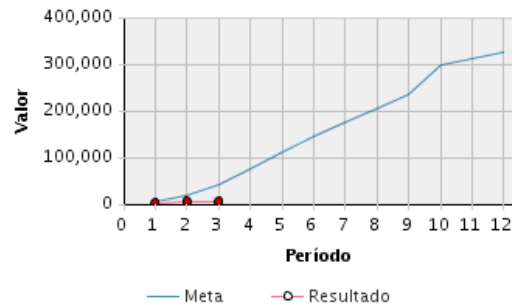

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	4,507.69	2,877.22	4,507.69	2,877.22	63.83 %		0.89 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	12,507.69	3,095.80	17,015.38	5,973.02	35.10 %		1.84 %
Mar	25,313.95	0.00	42,329.33	5,973.02	14.11 %		1.84 %
Abr	32,984.78		75,314.11				
May	36,984.78		112,298.89				
Jun	32,484.78		144,783.67				
Jul	31,718.98		176,502.65				
Ago	29,960.77		206,463.42				
Sep	27,784.76		234,248.18				
Oct	64,028.51		298,276.69				
Nov	13,857.68		312,134.37				
Dic	12,298.76		324,433.13				
Total	324,433.13	5,973.02					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
15	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		Planilla_microempresa_Sageo_marzo_2017.pdf	05/05/2017
2		Planilla_microempresa_Matapin_marzo_2017.pdf	05/05/2017
3		Planilla_microempresa_Zhoray_marzo_2017.pdf	05/05/2017
4		Orden_de_compra_La_Primavera_-_Septiembre.pdf	01/11/2017
5	A1-Informe sitop-mayo-05-micro-Matapin	Inf-sitop-mayo05--micro-Matapin.pdf	09/06/2015
6	A10-Inf-sitop-junio-2017	informe_ejecutivo_El_Descanso.pdf	05/07/2017
7	A11-Inf-sitop-junio-2017	Matrama_Mazar_tramo_1.pdf	05/07/2017
8	A12-Inf-sitop-junio-2017	Matrama_Mazar_tramo_2.pdf	05/07/2017
9	A13-Inf-sitop-junio-2017	Informe_Troncal_Puerto_Inca.pdf	05/07/2017
10	A2-Informe-sitop-mayo-05-micro-Zhoray	Inf-sitop-mayo-05-micro-Zhoray.pdf	09/06/2015
11	A3-Informe sitop-junio-05-micro-Sageo	Informe_sitop_junio-05_micro-Sageo.pdf	08/07/2015
12	A4-Informe sitop junio-05-micro-Matapin	Informe_sitop_junio-05_micro-Matapin.pdf	08/07/2015
13	A5-Informe-sitop-junio-05-micro-Zhoray	Informe_sitop_junio-05-micro-zhoray.pdf	08/07/2015
14	A6-Informe-sitop-micro-matapin-agos-05	Inf-sitop-matapin-agos-05.pdf	07/09/2015
15	A7-Inf-micro-sageo-junio-06	A7-Inf-micro-sageo-junio-06.pdf	04/07/2016
16	A8-Inf-sitop-julio-06-Matapin	A8-Inf-sitop-julio-06-Matapin.pdf	04/08/2016
17	A9-Inf-sitop-julio-06-Zhoray	A9-Inf-sitop-julio-06-Zhoray.pdf	04/08/2016
18	Acta de planilla 4	ACTA.pdf	05/07/2018
19	Acta de recepcion parcial Chontamarca	22348_Chontamarca_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf	05/11/2018
20	Acta de recepcion parcial Chontamarca septiembre	22348_Chontamarca_Acta_recepción_parcial_Septiembre_2018.pdf	05/11/2018
21	Acta de recepcion parcial LA PRIMAVERA	21009_La_Primavera_Acta_Recepción_Parcial_Octubre_2018.pdf	05/12/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
22	Acta de recepción parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA CHONTAMARCA	22348_Chontamarca_Acta_Recepción_Parcial_Diciembre_2018.pdf	04/01/2019
23	Acta de recepción parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA LA PRIMAVERA	21009_La_Primavera_Acta_Recepción_Parcial_Diciembre_2018.pdf	04/01/2019
24	Acta de recepción parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA MATAPIN	Acta_de_recepcion_parcial_Matapin.pdf	04/01/2019
25	Acta de recepción parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA NUEVO JAVIN	21450_Nuevo_Javin_Acta_Recepción_Parcial_Noviembre_2018.pdf	04/01/2019
26	Acta de recepción parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA SAGEO	Acta_de_recepcion_parcial_sageo_diciembre.pdf	04/01/2019
27	Acta de recepción parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA SAN ANTONIO	21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_Recepción_Parcial_Noviembre_2018.pdf	04/01/2019
28	Acta de recepción parcial NUEVO JAVIN	21450_Nuevo_Javin_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf	05/12/2018
29	Acta de recepción parcial PANCHO NEGRO	21453_Américas_Pancho_Negro_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf	05/12/2018
30	Acta de recepción definitiva	Acta_de_trabajos_microempresa_primavera.pdf	05/08/2017
31	Acta de recepción definitiva	Acta_de_trabajos_microempresa_primavera.pdf	05/08/2017
32	Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa CHONTAMARCA	22348_Chontamarca_Acta_Recepción_Definitiva_2018.pdf	04/01/2019
33	Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa LA PRIMAVERA	21009_La_Primavera_Acta_Recepción_Definitiva_2018.pdf	04/01/2019
34	Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa MATAPIN	Acta_de_recepcion_definitivo_Matapin.pdf	04/01/2019
35	Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa NUEVO JAVIN	21450_Nuevo_Javin_Acta_Recepción_Definitiva.pdf	04/01/2019
36	Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa San Antonio	21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_Recepción_Definitiva.pdf	04/01/2019
37	Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa ZHORAY	Acta_de_recepcion_definitiva.pdf	04/01/2019
38	Acta de recepción microempresa AMERICAS	_actalas_americas.pdf	05/09/2018
39	Acta de recepción microempresa AMERICAS	21453_Américas_Pancho_Negro_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
40	Acta de recepción microempresa AMERICAS	21453_Américas_Pancho_Negro_Acta_recepción_parcial_Sepiembre_2018.pdf	05/12/2018
41	Acta de recepción microempresa matapin	Acta_de_recepción_parcial_Matrama_mazar_T1.pdf	05/10/2017
42	Acta de recepción microempresa matapin	Acta_Microempresa_Matapin_-_Sep.pdf	01/11/2017
43	Acta de recepción microempresa matapin	19561_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf	05/12/2017
44	Acta de recepción microempresa matapin	19561_Acta_de_recepción_parcial_2.pdf	05/01/2018
45	Acta de recepción microempresa MATAPIN	acta_matapin.pdf	05/09/2018
46	Acta de recepción microempresa MATAPIN	21007_Acta_recepción_parcial_Matapin_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
47	Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN	_actanuevo_javin.pdf	05/09/2018
48	Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN	21450_Nuevo_Javin_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
49	Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN	21450_Nuevo_Javin_Acta_recepción_parcial_Septiembre_2018.pdf	05/12/2018
50	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	Acta_de_recepción_parcial_Truncal_P.Inca.pdf	05/10/2017
51	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	Acta_Microempresa_La_Primavera_-_Sep.pdf	01/11/2017
52	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	19558_-_Acta_Definitiva.pdf	05/12/2017
53	Acta de recepción microempresa Primavera	20489_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf	05/01/2018
54	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	acta_primavera.pdf	05/09/2018
55	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	21009_La_Primavera_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
56	Acta de recepción microempresa sageo	Acta_de_recepción_parcial_Descaso_Biblián.pdf	05/10/2017
57	Acta de recepción microempresa sageo	Acta_Microempresa_Sageo_-_Sep.pdf	01/11/2017
58	Acta de recepción microempresa sageo	19559_-Acta_Definitiva.pdf	05/12/2017
59	Acta de recepción microempresa sageo	20488_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf	05/01/2018
60	Acta de recepción microempresa SAGEO	acta_sageo.pdf	05/09/2018
61	Acta de recepción microempresa SAGEO	21008_Acta_recepción_parcial_Sageo_Agosto_2018.pdf	05/10/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
62	Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO	acta_s@n_antonio_de_paguacay.pdf	05/09/2018
63	Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO	21451_San_Antonio_Paguacay_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
64	Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO	21451_San_Antonio_Paguacay_Acta_recepción_parcial_Sepiembre_2018.pdf	05/11/2018
65	Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO	21451_San_Antonio_Paguacay_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf	05/12/2018
66	Acta de recepción microempresa zhoray	Acta_de_recepción_parcial_Matrama_Mazar_T2.pdf	05/10/2017
67	Acta de recepción microempresa zhoray	Acta_Microempresa_Zhoray_-_Sep.pdf	01/11/2017
68	Acta de recepción microempresa zhoray	19562_-_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf	05/12/2017
69	Acta de recepción microempresa zhoray	19562_-_Acta_de_recepción_parcial_2.pdf	05/01/2018
70	Acta de recepción microempresa ZHORAY	acta_zhoray.pdf	05/09/2018
71	Acta de recepción microempresa ZHORAY	21006_Acta_recepción_Zhoray_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
72	INFOMRE SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_ZHORAY.pdf	04/10/2016
73	INFOMRME SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_MATAPIN.pdf	04/10/2016
74	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	MICROEMPRESA_PRIMAVERA.pdf	05/09/2017
75	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESA_MATAPIN.pdf	05/09/2017
76	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVOMICROEMPRESA_SAGEO.pdf	05/09/2017
77	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVO_MICRO_ZHORAY.pdf	05/09/2017
78	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_ZHUD_-_CHILCHIL.pdf	03/08/2018
79	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_MATRAMA_MAZAR_T2.pdf	03/08/2018
80	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_TRONCAL_PUERTO_INCA.pdf	03/08/2018
81	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_EL_CHORRO-_EL_TRIUNFO.pdf	03/08/2018
82	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_CHILCHIL_-_EL_CHORRO.pdf	03/08/2018
83	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_MATRAMA_-_MAZAR_T1.pdf	03/08/2018
84	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJECT_DESCANSO_-_AZOG-_BI.pdf	03/08/2018
85	Informe ejecutivo mes de junio 2018	Informe_ejecutivo_mantenimiento_Chorro_el_Triunfo.pdf	05/07/2018
86	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_ZHUD-COCHANCAY.pdf	05/07/2018
87	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_SAN_ANTONIO.pdf	05/07/2018
88	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_Primavera.pdf	05/07/2018
89	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_matrama_mazar_t2.pdf	05/07/2018
90	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_descanso.pdf	05/07/2018
91	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_matrama_mazar_T1.pdf	05/07/2018
92	Informe ejecutivo mes de Marzo 2018 Descanso Biblián	informe_ejecutivo_sageo.pdf	05/04/2018
93	Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Matrama Mazar 1	Informe_ejecutivo_matapin.pdf	05/04/2018
94	Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Matrama Mazar 2	Informe_ejecutivo_zhoray.pdf	05/04/2018
95	Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Troncal Puerto Inca	informe_ejecutivo_PRIMAVERA.pdf	05/04/2018
96	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	Informe_ejecutivo_Zhud_-_Chilchil.pdf	05/06/2018
97	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	Informe_ejecutivo_Chilchil_-_El_Chorro.pdf	05/06/2018
98	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	Informe_ejecutivo_El_Chorro_-_El_Triunfo.pdf	05/06/2018
99	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	Informe_ejecutivo_tramo_1.pdf	05/06/2018
100	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	informe_ejecutivo_Troncal_Puerto.pdf	05/06/2018
101	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	informe_ejecutivo_zhoray_tramo_2.pdf	05/06/2018
102	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	informe_ejecutivo_Azogues_-_Descanso.pdf	05/06/2018
103	Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Mensual_Microempresa_La_Primavera_-_Sep.pdf	01/11/2017
104	Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Mensual_Microempresa_Matapin_-_Sep.pdf	01/11/2017
105	Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Mensual_Microempresa_Sageo_-_Sep.pdf	01/11/2017
106	Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Mensual_Microempresa_Zhoray_-_Sep.pdf	01/11/2017
107	Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Descanso Biblián	Informe_Ejecutivo_Sageo.pdf	05/10/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
108	Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Matrama Mazar 1	Informe_ejecutivo_Matapin.pdf	05/10/2017
109	Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Matrama Mazar 2	Informe_ejecutivo_Zhoray.pdf	05/10/2017
110	Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Troncal Puerto Inca	Informe_Ejecutivo_Primavera.pdf	05/10/2017
111	informe sitop matapin octubre	microempresa_matapin.pdf	05/11/2016
112	informe sitop octubre sageo	miroempresa_sageo.pdf	05/11/2016
113	INFORME SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_SAGEO.pdf	04/10/2016
114	Informe-sitop-micro-sageo-agos-05	Inf-sitop-sageo-agos-05.pdf	07/09/2015
115	informese sitop octubre zhoray	miroempresa_zhoray.pdf	05/11/2016
116	Orden de Compra Microempresa Matapin	19561_Orden_de_compra.pdf	05/12/2017
117	Planilla mes de junio de 2017 Troncal Puerto Inca	PLANILLA_MICROEMPRESA_PRIMAVERA.pdf	05/07/2017
118	Planilla mes de mayo de 2017 Tramo 1	PLANILLA_MICROEMPRESA_MATAPIN.pdf	05/07/2017
119	Planilla mes de mayo de 2017 Tramo 2	PLANILLA_MICROEMPRESA_ZHORAY.pdf	05/07/2017
120	Planilla mes de mayo el Descanso	PLANILLA_MICROEMPRESA_SAGEO.pdf	05/07/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Chaca Álvarez, Ivan Patricio	Titular	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	ichaca@mtop.gob.ec	023974600
Chaca Álvarez, Ivan Patricio	Lider de Proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	ichaca@mtop.gob.ec	023974600
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
75724_1.jpg	05/04/2018
