

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6

Dirección Provincial Morona Santiago

PROYECTO: K043 MTOP- Mantenimiento Vial de la Provincia de Morona Santiago

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto: | Tipan Guañuna, Jairo Fernando (jtipan@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Quezada Jara, Mónica Fabiola | Programas Relacionados: | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, Provincia - Morona Santiago |
| Titular: | Saavedra Correa, Jose Luis | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.506.3661 | TIR: | 20.00 % |
| Objetivos Operativos: | 4 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 12,031,896.72 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/03/2012 - 31/01/2022 |
| Fecha de última actualización: | 01/03/2019 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2013 |
| Modificado por: | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | Fecha del siguiente Hito: | 30/06/2019 |

DATOS GENERALES

Descripción

La realización del Manteamiento de las vías que se encuentran a cargo del MTOP en la Provincia de Morona Santiago.

Contratista: Varios contratos con diferentes contratistas, como Microempresas, etc.

Microempresas: 21 de Marzo, Valle del río, Esperanzas del futuro, Luchando por el Futura, Brisas del Sangay, Brisas del Upano,

Objetivo: Mejorar el nivel de servicio del usuario, integrando zonas productivas agrícolas, ganaderas, turísticas y mineras, implementando mano de obra directa e indirecta, servicio directo a las poblaciones de las Provincias del Azuay, Morona y el resto del país.

Linea base.- proyecto se encuentra a nivel de carpeta asfáltica con cunetas revestidas, con señalización horizontal y vertical.

monto mantenimiento año 2012\$ 4.408.599,39
 monto mantenimiento año 2013\$ 1.287.429,58
 monto mantenimiento año 2014\$ 924.557,59
 monto mantenimiento año 2015\$ 3.058.380,48
 monto mantenimiento año 2016\$ 2.000.000,00
 Valor Total \$ 11.678.967,04

Beneficios Cualitativos

Realizando el Mantenimiento se tiene las vías en buenas condiciones, lo que mejora el Comercio, la fácil salida de los productos agrícolas y ganaderos, se incrementa el Turismo tanto nacional como internacional. Es decir, mejorar el nivel de servicio, seguridad vial y costo de viaje.

Tipo de Beneficiario

Directos:
 Indirectos:
 Población de la Provincia de Morona Santiago y Provincia aledañas


Restricciones

Tiempo: la fecha limite para culmiar las obras es el 31 de Diciembre de 2014

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 70.67 %
 Fecha de Inicio: 01/03/2012 Fecha de Fin: 31/01/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

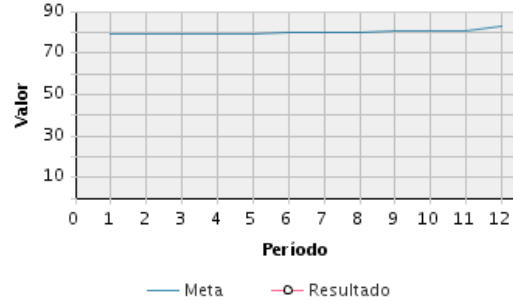

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2019 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 80 % | 80 % | 80 % | 81 % | 81 % | 81 % | 83 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| FEBRERO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc a nivel de la red vial estatal. | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 01/03/2019 - 07:38 AM |
| ENERO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 05/02/2019 - 10:58 AM |
| (HITO ASOCIADO 9) DICIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 04/01/2019 - 09:13 AM |
| (HITO ASOCIADO 9) NOVIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 05/12/2018 - 09:05 AM |
| (HITO ASOCIADO 9) OCTUBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 05/11/2018 - 04:01 PM |
| (HITO ASOCIADO 9) SEPTIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 05/10/2018 - 01:28 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc | | |
| (HITO ASOCIADO 9) AGOSTO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 04/09/2018 - 11:58 AM |
| HITO ASOCIADO 9) JULIO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 02/08/2018 - 02:58 PM |
| HITO ASOCIADO 9) JUNIO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | Idrovo Aguirre, Romeo Alexander | 06/07/2018 - 07:25 PM |
| MAYO 2018. Con fecha 28 de mayo de 2018, se analizo y aprobó los avales de servicio de voluntariado, se inicio con el proceso para la contratación, mientras tanto el mes de mayo hubieron fuertes precipitaciones a lo largo de la RVE, los mismos que provocaron el cierre parcial en algunos tramos, se trabajo con maquinaria por administración directa y con colaboración de la empresa privada se despejo las vías, además existió el apoyo de maquinarias de otras Direcciones Distritales. | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 05/06/2018 - 09:52 AM |
| HITO ASOCIADO 9) ABRIL 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 04/05/2018 - 03:07 PM |
| (HITO ASOCIADO 9) MARZO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 04/04/2018 - 04:14 PM |
| (HITO ASOCIADO 9) FEBRERO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 20/03/2018 - 02:34 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| (HITO ASOCIADO 9) ENERO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 20/03/2018 - 02:33 PM |
| (HITO ASOCIADO 9) DICIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 04/01/2018 - 04:45 PM |
| (HITO ASOCIADO 9) NOVIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 06/12/2017 - 11:06 AM |
| (HITO ASOCIADO 9) OCTURE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 01/11/2017 - 03:42 PM |
| SEPTIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | Tipan Guañuna, Jairo Fernando | 05/10/2017 - 11:46 AM |
| AGOSTO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | Saavedra Correa, Jose Luis | 06/09/2017 - 04:08 PM |
| JULIO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | Saavedra Correa, Jose Luis | 04/08/2017 - 12:18 PM |
| JUNIO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y | Saavedra Correa, Jose Luis | 04/07/2017 - 03:20 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | | |
| MAYO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | Saavedra Correa, Jose Luis | 05/06/2017 - 04:57 PM |
| ABRIL 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | Saavedra Correa, Jose Luis | 03/05/2017 - 02:42 PM |
| MARZO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc | Saavedra Correa, Jose Luis | 05/04/2017 - 09:58 AM |
| FEBRERO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., ha realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc. | Saavedra Correa, Jose Luis | 07/03/2017 - 12:25 PM |
| ENERO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc. | Saavedra Correa, Jose Luis | 07/02/2017 - 09:26 AM |
| DICIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco - Kalaglas, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc. | Saavedra Correa, Jose Luis | 05/01/2017 - 05:33 PM |
| NOVIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco - Kalaglas, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc. | Arias Castro, Franklin | 02/12/2016 - 12:25 PM |
| OCTUBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP MS., en este periodo ha realizado labores de mantenimiento rutinario especialmente en los rubros limpieza y estabilización de taludes, limpieza de drenaje, señalización, roza a mano y bacheo menor y mayor de la calzada, especialmente con contratos de microempresas, y por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital, dandose énfasis y prioridad al paso de la vía Cebadas - 09 de Octubre km. 49+000, vía Mendez Morona y Bella Unión - Limón, además se ha tenido el aporte de maquinaria de otras Direcciones Provinciales para afrontar sectores críticos y evitar que se suspenda el tráfico vehicular. | Arias Castro, Franklin | 01/11/2016 - 11:15 AM |
| SEPTIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP MS., en este periodo ha realizado labores de mantenimiento rutinario especialmente en los rubros limpieza y estabilización de taludes, limpieza de drenaje, señalización, roza a mano y bacheo menor y mayor de la calzada, especialmente con contratos de microempresas, y por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital, dandose énfasis y prioridad al paso de la vía Cebadas - 09 de Octubre km. 49+000, vía Mendez Morona y Bella Unión - Limón. | Arias Castro, Franklin | 04/10/2016 - 10:35 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|------------------------|-------------------------------|
| AGOSTO 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a trabajado con microempresas de acuerdo a orden de compra en la red vial estatal, además se a ejecutado trabajos por administración directa en sitios criticos para habilitar el paso vehicular debido a derrumbes por desestabilización de taludes, se debe informar que toda la red estatal de la provincia se encuentra a cargo de la Dirección Distrital de Morona Santiago a excepción de la carretera SIgsig - Matanga - Gualaquiza que se encuentra en construcción y cargo de la Cia. Sinohydro, es necesario repotenciar la maquinaria para cubrir el mantenimiento rutinario de toda la red vial | Arias Castro, Franklin | 06/09/2016 - 04:20 PM |
| JULIO 2016.- La Dirección Distrital de Morona Santiago ha realizado el mantenimiento por administración directa, con microempresas, y con las Cías. Contratistas dando prioridad a las siguientes vías: Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Bella Unión, Macas 09 de octubre, Cebadas 09 de octubre, Méndez Morona, Sigsig - Gualaquiza; Méndez Guarumales. | Arias Castro, Franklin | 05/08/2016 - 03:15 PM |
| JUNIO 2016.- Se ha realizado mantenimiento rutinario de la provincia con el siguiente detalle: via Plan de Milagro - Limón a cargo de la Cia. Hidrobo Estrada, Méndez - Morona a cargo de la Cia. Fopeca, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral a cargo de la Cia. Fopeca, Plan de Milagro - San Juan Bosco a cargo de la microempresa Transformando Vías, Sucua Logroño - Bella Unión Tramo Sucua - Logroño a cargo de la microempresa Brisas del Upano, Tramo Logroño Méndez a cargo de la microempresa Esperanza del Futuro, Bella Unión - Limón; Bella Unión - Cumtza, a cargo de la microempresa Luchando por el futuro, San Juan Bosco - Gualaquiza, a cargo del MTOP M.S., Macas - Puente Pastaza a cargo del MTOP M.S., Cebadas 09 de octubre a cargo del MTOP M.S., Sigsig - Matanga - Gualaquiza a cargo de la Cia. Sinohydro | Arias Castro, Franklin | 05/07/2016 - 12:50 PM |
| MAYO 2016.- Maquinaria de la Dirección Distrital del MTOP M.S., se encuentra realizando mantenimiento a las siguientes vías: Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza; Bella Unión - Cumtza - Limón, Cebadas - 09 de octubre, además la Cia. Hidrobo Estrada pro medio de contrato vigente se encuentra ejecutando mantenimiento rutinario de la via Plan de Milagro - Limón, Cia Fopeca de las vías Mendez - Morona, 09 de octubre - Macas y Paso Lateral, via Mendez - Guarumales, además por medio de orden de trabajo se contrato trabajos de conservación vial con la Asociación Brisas del Upano, tramo Sucua - Logroño, con fecha 12 de mayo de 2016, se adjunta respaldo. | Arias Castro, Franklin | 03/06/2016 - 11:06 AM |
| ABRIL 2016.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., debido a la fuerte estación imperante en la red vial estatal ha priorizado los trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, especialmente en la via 9 de Octubre -Cebadas, Bella Unión - Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco, además la Cia. Fopeca ha realizado el mantenimiento de la via, Macas - 9 de octubre y Paso Lateral, Méndez - San José de Morona, lograndose habilitar el tráfico vehicular de manera oportuna | Arias Castro, Franklin | 04/05/2016 - 12:04 PM |
| MARZO 2016.- Los trabajos de mantenimiento rutinario se han realizado con los Contratistas Fopeca e Hidrobo Estrada por medio de contratos vigentes, en el mantenimiento rutinario por administración directa estamos trabajando en la via Bella Unión - Limón y Cebadas 9 de octubre y Plan de Milagro - Gualaquiza, donde se han producido deslizamientos de taludes, taponamiento de vías, por lo que se a priorizado algunos sectores procediendo a la limpieza de materiales y habilitación al tráfico vehicular | Arias Castro, Franklin | 04/04/2016 - 02:32 PM |
| FEBRERO 2016.- Los trabajos de mantenimiento rutinario se han realizado con los Contratistas Fopeca e Hidrobo Estrada por medio de contratos vigentes, en el mantenimiento rutinario por administración directa estamos trabajando en la via Bella Unión -- Limón y Cebadas 9 de octubre, donde se han producido deslizamientos de taludes, taponamiento de vías, por lo que se a priorizado algunos sectores procediendo a la limpieza de materiales. | Arias Castro, Franklin | 02/03/2016 - 11:44 AM |
| ENERO 2016.- Las empresas contratistas Cia. Hidrobo Estrada, Fopeca estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la via Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa, situación que deberá definirse en el mes de febrero 2016, a fin de poder programar los indicadores de cumplimiento para este año, se adjuntan documentos de respaldo | Arias Castro, Franklin | 04/02/2016 - 03:46 PM |
| DICIEMBRE 2015.- Las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeca estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la via Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa, situación que deberá definirse en el mes de enero a fin de poder programar los indicadores de cumplimiento para este año | Arias Castro, Franklin | 05/01/2016 - 02:53 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>NOVIEMBRE 2015.- Las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbletza - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa</p> | <p>Arias Castro, Franklin</p> | <p>02/12/2015 - 02:40 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2015.- Autoridades Superiores del MTOP deberán pronunciarse y darles disposiciones referente a la remediación de fallas geologicas, a la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbletza - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas</p> | <p>Arias Castro, Franklin</p> | <p>04/11/2015 - 03:35 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red via l estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos economicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbletza - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas</p> | <p>Arias Castro, Franklin</p> | <p>07/10/2015 - 08:31 AM</p> |
| <p>AGOSTO 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red via l estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos economicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbletza - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas</p> | <p>Arias Castro, Franklin</p> | <p>01/09/2015 - 10:15 AM</p> |
| <p>JULIO 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red via l estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos economicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbletza - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza.</p> | <p>Arias Castro, Franklin</p> | <p>12/08/2015 - 11:51 AM</p> |
| <p>JUNIO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de</p> | <p>Arias Castro, Franklin</p> | <p>08/07/2015 - 11:28 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>acuerdo con lo programado en el año 2015, estos trabajos deberán ser de manera permanente sin interrupciones.</p> | | |
| <p>Mayo 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015, estos trabajos deberán ser de manera permanente sin interrupciones.</p> | <p>Arias Castro, Franklin</p> | <p>04/06/2015 - 04:13 PM</p> |
| <p>Abril 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015.</p> | <p>Arias Castro, Franklin</p> | <p>06/05/2015 - 03:51 PM</p> |
| <p>MARZO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.</p> | <p>Arias Castro, Franklin</p> | <p>06/04/2015 - 03:29 PM</p> |
| <p>FEBRERO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.</p> | <p>Arias Castro, Franklin</p> | <p>05/03/2015 - 10:49 AM</p> |
| <p>ENERO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus</p> | <p>Arias Castro, Franklin</p> | <p>05/03/2015 - 10:49 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|------------------------|-------------------------------|
| contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa continuará con lo programado en el año 2015. | | |
| <p>DICIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas se han cumplido totalmente el periodo 2014, no ha si con las contratistas que deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa se ha cumplido con lo programado en el año 2014.</p> | Arias Castro, Franklin | 07/01/2015 - 10:41 AM |
| <p>NOVIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.</p> | Arias Castro, Franklin | 02/12/2014 - 02:23 PM |
| <p>OCTUBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.</p> | Arias Castro, Franklin | 07/11/2014 - 11:33 AM |
| <p>SEPTIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S, trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.</p> | Arias Castro, Franklin | 03/10/2014 - 10:01 AM |
| <p>AGOSTO 2014.- Se trabaja con 7 microempresas de conservación vial en el mantenimiento de la red vial troncal amazonica E45 desde Puente Pastaza hasta Llmón, además existen microempresas de conservación vial a cargo de la Cia Fopeca 9 de octubre - Macas y Paso lateral de Macas y la Carretera Méndez - San José, realizandose los siguientes trabajos: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, roza a mano, sello de fisuras, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, arreglo de sectores de hundimientos y asentamientos además se trabaja con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago en los tramos: Sucua - Limón y Plan de Milagro - San Juan Bosco, limpieza de derrumbes, colocación de material en asentamientos, hundimientos, sello de fisuras y nivelación de hundimientos con material asfaltico.</p> | Arias Castro, Franklin | 02/09/2014 - 03:58 PM |
| <p>JULIO 2014.- Se encuentra ejecutando mantenimiento vial limpieza de alcantarillas, limpieza de drenaje, derrumbes a mano, desde el Puente Pastaza hasta Limón. con 6 microempresas, además se encuentra ejecutando mantenimiento rutinario por administración directa en el tramo Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco y Gualaquiza Chiguinda, especialmente en el rubro limpieza de derrumbes y reconfiguración de rasante existente.</p> | Arias Castro, Franklin | 05/08/2014 - 11:39 AM |
| <p>JUNIO 2014.- Las Microempresas continuan trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la via troncal amazonica Puente Pastaza - Macas - Limón, además también se encuentra trabajando la maquinaria del MTOP M.S., en el mantenimiento de la carretera Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza; Tramo Plan de Milagro - San Juan Bosco y Carretera Sigsig - Matanga - Gualaquiza; Tramo: El Ideal - La Pradera.</p> | Arias Castro, Franklin | 01/08/2014 - 10:08 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| MAYO 2014.- Las Microempresas continúan trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la vía troncal amazónica Puente Pastaza - Macas - Limón | Arias Castro, Franklin | 04/06/2014 - 09:43 AM |
| ABRIL 2014.- Microempresas se encuentran trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la vía troncal amazónica Puente Pastaza - Macas - Limón | Arias Castro, Franklin | 06/05/2014 - 06:03 PM |
| MARZO 2014.- La Dirección Provincial se encuentra realizando los trámites para el proceso de contratación en el portal de compras públicas en el mantenimiento rutinario | Arias Castro, Franklin | 06/05/2014 - 06:02 PM |
| FEBRERO 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá iniciar el proceso para la contratación de las microempresas a nivel provincial. | Arias Castro, Franklin | 06/05/2014 - 06:01 PM |
| ENERO 2014: Trabajos de mantenimiento rutinario con microempresas, están suspendidos hasta efectuar el proceso de contratación para el año 2014. | Arias Castro, Franklin | 18/02/2014 - 01:35 PM |
| DICIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde, | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 06/01/2014 - 09:21 AM |
| NOVIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde, | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 01/12/2013 - 03:14 PM |
| OCTUBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde, | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 01/12/2013 - 03:14 PM |
| SEPTIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 05/11/2013 - 09:49 AM |
| AGOSTO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 02/10/2013 - 07:09 AM |
| JULIO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 05/09/2013 - 07:33 AM |
| JUNIO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 29/06/2013 - 03:20 PM |
| MAYO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 29/06/2013 - 03:20 PM |
| ABRIL 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 28/05/2013 - 02:39 PM |
| MARZO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 04/05/2013 - 08:30 AM |
| FEBRERO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 05/04/2013 - 01:05 PM |
| ENERO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 05/04/2013 - 01:04 PM |
| DICIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 05/04/2013 - 01:04 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>NOVIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre</p> | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 05/04/2013 - 01:04 PM |
| <p>OCTUBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre</p> <p>SEPTIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre</p> <p>AGOSTO 2012.- Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre</p> <p>JULIO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento</p> <p>JUNIO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento</p> <p>MAYO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento</p> <p>ABRIL 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento</p> <p>MARZO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento</p> <p>FEBRERO 2012.-Se ha iniciado con varios trabajos de mantenimiento como la Señalización Vertical y Horizontal en varios tramos de las vías de la Provincia de Morona Santiago, Microempresas para realizar mantenimiento rutinario,</p> <p>ENERO 2012.-Se han considerado varios Proyectos de Mantenimiento dentro de la Provincia</p> | Vásconez Vásquez, Hugo Francisco | 02/12/2012 - 10:06 AM |

Problemas cerrados: 9, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <p>5- PROYECTO. * General. El fuerte temporada invernal CAUSARÍA el retraso de la obra</p> | 01/03/2019 | Jairo Fernando Tipan Guañuna | 30 % | 10 | 3 | 1/2 |

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados | 1-Solicitud de Información | 01/03/2012 | | 01/03/2012 | | Sí | 5.0 |
| 2 | PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido | 1-Solicitud de Información | 01/03/2012 | | 01/03/2012 | | Sí | 5.0 |
| 3 | EJECUCIÓN: Inicio Mantenimiento vial con empresas constructoras ejecutado | 4-Inicio de Trabajo | 02/01/2015 | | 02/01/2015 | | Sí | 5.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 4 | EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento rutinario por administración directa, limpieza de derrumbes, ejecutado 10% | 4-Inicio de Trabajo | 05/01/2015 | | 05/01/2015 | | Sí | 8.0 |
| 5 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Vial por administración directa, limpieza de derrumbes, ejecutado 50% | 5-Entregables Intermedios | 02/06/2015 | | 02/06/2015 | | Sí | 8.0 |
| 6 | EJECUCIÓN: Contratos con Microempresas de mantenimiento rutinario ejecutado | 4-Inicio de Trabajo | 31/08/2015 | | 31/05/2016 | | Sí | 8.0 |
| 7 | EJECUCIÓN: Mantenimiento por administracion directa , limpieza de derrumbes ejecutado 60% | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2015 | | 31/08/2015 | | Sí | 5.0 |
| 8 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario con Microempresas contrato legalizado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2015 | | 16/05/2016 | | Sí | 5.0 |
| 9 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario roza a mano con microempresas ejecutado 50% | 5-Entregables Intermedios | 01/09/2015 | | 31/08/2016 | | Sí | 5.0 |
| 10 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario limpieza de drenajes con microempresa ejecutado 50% | 5-Entregables Intermedios | 15/10/2015 | | 31/08/2016 | | Sí | 5.0 |
| 11 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario roza a mano, con microempresas ejecutado 100% | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2015 | | 31/12/2017 | | Sí | 5.0 |
| 12 | EJECUCIÓN: Culminación trabajos mantenimiento rutinario por administración directa concluido | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 31/12/2017 | | Sí | 5.0 |
| 13 | EJECUCIÓN: Limpieza del Campamento Patuca ejecutado | 9-Entregables Formales | 31/12/2015 | | 31/12/2017 | | Sí | 5.0 |
| 14 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial con microempresas, drenaje ejecutado 100% | 9-Entregables Formales | 31/12/2015 | | 31/12/2017 | | Sí | 5.0 |
| 15 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2019 | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019 | 30/06/2019 | | | No | 1.0 |
| 16 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2019 | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019 | 30/09/2019 | | | No | 1.0 |
| 17 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2019 | 30/12/2019 | | | No | 1.0 |
| 18 | CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2019 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019 | 31/12/2019 | | | No | 1.0 |
| 19 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2019 | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2020 | 31/01/2020 | | | No | 1.0 |
| 20 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2020 | 30/06/2020 | | | No | 1.0 |


HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2020 | | | | | | | |
| 21 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2020 | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2020 | 30/09/2020 | | | No | 2.0 |
| 22 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2020 | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2020 | 30/12/2020 | | | No | 1.0 |
| 23 | CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2020 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | | No | 1.0 |
| 24 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2020 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/01/2021 | 31/01/2021 | | | No | 1.0 |
| 25 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2021 | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2021 | 30/06/2021 | | | No | 1.0 |
| 26 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2021 | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2021 | 30/09/2021 | | | No | 2.0 |
| 27 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2021 | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2021 | 30/12/2021 | | | No | 1.0 |
| 28 | CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2021 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 0.5 |
| 29 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2021 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 26/01/2022 | 26/01/2022 | | | No | 0.5 |
| 30 | CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado | 9-Entregables Formales | 27/01/2022 | 27/01/2022 | | | No | 1.0 |
| 31 | CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita | 9-Entregables Formales | 28/01/2022 | 28/01/2022 | | | No | 1.0 |
| 32 | CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito | 9-Entregables Formales | 29/01/2022 | 29/01/2022 | | | No | 1.0 |
| 33 | CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF | 9-Entregables Formales | 30/01/2022 | 30/01/2022 | | | No | 1.0 |
| 34 | CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado | 9-Entregables Formales | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | | No | 1.0 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|--|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Supervisión positiva se pudo verificar los trabajos de mantenimiento | López Bermeo, Julio Rodrigo | {PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO | 16/03/2016 |
| 2 | Supervisión positiva del mantenimiento vial en el via del sector del Rosario a General Plaza en Limón Indanza | López Bermeo, Julio Rodrigo | {PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO | 19/10/2015 |
| 3 | Supervisión negativa de la ejecución de proyecto de acuerdo al hito 3 de Mantenimiento Vial por administración directa programado | López Bermeo, Julio Rodrigo | {PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO | 17/07/2015 |
| 4 | Historico - Existen inconvenientes en el mantenimiento de la vía, en el tramo Bella Unión # Cumtza, por falta de equipo caminero. | Arcos Tuitza, Juan Rafael | {PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO | 02/05/2012 |
| 5 | Historico - El Ministerio ha procedido a contratar los servicios de conservación vial de la Troncal Amazónica, los mismos que mantienen un buen nivel de servicio. | Arcos Tuitza, Juan Rafael | {PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO | 30/03/2012 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Estatal en Buen Estado |  | - | - | - | 01/01/2012 | - |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 3,503,690.11 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 12,031,896.72 ** |
| Costo Total: | 11,678,967.04 |
| Total Devengado: | 9,590,056.90 |
| % Costo Total Devengado: | 82.11 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 82.11 %

Perfil Económico 2019

| | Años Previos | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total |
|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 8,545,508.00 | 18,228,932.08 | 0.00 | 26,774,440.08 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 19,267,292.71 | 2,441,839.82 | 0.00 | 21,709,132.53 |
| Ppto. Codificado | 17,140,900.47 | 2,441,839.82 | 0.00 | 19,582,740.29 |
| Ppto. Comprometido | 7,526,305.91 | 0.00 | 0.00 | 7,526,305.91 |
| Planeado - Codificado (2019) | | 15,787,092.26 | | |
| Programado a Devengar | 15,022,870.50 | 2,441,839.82 | 0.00 | 17,464,710.32 |
| Ppto. Devengado | 9,590,056.90 | 0.00 | 0.00 | 9,590,056.90 |
| Pagado Real | 4,712,727.08 | 0.00 | 0.00 | 4,712,727.08 |
| Estimado a fin de año | * 9,590,056.90 | 0.00 | 0.00 | 9,590,056.90 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 5,432,813.60 | 2,441,839.82 | 0.00 | 7,874,653.42 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 63.84 % | 0.00 % | 0.00 % | 54.91 % |
| Ppto. Codificado 998 | 290,816.35 | 0.00 | 0.00 | 290,816.35 |
| Ppto. Devengado 998 | 290,816.35 | 0.00 | 0.00 | 290,816.35 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

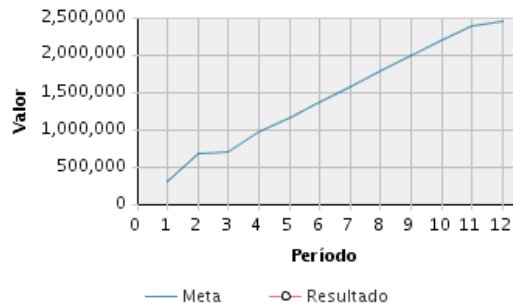

Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | | |

| Presupuesto Mensual 2019 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 369,017.03 | | 669,017.03 | | | | |
| Mar | 36,744.31 | | 705,761.34 | | | | |
| Abr | 252,587.14 | | 958,348.48 | | | | |
| May | 205,782.92 | | 1,164,131.40 | | | | |
| Jun | 205,782.92 | | 1,369,914.32 | | | | |
| Jul | 205,782.92 | | 1,575,697.24 | | | | |
| Ago | 210,145.11 | | 1,785,842.35 | | | | |
| Sep | 205,634.09 | | 1,991,476.44 | | | | |
| Oct | 205,634.09 | | 2,197,110.53 | | | | |
| Nov | 185,357.15 | | 2,382,467.68 | | | | |
| Dic | 59,372.14 | | 2,441,839.82 | | | | |
| Total | 2,441,839.82 | | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 18 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada |
| 19 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 20 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo |
| 21 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 1 | 16 DE ABRIL - KALAGLAS | W.5.pdf | 05/08/2016 |
| 2 | 1_Informe de cumplimiento_Mantenimiento Vial | 1_Informe_de_cumplimiento_Mantenimiento_Vial.pdf | 23/01/2018 |
| 3 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL UPANO | T.2.pdf | 06/05/2015 |
| 4 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017 | 18637_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(9_DE_OCTUBRE).pdf | 04/01/2018 |
| 5 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017 | 18639_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(21_MARZO).pdf | 04/01/2018 |
| 6 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017 | 18640_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(BRISAS_SANGAY).pdf | 04/01/2018 |
| 7 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017 | 18641_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(BRISAS_UPANO).pdf | 04/01/2018 |
| 8 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017 | 18643_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(ESPERANZAS_DEL_FUTURO).pdf | 04/01/2018 |
| 9 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017 | 18644_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(HEROES_AMAZONAS).pdf | 04/01/2018 |
| 10 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017 | 18659_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(RIO_BLANCO).pdf | 04/01/2018 |
| 11 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 21 DE MARZO | G.6.pdf | 06/05/2014 |
| 12 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL SANGAY | G.7.pdf | 06/05/2014 |
| 13 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL SANGAY | T.1.pdf | 06/05/2015 |
| 14 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL UPANO | G.8.pdf | 06/05/2014 |
| 15 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CHIGUINDA MATANGA | G.9.pdf | 06/05/2014 |
| 16 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA ESPERANZAS DEL FUTURO | T.3.pdf | 06/05/2015 |
| 17 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LA ESPERANZA | H.1.pdf | 06/05/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 18 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LAS 3 CHORRERAS | H.2.pdf | 06/05/2014 |
| 19 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LUCHANDO POR EL FUTURO | H.3.pdf | 06/05/2014 |
| 20 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LUCHANDO POR EL FUTURO | T.4.pdf | 06/05/2015 |
| 21 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA TRES DE OCTUBRE | T.5.pdf | 06/05/2015 |
| 22 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA VALLE DEL RIO | H.4.pdf | 06/05/2014 |
| 23 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA VALLE DEL RIO | T.6.pdf | 06/05/2015 |
| 24 | ACTA RECEPCIÓN DEFINITVA 21 DE MARZO | S.9.pdf | 06/05/2015 |
| 25 | certificacion_presupuestaria_microempresas | certificacion_presupuestaria_microempresas_201160802527008/06/2015.pdf | 06/06/2015 |
| 26 | CONTRATO COMPLEMENTARIO ING. JENRY MENDOZA | A.1.pdf | 06/05/2014 |
| 27 | CONTRATO MANTENIMIENTO 21 DE MARZO | A.5.pdf | 06/05/2014 |
| 28 | CONTRATO MANTENIMIENTO 21 DE MARZO 2014 | I.2.pdf | 07/05/2014 |
| 29 | CONTRATO MANTENIMIENTO 3 DE OCTUBRE 2014 | I.5.pdf | 07/05/2014 |
| 30 | CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL SANGAY | A.6.pdf | 06/05/2014 |
| 31 | CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL SANGAY 2014 | I.1.pdf | 07/05/2014 |
| 32 | CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL UPANO | A.9.pdf | 06/05/2014 |
| 33 | CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL UPANO 2014 | I.4.pdf | 07/05/2014 |
| 34 | CONTRATO MANTENIMIENTO ESPERANZA DEL FUTURO | A.4.pdf | 06/05/2014 |
| 35 | CONTRATO MANTENIMIENTO LA ESPERANZA | A.3.pdf | 06/05/2014 |
| 36 | CONTRATO MANTENIMIENTO LAS 3 CHORRERAS | A.8.pdf | 06/05/2014 |
| 37 | CONTRATO MANTENIMIENTO LUCHANDO POR EL FUTURO | A.2.pdf | 06/05/2014 |
| 38 | CONTRATO MANTENIMIENTO VALLE DEL RIO | A.7.pdf | 06/05/2014 |
| 39 | CONTRATO MANTENIMIENTO VALLE DEL RIO 2014 | I.3.pdf | 07/05/2014 |
| 40 | FOTOS DE MANTENIMIENTO | S.9.doc | 04/06/2015 |
| 41 | FOTOS DE MANTENIMIENTO ENERO 2016 | W.1.doc | 04/02/2016 |
| 42 | FOTOS DE TRABAJOS REALIZADOS | M.6.doc | 06/10/2014 |
| 43 | FOTOS DEL PROYECTO | T.8.doc | 01/12/2015 |
| 44 | FOTOS DEL PROYECTO | U.1.doc | 01/12/2015 |
| 45 | FOTOS HIDROBO ENERO 2016 | W.2.PDF | 04/02/2016 |
| 46 | FOTOS MANTENIMIENTO DE LA VIA NOVIEMBRE 2014 | O.3.doc | 05/12/2014 |
| 47 | FOTOS MANTENIMIENTO DE LA VIA OCTUBRE 2014 | N.5.pdf | 05/11/2014 |
| 48 | FOTOS MANTENIMIENTO PROVINCIA | FOTOS_MANTENIMIENTO_PROVINCIA.pdf | 05/07/2016 |
| 49 | FOTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | J.8.pdf | 31/07/2014 |
| 50 | INFORME 074 C - Nov. 2015 | U.2.doc | 02/12/2015 |
| 51 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012 | B.1.pdf | 06/05/2014 |
| 52 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012 | B.2.pdf | 06/05/2014 |
| 53 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012 | B.3.pdf | 06/05/2014 |
| 54 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012 | B.4.pdf | 06/05/2014 |
| 55 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012 | B.5.pdf | 06/05/2014 |
| 56 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012 | B.6.pdf | 06/05/2014 |
| 57 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012 | B.7.pdf | 06/05/2014 |
| 58 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014 | I.7.pdf | 07/05/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 59 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014 | I.9.pdf | 07/05/2014 |
| 60 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014 | J.2.pdf | 07/05/2014 |
| 61 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014 | J.4.pdf | 07/05/2014 |
| 62 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014 | J.6.pdf | 07/05/2014 |
| 63 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 | 9_DE_OCTUBRE.pdf | 04/05/2017 |
| 64 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 | 16_DE_ABRIL_- _KALAGLAS.pdf | 04/05/2017 |
| 65 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 | 21_DE_MARZO.pdf | 04/05/2017 |
| 66 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 | BRISAS_DEL_SANGAY.pdf | 04/05/2017 |
| 67 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 | BRISAS_DEL_UPANO.pdf | 04/05/2017 |
| 68 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 | CASCADAS_DE_CUGUSHA.pdf | 04/05/2017 |
| 69 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 | ESPERANZA_DEL_FUTURO.pdf | 04/05/2017 |
| 70 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 | LOS_CEDROS.pdf | 04/05/2017 |
| 71 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 | LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf | 04/05/2017 |
| 72 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 | MIRADOR_SHAIME.pdf | 04/05/2017 |
| 73 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 | SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf | 04/05/2017 |
| 74 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 | TIWINTZA.pdf | 04/05/2017 |
| 75 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017 | TRANSFORMANDO_VIAS.pdf | 04/05/2017 |
| 76 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 18932.pdf | 04/05/2018 |
| 77 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 20556.pdf | 04/05/2018 |
| 78 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 20557.pdf | 04/05/2018 |
| 79 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 20558.pdf | 04/05/2018 |
| 80 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 20560.pdf | 04/05/2018 |
| 81 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 20561.pdf | 04/05/2018 |
| 82 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 20562.pdf | 04/05/2018 |
| 83 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 20563.pdf | 04/05/2018 |
| 84 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 20564.pdf | 04/05/2018 |
| 85 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 20565.pdf | 04/05/2018 |
| 86 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 20566.pdf | 04/05/2018 |
| 87 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 20567.pdf | 04/05/2018 |
| 88 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 20568.pdf | 04/05/2018 |
| 89 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 20559.pdf | 04/05/2018 |
| 90 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018 | 20569.pdf | 04/05/2018 |
| 91 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012 | B.8.pdf | 06/05/2014 |
| 92 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012 | B.9.pdf | 06/05/2014 |
| 93 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012 | C.1.pdf | 06/05/2014 |
| 94 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012 | C.2.pdf | 06/05/2014 |
| 95 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012 | C.3.pdf | 06/05/2014 |
| 96 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012 | C.4.pdf | 06/05/2014 |
| 97 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012 | C.5.pdf | 06/05/2014 |
| 98 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012 | C.6.pdf | 06/05/2014 |
| 99 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014 | J.7.pdf | 03/09/2014 |
| 100 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014 | J.8.pdf | 03/09/2014 |
| 101 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014 | J.9.pdf | 03/09/2014 |
| 102 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014 | K.1.pdf | 03/09/2014 |
| 103 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014 | K.2.pdf | 03/09/2014 |
| 104 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014 | K.3.pdf | 03/09/2014 |
| 105 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014 | K.4.pdf | 05/09/2014 |
| 106 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21489.pdf | 04/09/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|----------------------------------|-----------|---------------|
| 107 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21493.pdf | 04/09/2018 |
| 108 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21494.pdf | 04/09/2018 |
| 109 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21495.pdf | 04/09/2018 |
| 110 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21498.pdf | 04/09/2018 |
| 111 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21499.pdf | 04/09/2018 |
| 112 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21500.pdf | 04/09/2018 |
| 113 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21501.pdf | 04/09/2018 |
| 114 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21502.pdf | 04/09/2018 |
| 115 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21503.pdf | 04/09/2018 |
| 116 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21504.pdf | 04/09/2018 |
| 117 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21505.pdf | 04/09/2018 |
| 118 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21507.pdf | 04/09/2018 |
| 119 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21508.pdf | 04/09/2018 |
| 120 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21509.pdf | 04/09/2018 |
| 121 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21510.pdf | 04/09/2018 |
| 122 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21512.pdf | 04/09/2018 |
| 123 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21513.pdf | 04/09/2018 |
| 124 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21514.pdf | 04/09/2018 |
| 125 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21515.pdf | 04/09/2018 |
| 126 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21545.pdf | 04/09/2018 |
| 127 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21546.pdf | 04/09/2018 |
| 128 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018 | 21560.pdf | 04/09/2018 |
| 129 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013 | H.7.pdf | 07/05/2014 |
| 130 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014 | P.7.pdf | 06/01/2015 |
| 131 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014 | P.8.pdf | 06/01/2015 |
| 132 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014 | P.9.pdf | 06/01/2015 |
| 133 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014 | Q.1.pdf | 06/01/2015 |
| 134 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014 | Q.2.pdf | 06/01/2015 |
| 135 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014 | Q.3.pdf | 06/01/2015 |
| 136 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014 | Q.4.pdf | 06/01/2015 |
| 137 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21493.pdf | 04/01/2019 |
| 138 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21494.pdf | 04/01/2019 |
| 139 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21495.pdf | 04/01/2019 |
| 140 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21498.pdf | 04/01/2019 |
| 141 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21500.pdf | 04/01/2019 |
| 142 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21503.pdf | 04/01/2019 |
| 143 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21504.pdf | 04/01/2019 |
| 144 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21507.pdf | 04/01/2019 |
| 145 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21508.pdf | 04/01/2019 |
| 146 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21512.pdf | 04/01/2019 |
| 147 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21513.pdf | 04/01/2019 |
| 148 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21514.pdf | 04/01/2019 |
| 149 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21546.pdf | 04/01/2019 |
| 150 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21489.pdf | 04/01/2019 |
| 151 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21509.pdf | 04/01/2019 |
| 152 | INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 | 21515.pdf | 04/01/2019 |
| 153 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2014 | H.8.pdf | 07/05/2014 |
| 154 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2015 | Q.5.pdf | 04/03/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--------------------------------|-----------|---------------|
| 155 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2015 | Q.6.pdf | 04/03/2015 |
| 156 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2015 | Q.7.pdf | 04/03/2015 |
| 157 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2015 | Q.8.pdf | 04/03/2015 |
| 158 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2015 | Q.9.pdf | 04/03/2015 |
| 159 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2015 | R.1.pdf | 04/03/2015 |
| 160 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2015 | R.2.pdf | 04/03/2015 |
| 161 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 | 21493.pdf | 05/02/2019 |
| 162 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 | 21501.pdf | 05/02/2019 |
| 163 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 | 21502.pdf | 05/02/2019 |
| 164 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 | 21505.pdf | 05/02/2019 |
| 165 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 | 21508.pdf | 05/02/2019 |
| 166 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 | 21510.pdf | 05/02/2019 |
| 167 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 | 21512.pdf | 05/02/2019 |
| 168 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 | 21513.pdf | 05/02/2019 |
| 169 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 | 21545.pdf | 05/02/2019 |
| 170 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 | 21546.pdf | 05/02/2019 |
| 171 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 | 21560.pdf | 05/02/2019 |
| 172 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 | 21507.pdf | 05/02/2019 |
| 173 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 | 21500.pdf | 05/02/2019 |
| 174 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2019 | 21498.pdf | 05/02/2019 |
| 175 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014 | H.9.pdf | 07/05/2014 |
| 176 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015 | R.3.pdf | 04/03/2015 |
| 177 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015 | R.4.pdf | 04/03/2015 |
| 178 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015 | R.5.pdf | 04/03/2015 |
| 179 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015 | R.6.pdf | 04/03/2015 |
| 180 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015 | R.7.pdf | 04/03/2015 |
| 181 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015 | R.8.pdf | 04/03/2015 |
| 182 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015 | R.9.pdf | 04/03/2015 |
| 183 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21493.pdf | 01/03/2019 |
| 184 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21494.pdf | 01/03/2019 |
| 185 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21495.pdf | 01/03/2019 |
| 186 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21503.pdf | 01/03/2019 |
| 187 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21504.pdf | 01/03/2019 |
| 188 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21508.pdf | 01/03/2019 |
| 189 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21512.pdf | 01/03/2019 |
| 190 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21513.pdf | 01/03/2019 |
| 191 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21514.pdf | 01/03/2019 |
| 192 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21546.pdf | 01/03/2019 |
| 193 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21510.pdf | 01/03/2019 |
| 194 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21505.pdf | 01/03/2019 |
| 195 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21560.pdf | 01/03/2019 |
| 196 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21545.pdf | 01/03/2019 |
| 197 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21502.pdf | 01/03/2019 |
| 198 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21499.pdf | 01/03/2019 |
| 199 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21501.pdf | 01/03/2019 |
| 200 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21498.pdf | 01/03/2019 |
| 201 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21507.pdf | 01/03/2019 |
| 202 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21500.pdf | 01/03/2019 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--------------------------------|-----------|---------------|
| 203 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21489.pdf | 01/03/2019 |
| 204 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21515.pdf | 01/03/2019 |
| 205 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019 | 21509.pdf | 01/03/2019 |
| 206 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2012 | C.7.pdf | 06/05/2014 |
| 207 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2012 | C.8.pdf | 06/05/2014 |
| 208 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2012 | C.9.pdf | 06/05/2014 |
| 209 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2012 | D.1.pdf | 06/05/2014 |
| 210 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2012 | D.2.pdf | 06/05/2014 |
| 211 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2012 | D.3.pdf | 06/05/2014 |
| 212 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2012 | D.4.pdf | 06/05/2014 |
| 213 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2012 | D.5.pdf | 06/05/2014 |
| 214 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2012 | D.6.pdf | 06/05/2014 |
| 215 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2014 | H.5.pdf | 05/08/2014 |
| 216 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2014 | H.6.pdf | 05/08/2014 |
| 217 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2014 | H.7.pdf | 05/08/2014 |
| 218 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2014 | H.8.pdf | 05/08/2014 |
| 219 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2014 | H.9.pdf | 05/08/2014 |
| 220 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2014 | I.1.pdf | 05/08/2014 |
| 221 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21489.pdf | 02/08/2018 |
| 222 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21494.pdf | 02/08/2018 |
| 223 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21495.pdf | 02/08/2018 |
| 224 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21498.pdf | 02/08/2018 |
| 225 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21499.pdf | 02/08/2018 |
| 226 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21501.pdf | 02/08/2018 |
| 227 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21502.pdf | 02/08/2018 |
| 228 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21505.pdf | 02/08/2018 |
| 229 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21507.pdf | 02/08/2018 |
| 230 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21509.pdf | 02/08/2018 |
| 231 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21510.pdf | 02/08/2018 |
| 232 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21514.pdf | 02/08/2018 |
| 233 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21515.pdf | 02/08/2018 |
| 234 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21545.pdf | 02/08/2018 |
| 235 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2018 | 21560.pdf | 02/08/2018 |
| 236 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012 | D.7.pdf | 06/05/2014 |
| 237 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012 | D.8.pdf | 06/05/2014 |
| 238 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012 | D.9.pdf | 06/05/2014 |
| 239 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012 | E.1.pdf | 06/05/2014 |
| 240 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012 | E.2.pdf | 06/05/2014 |
| 241 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012 | E.3.pdf | 06/05/2014 |
| 242 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012 | E.4.pdf | 06/05/2014 |
| 243 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012 | E.5.pdf | 06/05/2014 |
| 244 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014 | K.8.pdf | 08/07/2014 |
| 245 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014 | K.9.pdf | 08/07/2014 |
| 246 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014 | L.1.pdf | 08/07/2014 |
| 247 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014 | L.2.pdf | 08/07/2014 |
| 248 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014 | L.3.pdf | 08/07/2014 |
| 249 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014 | L.4.pdf | 08/07/2014 |
| 250 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014 | L.5.pdf | 08/07/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 251 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | 5_DE_AGOSTO.pdf | 06/07/2018 |
| 252 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | 9_de_octubre.pdf | 06/07/2018 |
| 253 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | 16_DE_ABRIL-KALAGLAS.pdf | 06/07/2018 |
| 254 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | 21_DE_MARZO.pdf | 06/07/2018 |
| 255 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | BRISAS_DEL_SANGAY.pdf | 06/07/2018 |
| 256 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | BRISAS_DEL_UPANO.pdf | 06/07/2018 |
| 257 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | EL_FUTURO_DE_PATUCA.pdf | 06/07/2018 |
| 258 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | ESPERANZAS_DEL_FUTURO.pdf | 06/07/2018 |
| 259 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | HEROES_DE_LA_AMAZONIA.pdf | 06/07/2018 |
| 260 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | KIMIUS.pdf | 06/07/2018 |
| 261 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | LOS_CEDROS.pdf | 06/07/2018 |
| 262 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf | 06/07/2018 |
| 263 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | MIRADOR_SHAIME.pdf | 06/07/2018 |
| 264 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | PACHECO_ALVAREZ.pdf | 06/07/2018 |
| 265 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | RIO_BLANCO.pdf | 06/07/2018 |
| 266 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf | 06/07/2018 |
| 267 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | SAN_VICENTE_FERRER.pdf | 06/07/2018 |
| 268 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | TIWINZA.pdf | 06/07/2018 |
| 269 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | TRANSFORMANDO_VIAS.pdf | 06/07/2018 |
| 270 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | TRES_DE_OCTUBRE.pdf | 06/07/2018 |
| 271 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | UNIDOS_CONSERVANDO_VIAS.pdf | 06/07/2018 |
| 272 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | VALLE_DEL_RIO.pdf | 06/07/2018 |
| 273 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | ZUÑAG-19_DE_AGOSTO.pdf | 06/07/2018 |
| 274 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2012 | E.6.pdf | 06/05/2014 |
| 275 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2012 | E.7.pdf | 06/05/2014 |
| 276 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2012 | E.8.pdf | 06/05/2014 |
| 277 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2012 | E.9.pdf | 06/05/2014 |
| 278 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2012 | F.1.pdf | 06/05/2014 |
| 279 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2012 | F.2.pdf | 06/05/2014 |
| 280 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2012 | F.3.pdf | 06/05/2014 |
| 281 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2014 | I.6.pdf | 07/05/2014 |
| 282 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2014 | I.8.pdf | 07/05/2014 |
| 283 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2014 | J.1.pdf | 07/05/2014 |
| 284 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2014 | J.3.pdf | 07/05/2014 |
| 285 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2014 | J.5.pdf | 07/05/2014 |
| 286 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2015 | S.1.pdf | 06/04/2015 |
| 287 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2015 | S.2.pdf | 06/04/2015 |
| 288 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2015 | S.3.pdf | 06/04/2015 |
| 289 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2015 | S.4.pdf | 06/04/2015 |
| 290 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2015 | S.5.pdf | 06/04/2015 |
| 291 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2015 | S.6.pdf | 06/04/2015 |
| 292 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2015 | S.7.pdf | 06/04/2015 |
| 293 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | 3_DE_OCTUBRE_20564.pdf | 05/04/2018 |
| 294 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | 9_DE_OCTUBRE_20559.pdf | 05/04/2018 |
| 295 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | 16_DE_ABRIL_- KALAGLAS_20565.pdf | 05/04/2018 |
| 296 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | 21_DE_MARZO_20557.pdf | 05/04/2018 |
| 297 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | BRISAS_DEL_SANGAY_20558.pdf | 05/04/2018 |
| 298 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | ESPERANZA_DEL_FUTURO_20561.pdf | 05/04/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 299 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | FUTURO_DE_PATUCA_20568.pdf | 05/04/2018 |
| 300 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | HEROES_DE_LA_AMAZONIA_20556.pdf | 05/04/2018 |
| 301 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | KIMIUS_20569.pdf | 05/04/2018 |
| 302 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | LOS_CEDROS_20566.pdf | 05/04/2018 |
| 303 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | LUCHANDO_POR_EL_FUTURO_20563.pdf | 05/04/2018 |
| 304 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | RIO_BLANCO_20560.pdf | 05/04/2018 |
| 305 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA_20567.pdf | 05/04/2018 |
| 306 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | VALLE_DEL_RIO_20562.pdf | 05/04/2018 |
| 307 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | 20566.pdf | 04/05/2018 |
| 308 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2012 | F.4.pdf | 06/05/2014 |
| 309 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2012 | F.5.pdf | 06/05/2014 |
| 310 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2012 | F.6.pdf | 06/05/2014 |
| 311 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2012 | F.7.pdf | 06/05/2014 |
| 312 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2012 | F.8.pdf | 06/05/2014 |
| 313 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2012 | F.9.pdf | 06/05/2014 |
| 314 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2012 | G.1.pdf | 06/05/2014 |
| 315 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2012 | G.2.pdf | 06/05/2014 |
| 316 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2014 | J.8.pdf | 04/06/2014 |
| 317 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2014 | J.9.pdf | 04/06/2014 |
| 318 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2014 | K.1.pdf | 04/06/2014 |
| 319 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2014 | K.2.pdf | 04/06/2014 |
| 320 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2014 | K.3.pdf | 04/06/2014 |
| 321 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2014 | K.4.pdf | 04/06/2014 |
| 322 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013 | H.6.pdf | 07/05/2014 |
| 323 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014 | N.5.pdf | 02/12/2014 |
| 324 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014 | N.6.pdf | 02/12/2014 |
| 325 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014 | N.7.pdf | 02/12/2014 |
| 326 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014 | N.8.pdf | 02/12/2014 |
| 327 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014 | N.9.pdf | 02/12/2014 |
| 328 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014 | O.1.pdf | 02/12/2014 |
| 329 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014 | O.2.pdf | 02/12/2014 |
| 330 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | id_contrato_18638.pdf | 04/12/2017 |
| 331 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | id_contrato_18642.pdf | 04/12/2017 |
| 332 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | id_contrato_18645.pdf | 04/12/2017 |
| 333 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | id_contrato_18646.pdf | 04/12/2017 |
| 334 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | id_contrato_18656.pdf | 04/12/2017 |
| 335 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | id_contrato_18658.pdf | 04/12/2017 |
| 336 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | id_contrato_18660.pdf | 04/12/2017 |
| 337 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | id_contrato_18661.pdf | 04/12/2017 |
| 338 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | id_contrato_18662.pdf | 04/12/2017 |
| 339 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | id_contrato_18682.pdf | 04/12/2017 |
| 340 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | id_contrato_18931.pdf | 04/12/2017 |
| 341 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | ID_18644_INFORME_EJECUTIVO.pdf | 06/12/2017 |
| 342 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | ID_18659_INFORME_EJECUTIVO.pdf | 06/12/2017 |
| 343 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | ID_18932_INFORME_EJECUTIVO.pdf | 06/12/2017 |
| 344 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | ID_19118_INFORME_EJECUTIVO.pdf | 06/12/2017 |
| 345 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | ID_18641_INFORME_EJECUTIVO.pdf | 06/12/2017 |
| 346 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | ID_18643_INFORME_EJECUTIVO.pdf | 06/12/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 347 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | ID_18640_INFORME_EJECUTIVO.pdf | 06/12/2017 |
| 348 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | ID_18639_INFORME_EJECUTIVO.pdf | 06/12/2017 |
| 349 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | ID_18637_INFORME_EJECUTIVO.pdf | 06/12/2017 |
| 350 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21489.pdf | 05/12/2018 |
| 351 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21493.pdf | 05/12/2018 |
| 352 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21503.pdf | 05/12/2018 |
| 353 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21504.pdf | 05/12/2018 |
| 354 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21508.pdf | 05/12/2018 |
| 355 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21509.pdf | 05/12/2018 |
| 356 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21512.pdf | 05/12/2018 |
| 357 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21513.pdf | 05/12/2018 |
| 358 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21515.pdf | 05/12/2018 |
| 359 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21546.pdf | 05/12/2018 |
| 360 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21489.pdf | 05/12/2018 |
| 361 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21494.pdf | 05/12/2018 |
| 362 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21495.pdf | 05/12/2018 |
| 363 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21498.pdf | 05/12/2018 |
| 364 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21500.pdf | 05/12/2018 |
| 365 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21507.pdf | 05/12/2018 |
| 366 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018 | 21514.pdf | 05/12/2018 |
| 367 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013 | H.5.pdf | 07/05/2014 |
| 368 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014 | M.7.pdf | 05/11/2014 |
| 369 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014 | M.8.pdf | 05/11/2014 |
| 370 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014 | M.9.pdf | 05/11/2014 |
| 371 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014 | N.1.pdf | 05/11/2014 |
| 372 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014 | N.2.pdf | 05/11/2014 |
| 373 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014 | N.3.pdf | 05/11/2014 |
| 374 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014 | N.4.pdf | 05/11/2014 |
| 375 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017 | ID_CONTRATO_18637.pdf | 01/11/2017 |
| 376 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017 | ID_CONTRATO_18639.pdf | 01/11/2017 |
| 377 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017 | ID_CONTRATO_18641.pdf | 01/11/2017 |
| 378 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017 | ID_CONTRATO_18643.pdf | 01/11/2017 |
| 379 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017 | ID_CONTRATO_18644.pdf | 01/11/2017 |
| 380 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017 | ID_CONTRATO_18659.pdf | 01/11/2017 |
| 381 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017 | ID_CONTRATO_18932.pdf | 01/11/2017 |
| 382 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017 | ID_CONTRATO_19118.pdf | 01/11/2017 |
| 383 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018 | 21493.pdf | 05/11/2018 |
| 384 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018 | 21498.pdf | 05/11/2018 |
| 385 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018 | 21500.pdf | 05/11/2018 |
| 386 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018 | 21503.pdf | 05/11/2018 |
| 387 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018 | 21504.pdf | 05/11/2018 |
| 388 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018 | 21507.pdf | 05/11/2018 |
| 389 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018 | 21508.pdf | 05/11/2018 |
| 390 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018 | 21512.pdf | 05/11/2018 |
| 391 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018 | 21513.pdf | 05/11/2018 |
| 392 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018 | 21546.pdf | 05/11/2018 |
| 393 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013 | G.3.pdf | 06/05/2014 |
| 394 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013 | G.4.pdf | 06/05/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---------------------------------|---------------|
| 395 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013 | G.5.pdf | 06/05/2014 |
| 396 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014 | L.8.pdf | 06/10/2014 |
| 397 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014 | L.9.pdf | 06/10/2014 |
| 398 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014 | M.1.pdf | 06/10/2014 |
| 399 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014 | M.2.pdf | 06/10/2014 |
| 400 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014 | M.3.pdf | 06/10/2014 |
| 401 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014 | M.4.pdf | 06/10/2014 |
| 402 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014 | M.5.pdf | 06/10/2014 |
| 403 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21489.pdf | 04/10/2018 |
| 404 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21493.pdf | 04/10/2018 |
| 405 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21494.pdf | 04/10/2018 |
| 406 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21495.pdf | 04/10/2018 |
| 407 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21499.pdf | 04/10/2018 |
| 408 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21501.pdf | 04/10/2018 |
| 409 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21502.pdf | 04/10/2018 |
| 410 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21503.pdf | 04/10/2018 |
| 411 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21504.pdf | 04/10/2018 |
| 412 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21505.pdf | 04/10/2018 |
| 413 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21508.pdf | 04/10/2018 |
| 414 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21509.pdf | 04/10/2018 |
| 415 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21510.pdf | 04/10/2018 |
| 416 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21512.pdf | 04/10/2018 |
| 417 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21513.pdf | 04/10/2018 |
| 418 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21514.pdf | 04/10/2018 |
| 419 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21515.pdf | 04/10/2018 |
| 420 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21545.pdf | 04/10/2018 |
| 421 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21546.pdf | 04/10/2018 |
| 422 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018 | 21560.pdf | 04/10/2018 |
| 423 | INFORME MECANICO JULIO 2016 | W.7.xls | 05/08/2016 |
| 424 | INFORME MECANICO ABRIL 2015 | S.8.xls | 06/05/2015 |
| 425 | INFORME MECANICO ABRIL 2016 | W.3.xls | 04/05/2016 |
| 426 | INFORME MECANICO AGOSTO 2014 | K.4.xls | 05/09/2014 |
| 427 | INFORME MECANICO DICIEMBRE 2015 | U.6.xls | 06/01/2016 |
| 428 | INFORME MECANICO ENERO 2016 | U.8.xls | 03/02/2016 |
| 429 | INFORME MECANICO JULIO 2015 | T.2.xls | 12/08/2015 |
| 430 | INFORME MECANICO JUNIO 2015 | T.1.xls | 08/07/2015 |
| 431 | INFORME MECANICO MARZO 2015 | S.8.xls | 06/04/2015 |
| 432 | INFORME MECANICO MARZO 2016 | INFORME_MECANICO_MARZO_2016.xls | 05/04/2016 |
| 433 | INFORME MECANICO MAYO 2015 | S.9.xls | 05/06/2015 |
| 434 | INFORME MECANICO MAYO 2016 | V.8.xls | 03/06/2016 |
| 435 | INFORME MECANICO NOVIEMBRE 2015 | U.4.xls | 03/12/2015 |
| 436 | INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2014 | M.6.xls | 07/10/2014 |
| 437 | INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2016 | Y.1.pdf | 04/10/2016 |
| 438 | INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2016 | Y.2.xls | 04/10/2016 |
| 439 | INFORME MECÁNICO NOVIEMBRE 2014 | O.3.xls | 05/12/2014 |
| 440 | INSPECCIÓN FALLAS GEOLOGICAS PARA MANTENIMIENTO | K.8.doc | 08/09/2014 |
| 441 | INSPECCIÓN FALLAS GEOLOGICAS PARA MANTENIMIENTO | K.9.doc | 08/09/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|--|---------------|
| 442 | MANTENIMIENTO CARRETERA GUALAQUIZA - MATANGA | K.6.pdf | 03/07/2014 |
| 443 | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS | T.8.doc | 06/11/2015 |
| 444 | MANTENIMIENTO VIAL PLAN DE MILAGRO - SAN JUAN BOSCO | K.7.pdf | 03/07/2014 |
| 445 | MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA | K.5.pdf | 03/07/2014 |
| 446 | MTOP-ADM_MOR-2016-8-ME | V.1.pdf | 03/02/2016 |
| 447 | mtop-cgp-2016-30-me | V.4.pdf | 04/02/2016 |
| 448 | MTOP-CON_MOR-2016-22-ME | V.2.pdf | 03/02/2016 |
| 449 | MTOP-CON_MOR-2016-24-ME | V.3.pdf | 03/02/2016 |
| 450 | MTOP-CON_MOR-2016-24-ME | V.5.pdf | 04/02/2016 |
| 451 | MTOP-CONS_MOR-2016-1-ME | V.6.pdf | 04/02/2016 |
| 452 | MTOP-DDMS-2016-390-ME | W.5.pdf | 04/05/2016 |
| 453 | MTOP-DDMS-2016-465-ME | V.9.pdf | 03/06/2016 |
| 454 | MTOP-DDMS-2016-491-ME | MTOP-DDMS-2016-491-ME.pdf | 05/07/2016 |
| 455 | MTOP-DDMS-2016-609-ME | W.9.pdf | 05/08/2016 |
| 456 | MTOP-DDMS-2016-808-ME | W.9.pdf | 05/12/2016 |
| 457 | MTOP-DPMS-2015-605-ME | T.3.pdf | 12/08/2015 |
| 458 | MTOP-DPMS-2015-945-ME-1 | U.3.pdf | 03/12/2015 |
| 459 | MTOP-DPMS-2016-53-ME | V.7.pdf | 04/02/2016 |
| 460 | MTOP-DPMS-2016-79-ME | V.8.pdf | 04/02/2016 |
| 461 | MTOP-FINAN_MOR-2016-3-ME | V.9.pdf | 04/02/2016 |
| 462 | ORDEN DE COMPRA 16 DE ABRIL - KALAGLAS 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_16_DE_ABRIL_-_KALAGLAS.pdf | 05/04/2017 |
| 463 | ORDEN DE COMPRA 21 DE MARZO 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_21_DE_MARZO.pdf | 05/04/2017 |
| 464 | ORDEN DE COMPRA 9 DE OCTUBRE/2017 | ORDEN_DE_COMPRA_9_DE_OCTUBRE.pdf | 05/04/2017 |
| 465 | ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL SANGAY 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_SANGAY.pdf | 05/04/2017 |
| 466 | ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL UPANO 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_UPANO.pdf | 05/04/2017 |
| 467 | ORDEN DE COMPRA CASCADAS DE CUGUSHA | ORDEN_DE_COMPRA_CASCADAS_DE_CUGUSHA.pdf | 03/05/2017 |
| 468 | ORDEN DE COMPRA ESPERANZAS DEL FUTURO 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_ESPERANZAS_DEL_FUTURO.pdf | 05/04/2017 |
| 469 | ORDEN DE COMPRA LOS CEDROS 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_LOS_CEDROS.pdf | 05/04/2017 |
| 470 | ORDEN DE COMPRA LUCHANDO POR EL FUTURO 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf | 05/04/2017 |
| 471 | ORDEN DE COMPRA MARZO2017_MIRADOR SHAIME 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_MARZO2017_MIRADOR_SHAIME-10510 | 05/04/2017 |
| 472 | ORDEN DE COMPRA PACHECO ALVAREZ | ORDEN_DE_COMPRA_PACHECO_ALVAREZ.pdf | 03/05/2017 |
| 473 | ORDEN DE COMPRA SAN PEDRO DE GUALAQUIZA 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf | 05/04/2017 |
| 474 | ORDEN DE COMPRA TIWINTZA 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_TIWINTZA.pdf | 05/04/2017 |
| 475 | ORDEN DE COMPRA TRANSFORMANDO VIAS 2017 | ORDEN_DE_COMPRA_TRANSFORMANDO_VIAS.pdf | 05/04/2017 |
| 476 | orden de compra_mantenimiento vial-sucua-logroño | V.7.pdf | 03/06/2016 |
| 477 | PINTURA DE LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS JURUMBAINO, BLANCO, TIMBIANA Y ARAPICOS | L.6.pdf | 16/09/2014 |
| 478 | RECORRIDO INSPECCION FUNCIONARIOS | T.9.doc | 01/12/2015 |
| 479 | REPORTE DE MAQUINARIA NOVIEMBRE 2015 | U.5.pdf | 03/12/2015 |
| 480 | REPORTE DE PRESUPUESTO ABRIL 2014 | O.7.pdf | 24/12/2014 |
| 481 | REPORTE DE PRESUPUESTO AGOSTO 2014 | P.2.pdf | 24/12/2014 |
| 482 | REPORTE DE PRESUPUESTO DICIEMBRE 2014 | P.6.pdf | 24/12/2014 |
| 483 | REPORTE DE PRESUPUESTO ENERO 2014 | O.4.pdf | 24/12/2014 |
| 484 | REPORTE DE PRESUPUESTO FEBRERO 2014 | O.5.pdf | 24/12/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---|---------------|
| 485 | REPORTE DE PRESUPUESTO JULIO 2014 | P.1.pdf | 24/12/2014 |
| 486 | REPORTE DE PRESUPUESTO JUNIO 2014 | O.9.pdf | 24/12/2014 |
| 487 | REPORTE DE PRESUPUESTO MARZO 2014 | O.6.pdf | 24/12/2014 |
| 488 | REPORTE DE PRESUPUESTO MAYO 2014 | O.8.pdf | 24/12/2014 |
| 489 | REPORTE DE PRESUPUESTO NOVIEMBRE 2014 | P.5.pdf | 24/12/2014 |
| 490 | REPORTE DE PRESUPUESTO OCTUBRE 2014 | P.4.pdf | 24/12/2014 |
| 491 | REPORTE DE PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2014 | P.3.pdf | 24/12/2014 |
| 492 | REPORTE GRAFICO ABRIL 2016 | W.4.pdf | 04/05/2016 |
| 493 | REPORTE LEGALIZADO ENERO 2016 | U.9.pdf | 03/02/2016 |
| 494 | REPORTE MECANICO OCTUBRE 2015 | T.7.xls | 06/11/2015 |
| 495 | REPORTE MECANICO SEPTIEMBRE | T.5.pdf | 07/10/2015 |
| 496 | REPORTE MECANICO SEPTIEMBRE | T.6.xls | 07/10/2015 |
| 497 | resolucion_de_contratacion_transformando_vias | resolucion_de_contratacion_transformando_vias.doc | 05/07/2016 |
| 498 | RESUMEN DICIEMBRE 2015 | U.7.pdf | 06/01/2016 |
| 499 | RESUMEN INFORME MECANICO JULIO 2016 | W.8.pdf | 05/08/2016 |
| 500 | SAN PEDRO DE GUALAQUIZA | W.6.pdf | 05/08/2016 |
| 501 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIA GUALAQUIZA - CHIGUINDA | J.7.pdf | 07/05/2014 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-------------|
| | FINANCIERO MTOP | | | |
| | ANALISTA ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO MTOP | | | |
| Quezada Jara, Mónica Fabiola | PATROCINADOR EJECUTIVO MTOP | Subsecretaria Zonal 6 | mquezada@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Saavedra Correa, Jose Luis | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO MTOP | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Morona Santiago | jsaavedra@mtop.gob.ec | 64021 |
| Tipan Guañuna, Jairo Fernando | SUPERVISOR VIAL MTOP ETAPA DE MANTENIMIENTO | Coordinador Técnico de Infraestructura Distrital/ Líder de Proyecto | jtipan@mtop.gob.ec | 64213 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 38711_1.jpg | 05/02/2019 |
