

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 6**  
**Dirección Provincial Cañar**

**PROYECTO: K023 MTOP-Mantenimiento Vial de la Provincia del Cañar**

Líder del Proyecto:	Dután Sanango, Italo Medardo (imдутan@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, Provincia - Cañar, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3657	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,797,233.31
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/03/2022
Fecha de última actualización:	13/05/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	01/07/2019

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCION:

MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR

EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA MTOP

SERVICIO: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las poblaciones que se encuentran en las vías que se dan mantenimiento vial permanente.

LINEA BASE: A lo largo del proyecto, Las viviendas están concentradas en las cercanías de los centros comunales y otras dispersas. Para la construcción de las viviendas se usa principalmente el cemento, ladrillo, bloque, techos de eternit, ardex, teja vidriada de fibra plástica. Las casas son de variados modelos y colores, en algunos casos modelos adoptados de las ciudades con espacios de parqueaderos, corredores amplios.

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la capacidad de circulación en la vía, imagen y seguridad, de las poblaciones que se encuentran en la vía con la dotación de infraestructura vial en buen estado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- 1.1 Limpieza de cunetas.
- 1.2 Limpieza de bordillos
- 1.3 Limpieza de Alcantarillas
- 1.4 limpieza de derrumbes.
- 1.5 Bacheo Asfáltico.
- 1.6 Estabilización de sitios críticos.

MICROEMPRESAS:

- Cantera Chauca
- Matapin
- Zhoray

**Beneficios Cualitativos**

Mediante el mantenimiento vial se reduce el costo del transporte, los tiempos de traslado, se extiende el tiempo de vida útil de la vía y se brinda seguridad al conductor y peatón.

**Tipo de Beneficiario**

Comerciantes  
Agricultores  
Sector Turístico  
Población en general


**Restricciones**

Tiempo: El plazo para el mantenimiento es anual.  
Costo: El valor total para el mantenimiento es aproximadamente de USD \$500.000,00 por año.  
Alcance Se espera contar con la red vial estatal de la provincia del Cañar en condiciones óptimas para el Tránsito vehicular y peatonal.  
Recursos: Personal y maquinaria del MTOP- Cañar, así como contratación de Asociación de Microempresarios.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 65.70 %  
Fecha de Inicio: 01/01/2014      Fecha de Fin: 31/03/2022

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	76 %	76 %	78 %	78 %	78 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	82 %
	Avance real acumulado											
	76 %	76 %	78 %									
Estado												
	●	●	●									

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay - El Triunfo y Pasos Laterales; y, Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	02/05/2019 - 08:18 AM
<p>MARZO 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay - El Triunfo y Pasos Laterales; y, Zhud - Biblián, panamericana antigua tramo Biblián - Descanso. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud Río Angas y Matrama Mazar.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	02/04/2019 - 04:21 PM
<p>FEBRERO 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/03/2019 - 10:29 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se ha contratado 2 microempresas desde el 26 y 27 de febrero de 2019, las mismas que atienden los tramos: Zhud Río Angas y Matrama Mazar.		
ENERO 2019  Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián. Se ha contratado 2 microempresas desde el 26 y 27 de febrero de 2019, las mismas que atienden los tramos: Zhud Río Angas y Matrama Mazar.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/03/2019 - 10:28 AM
ENERO 2019  Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián. Se ha iniciado la gestión para obtener recursos para la contratación de microempresas.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	05/02/2019 - 08:14 AM
DICIEMBRE 2018  Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vía Zhud - Biblián. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Río Angas.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	04/01/2019 - 08:09 AM
NOVIEMBRE 2018  Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; Y Zhud - Río Angas.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/12/2018 - 05:07 PM
OCTUBRE 2018  Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; Y Zhud - Río Angas.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/11/2018 - 04:09 PM
SEPTIEMBRE 2018  Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/10/2018 - 12:31 PM
AGOSTO 2018  Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Buestan Toral, José Remigio	05/09/2018 - 05:30 PM
JULIO 2018  Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Dután Sanango, Italo Medardo	03/08/2018 - 10:45 AM
JUNIO 2018  Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/07/2018 - 12:31 PM
Mayo2018  Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/06/2018 - 04:46 PM
Abril 2018	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/05/2018 - 02:08 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 4 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso.		
Marzo 2018  Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 4 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/04/2018 - 04:18 PM
Febrero 2018  Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Descanso - Azogues, y Troncal - Puerto Inca. No se ha logrado contratar a las microempresas por falta de aprobación del aval para el servicio de voluntariado.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:52 AM
ENERO 2018  Se realiza mantenimiento de la vía matrama - Mazar por administración directa, puesto que no se ha podido contratar a las microempresas.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:50 AM
DICIEMBRE 2017  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, con el propósito de mantener la vía en condiciones de transitabilidad confiable para los usuarios.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/01/2018 - 04:48 PM
NOVIEMBRE 2017  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, con el propósito de mantener la vía en condiciones de transitabilidad confiable para los usuarios.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/12/2017 - 04:15 PM
OCTUBRE 2017  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano. Además se coloca tachas en la vía Azogues - Matrama con la ayuda de los microempresarios.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 11:48 AM
SEPTIEMBRE 2017  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/10/2017 - 03:38 PM
AGOSTO 2017  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/09/2017 - 05:53 PM
JULIO 2017	García González,	05/08/2017 - 09:29 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues.</p> <p>Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano</p>	Mariana Alexandra	
<p><b>JUNIO 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante la limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal.. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues.</p> <p>Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano.</p>	García González, Mariana Alexandra	05/07/2017 - 10:29 AM
<p><b>MAYO 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal..</p> <p>Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar con tres microempresas de conservación vial contratadas</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	01/06/2017 - 11:28 AM
<p><b>ABRIL 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal..</p> <p>Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar con tres microempresas de conservación vial contratadas</p>	García González, Mariana Alexandra	05/05/2017 - 12:37 PM
<p><b>MARZO 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal</p> <p>Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 02:13 PM
<p><b>FEBRERO 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal</p> <p>Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 02:12 PM
<p><b>FEBRERO 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano,</p> <p>Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/03/2017 - 01:35 PM
<p><b>DICIEMBRE 2016</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes y bacheo en la carretera Matrama-Mazar, en la carretera descansos-azogues-biblian (panamericana)</p> <p>Y en la carretera Zhud-Biblián se encuentran realizando limpieza de cunetas, bordillos y roza a mano</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/01/2017 - 07:03 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2016</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes y bacheo en la carretera Matrama-Mazar, en la carretera descansos-azogues-biblian (panamericana)</p> <p>Y en la carretera Zhud-Biblián se encuentran realizando limpieza de cunetas, bordillos y roza a mano</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/12/2016 - 03:07 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2016</p> <p>los contratos de las microempresas culminó por falta de recursos . Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazary la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana)</p>	<p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p>	<p>05/11/2016 - 06:33 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de alcantarillas desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p>	<p>04/10/2016 - 07:46 PM</p>
<p>AGOSTO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de alcantarillas desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>01/09/2016 - 07:51 AM</p>
<p>JULIO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 5+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>04/08/2016 - 12:30 PM</p>
<p>JUNIO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 10+000 al 19+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>04/07/2016 - 02:32 PM</p>
<p>MAYO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>05/06/2016 - 08:12 PM</p>
<p>ABRIL 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 30+000 al Km 60+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>05/05/2016 - 07:43 AM</p>
<p>MARZO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 00+000 al Km 30+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>04/04/2016 - 09:32 PM</p>
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 30+000 al Km 50+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>06/03/2016 - 05:26 PM</p>
<p>ENERO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 20+000</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>05/02/2016 - 10:45 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
al Km 50+000 de la carretera Matrama-Mazar		
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 30+000 al Km 69+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2016 - 07:38 AM
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 30+000 al Km 69+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/12/2015 - 10:21 AM
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP continua con la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/11/2015 - 10:25 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP continua con la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/10/2015 - 04:22 PM
<p>AGOSTO 2015</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2015 - 10:24 AM
<p>JULIO 2015</p> <p>Por la fuerte temporada invernal En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de derrumbes y alcantarillas con personal y maquinaria del MTOP Km 30 +000 al 69+000..</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2015 - 09:28 PM
<p>JUNIO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños desde el Km 40 +000 al 69+000..</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/07/2015 - 03:42 PM
<p>MAYO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 10+000 al 19+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/06/2015 - 02:17 PM
<p>ABRIL 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 00+000 al 10+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/05/2015 - 07:48 AM
<p>MARZO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 10+000 al 19+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2015 - 03:35 PM
<p>FEBRERO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/03/2015 - 09:41 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
E la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos.		
ENERO 2014  En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y limpieza del derecho de via. en la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando el bacheo asfaltico desde el Km 6+000 al 19+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/02/2015 - 03:21 PM
DICIEMBRE 2014  Se esta realizando el bacheo asfaltico en la carretera Biblian-Azogues-Descanso, antigua panamericana, tambien la limioieza de cunetas y bordillos en la carretera Azogues-Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2015 - 11:49 AM
NOVIEMBRE 2014  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos.  Tambien se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos del tramo Azogues a Matrama.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/12/2014 - 03:21 PM
OCTUBRE 2014  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos.  Tambien se esta realizando la limpieza de derrumbes pequeños en el tramo comprendido entre el Km 50 + 000 al 60 +000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/11/2014 - 09:31 PM
SEPTIEMBRE 2014  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de derrumbes pequeños.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/10/2014 - 12:09 PM
AGOSTO 2014  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta restituyendo una alcantarilla en el sector de Buenos Aires en la carretera Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2014 - 08:44 PM
JULIO 2014  En la carretera Matrama-mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos, como tambien de derrumbes pequeños con personal y maquinaria del MTOP y la microempresa.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2014 - 10:39 PM
JUNIO 2014  En la carretera Matrama-mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos, como tambine de derrumbes pequeños.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	10/07/2014 - 08:31 AM
MAYO 2014  En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos y tambien alcantarillas. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos como tambien la limpieza de derrumbes pequeños.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	03/06/2014 - 02:34 PM
ABRIL 2014  En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos como	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/05/2014 - 08:05 PM



### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
tambien la limpieza de alcantarillas.		
<b>MARZO 2014</b> En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando el sellado de fisuras. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos. Se esta limpiando alcantarillas con ayuda de la excavadora 320 en el sector de Buenos Aires.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2014 - 07:40 AM
<b>FEBRERO 2014</b> En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando mla limpieza de cunetas, En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de Alcantarillas.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	28/02/2014 - 09:31 AM
<b>ENERO 2014</b> En la carrtera Matrama-Mazar, en el tramo entre Buenos Aires y Rivera se esta realizando el bacheo con mezcla asfaltica.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2014 - 07:27 AM

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Recursos.</b> Falta de recursos CAUSARÍA el retraso del mantenimiento de la vía	02/04/2019	Galo Fernando Izquierdo Campoverde	60 %	80	48	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2014	3-Adjudicación	10/01/2014		10/01/2014		Sí	2.0
2	PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2014	3-Adjudicación	10/01/2014		10/01/2014		Sí	2.0
3	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 30+000 al 60+000 en la carretera Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	15/05/2014		15/05/2014		Sí	2.0
4	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 00+000 al 19+000 en la carretera Descanso-Biblian	5-Entregables Intermedios	15/06/2014		15/06/2014		Sí	2.0
5	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el	5-Entregables Intermedios	15/07/2014		15/07/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	periodo de Enero a Junio del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP							
6	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	15/07/2014		15/07/2014		Sí	2.0
7	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera Azogues-Matrama-Mazar Realizado	5-Entregables Intermedios	15/08/2014		15/08/2014		Sí	3.0
8	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera biblian-Azogues-Descanso Realizado	5-Entregables Intermedios	15/09/2014		15/09/2014		Sí	3.0
9	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 00+000 al 30+000 en la carretera Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	15/10/2014		15/10/2014		Sí	2.0
10	EJECUCION: Limpieza de derrumbes en la carretera matrama-mazar	5-Entregables Intermedios	15/11/2014		15/11/2014		Sí	3.0
11	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	3.0
12	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
13	PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2015	3-Adjudicación	10/01/2015		10/01/2015		Sí	2.0
14	PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2015	3-Adjudicación	10/01/2015		10/01/2015		Sí	2.0
15	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 30+000 al 60+000 en la carretera Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	15/05/2015		15/05/2015		Sí	2.0
16	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 00+000 al 19+000 en la carretera Descanso-Biblian	5-Entregables Intermedios	15/06/2015		15/06/2015		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
17	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2015 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	15/07/2015		15/07/2015		Sí	3.0
18	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2015 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	15/07/2015		15/07/2015		Sí	3.0
19	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera Azogues-Matrama-Mazar Realizado	5-Entregables Intermedios	15/08/2015		15/08/2015		Sí	3.0
20	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera biblian-Azogues-Descanso Realizado	5-Entregables Intermedios	15/09/2015		15/09/2015		Sí	3.0
21	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 00+000 al 30+000 en la carretera Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		15/10/2015		Sí	3.0
22	EJECUCION: Limpieza de derrumbes en la carretera matrama-mazar	5-Entregables Intermedios	15/11/2015		15/11/2015		Sí	3.0
23	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2015 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	3.0
24	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	3.0
25	EJECUCION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2016	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		16/05/2016		Sí	2.0
26	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	19/07/2016		19/07/2016		Sí	1.0
27	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-	5-Entregables Intermedios	19/07/2016		19/07/2016		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP							
28	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
29	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues- Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
30	EJECUCION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2017	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/02/2017		Sí	1.0
31	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de enero a junio 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	24/07/2017		31/12/2017		Sí	1.0
32	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues- Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	24/07/2017		31/12/2017		Sí	1.0
33	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	1.0
34	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues- Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	1.0
35	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscritas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2017		31/12/2017		Sí	1.0
36	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a junio 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP							
37	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.5
38	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Diciembre del 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.0
39	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Troncal - Puerto Inca en el periodo de Enero a Diciembre del 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.0
40	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio - diciembre 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.0
41	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Febero a Marzo del 2019 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	29/03/2019		29/03/2019		Sí	2.0
42	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Abril a Junio del 2019 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	28/06/2019	01/07/2019			No	1.0
43	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Julio a Septiembre del 2019 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	01/10/2019			No	1.0
44	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2019	03/02/2020			No	0.5
45	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	en el periodo de Octubre a Diciembre del 2019 Realizado a satisfaccion del MTOP							
46	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Febero a Marzo del 2020 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	01/04/2020		▼	No	1.0
47	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Abril a Junio del 2020 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	01/07/2020		▼	No	1.0
48	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Julio a Septiembre del 2020 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	01/10/2020		▼	No	1.0
49	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscritas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2020	31/12/2020		●	No	0.5
50	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Octubre a Diciembre del 2020 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	01/01/2021		▼	No	1.0
51	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Febero a Marzo del 2021 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/03/2021	02/04/2021		▼	No	1.0
52	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Abril a Junio del 2021 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	02/07/2021		▼	No	1.0
53	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Julio a Septiembre del 2021 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	01/10/2021		▼	No	1.0



**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
54	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5
55	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Octubre a Diciembre del 2020 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	2.0
56	CIERRE: Informes del Supervisor aprobados	5-Entregables Intermedios	04/01/2022	06/01/2022			No	1.0
57	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	10/01/2022	14/01/2022			No	1.0
58	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	15/02/2022	15/02/2022			No	2.0
59	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	5-Entregables Intermedios	22/02/2022	22/02/2022			No	1.0
60	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	25/02/2022	25/02/2022			No	1.0
61	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	15/03/2022	15/03/2022			No	1.5
62	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/03/2022	31/03/2022			No	0.5

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión Positiva: Limpieza de cunetas y bordillos	Quishpi Vélez, Luis Manuel	{PR} - Provincia - CAÑAR	31/08/2017
2	Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza y mantenimiento	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	20/07/2016
3	Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza en la vía.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/04/2016
4	Supervisión Positiva- Se realizan mantenimientos en diferentes vías	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/11/2015
5	Limpieza de cunetas y lastrado de las vías en las Parroquias	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/05/2015
6	Verificación de la terminación del Proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2015
7	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/10/2014
8	Mantenimiento vial, limpieza de derrumbes	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/05/2014

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Km de la Red Vial en buen estado		100.00 %	0.17	0.17	01/01/2014	Abril
2	Porcentaje de cumplimiento económico del cronograma		120.77 %	0.13	0.157	01/01/2014	Abril



**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,797,233.31 **
Costo Total:	830,000.00
Total Devengado:	2,481,869.00
% Costo Total Devengado:	299.02 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 299.02 %

**Perfil Económico 2019**

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
<b>Ppto. Planeado</b>	1,628,872.00	3,140,000.00	0.00	<b>4,768,872.00</b>
<b>Ppto. Externo Planeado</b>	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	2,401,029.99	324,433.13	0.00	<b>2,725,463.12</b>
<b>Ppto. Codificado</b>	2,091,963.90	324,433.13	0.00	<b>2,416,397.03</b>
<b>Ppto. Comprometido</b>	1,643,552.68	9,265.45	0.00	<b>1,652,818.13</b>
<b>Planeado - Codificado (2019)</b>		2,815,566.87		
<b>Programado a Devengar</b>	2,732,384.37	324,433.13	0.00	<b>3,056,817.50</b>
<b>Ppto. Devengado</b>	2,472,800.18	9,068.82	0.00	<b>2,481,869.00</b>
<b>Pagado Real</b>	1,576,194.53	9,068.82	0.00	<b>1,585,263.35</b>
<b>Estimado a fin de año</b>	* 2,472,800.18	0.00	0.00	<b>2,472,800.18</b>
<b>Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)</b>	259,584.19	324,433.13	0.00	<b>584,017.32</b>
<b>% de Programado a Devengar vs. Devengado</b>	* 90.50 %	2.80 %	0.00 %	<b>81.19 %</b>
<b>Ppto. Codificado 998</b>	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Ppto. Devengado 998</b>	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019**

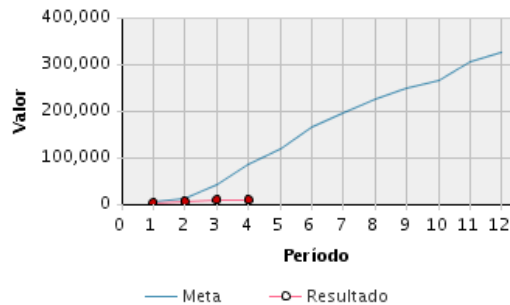

**Presupuesto Mensual 2019**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	4,507.69	2,877.22	4,507.69	2,877.22	63.83 %		0.89 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	8,007.69	3,095.80	12,515.38	5,973.02	47.73 %		1.84 %
Mar	29,263.95	3,095.80	41,779.33	9,068.82	21.71 %		2.80 %
Abr	42,434.78	0.00	84,214.11	9,068.82	10.77 %		2.80 %
May	34,934.78		119,148.89				
Jun	45,434.78		164,583.67				
Jul	29,668.98		194,252.65				
Ago	30,410.77		224,663.42				
Sep	24,734.76		249,398.18				
Oct	15,978.51		265,376.69				
Nov	40,807.68		306,184.37				
Dic	18,248.76		324,433.13				
<b>Total</b>	<b>324,433.13</b>	<b>9,068.82</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
15	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		Planilla_microempresa_Sageo_marzo_2017.pdf	05/05/2017
2		Planilla_microempresa_Matapin_marzo_2017.pdf	05/05/2017
3		Planilla_microempresa_Zhoray_marzo_2017.pdf	05/05/2017
4		Orden_de_compra_La_Primavera_-_Septiembre.pdf	01/11/2017
5	A1-Informe sitop-mayo-05-micro-Matapin	Inf-sitop-mayo05--micro-Matapin.pdf	09/06/2015
6	A10-Inf-sitop-junio-2017	informe_ejecutivo_El_Descanso.pdf	05/07/2017
7	A11-Inf-sitop-junio-2017	Matrama_Mazar_tramo_1.pdf	05/07/2017
8	A12-Inf-sitop-junio-2017	Matrama_Mazar_tramo_2.pdf	05/07/2017
9	A13-Inf-sitop-junio-2017	Informe_Troncal_Puerto_Inca.pdf	05/07/2017
10	A2-Informe-sitop-mayo-05-micro-Zhoray	Inf-sitop-mayo-05-micro-Zhoray.pdf	09/06/2015
11	A3-Informe sitop-junio-05-micro-Sageo	Informe_sitop_junio-05_micro-Sageo.pdf	08/07/2015
12	A4-Informe sitop junio-05-micro-Matapin	Informe_sitop_junio-05_micro-Matapin.pdf	08/07/2015
13	A5-Informe-sitop-junio-05-micro-Zhoray	Informe_sitop_junio-05-micro-zhoray.pdf	08/07/2015
14	A6-Informe-sitop-micro-matapin-agos-05	Inf-sitop-matapin-agos-05.pdf	07/09/2015
15	A7-Inf-micro-sageo-junio-06	A7-Inf-micro-sageo-junio-06.pdf	04/07/2016
16	A8-Inf-sitop-julio-06-Matapin	A8-Inf-sitop-julio-06-Matapin.pdf	04/08/2016
17	A9-Inf-sitop-julio-06-Zhoray	A9-Inf-sitop-julio-06-Zhoray.pdf	04/08/2016
18	Acta de planilla 4	ACTA.pdf	05/07/2018
19	Acta de recepcion parcial Chontamarca	22348_Chontamarca_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf	05/11/2018
20	Acta de recepcion parcial Chontamarca septiembre	22348_Chontamarca_Acta_recepción_parcial_Septiembre_2018.pdf	20/08/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
21	Acta de recepcion parcial LA PRIMAVERA	21009_La_Primavera_Acta_Recepción_Parcial_Octubre_2018.pdf	05/12/2018
22	Acta de recepcion parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA CHONTAMARCA	22348_Chontamarca_Acta_Recepción_Parcial_Diciembre_2018.pdf	04/01/2019
23	Acta de recepcion parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA LA PRIMAVERA	21009_La_Primavera_Acta_Recepción_Parcial_Diciembre_2018.pdf	04/01/2019
24	Acta de recepcion parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA MATAPIN	Acta_de_recepcion_parcial_Matapin.pdf	04/01/2019
25	Acta de recepcion parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA NUEVO JAVIN	21450_Nuevo_Javin_Acta_Recepción_Parcial_Noviembre_2018.pdf	04/01/2019
26	Acta de recepcion parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA SAGEO	Acta_de_recepcion_parcial_sageo_diciembre.pdf	04/01/2019
27	Acta de recepcion parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA SAN ANTONIO	21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_Recepción_Parcial_Noviembre_2018.pdf	04/01/2019
28	Acta de recepcion parcial NUEVO JAVIN	21450_Nuevo_Javin_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf	05/12/2018
29	Acta de recepcion parcial PANCHO NEGRO	21453_Américas_Pancho_Negro_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf	05/12/2018
30	Acta de recepción definitiva	Acta_de_trabajos_microempresa_primavera.pdf	05/08/2017
31	Acta de recepción definitiva	Acta_de_trabajos_microempresa_primavera.pdf	05/08/2017
32	Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa CHONTAMARCA	22348_Chontamarca_Acta_Recepción_Definitiva_2018.pdf	04/01/2019
33	Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa LA PRIMAVERA	21009_La_Primavera_Acta_Recepción_Definitiva_2018.pdf	04/01/2019
34	Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa MATAPIN	Acta_de_recepcion_definitivo_Matapin.pdf	04/01/2019
35	Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa NUEVO JAVIN	21450_Nuevo_Javin_Acta_Recepción_Definitiva.pdf	04/01/2019
36	Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa San Antonio	21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_Recepción_Definitiva.pdf	04/01/2019
37	Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa ZHORAY	Acta_de_recepcion_definitiva.pdf	04/01/2019
38	Acta de recepción microempresa AMERICAS	_actalas_americas.pdf	05/09/2018
39	Acta de recepción microempresa AMERICAS	21453_Américas_Pancho_Negro_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
40	Acta de recepción microempresa AMERICAS	21453_Américas_Pancho_Negro_Acta_recepción_parcial_Septiembre_2018.pdf	05/11/2018
41	Acta de recepción microempresa matapin	Acta_de_recepción_parcial_Matrama_mazar_T1.pdf	05/10/2017
42	Acta de recepción microempresa matapin	Acta_Microempresa_Matapin_-_Sep.pdf	01/11/2017
43	Acta de recepción microempresa matapin	19561_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf	05/12/2017
44	Acta de recepción microempresa matapin	19561_Acta_de_recepción_parcial_2.pdf	05/01/2018
45	Acta de recepción microempresa MATAPIN	acta_matapin.pdf	05/09/2018
46	Acta de recepción microempresa MATAPIN	21007_Acta_recepción_parcial_Matapin_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
47	Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN	_actanuevo_javin.pdf	05/09/2018
48	Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN	21450_Nuevo_Javin_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
49	Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN	21450_Nuevo_Javin_Acta_recepción_parcial_Septiembre_2018.pdf	05/11/2018
50	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	Acta_de_recepción_parcial_Troncal_P.Inca.pdf	05/10/2017
51	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	Acta_Microempresa_La_Primavera_-_Sep.pdf	01/11/2017
52	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	19558_-_Acta_Definitiva.pdf	05/12/2017
53	Acta de recepción microempresa Primavera	20489_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf	05/01/2018
54	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	acta_primavera.pdf	05/09/2018
55	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	21009_La_Primavera_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
56	Acta de recepción microempresa sageo	Acta_de_recepción_parcial_Descaso_Biblián.pdf	05/10/2017
57	Acta de recepción microempresa sageo	Acta_Microempresa_Sageo_-_Sep.pdf	01/11/2017
58	Acta de recepción microempresa sageo	19559_-Acta_Definitiva.pdf	05/12/2017
59	Acta de recepción microempresa sageo	20488_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf	05/01/2018
60	Acta de recepción microempresa SAGEO	acta_sageo.pdf	05/09/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
61	Acta de recepción microempresa SAGEO	21008_Acta_recepción_parcial_Sageo_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
62	Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO	acta_s@n_antonio_de_paguacay.pdf	05/09/2018
63	Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO	21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
64	Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO	21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_recepción_parcial_Sepiembre_2018.pdf	05/11/2018
65	Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO	21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf	05/12/2018
66	Acta de recepción microempresa zhoray	Acta_de_recepción_parcial_Matrama_Mazar_T2.pdf	05/10/2017
67	Acta de recepción microempresa zhoray	Acta_Microempresa_Zhoray_-_Sep.pdf	01/11/2017
68	Acta de recepción microempresa zhoray	19562_-_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf	05/12/2017
69	Acta de recepción microempresa zhoray	19562_-_Acta_de_recepción_parcial_2.pdf	05/01/2018
70	Acta de recepción microempresa ZHORAY	acta_zhoray.pdf	05/09/2018
71	Acta de recepción microempresa ZHORAY	21006_Acta_recepción_Zhoray_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
72	Acta de recepción parcial mes de abril 2019	23397_Acta_Recepción_Parcial_Nuevo_Javín_Abril_2019.pdf	02/05/2019
73	Acta de recepción parcial mes de abril 2019 Zhoray	23398_Acta_Recepción_Parcial_Zhoray_Abril_2019.pdf	02/05/2019
74	Acta de recepción parcial mes de marzo 2019	23397_Acta_Recepción_Parcial_Nuevo_Javín_Marzo_2019.pdf	02/05/2019
75	Acta de recepción parcial mes de marzo 2019 Zhoray	23398_Acta_Recepción_Parcial_Zhoray_Marzo_2019.pdf	02/05/2019
76	INFOMRE SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_ZHORAY.pdf	04/10/2016
77	INFOMRME SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_MATAPIN.pdf	04/10/2016
78	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	MICROEMPRESA_PRIMAVERA.pdf	05/09/2017
79	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESA_MATAPIN.pdf	05/09/2017
80	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVOMICROEMPRESA_SAGEO.pdf	05/09/2017
81	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVO_MICRO_ZHORAY.pdf	05/09/2017
82	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_ZHUD_-_CHILCHIL.pdf	03/08/2018
83	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_MATRAMA_MAZAR_T2.pdf	03/08/2018
84	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_TRONCAL_PUERTO_INCA.pdf	03/08/2018
85	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_EL_CHORRO-_EL_TRIUNFO.pdf	03/08/2018
86	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_CHILCHIL_-_EL_CHORRO.pdf	03/08/2018
87	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_MATRAMA_-_MAZAR_T1.pdf	03/08/2018
88	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJECT_DESCANSO_-_AZOG-_Bl.pdf	03/08/2018
89	Informe ejecutivo mes de junio 2018	Informe_ejecutivo_mantenimiento_Chorro_el_Triunfo.pdf	05/07/2018
90	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_ZHUD-COCHANCAJ.pdf	05/07/2018
91	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_SAN_ANTONIO.pdf	05/07/2018
92	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_Primavera.pdf	05/07/2018
93	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_matrama_mazar_t2.pdf	05/07/2018
94	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_descanso.pdf	05/07/2018
95	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_matrama_mazar_T1.pdf	05/07/2018
96	Informe ejecutivo mes de Marzo 2018 Descanso Biblián	informe_ejecutivo_sageo.pdf	05/04/2018
97	Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Matrama Mazar 1	Informe_ejecutivo_matapin.pdf	05/04/2018
98	Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Matrama Mazar 2	Informe_ejecutivo_zhoray.pdf	05/04/2018
99	Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Troncal Puerto Inca	informe_ejecutivo_PRIMAVERA.pdf	05/04/2018
100	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	Informe_ejecutivo_Zhud_-_Chilchil.pdf	05/06/2018
101	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	Informe_ejecutivo_Chilchil_-_El_Chorro.pdf	05/06/2018
102	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	Informe_ejecutivo_El_Chorro_-_El_Triunfo.pdf	05/06/2018
103	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	Informe_ejecutivo_tramo_1.pdf	05/06/2018
104	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	informe_ejecutivo_Troncal_Puerto.pdf	05/06/2018
105	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	informe_ejecutivo_zhoray_tramo_2.pdf	05/06/2018
106	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	informe_ejecutivo_Azogues_-_Descanso.pdf	05/06/2018
107	Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Mensual_Microempresa_La_Primavera_-_Sep.pdf	01/11/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
108	Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Mensual_Microempresa_Matapin_-_Sep.pdf	01/11/2017
109	Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Mensual_Microempresa_Sageo_-_Sep.pdf	01/11/2017
110	Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Mensual_Microempresa_Zhoray_-_Sep.pdf	01/11/2017
111	Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Descanso Biblián	Informe_Ejecutivo_Sageo.pdf	05/10/2017
112	Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Matrama Mazar 1	Informe_ejecutivo_Matapin.pdf	05/10/2017
113	Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Matrama Mazar 2	Informe_ejecutivo_Zhoray.pdf	05/10/2017
114	Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Troncal Puerto Inca	Informe_Ejecutivo_Primavera.pdf	05/10/2017
115	informe sitop matapin octubre	microempresa_matapin.pdf	05/11/2016
116	informe sitop octubre sageo	miroempresa_sageo.pdf	05/11/2016
117	INFORME SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_SAGEO.pdf	04/10/2016
118	Informe-sitop-micro-sageo-agos-05	Inf-sitop-sageo-agos-05.pdf	07/09/2015
119	informese sitop octubre zhoray	miroempresa_zhoray.pdf	05/11/2016
120	Orden de Compra Microempresa Matapin	19561_Orden_de_compra.pdf	05/12/2017
121	Planilla mes de junio de 2017 Troncal Puerto Inca	PLANILLA_MICROEMPRESA_PRIMAVERA.pdf	05/07/2017
122	Planilla mes de mayo de 2017 Tramo 1	PLANILLA_MICROEMPRESA_MATAPIN.pdf	05/07/2017
123	Planilla mes de mayo de 2017 Tramo 2	PLANILLA_MICROEMPRESA_ZHORAY.pdf	05/07/2017
124	Planilla mes de mayo el Descanso	PLANILLA_MICROEMPRESA_SAGEO.pdf	05/07/2017
125	Planilla Nro 1 Microempresa Nuevo Javin	23397_Planilla_1_Nuevo_Javín_Marzo_2019.pdf	02/05/2019
126	Planilla Nro 1 Microempresa Zhoray 2019	23398_Planilla_1_Zhoray_Marzo_2019.pdf	02/05/2019
127	Planilla Nro 2 Microempresa Nuevo Javin	23397_Planilla_2_Nuevo_Javín_Abril_2019.pdf	02/05/2019
128	Planilla Nro 2 Microempresa Zhoray 2019	23398_Planilla_2_Zhoray_Abril_2019.pdf	02/05/2019

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Chaca Álvarez, Ivan Patricio	Titular	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	ichaca@mtop.gob.ec	023974600
Chaca Álvarez, Ivan Patricio	Lider de Proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	ichaca@mtop.gob.ec	023974600
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
75724_1.jpg	05/04/2018
