

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3

Dirección Provincial Chimborazo

PROYECTO: K009 MTOP - Mantenimiento vial de la Provincia de Chimborazo

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto: | Andrade Almache, Patricio (pandrade@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Gamboa López, Enma Katherine | Programas Relacionados: | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, Provincia - Chimborazo, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular: | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.506.3813 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 4 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 80,424,061.85 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2012 - 31/12/2020 |
| Fecha de última actualización: | 26/07/2019 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2013 |
| Modificado por: | Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando | Fecha del siguiente Hito: | 31/07/2019 |

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Evaluación y reparación del Puente Cornelio Dávalos.
 Contratista: PATECA

Microempresas Contratadas:

Tramo Calpi - San Juan - El Arenal: Microempresa Patrono San Juan
 Tramo Guasuntos Chunchi: Microempresa Nueva Camino
 Tramo Huigra - Tomebamba: Microempresa Paquisha
 Tramo Tomebamba - El Triunfo: Microempresa Asociación San Felipe
 Tramo Riobamba - Penipe - Puela: Microempresa 9 de Febrero
 Tramo Alausí - Huigra: Microempresa Asociación de Conservación Vial Alausí

MONTO: Para el año 2014, se tiene asignado a este proyecto 33'803.942,04 USD

PRODUCTO/SERVICIO:

Al término de la ejecución de trabajos de mantenimiento vial, las vías presentarán condiciones confortables y seguras

LINEA BASE: Mantenimiento por administración directa y contratada

OBJETIVO GENERAL: Realizar el Mantenimiento Vial de la Provincia De Chimborazo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Presentar las condiciones de la vía en óptimas condiciones
 Mejorar la seguridad de los usuarios
 Mejorar el servicio de las vías
 Implementar obras complementarias que permitan facilitar el tráfico vehicular y proporcionar seguridad al tránsito vehicular y peatonal.
 Contar con un plan de manejo ambiental que permita mitigar el impacto en la ejecución de proyectos.
 Dotar de un sistema de señalización acorde a las especificaciones técnicas del MTOP e INEN, mediante la aplicación de señalética horizontal y vertical que permita a los usuarios de las vías el uso adecuado de las mismas.

Beneficios Cualitativos


Seguridad
 Mejor servicio al ciudadano
 Conservación de la infraestructura vial

| |
|------------------------------|
| Tipo de Beneficiario |
| Todos los usuarios de la vía |
| Restricciones |
| Condiciones climáticas |

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 84.22 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

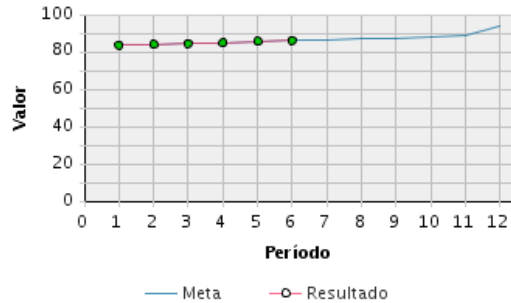

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2019 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 84 % | 84 % | 84 % | 85 % | 86 % | 86 % | 86 % | 87 % | 88 % | 88 % | 88 % | 94 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 84 % | 84 % | 84 % | 85 % | 86 % | 86 % | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| JUNIO 2019: 1.- Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa y con Asociaciones de Conservación Vial, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 04/07/2019 - 10:45 AM |
| MAYO 2019: 1.- Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa y con Asociaciones de Conservación Vial, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 03/06/2019 - 02:36 PM |
| ABRIL 2019: 1.- Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 02/05/2019 - 10:32 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | | |
| MARZO 2019: 1.- Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/04/2019 - 11:35 AM |
| FEBRERO 2019: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/04/2019 - 11:07 AM |
| FEBRERO 2019: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 01/03/2019 - 10:42 AM |
| ENERO 2019: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/02/2019 - 09:27 AM |
| DICIEMBRE 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/01/2019 - 09:22 AM |
| NOVIEMBRE 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/12/2018 - 09:30 AM |
| OCTUBRE 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/11/2018 - 11:05 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | | |
| <p>SEPTIEMBRE 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/10/2018 - 10:13 AM |
| <p>AGOSTO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/09/2018 - 05:03 PM |
| <p>JULIO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 02/08/2018 - 11:02 AM |
| <p>JUNIO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/07/2018 - 11:07 AM |
| <p>MAYO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/06/2018 - 09:14 AM |
| <p>ABRIL 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/05/2018 - 09:20 AM |
| <p>MARZO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/04/2018 - 10:06 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>FEBRERO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/03/2018 - 03:10 PM |
| <p>ENERO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/03/2018 - 03:09 PM |
| <p>DICIEMBRE 2017: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/01/2018 - 10:10 AM |
| <p>NOVIEMBRE 2017: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/12/2017 - 10:27 AM |
| <p>OCTUBRE 2017: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 02/11/2017 - 08:24 AM |
| <p>SEPTIEMBRE 2017: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/10/2017 - 07:38 PM |
| <p>AGOSTO 2017:</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/09/2017 - 01:50 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>CAUSAS: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial a la Red Vial Estatal, dando un mantenimiento rutinario evitando la progresión de fallas y atención emergente a siniestros naturales.</p> <p>ACCIONES: Se realiza trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones, bacheo menor, etc en cada uno de los tramos asignados a cada Asociación de Conservación Vial.</p> <p>tramos:</p> <ul style="list-style-type: none"> *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS *CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES *CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD | | |
| <p>JULIO 2017:</p> <p>CAUSAS: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial a la Red Vial Estatal, dando un mantenimiento rutinario evitando la progresión de fallas y atención emergente a siniestros naturales.</p> <p>ACCIONES: Se realiza trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones, bacheo menor, etc en cada uno de los tramos asignados a cada Asociación de Conservación Vial.</p> <p>tramos:</p> <ul style="list-style-type: none"> *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS *CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES *CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/08/2017 - 10:46 AM |
| <p>JUNIO 2017:</p> <p>Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p> <ul style="list-style-type: none"> *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS *CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES *CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD <p>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones.</p> <p>bacheo menor.</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/07/2017 - 05:03 PM |
| <p>MAYO 2017:</p> <p>Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p> <ul style="list-style-type: none"> *ALASÍ - PEPINALES +PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO *CALPI - CASA CONDOR *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI *SAN LUIS - SOCAVÓN *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS <p>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones.</p> <p>bacheo menor.</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/06/2017 - 03:11 PM |
| <p>ABRIL 2017:</p> <p>Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p> <ul style="list-style-type: none"> *ALASÍ - PEPINALES +PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO *CALPI - CASA CONDOR *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/05/2017 - 12:30 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|---|
| <p>*SAN LUIS - SOCAVÓN *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones. bacheo menor, y pintura sobre la calzada</p> | | |
| <p>MARZO 2017: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *ALASÍ - PEPINALES +PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO *CALPI - CASA CONDOR *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI *SAN LUIS - SOCAVÓN *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones. bacheo menor, y pintura sobre la calzada</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>03/04/2017 - 09:31 AM</p> |
| <p>FEBRERO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *ALASÍ - PEPINALES *PEDERNALES - LA Y DE SAN JOSÉ - CHUNCHI *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO *CALPI - CASA CONDOR *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI *SAN LUIS - SOCAVÓN *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - RUNGURAHUA *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO/CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones. bacheo menor, y pintura sobre la calzada</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>04/03/2017 - 09:25 PM</p> |
| <p>ENERO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por administración directa, se realizó trabajos de limpieza de derrumbes en 124,36 Km de la RVE Chimborazo, en los siguientes tramos: * Riobamba - Penipe *Penipe - Puela - Cahuají Bajo * Cahuají Bajo - Lte. Prov. chimborazo / Tungurahua * Guamote - Socavón - Vía (Riobamba - Cebadas) * Socavón (Riobamba - Cebadas) - El Atillo - Km 54.6 (Vía Cebadas - Alshi)</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>04/03/2017 - 09:16 PM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. * Riobamba - Penipe - Cahuají * Riobamba - Cebadas * Guamote - Socavón * Guasuntos - Chunchi * Alausí - Huigra Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y cunetas. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>04/01/2017 - 04:54 PM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena,</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>05/12/2016 - 06:37 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>*Huigra - Piedrero. * Riobamba - Penipe - Cahuají * Riobamba - Cebadas * Guamote - Socavón * Guasuntos - Chunchi * Alausí - Huigra Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 01/11/2016 - 04:26 PM |
| <p>SEPTIEMBRE 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/10/2016 - 10:32 AM |
| <p>AGOSTO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 01/09/2016 - 07:26 AM |
| <p>JULIO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/08/2016 - 10:43 AM |
| <p>JUNIO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/07/2016 - 12:35 PM |
| <p>MAYO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/06/2016 - 11:37 AM |
| <p>ABRIL 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p> | Paula López, Ricardo Octavio | 05/05/2016 - 10:07 AM |
| <p>MARZO 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe,</p> | Paula López, Ricardo Octavio | 08/04/2016 - 11:38 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | | |
| FEBRERO 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Paula López, Ricardo Octavio | 09/03/2016 - 10:44 PM |
| ENERO 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 10/02/2016 - 07:31 AM |
| DICIEMBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Paula López, Ricardo Octavio | 06/01/2016 - 05:35 PM |
| NOVIEMBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Paula López, Ricardo Octavio | 07/12/2015 - 03:57 PM |
| OCTUBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Paula López, Ricardo Octavio | 06/11/2015 - 12:25 AM |
| SEPTIEMBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 07/10/2015 - 03:28 PM |
| AGOSTO 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 08/09/2015 - 11:59 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | | |
| <p>JULIO 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Se realizó trabajos de bacheo en la carretera Riobamba - Penipe - Cahuajá Bajo</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 06/08/2015 - 10:47 AM |
| <p>Junio 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Se realizó trabajos de bacheo en la carretera Riobamba - Penipe - Cahuajá Bajo.</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 06/07/2015 - 01:15 PM |
| <p>Mayo 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | Paula López, Ricardo Octavio | 05/06/2015 - 01:14 PM |
| <p>Abril 2015: En etapa precontractual para contratación de microempresas</p> | Solis Mazón, Nestor Rubén | 07/05/2015 - 11:26 PM |
| <p>Marzo 2015 Proyecto con microempresas terminado. Por contratar 6 microempresas.</p> | Solis Mazón, Nestor Rubén | 07/04/2015 - 04:34 PM |
| <p>Febrero 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | Solis Mazón, Nestor Rubén | 09/03/2015 - 01:27 PM |
| <p>Enero 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | Solis Mazón, Nestor Rubén | 09/02/2015 - 09:40 AM |
| <p>Diciembre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Solis Mazón , Nestor Rubén 01/12/2014 - 04:31 PM</p> | Solis Mazón, Nestor Rubén | 08/01/2015 - 08:31 AM |
| <p>Noviembre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | Solis Mazón, Nestor Rubén | 01/12/2014 - 04:31 PM |
| <p>Octubre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | Solis Mazón, Nestor Rubén | 07/11/2014 - 12:37 PM |
| <p>Septiembre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | Solis Mazón, Nestor Rubén | 06/10/2014 - 11:51 AM |
| <p>Agosto 2014:</p> | Solis Mazón, Nestor Rubén | 11/09/2014 - 08:56 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | | |
| Julio 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Solis Mazón, Nestor Rubén | 03/08/2014 - 06:37 PM |
| Junio 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Solis Mazón, Nestor Rubén | 03/07/2014 - 03:24 PM |
| Mayo 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Solis Mazón, Nestor Rubén | 05/06/2014 - 11:44 PM |
| Abril 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Solis Mazón, Nestor Rubén | 07/05/2014 - 09:00 AM |
| Marzo 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Solis Mazón, Nestor Rubén | 07/04/2014 - 09:20 AM |
| Febrero 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Solis Mazón, Nestor Rubén | 10/03/2014 - 11:34 AM |
| Enero 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Solis Mazón, Nestor Rubén | 10/02/2014 - 08:24 AM |
| Diciembre 2013: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Solis Mazón, Nestor Rubén | 06/01/2014 - 11:28 AM |
| Noviembre 2013: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial. Construcción de sistemas bta's | Solis Mazón, Nestor Rubén | 02/12/2013 - 04:20 PM |
| Enero - Octubre 2013: Contratación de Microempresas. Construcción de muros Alquiler de maquinaria | Solis Mazón, Nestor Rubén | 13/11/2013 - 03:13 PM |
| Diciembre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH | Solis Mazón, Nestor Rubén | 07/01/2013 - 10:34 AM |
| Noviembre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH | Solis Mazón, Nestor Rubén | 07/12/2012 - 09:20 AM |
| Octubre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH | Solis Mazón, Nestor Rubén | 12/11/2012 - 06:15 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------|-------------------------------|
| <p>Septiembre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.</p> <p>Agosto 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.</p> <p>Julio 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.</p> <p>Junio 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.</p> <p>Mayo 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y Abril 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.</p> <p>Marzo 2012: Se inicia los trabajos el 9 de marzo de 2012 con las 4 microempresas en diferentes tramos de la la Red vial Estatal de la Provincia.</p> <p>Febrero 2012: -Proceso de adjudicación para realizar trabajos con microempresa.</p> <p>Enero 2012: - Campamento Chunchi: % de Avance 20%</p> | | |

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <p>5- PROYECTO. Recursos. Falta de asignación de recursos, CAUSARÍA retraso de la ejecución de los trabajos.</p> | 06/06/2019 | Patricio Andrade Almache | 30 % | 10 | 3 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo |

HITOS

| Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 EJECUCIÓN: Continuación de trabajos del año pasado. Trabajos ejecutados | 4-Inicio de Trabajo | 01/01/2014 | | 01/01/2014 | | Sí | 1.0 |
| 2 EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempres. Trabajos terminados | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 22/01/2014 | | 22/01/2014 | | Sí | 1.0 |
| 3 EJECUCIÓN: Inspección de Obra. Trabajos revisados | 5-Entregables Intermedios | 22/01/2014 | | 22/01/2014 | | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 4 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Actas firmadas FASE 1: Realizado | 5-Entregables Intermedios | 23/01/2014 | | 23/01/2014 | | Sí | 1.0 |
| 5 | PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada | 1-Solicitud de Información | 28/01/2014 | | 28/01/2014 | | Sí | 1.0 |
| 6 | PLANEACIÓN: Presupuesto Aprobado | 1-Solicitud de Información | 30/01/2014 | | 30/01/2014 | | Sí | 2.0 |
| 7 | PLANEACIÓN: Elaboración de pliegos realizados | 1-Solicitud de Información | 31/01/2014 | | 31/01/2014 | | Sí | 2.0 |
| 8 | PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado | 2-Publicación de Pliegos | 05/02/2014 | | 05/02/2014 | | Sí | 2.0 |
| 9 | EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Trabajos adjudicados | 3-Adjudicación | 13/02/2014 | | 13/02/2014 | | Sí | 1.0 |
| 10 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado | 3-Adjudicación | 20/02/2014 | | 20/02/2014 | | Sí | 1.0 |
| 11 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados | 4-Inicio de Trabajo | 21/02/2014 | | 21/02/2014 | | Sí | 1.0 |
| 12 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 19/06/2014 | | 19/06/2014 | | Sí | 1.0 |
| 13 | EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2014 | | 30/09/2014 | | Sí | 1.0 |
| 14 | EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015 | | 31/01/2015 | | Sí | 1.0 |
| 15 | EJECUCIÓN: Mantenimiento de señalización. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 10/02/2015 | | 10/02/2015 | | Sí | 1.0 |
| 16 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 20/02/2015 | | 20/02/2015 | | Sí | 1.0 |
| 17 | EJECUCIÓN: Ejecución de Planillas. Planillas ejecutadas | 4-Inicio de Trabajo | 21/02/2015 | | 21/02/2015 | | Sí | 1.0 |
| 18 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 24/02/2015 | | 24/02/2015 | | Sí | 1.0 |
| 19 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 2: Realizado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015 | | 28/02/2015 | | Sí | 1.0 |
| 20 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 2.1: Realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 03/03/2015 | | 03/03/2015 | | Sí | 1.0 |
| 21 | PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada | 1-Solicitud de Información | 17/04/2015 | | 17/04/2015 | | Sí | 2.0 |
| 22 | PLANEACIÓN: Presupuesto Aprobado | 1-Solicitud de Información | 22/04/2015 | | 22/04/2015 | | Sí | 2.0 |
| 23 | PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado | 1-Solicitud de Información | 29/04/2015 | | 29/04/2015 | | Sí | 2.0 |
| 24 | PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado | 2-Publicación de Pliegos | 04/05/2015 | | 04/05/2015 | | Sí | 2.0 |
| 25 | EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Trabajos adjudicados | 3-Adjudicación | 11/05/2015 | | 11/05/2015 | | Sí | 1.0 |
| 26 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado | 3-Adjudicación | 18/05/2015 | | 18/05/2015 | | Sí | 1.0 |
| 27 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados | 4-Inicio de Trabajo | 25/05/2015 | | 25/05/2015 | | Sí | 1.0 |
| 28 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 26/06/2015 | | 26/06/2015 | | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 29 | EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 26/06/2015 | | 26/06/2015 | | Sí | 1.0 |
| 30 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 28/08/2015 | | 28/08/2015 | | Sí | 1.0 |
| 31 | EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 25/09/2015 | | 25/09/2015 | | Sí | 1.0 |
| 32 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2015 | | 30/10/2015 | | Sí | 1.0 |
| 33 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 3: Realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2015 | | 30/12/2015 | | Sí | 2.0 |
| 34 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 3.1: Realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2015 | | 30/12/2015 | | Sí | 2.0 |
| 35 | PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada | 1-Solicitud de Información | 09/03/2016 | | 09/03/2016 | | Sí | 1.0 |
| 36 | PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado | 2-Publicación de Pliegos | 16/03/2016 | | 16/03/2016 | | Sí | 2.0 |
| 37 | EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Contratos adjudicados | 3-Adjudicación | 31/03/2016 | | 31/03/2016 | | Sí | 1.0 |
| 38 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado | 3-Adjudicación | 08/04/2016 | | 08/04/2016 | | Sí | 1.0 |
| 39 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados | 4-Inicio de Trabajo | 12/04/2016 | | 12/04/2016 | | Sí | 1.0 |
| 40 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2016 | | 31/07/2016 | | Sí | 1.0 |
| 41 | EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016 | | 31/08/2015 | | Sí | 1.0 |
| 42 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 30/09/2016 | | Sí | 1.0 |
| 43 | EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016 | | 30/09/2016 | | Sí | 1.0 |
| 44 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016 | | 30/11/2016 | | Sí | 1.0 |
| 45 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 4: Realizado | 5-Entregables Intermedios | 27/12/2016 | | 27/12/2016 | | Sí | 0.5 |
| 46 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 4.1: Realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2016 | | 30/12/2016 | | Sí | 0.5 |
| 47 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado | 3-Adjudicación | 02/02/2017 | | 02/02/2017 | | Sí | 1.0 |
| 48 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados | 4-Inicio de Trabajo | 03/02/2017 | | 03/02/2017 | | Sí | 1.0 |
| 49 | PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada | 1-Solicitud de Información | 06/02/2017 | | 06/02/2017 | | Sí | 2.0 |
| 50 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1 | 5-Entregables Intermedios | 02/03/2017 | | 02/03/2017 | | Sí | 1.0 |
| 51 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 5: Realizado | 5-Entregables Intermedios | 02/04/2017 | | 02/04/2017 | | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 52 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado | 3-Adjudicación | 02/04/2017 | | 02/04/2017 | | Sí | 1.0 |
| 53 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 5.1: Realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 02/04/2017 | | 02/04/2017 | | Sí | 2.0 |
| 54 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados | 4-Inicio de Trabajo | 03/04/2017 | | 03/04/2017 | | Sí | 2.0 |
| 55 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1 | 5-Entregables Intermedios | 02/05/2017 | | 02/05/2017 | | Sí | 1.0 |
| 56 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 6 Realizado | 5-Entregables Intermedios | 02/06/2017 | | 02/06/2017 | | Sí | 1.0 |
| 57 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 6.1: Realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 02/06/2017 | | 02/06/2017 | | Sí | 1.0 |
| 58 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado | 3-Adjudicación | 09/06/2017 | | 09/06/2017 | | Sí | 0.5 |
| 59 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados | 4-Inicio de Trabajo | 12/06/2017 | | 12/06/2017 | | Sí | 0.5 |
| 60 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1 | 5-Entregables Intermedios | 11/07/2017 | | 11/07/2017 | | Sí | 1.0 |
| 61 | EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE-Chimborazo. Planilla 2 | 5-Entregables Intermedios | 12/08/2017 | | 11/08/2017 | | Sí | 1.0 |
| 62 | EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE-Chimborazo. Planilla 3 | 5-Entregables Intermedios | 11/09/2017 | | 11/09/2017 | | Sí | 1.0 |
| 63 | EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE-Chimborazo. Planilla 4 | 5-Entregables Intermedios | 20/10/2017 | | 20/10/2017 | | Sí | 1.0 |
| 64 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas, Derrumbes menores | 5-Entregables Intermedios | 25/10/2017 | | 25/10/2017 | | Sí | 1.0 |
| 65 | EJECUCIÓN: Desmonte, roza a mano, ayuda emergente | 5-Entregables Intermedios | 01/11/2017 | | 01/11/2017 | | Sí | 1.0 |
| 66 | EJECUCIÓN: Limpieza de todos los sistemas de drenaje | 5-Entregables Intermedios | 25/11/2017 | | 25/11/2017 | | Sí | 1.0 |
| 67 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 7: Realizado | 4-Inicio de Trabajo | 21/12/2017 | | 21/12/2017 | | Sí | 1.0 |
| 68 | EJECUCIÓN: limpieza de derrumbes y ayudas emergentes | 5-Entregables Intermedios | 25/12/2017 | | 25/12/2017 | | Sí | 0.5 |
| 69 | EJECUCIÓN:Recepción definitiva. Firmada FASE 7.1 Realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 27/12/2017 | | 27/12/2017 | | Sí | 1.5 |
| 70 | EJECUCIÓN: Inicio de trabajos | 4-Inicio de Trabajo | 15/03/2018 | | 15/03/2018 | | Sí | 1.0 |
| 71 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias | 5-Entregables Intermedios | 15/12/2018 | | 15/12/2018 | | Sí | 1.0 |
| 72 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2018 | | 31/12/2018 | | Sí | 1.0 |
| 73 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2019 | | 31/01/2019 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | emergencias Administración Directa | | | | | | | |
| 74 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias Administración Directa | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2019 | | 28/02/2019 | | Sí | 0.5 |
| 75 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias Administración Directa | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2019 | | 31/03/2019 | | Sí | 0.5 |
| 76 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019 | | 30/04/2019 | | Sí | 0.5 |
| 77 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019 | | 31/05/2019 | | Sí | 0.5 |
| 78 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019 | | 30/06/2019 | | Sí | 0.5 |
| 79 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019 | 31/07/2019 | | | No | 0.5 |
| 80 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2019 | 31/08/2019 | | | No | 0.5 |
| 81 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019 | 30/09/2019 | | | No | 0.5 |
| 82 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019 | 31/10/2019 | | | No | 0.5 |
| 83 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019 | 30/11/2019 | | | No | 0.5 |
| 84 | CIERRE: Firma de Acta Entrega Recepción de los trabajos de mantenimiento. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2019 | 31/12/2019 | | | No | 5.0 |
| 85 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019 | 31/12/2019 | | | No | 0.5 |
| 86 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2020 | 31/03/2020 | | | No | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | de Conservación Vial varios tramos RVE primer trimestre | | | | | | | |
| 87 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE segundo trimestre | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2020 | 30/06/2020 | | | No | 0.5 |
| 88 | CIERRE: Firma de Acta Entrega Recepción de los trabajos de mantenimiento tercer trimestre | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | | No | 5.0 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | La obra esta en Curso | Calle Verzozzi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 26/08/2016 |
| 2 | Las obras estan en ejecución | Calle Verzozzi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 29/09/2015 |
| 3 | El mantenimiento esta en proceso | Calle Verzozzi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 27/10/2015 |
| 4 | Las obras siempre esta en constante mantenimiento | Calle Verzozzi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 29/06/2015 |
| 5 | El mantenimiento vial en la Provincia esta en ejecución | Calle Verzozzi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 23/12/2014 |
| 6 | la obra esta en ejecución | Calle Verzozzi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 19/08/2014 |
| 7 | Dr. Hermuy Calle V. | Calle Verzozzi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 25/02/2014 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|-------------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de microempresas contratadas | | 100.00 % | 15 | 15 | 01/01/2012 | Abr-Jun |
| 2 | Kilómetros Mantenidos | | 100.00 % | 0.95 | 0.95 | 01/01/2012 | Junio |

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 80,424,061.85 ** |
| Costo Total: | 20,000,000.00 |
| Total Devengado: | 20,131,018.78 |
| % Costo Total Devengado: | 100.66 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 100.66 %

Perfil Económico 2019

| | Años Previos | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total |
|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 12,649,795.19 | 30,851,593.61 | 55,789,200.00 | 99,290,588.80 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 11,981,158.17 | 4,518,344.89 | 0.00 | 16,499,503.06 |
| Ppto. Codificado | 20,382,560.26 | 4,518,344.89 | 0.00 | 24,900,905.15 |
| Ppto. Comprometido | 17,151,567.64 | 14,501.82 | 0.00 | 17,166,069.46 |
| Planeado - Codificado (2019) | | 26,333,248.72 | | |
| Programado a Devengar | 16,827,004.65 | 4,518,344.89 | 0.00 | 21,345,349.54 |
| Ppto. Devengado | 20,116,516.96 | 14,501.82 | 0.00 | 20,131,018.78 |
| Pagado Real | 13,365,623.70 | 14,501.82 | 0.00 | 13,380,125.52 |
| Estimado a fin de año | * 20,116,516.96 | 0.00 | 0.00 | 20,116,516.96 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | -3,289,512.31 | 4,518,344.89 | 0.00 | 1,228,832.58 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 119.55 % | 0.32 % | 0.00 % | 94.31 % |
| Ppto. Codificado 998 | 27,690.38 | 0.00 | 0.00 | 27,690.38 |
| Ppto. Devengado 998 | 27,690.38 | 0.00 | 0.00 | 27,690.38 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

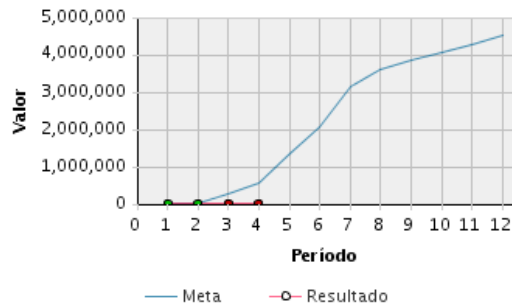

Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 4,600.92 | 4,600.92 | 4,600.92 | 4,600.92 | 100.00 % | ● | 0.10 % |

| Presupuesto Mensual 2019 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 4,950.45 | 4,950.45 | 9,551.37 | 9,551.37 | 100.00 % | | 0.21 % |
| Mar | 271,450.45 | 4,950.45 | 281,001.82 | 14,501.82 | 5.16 % | | 0.32 % |
| Abr | 290,233.22 | 0.00 | 571,235.04 | 14,501.82 | 2.54 % | | 0.32 % |
| May | 771,402.62 | | 1,342,637.66 | | | | |
| Jun | 722,444.62 | | 2,065,082.28 | | | | |
| Jul | 1,069,721.57 | | 3,134,803.85 | | | | |
| Ago | 457,520.68 | | 3,592,324.53 | | | | |
| Sep | 251,733.91 | | 3,844,058.44 | | | | |
| Oct | 225,733.90 | | 4,069,792.34 | | | | |
| Nov | 217,233.90 | | 4,287,026.24 | | | | |
| Dic | 231,318.65 | | 4,518,344.89 | | | | |
| Total | 4,518,344.89 | 14,501.82 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 16 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 17 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 18 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |
| 19 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 1 | A.1 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2011 | A.1.pdf | 11/03/2014 |
| 2 | A.2 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2012 | A.2.pdf | 11/03/2014 |
| 3 | A.3 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2012 | A.3.jpg | 11/03/2014 |
| 4 | A.4 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo febrero 2012 - Microempresa | A.4.pdf | 13/03/2014 |
| 5 | A.5 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo marzo 2012 - Microempresa | A.5.pdf | 13/03/2014 |
| 6 | A.6 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo abril 2012 - Microempresa | A.6.pdf | 13/03/2014 |
| 7 | A.7 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo mayo 2012 | A.7.pdf | 13/03/2014 |
| 8 | A.8 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo junio 2012 - Microempresa | A.8.pdf | 13/03/2014 |
| 9 | A.9 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo julio 2012 - Microempresa | A.9.pdf | 13/03/2014 |
| 10 | Acta Definitiva Alausi Huigra 13-02-2015 | Acta_Definitiva_Alausi_Huigra_13-02-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 11 | Acta Definitiva Calpi San Juan El Arenal 13-02-2015 | Acta_Definitiva_Calpi_San_Juan_El_Arenal_13-02-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 12 | Acta Definitiva Guasuntos Chunchi 13-02-2015 | Acta_Definitiva_Guasuntos_Chunchi_13-02-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 13 | Acta Definitiva Huigra Tomebamba 13-02-2015 | Acta_Definitiva_Huigra_Tomebamba_13-02-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 14 | Acta Definitiva Riobamba Penipe 13-02-2015 | Acta_Definitiva_Riobamba_Penipe_13-02-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 15 | Acta Definitiva Tomebamba El Triunfo 13-02-2015 | Acta_Definitiva_Tomebamba_El_Triunfo_13-02-2015.pdf | 02/07/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 16 | ASOCIACION HITO 25.- Firma de contrato | D.7.pdf | 05/06/2015 |
| 17 | ASOCIACIÓN HITO 71 INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | k009.pdf | 03/04/2018 |
| 18 | B.1 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo agosto 2012 - Microempresa | B.1.pdf | 13/03/2014 |
| 19 | B.2 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo septiembre 2012 - Microempresa | B.2.pdf | 13/03/2014 |
| 20 | B.3 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo octubre 2012 - Microempresa | B.3.pdf | 13/03/2014 |
| 21 | B.4 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo noviembre 2012 - Microempresa | B.4.pdf | 13/03/2014 |
| 22 | B.5 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo diciembre 2012 - Microempresa | B.5.pdf | 13/03/2014 |
| 23 | B.6 ASOCIACION HITO 1.- Acta recepción Definitiva Mantenimiento rutinario Calpi - San Juan - El Arenal | B.6.pdf | 13/03/2014 |
| 24 | B.6 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo octubre 2013 - Microempresa | B.6.pdf | 13/03/2014 |
| 25 | B.7 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo diciembre 2013 - Microempresa | B.7.pdf | 13/03/2014 |
| 26 | B.8 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo enero 2014- microempresas | B.8.pdf | 13/03/2014 |
| 27 | B.9 ASOCIACION HITO 4.- Acta recepción Definitiva Mantenimiento rutinario Calpi - San Juan - El Arenal | B.9.pdf | 13/03/2014 |
| 28 | C.1 ASOCIACION HITO 10.- Firma Contrato Mantenimiento Calpi San Juan El Arenal | C.1.pdf | 13/03/2014 |
| 29 | C.2 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo febrero 2014- microempresas | C.2.pdf | 13/03/2014 |
| 30 | C.3 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo marzo 2014- microempresas | C.3.pdf | 07/04/2014 |
| 31 | C.4 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo abril 2014- microempresas | C.4.pdf | 07/05/2014 |
| 32 | C.5 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo mayo 2014- microempresas | C.5.pdf | 06/06/2014 |
| 33 | C.6 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo junio 2014- microempresas | C.6.pdf | 03/07/2014 |
| 34 | C.7 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo julio 2014- microempresa | C.7.pdf | 03/08/2014 |
| 35 | C.8 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo agosto 2014- microempresa | C.8.pdf | 11/09/2014 |
| 36 | C.9 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo septiembre 2014- microempresa | C.9.pdf | 06/10/2014 |
| 37 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2012 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO | cedula_presupuestaria_2012_mantenimiento_vial_provincia | 09/02/2016 |
| 38 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2013 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO | cedula_presupuestaria_2013_mantenimiento_vial_provincia | 09/02/2016 |
| 39 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2014 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO | cedula_presupuestaria_2014_mantenimiento_vial_provincia | 09/02/2016 |
| 40 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2015 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO | cedula_presupuestaria_2015_mantenimiento_vial_provincia | 09/02/2016 |
| 41 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2016 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO | cedula_presupuestaria_2016_mantenimiento_vial_provincia | 09/02/2016 |
| 42 | Contrato Mantenimiento Alausi Huigra 15-05-2015 | Contrato_Mantenimiento_Alausi_Huigra__15-05-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 43 | Contrato Mantenimiento Calpi San Juan El Arenal 06-05-2015 | Contrato_Mantenimiento_Calpi_San_Juan_El_Arenal_06-05-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 44 | Contrato Mantenimiento Guasuntos Chunchi 15-05-2015 | Contrato_Mantenimiento_Guasuntos_Chunchi__15-05-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 45 | Contrato Mantenimiento Huigra Tomebamba 15-05-2015 | Contrato_Mantenimiento_Huigra_Tomebamba__15-05-2015.pdf | 02/07/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 46 | Contrato Mantenimiento Riobamba Penipe 15-05-2015 | Contrato_Mantenimiento_Riobamba_Penipe__15-05-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 47 | Contrato Mantenimiento Tomebamba El Triunfo 15-05-2015 | Contrato_Mantenimiento_Tomebamba_El_Triunfo_15-05-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 48 | D.1 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo octubre 2014- microempresa | D.1.pdf | 07/11/2014 |
| 49 | D.2 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo diciembre 2014- microempresa | D.2.pdf | 08/01/2015 |
| 50 | D.3 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo enero 2015- microempresa | D.3.pdf | 09/02/2015 |
| 51 | D.4 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo febrero 2015- microempresa | D.4.pdf | 09/03/2015 |
| 52 | D.5 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo marzo 2015- microempresa | D.5.pdf | 07/04/2015 |
| 53 | D.6. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo abril 2015- microempresa | D.6.pdf | 08/05/2015 |
| 54 | D.7. ASOCIACION HITO 26.- Contrato legalizado | D.7.pdf | 09/06/2015 |
| 55 | D.8. ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos | D.8.pdf | 09/06/2015 |
| 56 | D.9. ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos | D.9.pdf | 08/07/2015 |
| 57 | E.1 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos | E.1 | 06/08/2015 |
| 58 | E.10 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Mayo 2016 | E.10.pdf | 03/06/2016 |
| 59 | E.11 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Junio 2016 | E.11.pdf | 11/07/2016 |
| 60 | E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Agosto 2016 | E.12.pdf | 01/09/2016 |
| 61 | E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Julio 2016 | E.12.pdf | 03/08/2016 |
| 62 | E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Octubre 2016 | E.12...pdf | 01/11/2016 |
| 63 | E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Septiembre 2016 | E.12..pdf | 04/10/2016 |
| 64 | E.2 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos | E.2.pdf | 08/09/2015 |
| 65 | E.3 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos | E.3.pdf | 07/10/2015 |
| 66 | E.4 ASOCIACIÓN HITO 32.- Limpieza de derrumbes | E.4 | 06/11/2015 |
| 67 | E.5 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo noviembre 2015 | E.5.pdf | 07/12/2015 |
| 68 | E.6 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo diciembre 2015 | E.6 | 13/01/2016 |
| 69 | E.7 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo enero 2016 | E.7.pdf | 10/02/2016 |
| 70 | E.8 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo febrero 2016 | E.8.pdf | 09/03/2016 |
| 71 | E.9 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo marzo 2016 | E.9.pdf | 08/04/2016 |
| 72 | F.7. ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Noviembre 2016 | F.7.pdf | 05/12/2016 |
| 73 | F.8 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Diciembre 2016 | F.8.pdf | 04/01/2017 |
| 74 | F.9 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo FEBRERO 2017 | F.9..pdf | 04/03/2017 |
| 75 | G.1. ASOCIACIÓN HITO 51 Mantenimiento Administración Directa ENERO 2016 | %_de_mantenimiento_de_la_RVE_de_Chimborazo.jpg | 04/03/2017 |
| 76 | G.2 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo ABRIL 2017 | G.2.pdf | 05/05/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|-----------|---------------|
| 77 | G.3 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo MAYO 2017 | G3.pdf | 05/06/2017 |
| 78 | G.4 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo JUNIO 2017 | G.4..pdf | 05/07/2017 |
| 79 | G.5 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo JULIO 2017 | K009.pdf | 04/08/2017 |
| 80 | G.6 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo AGOSTO 2017 | K009.pdf | 05/09/2017 |
| 81 | G.7 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo SEPTIEMBRE 2017 | K009.pdf | 05/10/2017 |
| 82 | G.7 ASOCIACIÓN HITO 64 Informe Ejecutivo OCTUBRE 20178 | G.8.pdf | 01/11/2017 |
| 83 | G.9 ASOCIACIÓN HITO 66 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | K009.pdf | 04/12/2017 |
| 84 | H.1 ASOCIACIÓN HITO 67 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017 | k009..pdf | 04/01/2018 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|-------------|
| | Fiscalizador | | | |
| | Supervisor Conservación Vial | | | |
| | Supervisor Financiero | | | |
| Horna Sanipatín, Wilson | Coordinador Técnico | | salio@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Ponce Sigchay, Felix Ramiro | Director Provincial de Chimborazo | Director Distrital de Transporte y Obras Publicas del Chimborazo | fponce@mtop.gob.ec | |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 35904_1.jpg | 05/06/2016 |
