

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Tungurahua

PROYECTO: K017 MTOP - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

Líder del Proyecto:	Rodríguez Martínez, Edison Fabian (erodriguez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gamboa López, Enma Katherine	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, Provincia - Tungurahua, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	González Chávez, Alexandra del Rocío	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3799	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,611,448.32
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	26/07/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	20/06/2019

DATOS GENERALES

Descripción

Producto/Servicio: Servicio de Mantenimiento de infraestructura vial de la provincia de Tungurahua con la participación de microempresas y por administración directa.

Línea base: La Provincia de Tungurahua cuenta con 242,73 KM de red vial estatal de los cuales 188,73 KM reciben mantenimiento vial mediante microempresas y por administración directa y la diferencia a través de concesión vial.

Objetivo General:

Mantener la infraestructura vial de la provincia que pertenece a la red vial estatal en buenas condiciones de movilidad durante todo el año e implementar un proceso de movilidad continua, cubriendo requerimientos de infraestructura adecuada de primer nivel, y garantizando el desarrollo socioeconómico de la población.

Objetivos Específicos:

- .Mantener en estado óptimo la infraestructura de la Red Vial, que corresponde a la Dirección Provincial Tungurahua.
- .Garantizar vías en buenas condiciones de circulación vehicular, permitiendo seguridad en sus beneficiarios
- .Disminuir tiempos de viaje y reducir costos de operación de transporte.

Beneficios Cualitativos

- El tiempo de desplazamiento se reducirá.
- El comercio va a mejorar en la provincia.
- Se va a contar con mayor seguridad vial en las carreteras.
- Se contribuye con la interconexión provincial y nacional.

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Directos :
Mujeres 259.800
Hombres 244.783

Restricciones

Tiempo: El proyecto se planifica ejecutar hasta 2021
Costo: 19.019.715,59
Calidad: 242,73 Km de vía con mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, desbroce de maleza, señalética vertical y horizontal, bacheo y atención de derrumbes y deslizamientos
Recursos: Hasta 2018 recursos con financiamiento de fuente fiscal, 2019 recursos con financiamiento con crédito externo


Restricciones

Riesgos: La caída de ceniza volcán Tungurahua causa un mantenimiento permanente de calzada y cunetas, condiciones climáticas
 Alcance: Provincia Tungurahua 242,73 KM que corresponde a la red vial estatal

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 75.80 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

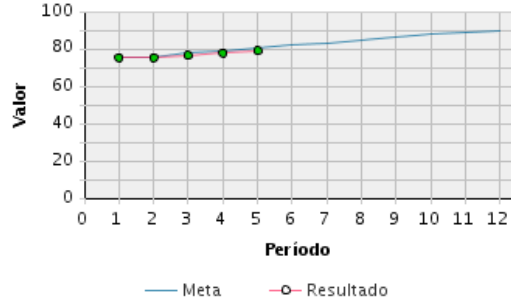

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	75 %	75 %	78 %	79 %	80 %	82 %	83 %	85 %	86 %	88 %	89 %	90 %
	Avance real acumulado											
	75 %	75 %	77 %	78 %	79 %							
	Estado											
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2019 1. El mantenimiento se lo realiza con el personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantemnimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA.	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	03/07/2019 - 10:36 AM
MAYO 2019 1. El mantenimiento se lo realiza con el personal del MTOP. y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantemnimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA.	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/06/2019 - 11:23 AM
ABRIL 2019 1. El mantenimiento se lo realiza con el personal del MTOP. y Se contrato las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantemnimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA.	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	02/05/2019 - 03:49 PM
MARZO 2019 1. El mantenimiento se lo realizó con el personal del MTOP.	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	01/04/2019 - 08:43 AM
FEBRERO 2019 1. El mantenimiento se lo esta realizando con el personal del MTOP. 2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2019	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	01/03/2019 - 12:23 PM
ENERO 2019 1. El mantenimiento se lo esta realizando con el personal del MTOP.	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	05/02/2019 - 02:11 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2019		
<p>DICIEMBRE 2018</p> <p>Se cuenta con 9 Microempresas, ejecutando trabajos de mantenimiento en toda la RVE de la Dirección Distrital de Tungurahua con actividades tales como limpieza de cunetas, alcantarillas, señalética vertical, roce a mano, bacheos menores.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	04/01/2019 - 04:18 PM
<p>OCTUBRE 2018:</p> <p>1. Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. 2. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas en trámite de pago del 8vo mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/12/2018 - 03:58 PM
<p>OCTUBRE 2018:</p> <p>1. Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. 2. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el SEPTIMO mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/11/2018 - 04:45 PM
<p>SEPTIEMBRE 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el SEXTO mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/10/2018 - 07:42 PM
<p>AGOSTO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el quinto mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/09/2018 - 06:48 PM
<p>JUNIO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el cuarto mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	Galarza García, Diego Fernando	02/08/2018 - 10:00 PM
<p>JUNIO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el segundo mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/07/2018 - 05:52 PM
<p>MAYO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Asociaciones de Conservación Vial, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/06/2018 - 11:34 AM
<p>ABRIL 2018:</p> <p>1. Se realizó la contratación de microempresas para atender la RVE de Tungurahua en los tramos corrspodientes. 2. Los trabajos de las asociaciones de Conservación Vial, iniciaron el 2 de abril del 2018.</p>	Galarza García, Diego Fernando	04/05/2018 - 05:19 PM
<p>FEBRERO 2018:</p> <p>1. Se realizó la contratación de microempresas para atender la RVE de Tungurahua en los tramos corrspodientes. 2. Lo strabajos iniciaron el 2 de abril del 2018</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/04/2018 - 12:38 PM
<p>FEBRERO 2018:</p> <p>1. El manteneimiento selo esta realizando con lepersonal del MTOP. 2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/03/2018 - 07:23 PM
<p>ENERO 2018:</p> <p>1. El manteneimiento selo esta realizando con lepersonal del MTOP. 2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/03/2018 - 07:22 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2018: 1. El mantenimiento se está realizando con el personal del MTOP. 2. Se está en espera de generación de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018</p>	Galarza García, Diego Fernando	28/02/2018 - 05:54 PM
<p>DICIEMBRE 2017: Las microempresas contratadas trabajaron en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), hasta el 29 de Diciembre del 2017.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/01/2018 - 05:09 PM
<p>NOVIEMBRE 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza),.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/12/2017 - 04:31 PM
<p>OCTUBRE 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p>	Galarza García, Diego Fernando	01/11/2017 - 01:31 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	05/10/2017 - 06:40 PM
<p>AGOSTO 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	05/09/2017 - 05:23 PM
<p>JULIO 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	04/08/2017 - 07:54 PM
<p>JUNIO 2017: Se realizó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017, y actualmente se encuentran trabajando en la red estatal.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/07/2017 - 04:38 PM
<p>MAYO 2017: Se realizó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017, y actualmente se encuentran trabajando en la red estatal.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/06/2017 - 04:09 PM
<p>ABRIL 2017: Se realizó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/05/2017 - 10:02 AM
<p>MARZO 2017: Se comenzó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/04/2017 - 06:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017.		
FEBRERO 2017: No se han contratado Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que se contrataran por catalogo electrónico del portal de compras publicas, una vez que se cuente con el aval del ministerio de finanzas.	Gamboa López, Enma Katherine	05/03/2017 - 10:18 AM
ENERO 2017: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas, y concluyeron sus trabajos el 15 de Enero del 2017, actualmente en recepción de los trabajos	Gamboa López, Enma Katherine	06/02/2017 - 10:16 AM
DICIEMBRE 2016: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas, y concluyen sus trabajos el 15 de Enero del 2017.	Gamboa López, Enma Katherine	04/01/2017 - 06:28 PM
NOVIEMBRE 2016: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas, y concluyeron sus trabajos el 02 de Noviembre, actualmente en tramite de recepción de trabajos y a la espera de recursos para proceder a contratar mas microempresas	Gamboa López, Enma Katherine	05/12/2016 - 06:55 PM
OCTUBRE 2016: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	05/11/2016 - 04:30 PM
SEPTIEMBRE 2016: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	01/10/2016 - 02:23 PM
AGOSTO 2016: Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotalo-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	04/09/2016 - 11:36 AM
JULIO 2016: Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Cahuaji- Pillate Cotalo), mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 01 de Junio del 2016 y rigen hasta el 30 de Junio del 2016, adicional a ello se procedio a realizar la contratción de la misma forma de dos microempresas para el tramo Pelileo- Baños- Limite provincial con Pastaza, misma que rigen hasta finales de Julio del 2016, luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado, el 15 de Julio se procedio a la compra por catalogo electronico de la microempresa Ramo de Girasol, misma que concluye su trabajo el 15 de Agosto del 2016	Moya Medina, Dilon German	03/08/2016 - 04:24 PM
JUNIO 2016: Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Cahuaji- Pillate Cotalo), mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 01 de Junio del 2016 y rigen hasta el 30 de Junio del 2016, adicional a ello se procedio a realizar la contratción de la misma forma de dos microempresas	Moya Medina, Dilon German	05/07/2016 - 05:51 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
para el tramo Pelileo- Baños- Limite provincial con Pastaza, misma que rigen hasta finales de Julio del 2016, luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.		
<p>MAYO 2016: Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo), mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 22 de Abril del 2016 y rigen hasta el 24 de Mayo del 2016 Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	05/06/2016 - 05:01 PM
<p>ABRIL 2016: Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo), mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 22 de Abril del 2016 y rigen hasta el 24 de Mayo del 2016 Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	05/05/2016 - 07:35 PM
<p>MARZO 2016: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	10/04/2016 - 08:41 PM
<p>FEBRERO 2016: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	04/03/2016 - 01:53 PM
<p>ENERO 2016: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	11/02/2016 - 04:22 PM
<p>DICIEMBRE 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	11/02/2016 - 04:21 PM
<p>NOVIEMBRE 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>		
<p>OCTUBRE 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	06/11/2015 - 03:51 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	06/11/2015 - 03:51 PM
<p>AGOSTO 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	Moya Medina, Dilon German	09/09/2015 - 03:32 PM
<p>JULIO 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado</p>	Moya Medina, Dilon German	07/08/2015 - 03:40 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado</p>	Moya Medina, Dilon German	09/07/2015 - 02:35 PM
<p>MAYO 2015: Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado</p> <p>ABRIL 2015: Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado</p> <p>Marzo 2015: Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado</p>	Moya Medina, Dilon German	03/06/2015 - 03:20 PM
<p>DICIEMBRE 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas de coronación, roza a mano, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato, limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	07/01/2015 - 04:58 PM
<p>NOVIEMBRE 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas de coronación, roza a mano, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato, limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	05/12/2014 - 08:31 AM
<p>AGOSTO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	03/09/2014 - 12:16 PM
<p>JULIO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	08/08/2014 - 12:05 PM
<p>JUNIO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	09/07/2014 - 05:17 PM
<p>MAYO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.</p> <p>JUNIO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	08/07/2014 - 07:41 PM
<p>ABRIL 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos.</p>	Guevara Rodriguez, Luis	30/04/2014 - 03:36 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodriguez, Luis	01/04/2014 - 09:13 AM
FEBRERO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodriguez, Luis	05/03/2014 - 03:55 PM
ENERO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodriguez, Luis	06/02/2014 - 09:10 AM
DICIEMBRE 2013: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodriguez, Luis	06/02/2014 - 09:09 AM
Noviembre 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodriguez, Luis	28/11/2013 - 01:45 PM
Octubre 2013: Se trabaja con personal y equipo de la Dirección Provincial de Tungurahua en el mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; se procedio adjudicar los procesos en el portal de compras públicas a dos Asociaciones de Conservación vial para el mantenimiento rutinario del paso lateral de Ambato y del tramo desde el redondel de Terremoto hasta Pelileo. Estos contratos inician el 1 de noviembre de 2013, el plazo es de un año.	Guevara Rodriguez, Luis	05/11/2013 - 02:54 PM
Septiembre 2013: Se trabaja con personal y equipo de la Dirección Provincial de Tungurahua en el mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; se ha elevado al portal de compras públicas dos procesos para contratar Asociaciones de Conservación vial patra el mantenimiento rutinario de el paso lateral de ambato y del tramo desde el redondel de terremoto hasta Pelileo.	Guevara Rodriguez, Luis	05/11/2013 - 02:51 PM
Agosto 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	05/09/2013 - 03:33 PM
Julio 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	07/08/2013 - 08:58 AM
Julio 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	07/08/2013 - 08:58 AM
Mayo 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	04/06/2013 - 05:24 PM
Abril 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	02/05/2013 - 11:55 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Marzo 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo</p>	<p>Proaño Paredes, Marco Antonio</p>	<p>02/05/2013 - 11:55 AM</p>
<p>Febrero 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo</p>	<p>Proaño Paredes, Marco Antonio</p>	<p>06/03/2013 - 03:53 PM</p>
<p>Enero 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo</p>	<p>Proaño Paredes, Marco Antonio</p>	<p>06/03/2013 - 03:52 PM</p>
<p>Diciembre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo</p>	<p>Proaño Paredes, Marco Antonio</p>	<p>06/03/2013 - 03:51 PM</p>
<p>Noviembre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos.</p>	<p>Proaño Paredes, Marco Antonio</p>	<p>07/12/2012 - 02:25 PM</p>
<p>Octubre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos.</p> <p>Septiembre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos en el tramo Redondel de Terremoto Pelileo.</p> <p>Agosto 2012: Se trabaja con personal y Equipo de DPT en la limpieza de cunetas, , limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo. Se ha contratado a través del Portal de Compras Públicas dos Asociaciones de Conservación Vial para em mantenimiento rutinario y atención de emergencias en dos tramos de la Red Vial Estatal. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta via.</p> <p>Julio 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo y culmina el contrato el 31 de julio de 2012, actualmente se elaborán los pliegos para la contratación de las microempresas por un año. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta via.</p> <p>Junio 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta via.</p> <p>Mayo 2012:</p>	<p>Proaño Paredes, Marco Antonio</p>	<p>21/11/2012 - 09:27 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo: en la carretera Ambato - Guaranda.</p> <p>Abril 2012: Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo: en la carretera Ambato - Guaranda.</p> <p>Marzo 2012: Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Se concluye la señalización de las vías; Paso lateral de Ambato;Redondel de terremoto - Totoras;Totoras - Pelileo Tisaleo-Cevallos-Totoras y Rita Vincés.</p> <p>Febrero 2012: Se trabaja con las microempresas en la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Atención de emergencias. Se contrata señalización para las vías; Paso lateral de Ambato;Redondel de terremoto - Totoras;Totoras - Pelileo Tisaleo-Cevallos-Totoras y Rita Vincés.</p> <p>Enero 2012: Se trabaja con las microempresas en la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Atención de emergencias.</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Temporada Invernal	03/07/2019	Edison Fabian Rodriguez Martinez	50	50	25	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. Deslaves y derrumbes CAUSARÍA la interrupción y posible destrucción de la vía.	03/07/2019	Edison Fabian Rodriguez Martinez	20 %	10	2	2/3

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Ambato
2	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Baños de Agua Santa
3	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Mocha

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
4	Zona 3 - Centro > Tungurahua > San Pedro de Pelileo
5	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Tisaleo

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2012		31/01/2012		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2012		29/02/2012		Sí	10.0
3	EJECUCION: Señalización vial de Tungurahua ejecutado.	9-Entregables Formales	15/03/2012		15/03/2012		Sí	0.65
4	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2012		31/03/2012		Sí	0.65
5	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2012		30/04/2012		Sí	0.65
6	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2012		31/05/2012		Sí	0.65
7	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/06/2012		Sí	0.65
8	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2012		30/07/2012		Sí	0.65
9	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2012		31/08/2012		Sí	0.65
10	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.65
11	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2012		31/10/2012		Sí	0.65
12	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estatal de Tungurahua ejecutado.							
13	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		30/12/2012		Sí	0.65
14	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.65
15	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.65
16	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	0.65
17	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.65
18	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		31/05/2013		Sí	0.65
19	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/06/2013		Sí	0.65
20	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	1-Solicitud de Información	30/07/2013		30/07/2013		Sí	0.65
21	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	1-Solicitud de Información	30/08/2013		30/08/2013		Sí	0.65
22	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.65
23	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/10/2013		Sí	0.65
24	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		30/12/2013		Sí	0.65
26	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.65
27	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.65
28	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.65
29	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.65
30	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.65
31	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.65
32	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.65
33	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	0.65
34	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.65
35	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.65
36	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.65
37	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.							
38	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.65
39	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.65
40	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.65
41	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.65
42	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.65
43	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.65
44	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.65
45	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.65
46	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.65
47	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.65
48	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.65
49	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estatal de Tungurahua ejecutado.							
50	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	0.65
51	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.65
52	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.65
53	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.65
54	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.65
55	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.65
56	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	0.65
57	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.65
58	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.65
59	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.65
60	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.65
61	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
62	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.65
63	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.65
64	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.65
65	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	0.65
66	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.65
67	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.65
68	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.65
69	EJECUCION: El informe anual respecto al Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua elaborado.	1-Solicitud de Información	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.65
70	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. Fase I	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.65
71	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.65
72	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.65
73	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
74	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.65
75	EJECUCIÓN: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I	5-Entregables Intermedios	15/03/2018		28/02/2018		Sí	0.65
76	EJECUCION: Firma del contrato e inicio de trabajos Rehabilitación de la carpeta asfáltica en el paso lateral sur Ambato	5-Entregables Intermedios	05/12/2018		05/12/2018		Sí	0.65
77	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
78	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
79	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
80	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
81	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
82	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
83	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
84	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
85	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
86	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
87	EJECUCIÓN: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase II	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
88	EJECUCION: Rehabilitación del Paso Lateral Sur Ambato	5-Entregables Intermedios	25/03/2019		11/03/2019		Sí	0.65
89	EJECUCION: Líquidación Económica Rehabilitación Paso Lateral Sur Ambato	5-Entregables Intermedios	28/03/2019	20/06/2019			No	0.65
90	EJECUCION: Recepción Provisional Rehabilitación Paso Lateral Sur Ambato	5-Entregables Intermedios	29/03/2019	30/06/2019			No	0.65
91	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
92	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.65
93	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.65
94	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.65
95	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.65
96	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	30/06/2019	30/06/2019			No	0.65
97	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019	30/06/2019			No	0.65
98	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	31/07/2019			No	0.65
99	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	31/07/2019			No	0.65
100	EJECUCION: Recepción Definitiva Rehabilitación Paso lateral Sur Ambato	5-Entregables Intermedios	28/08/2019	28/08/2019			No	0.65
101	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	31/08/2019	31/08/2019			No	0.65
102	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2019	31/08/2019			No	0.65
103	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019			No	0.65
104	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019			No	0.65
105	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	31/10/2019	31/10/2019			No	0.65
106	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019	31/10/2019			No	0.65
107	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	0.65
108	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
109	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2019	30/12/2019			No	0.45
110	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2019	30/12/2019			No	0.45
111	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua periodo enero diciembre 2020 ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.1
112	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua periodo enero diciembre 2021 ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	0.1
113	CIERRE: Acta entrega recepción - Definitiva	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2021	31/12/2021			No	10.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	TRABAJO EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	29/09/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de incidentes atendidos		100.00 %	1	1	01/01/2019	Abr-Jun
2	Porcentaje de Km mantenidos		95.93 %	1	0.9593	01/01/2019	Abr-Jun
3	POrcentaje de microempresas en labores de mantenimiento vial		100.00 %	1	1	01/01/2019	Abr-Jun

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,611,448.32 **
Costo Total:	2,396,994.24
Total Devengado:	4,893,914.13
% Costo Total Devengado:	204.17 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 204.17 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,832,389.62	5,206,986.00	0.00	7,039,375.62
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	6,615,358.42	2,614,863.72	0.00	9,230,222.14
Ppto. Codificado	6,875,189.51	2,614,863.72	0.00	9,490,053.23
Ppto. Comprometido	5,578,299.00	0.00	0.00	5,578,299.00
Planeado - Codificado (2019)		2,592,122.28		
Programado a Devengar	5,745,266.44	2,614,863.72	0.00	8,360,130.16
Ppto. Devengado	3,996,584.60	897,329.53	0.00	4,893,914.13
Pagado Real	3,434,877.33	0.00	0.00	3,434,877.33
Estimado a fin de año	* 3,996,584.60	0.00	0.00	3,996,584.60
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,748,681.84	2,614,863.72	0.00	4,363,545.56
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 69.56 %	34.32 %	0.00 %	58.54 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

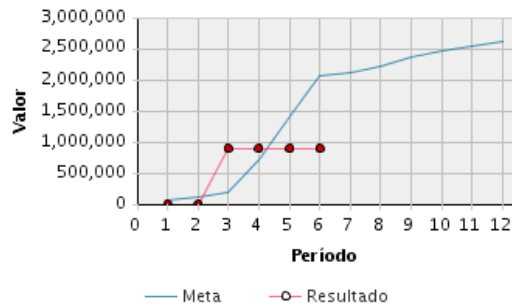

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	56,666.00	0.00	56,666.00	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	56,666.00	0.00	113,332.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	65,666.00	897,329.53	178,998.00	897,329.53	501.31 %		34.32 %
Abr	538,139.32	0.00	717,137.32	897,329.53	125.13 %		34.32 %
May	692,116.32	0.00	1,409,253.64	897,329.53	63.67 %		34.32 %
Jun	640,886.20	0.00	2,050,139.84	897,329.53	43.77 %		34.32 %
Jul	72,663.80		2,122,803.64				
Ago	84,013.09		2,206,816.73				
Sep	162,652.93		2,369,469.66				
Oct	105,428.69		2,474,898.35				
Nov	70,628.69		2,545,527.04				
Dic	69,336.68		2,614,863.72				
Total	2,614,863.72	897,329.53					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
18	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
19	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1 informe ejecutivo enero	nuevo_dia_enero.pdf	08/01/2014
2	A2 informe ejecutivo enero	girasoles_enero.pdf	08/01/2014
3	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA NUEVO DÍA MAYO 2016	A6.pdf	05/06/2016
4	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2016	A7.pdf	05/06/2016
5	Asociación de Conservación Vial Nuevo Día Informe Ejecutivo Septiembre	nuevoDia.pdf	10/10/2012
6	Asociación de Conservación Vial Ramo de Girasoles Informe Ejecutivo Septiembre	GIRASOLES.pdf	10/10/2012
7	ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00598.JPG	16/01/2012
8	ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00595.JPG	16/01/2012
9	AYUDA MEMORIA ABRIL 2016	A2.pdf	11/05/2016
10	AYUDA MEMORIA CHAUPI DICIEMBRE 2016	D2.pdf	04/01/2017
11	AYUDA MEMORIA CHAUPI ENERO 2017	D7.pdf	06/02/2017
12	AYUDA MEMORIA CHAUPI FEBRERO 2017	D8.pdf	05/03/2017
13	AYUDA MEMORIA CHAUPI JULIO 2016	B2.pdf	03/08/2016
14	AYUDA MEMORIA CHAUPI JUNIO 2017	F3.pdf	05/07/2017
15	AYUDA MEMORIA CHAUPI MAYO 2017	E4.pdf	05/06/2017
16	AYUDA MEMORIA CHAUPI NOVIEMBRE 2016	C8.pdf	05/12/2016
17	AYUDA MEMORIA CHAUPI OCTUBRE 2016	C1.pdf	05/11/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	AYUDA MEMORIA CHAUPI SEPTIEMBRE 2016	B9.pdf	05/10/2016
19	AYUDA MEMORIA NUEVO AMANECER QUISAPINCHA JUNIO 2017	F4.pdf	05/07/2017
20	AYUDA MEMORIA NUEVO AMANECER QUISAPINCHA MAYO 2017	E5.pdf	05/06/2017
21	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA DICIEMBRE 2016	D1_(2).pdf	04/01/2017
22	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA ENERO 2017	D4.pdf	06/02/2017
23	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA FEBRERO 2017	E2.pdf	05/03/2017
24	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JULIO 2016	B1.pdf	03/08/2016
25	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JUNIO 2016	A7.pdf	05/07/2016
26	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JUNIO 2017	F1.pdf	05/07/2017
27	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA MAYO 2016	A5.pdf	05/06/2016
28	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA MAYO 2017	E6.pdf	05/06/2017
29	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA NOVIEMBRE 2016	C7.pdf	05/12/2016
30	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA OCTUBRE 2016	C2.pdf	05/11/2016
31	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA S'PTIEMBRE 2016	B8.pdf	05/10/2016
32	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES ABRIL 2017	RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/05/2017
33	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES AGOSTO 2016	B4.pdf	05/09/2016
34	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES DICIEMBRE 2016	C9.pdf	04/01/2017
35	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES ENERO 2017	D5.pdf	06/02/2017
36	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES FEBRERO 2017	D9.pdf	05/03/2017
37	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JULIO 2016	A9.pdf	03/08/2016
38	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JUNIO 2016	A8.pdf	05/07/2016
39	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JUNIO 2017	F5.pdf	05/07/2017
40	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MARZO 2017	E3.pdf	05/04/2017
41	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2016	A6.pdf	05/06/2016
42	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2017	E7.pdf	05/06/2017
43	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES NOVIEMBRE 2016	C6.pdf	05/12/2016
44	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES OCTUBRE 2016	C4.pdf	05/11/2016
45	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES SEPTIEMBRE 2016	B7.pdf	05/10/2016
46	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO DICIEMBRE 2016	D3.pdf	04/01/2017
47	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO ENERO 2017	D6.pdf	06/02/2017
48	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO FEBRERO 2017	E1.pdf	05/03/2017
49	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO JULIO 2016	B3.pdf	03/08/2016
50	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO JUNIO 2017	F6.pdf	05/07/2017
51	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO MAYO 2017	E8.pdf	05/06/2017
52	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO NOVIEMBRE 2016	C5.pdf	05/12/2016
53	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO OCTUBRE 2016	C3.pdf	05/11/2016
54	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO SEPTIEMBRE 2016	F1.pdf	05/10/2016
55	AYUDA MEMORIA SAHUATO A MAYO 2017	E9.pdf	05/06/2017
56	AYUDA MEMORIA SAHUATO A JUNIO 2017	F2.pdf	05/07/2017
57	B1 INFORME EJECUTIVO ENERO 2013	NUEVO_DIA_ENERO.pdf	07/03/2013
58	B2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013	nuevo_dia_febrero.pdf	12/03/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
59	B3 Informe ejecutivo Abril 2013	PASO_LATERAL_ABRIL.pdf	02/05/2013
60	B4 Informe ejecutivo Abril 2013	TOTORAS-PELILEO.pdf	02/05/2013
61	B5 Informe ejecutivo Mayo 2013	NUEVO_DIA_MAYO.pdf	04/06/2013
62	B6 Informe ejecutivo Mayo 2013	GIRASOLES_MAYO.pdf	04/06/2013
63	B7 INFORME EJECUTIVO JUN 2014 Nuevo día	B7_GestiónReporte_JUN_2014.pdf	10/07/2014
64	B7 INFORME EJECUTIVO JUN 2014 Ramo Girasoles	B7_GestiónReporte_JUN_2014.pdf	10/07/2014
65	BACHEO REALIZADO EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00505.JPG	16/01/2012
66	BACHEO REALIZADO EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00508.JPG	16/01/2012
67	C1 Informe Ejecutivo Enero 2015	InformeEjecutivoEnero2015.pdf	14/04/2015
68	C10_Informe_Ejecutivo_Octubre_2015	C10_Informe_Ejecutivo_Octubre_2015.pdf	06/11/2015
69	C2 Informe Ejecutivo Febrero 2015	InformeEjecutivoFebrero2015.pdf	14/04/2015
70	C6 Informe Ejecutivo JUNIO 2015	Informe_Ejecutivo_JUNIO_2015_.pdf	09/07/2015
71	C7 Informe Ejecutivo JULIO 2015	C7_Informe_Ejecutivo_JULIO_2015.pdf	05/08/2015
72	C7 Informe Ejecutivo JULIO 2015	C8_Informe_Ejecutivo_AGOSTO_2015.pdf	11/09/2015
73	C9 Informe Ejecutivo SEPTIEMBRE 2015	C9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2015.pdf	07/10/2015
74	CONTRATO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO MICROEMPRESA CHAUPI	ORDEN_DE_COMPRA_CHAUPI.pdf	10/06/2019
75	CONTRATO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO MICROEMPRESA INTIÑAN	ORDEN_DE_COMPRA_INTIÑAN.pdf	10/06/2019
76	CONTRATO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO MICROEMPRESA LLANGAHUA	ORDEN_DE_COMPRA_LLANGAHUA.pdf	10/06/2019
77	CONTRATO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO MICROEMPRESA NUEVO AMANECER QUISAPINCHA	ORDEN_DE_COMPRA_NUEVO_AMANECER_QUISAPINCHA.pdf	10/06/2019
78	CONTRATO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO MICROEMPRESA RAMO DE GIRASOLES	ORDEN_DE_COMPRA_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	10/06/2019
79	CONTRATO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO MICROEMPRESA RIO NEGRO	ORDEN_DE_COMPRA_RIO_NEGRO.pdf	10/06/2019
80	CONTRATO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO MICROEMPRESA SAN ANTONIO DE COTALO	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_ANTONIO_DE_COTALO.pdf	10/06/2019
81	CONTRATO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO MICROEMPRESA ÑUKANCHIK	ORDEN_DE_COMPRA_ÑUKANCHIK.pdf	10/06/2019
82	D02_Informe_Ejecutivo_Febrero_2016	FEBRERO_2016_.pdf	04/03/2016
83	H 87 .- MICROEMPRESA CHAUPI 2018	acta_acv_chaupi.pdf	10/06/2019
84	H 87 .- MICROEMPRESA NUEVO AMANECER QUISAPINCHA 2018	acta_acv_nuevo_amanecer_quisapincha.pdf	10/06/2019
85	H 87 .- MICROEMPRESA NUEVO DIA 2018	acta_acv_nuevo_dia.pdf	10/06/2019
86	H 87 .- MICROEMPRESA RAMO DE GIRASOLES 2018	acta_acv_ramo_girasoles.pdf	10/06/2019
87	H 87 .- MICROEMPRESA RIO NEGRO 2018	acta_acv_rio_negro.pdf	10/06/2019
88	H 87 .- MICROEMPRESA SAHUATO 2018	Acta_entrega_recepcion_Sahuatoa.pdf	10/06/2019
89	H 87 .- MICROEMPRESA SAN ANTONIO DE COTALO 2018	acta_acv_san_antonio_de_cotalo.pdf	10/06/2019
90	H 87 .- MICROEMPRESA SAN JOSE 2018	acta_acv_san_jose.pdf	10/06/2019
91	H 87 .- MICROEMPRESA ÑUKANCHIK KAWSAY 2018	ACTA_ACV_ÑUKANCHIK_KAWSAY.pdf	10/06/2019
92	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAN_JOSE.pdf	05/01/2018
93	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_LOS_CAMINANTES.pdf	05/01/2018
94	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_KAWSAY.pdf	05/01/2018
95	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/01/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
96	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_CHAUPI.pdf	05/01/2018
97	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_NUEVO_AMANECER_QUISAPINCHA.pdf	05/01/2018
98	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_RIO_NEGRO.pdf	05/01/2018
99	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAHUATO.A.pdf	05/01/2018
100	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAN_ANTONIO_DE_COTALO.pdf	05/01/2018
101	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Los_Caminates_2017.PDF	05/12/2017
102	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Nuevo_Amanecer_Quisapincha2017.PDF	05/12/2017
103	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Nuevo_Dia2017.PDF	05/12/2017
104	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Ramo_de_Girasoles_2017.PDF	05/12/2017
105	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Rio_Negro_2017.PDF	05/12/2017
106	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Sahuatoa_2017.PDF	05/12/2017
107	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_San_Antonio_de_Cotalo_2017.PDF	05/12/2017
108	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_San_Jose_2017.PDF	05/12/2017
109	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_NUEVO_DÍA.pdf	05/01/2018
110	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Chaupi_abril_2017.PDF	05/12/2017
111	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Chaupi.PDF	05/11/2017
112	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Nuevo_Día_.PDF	05/11/2017
113	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Ñukanchik_Kawsay.PDF	05/11/2017
114	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Ramo_de_Girasoles.PDF	05/11/2017
115	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Río_Negro.PDF	05/11/2017
116	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Sahuatoa.PDF	05/11/2017
117	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_San_Antonio_de_Cotaló.PDF	05/11/2017
118	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_San_José.PDF	05/11/2017
119	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (CHAUPI)	Acta_entrega_recepcion_Chaupi.pdf	05/04/2018
120	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (LOS CAMINANTES)	Acta_entrega_recepcion_Los_Caminantes.pdf	05/04/2018
121	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (NUEVO AMANECER QUISAPINCHA)	Acta_entrega_recepcion_Nuevo_Amanecer_Quisapincha.pdf	05/04/2018
122	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (NUEVO DÍA)	Acta_entrega_recepcion_Nuevo_Dia.pdf	05/04/2018
123	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (Ramo de Girasoles)	Acta_entrega_recepcion_Ramo_de_Girasoles.pdf	05/04/2018
124	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (RIO NEGRO)	Acta_entrega_recepcion__Rio_Negro.pdf	05/04/2018
125	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (SAHUATO.A)	Acta_entrega_recepcion_Sahuatoa.pdf	05/04/2018
126	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (San Antonio de Cotalo)	Acta_entrega_recepcion_San_Antonio_de_Cotalo.pdf	05/04/2018
127	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (SAN JOSE)	Acta_entrega_recepcion_San_Jose.pdf	05/04/2018
128	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (Ñukanchik Kawsay)	Acta_entrega_recepcion_Ñukanchik_Kawsay.pdf	05/04/2018
129	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	GestionReporteFN(24).pdf	05/09/2013
130	Informe ejecutivo abril 2014	B3.-_Informe_ejecutivo.pdf	30/04/2014
131	Informe Ejecutivo correspondiente al mes de Julio 2013	IE_RamoGirasoles_Julio_2013.pdf	07/08/2013
132	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	A.1.1.pdf	11/03/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
133	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013	girasoles_febrero.pdf	12/03/2013
134	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	A.2.1.pdf	11/03/2014
135	Informe Ejecutivo julio 2014	InformeEjecutivo_julio_2014.pdf	01/08/2014
136	INFORME EJECUTIVO JUNIO PASO LATERAL	paso_junio.pdf	08/07/2013
137	Informe ejecutivo marzo 14	A3._Informe_ejecutivo_marzo14.pdf	07/04/2014
138	Informe ejecutivo microempresas abril 2012.	INforme_ejecutivo_micro_abril.pdf	08/06/2012
139	INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESAS ENERO 2012	INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_ENE-2012.pdf	16/03/2012
140	INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESAS FEBRERO 2012	INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_FEB-2012.pdf	16/03/2012
141	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE	conse_novie.pdf	10/12/2012
142	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2	conv_nuev.pdf	10/12/2012
143	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE	informe_octu_gi.pdf	22/11/2012
144	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE NUEVO DIA	informe_octubre_nuevo.pdf	22/11/2012
145	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESTATAL REALIZADO EN EL MES AGOSTOO 2015	PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_AGOSTO_2015_GPR	07/09/2015
146	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESTATAL REALIZADO PARA EN EL MES JULIO 2015.	PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_JULIO_2015_GPR	10/08/2015
147	MICROEMPRESA CHAUPI JULIO 2017	MICRO_CHAUPI_JULIO_201718220.pdf	30/08/2017
148	MICROEMPRESA NUEVO AMANECER JULIO 2017	NUEVO_AMANECER_JULIO_2017_-_18235.pdf	30/08/2017
149	MICROEMPRESA NUEVO DIA JULIO 2017	MICRO_NUEVO_DIA_JULIO_2017_-_17932.pdf	30/08/2017
150	MICROEMPRESA RAMO DE GIRASOLES JULIO 2017	RAMO_DE_GIRASOLES_JULIO_2017_-_18216.pdf	30/08/2017
151	MICROEMPRESA RIO NEGRO JULIO 2017	RIO_NEGRO_JULIO_2017-_18237.pdf	30/08/2017
152	MICROEMPRESA SAHUATOA JULIO 2017	SAHUATOA_JULIO_2017_-_18238.pdf	30/08/2017
153	NUEVO DIA JULIO 2017	17932.pdf	04/08/2017
154	O16.-INFORME DE RIESGO Condiciones Climaticas Adversas	Informe_Riesgo-- Condiciones_climaticas_adversas_CAUSARIAS.pdf	02/04/2019
155	O19.- Incrementar la calidad de la información RIESGO	Informe_de_Riesgo-- Incrementar_la_calidad_de_la_información_de_los_Proyectos.pdf	02/04/2019
156	ORDEN DE COMPRA NUEVO DIA	A3.pdf	11/05/2016
157	ORDEN DE COMPRA NUEVO DIA	A9.pdf	05/07/2016
158	ORDEN DE COMPRA RAMO DE GIRASOL	A4.pdf	11/05/2016
159	ORDEN DE COMPRA RAMO DE GIRASOLES	B1.pdf	05/07/2016
160	REPORTE ESIGEF JULIO 2016	B6.pdf	05/08/2016
161	REPORTE ESIGEF JUNIO 2016	B5.pdf	05/08/2016
162	REPORTE ESIGEF MAYO 2016	B4.pdf	05/08/2016
163	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 1	SAN_JOSE.pdf	05/10/2017
164	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 10	NUEVO_DIA.pdf	05/10/2017
165	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 2	ÑUKANCHIK_KAWSAY.pdf	05/10/2017
166	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 3	LOS_CAMINANTES.pdf	05/10/2017
167	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 4	COTALO.pdf	05/10/2017
168	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 5	SAHUATOA.pdf	05/10/2017
169	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 6	RIO_NEGRO.pdf	05/10/2017
170	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 8	CHAUPI.pdf	05/10/2017
171	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 9	RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/10/2017
172	T- INFORME EJECUTIVO MES DE AGOSTO RAMO DE GIRASOL	INFORME_EJECUTIVO-planilla_10.GIRASOLES.pdf	01/09/2014
173	T2- INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE MICROEMPRESA RAMO DE GIRASOLES	INF._EJECUTIVO._11.SEPT.girasoles.pdf	06/10/2014
174	T3- microempresa ramo de girasoles, septiembre 2014	INF._EJECUTIVO._11.SEPT.girasoles.pdf	06/10/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
175	T4- Informe Ejecutivo de la Microempresa del mes de Octubre 2014	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_microempresa_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/12/2014
176	T5- Mantenimiento Vial de la Microempresa Ramo de Girasoles-Noviembre 2014	Noviembre_Microempresas_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/12/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Gamboa López, Enma Katherine	Subsecretario Regional 3	Subsecretaria Zonal 3, Encargada	egamboa@mtop.gob.ec	023974600
González Chávez, Alexandra del Rocio	Director Provincial	Directora Distrital de Transporte y Obras Públicas de Tungurahua, Encargada	pamh120@hotmail.com	0223974798
Parra Cherres, María Gabriela	Analista de Presupuesto	Analista de Presupuesto	gparra@mtop.gob.ec	
Rodriguez Martinez, Edison Fabian	Lider técnico	Asistente de Infraestructura Distrital Servidor Público 1	erodriguez@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
30442_1.jpg	04/09/2016
