

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 6**  
**Dirección Provincial Cañar**

**PROYECTO: K023 MTOP- Mantenimiento Vial de la Provincia del Cañar**

|                                |  |                                 |   |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Líder del Proyecto:            | Dután Sanango, Italo Medardo (imдутan@mtop.gob.ec) |                                 |   |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Jaramillo Vintimilla, José Francisco               | Programas Relacionados:         | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, Provincia - Cañar, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular:                       | Izquierdo Campoverde, Galo Fernando                | Prioridad:                      | 0   |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura                                    | Retorno Económico:              | 0.00  |
| CUP:                           | 175200000.506.3657                                 | TIR:                            | 0.00 %  |
| Objetivos Operativos:          | 4  | VAN:                            | 0.00  |
| Viabilidad Técnica:            | Media  | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 2,797,233.31  |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                   |                                 |   |
| Tipo de Ppto. Externo:         |  | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2008 - 31/03/2022   |
| Fecha de última actualización: | 01/08/2019   | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2017  |
| Modificado por:                | Dután Sanango, Italo Medardo                       | Fecha del siguiente Hito:       | 01/10/2019  |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCION:**

La conservación de la red vial estatal de Cañar, durante el periodo comprendido entre el año 2008 - 2019, está supeditado por un incremento acelerado de vehículos, que consecuentemente genera un aumento en el uso y desgaste de las vías. Esta situación generó la necesidad de implementar el programa de conservación vial por Administración Directa, generando un compromiso para lograr la permanente movilidad, seguridad, economía y comodidad en la circulación vial, realizar de manera efectiva el mantenimiento de las vías, atender oportunamente las demandas prioritarias de la comunidad y hacer un uso eficiente de los recursos disponibles.

Para el efecto, mediante el Acuerdo Ministerial 001-12-2001 en su artículo 3, establece que la Red Vial Estatal está constituida por todas las vías administradas por el MTOP, como única entidad encargada del manejo y control.

Línea base del Proyecto.

Al tratarse de un proyecto de mantenimiento vial, la línea base del proyecto está determinado por el estado en que se encuentra el inventario vial de la provincia, el 75% de las vías estatales de la provincia están intervenidas con mantenimiento vial. Desde este punto de vista, el estado actual de la infraestructura vial que es administrada por el MTOP y forman parte del programa de mantenimiento vial de la provincia de Cañar se presenta de la siguiente manera:

RIO ANGAS LTE PROV/CAÑAR/CHIMBORAZO-ZHUD  
 ZHUD-CAÑAR  
 CAÑAR-BIBLIAN  
 EL DESCANSO-AZOGUES-BIBLIAN  
 ZHUD-DUCUR  
 DUCUR-COCHANCAY  
 COCHANCAY-LATRONCAL-MANUEL J. CALLE (EL TRIUNFO)  
 LIMITE GUAYAS/CAÑAR - VENTURA LIMITE CAÑAR/CHIMBORAZO  
 LA TRONCAL-PANCHO NEGRO-LTE PROV. GUAYAS/CAÑAR  
 AZOGUES INTERSECCIÓN ESTADIO-CEMENTERIO- "Y" DE MATRAMA "Y" DE PAUTE  
 "Y" DE MATRAMA -MAZAR (REPRESA) - CRUCE CON E40 (PAUTE/SAN PABLO/MENDEZ)

Objetivo General.-

Mantener la infraestructura vial de la provincia en buenas condiciones de movilidad, con requerimientos de infraestructura vial de primer nivel, para garantizar un servicio de calidad y seguridad vial.

Objetivos específicos.

Garantizar la operatividad de la Unidad Ejecutora para intervenir con acciones de mantenimiento vial en la red estatal no concesionada.

## DATOS GENERALES

### Descripción

Mantener un nivel administrativo óptimo que permita gestionar, ejecutar, supervisar y controlar el uso de los recursos del Estado en la inversión del programa de Mantenimiento vial de la provincia.

### Beneficios Cualitativos

Permitir un mayor y mejor desarrollo socio económico de las poblaciones involucradas al contar con una vía que permite mejorar la capacidad de circulación vehicular, imagen y seguridad de la población.  
 Proveer de una vía de comunicación y transporte eficiente y segura para los habitantes del sector y usuarios en general.  
 Conservar la inversión realizada por el estado en las vías.  
 Reducir el tiempo de viaje, con lo que se produce un ahorro económico.

### Tipo de Beneficiario

**Beneficiarios Directos:** Para efectos del proyecto, se considera como beneficiarios directos a aquellos que están intervenidos por las vías estatales a cargo del mantenimiento vial por administración Directa; así, tenemos los Cantones Azogues, Biblián, Cañar, Tambo, Suscal y Troncal; estableciéndose que la población de demanda efectiva es de 219084 habitantes.

**Beneficiarios Indirectos:** Los beneficiarios indirectos se consideran a las personas que visitan la provincia por motivos turísticos, y/o por comercio, por lo que se considera que la población es de 16730 habitantes.

### Restricciones

**Tiempo:** El plazo para el mantenimiento es anual, el mismo que será programado hasta el 2021, luego de lo cual se solicitará actualización de dictamen para ampliar el plazo.

**Costo:** El valor total para el mantenimiento es aproximadamente de USD \$500.000,00 por año,

**Calidad:** Las actividades de mantenimiento necesarias para la conservación de la infraestructura implementada deben cumplir con lo siguiente:

Conservar la inversión existente en la red vial estatal de la provincia.  
 Brindar adecuados niveles de seguridad, servicialidad y comodidad a los usuarios viales.  
 Contar con carreteras debidamente señalizadas y con seguridad vial  
 Mejorar las carreteras existentes a través de inversiones menores.

**Recursos:** Se considera tres grupos:

**Recursos Financieros:** La limitación en recursos económicos en el país podría causar que no se disponga de los insumos necesarios para poder ejecutar el mantenimiento vial correctamente.

**Recursos Humanos:** la falta de personal o gente especializada podría causar retrasos en el desarrollo del proyecto.

**Recursos Tecnológico:** Existe restricción en el suministro de materiales para la ejecución del mantenimiento, como en la compra de mezcla asfáltica, equipos, pinturas para señalización.

**Riesgo:** La falta de recursos causaría el retraso en el mantenimiento vial

**Alcance:** La administración y operación de las vías de Cañar, prevé la conservación de la infraestructura implementada bajo el cumplimiento de estándares de calidad; para lograr un mantenimiento vial que conserve las condiciones de la red vial y en consecuencia, sea satisfactorio para los usuarios se centra en la aplicación de un sistema de trabajo permanente y eficiente. Para el efecto la Dirección Distrital de Cañar.

**Recursos:** Personal y maquinaria del MTOP- Cañar, así como contratación de Asociación de Microempresarios.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

**Ejecución**

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado


## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 81.28 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2008 Fecha de Fin: 31/03/2022

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

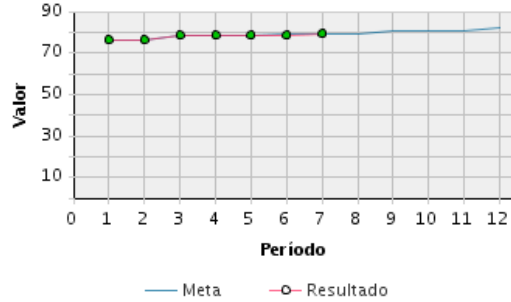

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
| 2019                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 76 %                        | 76 % | 78 % | 78 % | 78 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 82 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 76 %                        | 76 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 80 % |      |      |      |      |      |
| Estado               |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |      |      |      |      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                      | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>JULIO 2019</b></p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas.<br/>                     Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar.</p> <p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b><br/>                     Terminación de la construcción de muro de gaviones sector Rumiurco de la vía Azogues - Descanso.<br/>                     Limpieza de cunetas, roza a mano y alcantarillas en la vía Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas.<br/>                     Bacheo asfáltico en los sectores de Javin y Chilchil, pertenecientes al Tramo Zhud- Cochancay.</p> | Dután Sanango, Italo Medardo        | 01/08/2019 - 12:41 PM         |
| <p><b>JUNIO 2019</b></p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas.<br/>                     Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar.</p> <p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b><br/>                     Construcción de muro de gaviones sector Rumiurco de la vía Azogues - Descanso.<br/>                     Limpieza de cunetas, roza a mano y alcantarillas en la vía Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas.</p>   | Izquierdo Campoverde, Galo Fernando | 02/07/2019 - 11:05 AM         |
| <p><b>MAYO 2019</b></p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas.<br/>                     Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar.</p>   | Dután Sanango, Italo Medardo        | 03/06/2019 - 03:46 PM         |
| <p><b>ABRIL 2019</b></p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay - El Triunfo y Pasos Laterales; y, Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas.<br/>                     Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar.</p>  | Dután Sanango, Italo Medardo        | 02/05/2019 - 08:18 AM         |
| <p><b>MARZO 2019</b></p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay - El Triunfo y Pasos Laterales; y, Zhud - Biblián, panamericana antigua tramo Biblián - Descanso.</p>  | Dután Sanango, Italo Medardo        | 02/04/2019 - 04:21 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                      | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud Río Angas y Matrama Mazar.  |                                     |                               |
| <p>FEBRERO 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián.<br/>Se ha contratado 2 microempresas desde el 26 y 27 de febrero de 2019, las mismas que atienden los tramos: Zhud Río Angas y Matrama Mazar.</p>   | Izquierdo Campoverde, Galo Fernando | 02/03/2019 - 10:29 AM         |
| <p>ENERO 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián.<br/>Se ha contratado 2 microempresas desde el 26 y 27 de febrero de 2019, las mismas que atienden los tramos: Zhud Río Angas y Matrama Mazar.</p>   | Izquierdo Campoverde, Galo Fernando | 02/03/2019 - 10:28 AM         |
| <p>ENERO 2019</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián.<br/>Se ha iniciado la gestión para obtener recursos para la contratación de microempresas.</p>  | Izquierdo Campoverde, Galo Fernando | 05/02/2019 - 08:14 AM         |
| <p>DICIEMBRE 2018</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vía Zhud - Biblián. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Río Angas.</p>                    | Izquierdo Campoverde, Galo Fernando | 04/01/2019 - 08:09 AM         |
| <p>NOVIEMBRE 2018</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; Y Zhud - Río Angas.</p> | Dután Sanango, Italo Medardo        | 05/12/2018 - 05:07 PM         |
| <p>OCTUBRE 2018</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; Y Zhud - Río Angas.</p>   | Dután Sanango, Italo Medardo        | 05/11/2018 - 04:09 PM         |
| <p>SEPTIEMBRE 2018</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.</p>                    | Dután Sanango, Italo Medardo        | 05/10/2018 - 12:31 PM         |
| <p>AGOSTO 2018</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.</p>                        | Buestan Toral, José Remigio         | 05/09/2018 - 05:30 PM         |
| <p>JULIO 2018</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.</p>                         | Dután Sanango, Italo Medardo        | 03/08/2018 - 10:45 AM         |
| <p>JUNIO 2018</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.</p>                         | Dután Sanango, Italo Medardo        | 05/07/2018 - 12:31 PM         |
| <p>Mayo2018</p>  | Chaca Álvarez, Ivan Patricio        | 05/06/2018 - 04:46 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.  |                                 |                               |
| Abril 2018<br><br>Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 4 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso.   | Chaca Álvarez,<br>Ivan Patricio | 04/05/2018 -<br>02:08 PM      |
| Marzo 2018<br><br>Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 4 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso.   | Chaca Álvarez,<br>Ivan Patricio | 05/04/2018 -<br>04:18 PM      |
| Febrero 2018<br><br>Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Descanso - Azogues, y Troncal - Puerto Inca. No se ha logrado contratar a las microempresas por falta de aprobación del aval para el servicio de voluntariado.   | Chaca Álvarez,<br>Ivan Patricio | 23/03/2018 -<br>10:52 AM      |
| ENERO 2018<br><br>Se realiza mantenimiento de la vía matrama - Mazar por administración directa, puesto que no se ha podido contratar a las microempresas.   | Chaca Álvarez,<br>Ivan Patricio | 23/03/2018 -<br>10:50 AM      |
| DICIEMBRE 2017<br><br>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, con el propósito de mantener la vía en condiciones de transitabilidad confiable para los usuarios. | Chaca Álvarez,<br>Ivan Patricio | 05/01/2018 -<br>04:48 PM      |
| NOVIEMBRE 2017<br><br>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, con el propósito de mantener la vía en condiciones de transitabilidad confiable para los usuarios. | Chaca Álvarez,<br>Ivan Patricio | 05/12/2017 -<br>04:15 PM      |
| OCTUBRE 2017<br><br>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano. Además se coloca tachas en la vía Azogues - Matrama con la ayuda de los microempresarios.            | Chaca Álvarez,<br>Ivan Patricio | 01/11/2017 -<br>11:48 AM      |
| SEPTIEMBRE 2017<br><br>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano  | Chaca Álvarez,<br>Ivan Patricio | 05/10/2017 -<br>03:38 PM      |
| AGOSTO 2017<br><br>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues.  | Chaca Álvarez,<br>Ivan Patricio | 05/09/2017 -<br>05:53 PM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                     | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano  |                                    |                               |
| <p><b>JULIO 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues.</p> <p>Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano</p>  | García González, Mariana Alexandra | 05/08/2017 - 09:29 AM         |
| <p><b>JUNIO 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante la limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal.. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues.</p> <p>Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano.</p> | García González, Mariana Alexandra | 05/07/2017 - 10:29 AM         |
| <p><b>MAYO 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal..</p> <p>Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar con tres microempresas de conservación vial contratadas</p>  | Guillen Luna, Andrés Ismael        | 01/06/2017 - 11:28 AM         |
| <p><b>ABRIL 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal..</p> <p>Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar con tres microempresas de conservación vial contratadas</p>   | García González, Mariana Alexandra | 05/05/2017 - 12:37 PM         |
| <p><b>MARZO 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal</p> <p>Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.</p>   | Guillen Luna, Andrés Ismael        | 04/04/2017 - 02:13 PM         |
| <p><b>FEBRERO 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal</p> <p>Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.</p>   | Guillen Luna, Andrés Ismael        | 04/04/2017 - 02:12 PM         |
| <p><b>FEBRERO 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano,</p> <p>Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.</p>  | Guillen Luna, Andrés Ismael        | 05/03/2017 - 01:35 PM         |
| <p><b>DICIEMBRE 2016</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes y bacheo en la carretera Matrama-Mazar, en la carretera descansos-azogues-biblian (panamericana)</p> <p>Y en la carretera Zhud-Biblián se encuentran realizando limpieza de cunetas, bordillos y roza a mano</p>   | Guillen Luna, Andrés Ismael        | 05/01/2017 - 07:03 PM         |
| <p><b>NOVIEMBRE 2016</b></p>   | Guillen Luna, Andrés Ismael        | 05/12/2016 - 03:07 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes y bacheo en la carretera Matrama-Mazar, en la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana)<br/>Y en la carretera Zhud-Biblián se encuentran realizando limpieza de cunetas, bordillos y roza a mano</p> |                                  |                               |
| <p>OCTUBRE 2016<br/>los contratos de las microempresas culmino por falta de recursos .<br/>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazary la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana)</p>                              | Guillen Luna, Andrés Ismael      | 05/11/2016 - 06:33 PM         |
| <p>SEPTIEMBRE 2016<br/><br/>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de alcantarillas desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian.<br/>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>      | Guillen Luna, Andrés Ismael      | 04/10/2016 - 07:46 PM         |
| <p>AGOSTO 2016:<br/><br/>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de alcantarillas desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian.<br/>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>         | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 01/09/2016 - 07:51 AM         |
| <p>JULIO 2016:<br/><br/>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 5+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian.<br/>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>    | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 04/08/2016 - 12:30 PM         |
| <p>JUNIO 2016:<br/><br/>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 10+000 al 19+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian.<br/>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>   | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 04/07/2016 - 02:32 PM         |
| <p>MAYO 2016:<br/><br/>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian.<br/>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>     | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 05/06/2016 - 08:12 PM         |
| <p>ABRIL 2016:<br/><br/>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 30+000 al Km 60+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>   | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 05/05/2016 - 07:43 AM         |
| <p>MARZO 2016:<br/><br/>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 00+000 al Km 30+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>   | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 04/04/2016 - 09:32 PM         |
| <p>FEBRERO 2016:<br/><br/>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 30+000 al Km 50+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>   | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 06/03/2016 - 05:26 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                          | Fecha de última actualización |
|--|---|-------------------------------|
| <p>ENERO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 20+000 al Km 50+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>  | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>05/02/2016 - 10:45 AM</p>  |
| <p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 30+000 al Km 69+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>  | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>06/01/2016 - 07:38 AM</p>  |
| <p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 30+000 al Km 69+000.</p>   | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>07/12/2015 - 10:21 AM</p>  |
| <p>OCTUBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP continua con la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p>  | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>04/11/2015 - 10:25 PM</p>  |
| <p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP continua con la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p>  | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>07/10/2015 - 04:22 PM</p>  |
| <p>AGOSTO 2015</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p>   | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>07/09/2015 - 10:24 AM</p>  |
| <p>JULIO 2015</p> <p>Por la fuerte temporada invernal En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de derrumbes y alcantarillas con personal y maquinaria del MTOP Km 30 +000 al 69+000..</p>   | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>05/08/2015 - 09:28 PM</p>  |
| <p>JUNIO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños desde el Km 40 +000 al 69+000..</p>  | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>07/07/2015 - 03:42 PM</p>  |
| <p>MAYO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños.<br/>En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 10+000 al 19+000.</p>  | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>08/06/2015 - 02:17 PM</p>  |
| <p>ABRIL 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños.<br/>En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 00+000 al 10+000.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>08/05/2015 - 07:48 AM</p>  |
| <p>MARZO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños.<br/>En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 10+000 al 19+000.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>07/04/2015 - 03:35 PM</p>  |



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                                  | Fecha de última actualización    |
|---|---|----------------------------------|
| <p><b>FEBRERO 2015</b></p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos.<br/>E la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos.</p>   | <p>Encalada<br/>Clavijo, Efrain<br/>Eduardo</p> | <p>09/03/2015 -<br/>09:41 AM</p> |
| <p><b>ENERO 2014</b></p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y limpieza del derecho de via.<br/>en la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando el bacheo asfaltico desde el Km 6+000 al 19+000.</p>   | <p>Encalada<br/>Clavijo, Efrain<br/>Eduardo</p> | <p>06/02/2015 -<br/>03:21 PM</p> |
| <p><b>DICIEMBRE 2014</b></p> <p>Se esta realizando el bacheo asfaltico en la carretera Biblian-Azogues-Descanso, antigua panamericana, tambien la limoieza de cunetas y bordillos en la carretera Azogues-Matrama-Mazar</p>   | <p>Encalada<br/>Clavijo, Efrain<br/>Eduardo</p> | <p>06/01/2015 -<br/>11:49 AM</p> |
| <p><b>NOVIEMBRE 2014</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar.<br/>Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos.</p> <p>Tambien se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos del tramo Azogues a Matrama.</p>                          | <p>Encalada<br/>Clavijo, Efrain<br/>Eduardo</p> | <p>05/12/2014 -<br/>03:21 PM</p> |
| <p><b>OCTUBRE 2014</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar.<br/>Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos.</p> <p>Tambien se esta realizando la limpieza de derrumbes pequeños en el tramo comprendido entre el Km 50 + 000 al 60 +000.</p> | <p>Encalada<br/>Clavijo, Efrain<br/>Eduardo</p> | <p>09/11/2014 -<br/>09:31 PM</p> |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2014</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar.<br/>Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de derrumbes pequeños.</p>  | <p>Encalada<br/>Clavijo, Efrain<br/>Eduardo</p> | <p>06/10/2014 -<br/>12:09 PM</p> |
| <p><b>AGOSTO 2014</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar.<br/>Se esta restituyendo una alcantarilla en el sector de Buenos Aires en la carretera Matrama-Mazar</p>  | <p>Encalada<br/>Clavijo, Efrain<br/>Eduardo</p> | <p>07/09/2014 -<br/>08:44 PM</p> |
| <p><b>JULIO 2014</b></p> <p>En la carretera Matrama-mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos, como tambien de derrumbes pequeños con personal y maquinaria del MTOP y la microempresa.</p>   | <p>Encalada<br/>Clavijo, Efrain<br/>Eduardo</p> | <p>05/08/2014 -<br/>10:39 PM</p> |
| <p><b>JUNIO 2014</b></p> <p>En la carretera Matrama-mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos, como tambine de derrumbes pequeños.</p>  | <p>Encalada<br/>Clavijo, Efrain<br/>Eduardo</p> | <p>10/07/2014 -<br/>08:31 AM</p> |
| <p><b>MAYO 2014</b></p> <p>En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos y tambien alcantarillas.<br/>En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos como tambien la limpieza de derrumbes pequeños.</p>   | <p>Encalada<br/>Clavijo, Efrain<br/>Eduardo</p> | <p>03/06/2014 -<br/>02:34 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>ABRIL 2014</p> <p>En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos.<br/>En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos como tambien la limpieza de alcantarillas.</p>   | Encalada<br>Clavijo, Efrain<br>Eduardo | 04/05/2014 -<br>08:05 PM      |
| <p>MARZO 2014</p> <p>En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando el sellado de fisuras.<br/>En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos.<br/>Se esta limpiando alcantarillas con ayuda de la excavadora 320 en el sector de Buenos Aires.</p> | Encalada<br>Clavijo, Efrain<br>Eduardo | 07/04/2014 -<br>07:40 AM      |
| <p>FEBRERO 2014</p> <p>En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando mla limpieza de cunetas,<br/>En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de Alcantarillas.</p>  | Encalada<br>Clavijo, Efrain<br>Eduardo | 28/02/2014 -<br>09:31 AM      |
| <p>ENERO 2014</p> <p>En la carrtera Matrama-Mazar, en el tramo entre Buenos Aires y Rivera se esta realizando el bacheo con mezcla asfaltica.</p>  | Encalada<br>Clavijo, Efrain<br>Eduardo | 05/02/2014 -<br>07:27 AM      |

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

| Problema                             | Fecha de última actualización | Responsable                        | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| Deformaciones en la red vial estatal | 01/08/2019                    | Galo Fernando Izquierdo Campoverde | 20       | 20      | 4            | 0/1                         |

*Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1*

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

| Riesgo  | Fecha de última actualización | Responsable                        | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5- PROYECTO. Recursos.<br>Falta de recursos CAUSARÍA el retraso del mantenimiento de la vía | 01/08/2019                    | Galo Fernando Izquierdo Campoverde | 60 %         | 80      | 48           | 0/1                         |

*Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1*

**LOCALIDADES**

| Localidad de Impacto |   |
|----------------------|---|
| 1                    | Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar |

**HITOS**

| Hito   | Categoría      | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|--|----------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2014 contratada. | 3-Adjudicación | 10/01/2014         |                | 10/01/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 2 PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-                              | 3-Adjudicación | 10/01/2014         |                | 10/01/2014 |          | Sí            | 2.0           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|    | Biblian (antigua panamericana) para el 2014 contratada  |                           |                    |                |            |          |               |               |
| 3  | EJECUCION: Bacheo asfaltico desde el Km 30+000 al 60+000 en la carretera Matrama-Mazar realizado  | 5-Entregables Intermedios | 15/05/2014         |                | 15/05/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 4  | EJECUCION: Bacheo asfaltico desde el Km 00+000 al 19+000 en la carretera Descanso-Biblian realizado   | 5-Entregables Intermedios | 15/06/2014         |                | 15/06/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 5  | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2014 realizado a satisfaccion del MTOP                              | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2014         |                | 15/07/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 6  | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2014 realizado a satisfaccion del MTOP      | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2014         |                | 15/07/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 7  | EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera Azogues-Matrama-Mazar realizado.   | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2014         |                | 15/08/2014 |          | Sí            | 3.0           |
| 8  | EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera biblian-Azogues-Descanso realizado   | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2014         |                | 15/09/2014 |          | Sí            | 3.0           |
| 9  | EJECUCION: Bacheo asfaltico desde el Km 00+000 al 30+000 en la carretera Matrama-Mazar realizado.   | 5-Entregables Intermedios | 15/10/2014         |                | 15/10/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 10 | EJECUCION: Limpieza de derrumbes en la carretera matrama-mazar realizado.   | 5-Entregables Intermedios | 15/11/2014         |                | 15/11/2014 |          | Sí            | 3.0           |
| 11 | EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 realizado a satisfacción del MTOP                          | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014         |                | 31/12/2014 |          | Sí            | 3.0           |
| 12 | EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 realizado a satisfacción del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014         |                | 31/12/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 13 | PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2015 contratada.  | 3-Adjudicación            | 10/01/2015         |                | 10/01/2015 |          | Sí            | 2.0           |
| 14 | PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2015 contratada.  | 3-Adjudicación            | 10/01/2015         |                | 10/01/2015 |          | Sí            | 2.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 15 | EJECUCION: Bacheo asfáltico desde el Km 30+000 al 60+000 en la carretera Matrama-Mazar realizado.  | 5-Entregables Intermedios | 15/05/2015         |                | 15/05/2015 |    | Sí            | 2.0           |
| 16 | EJECUCION: Bacheo asfáltico desde el Km 00+000 al 19+000 en la carretera Descanso-Biblian realizado.   | 5-Entregables Intermedios | 15/06/2015         |                | 15/06/2015 |    | Sí            | 2.0           |
| 17 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2015 realizado a satisfacción del MTOP.                              | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2015         |                | 15/07/2015 |    | Sí            | 3.0           |
| 18 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso (antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2015 realizado a satisfacción del MTOP.    | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2015         |                | 15/07/2015 |    | Sí            | 3.0           |
| 19 | EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera Azogues-Matrama-Mazar realizado.  | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2015         |                | 15/08/2015 |    | Sí            | 3.0           |
| 20 | EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera biblian-Azogues-Descanso realizado.   | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2015         |                | 15/09/2015 |   | Sí            | 3.0           |
| 21 | EJECUCION: Bacheo asfáltico desde el Km 00+000 al 30+000 en la carretera Matrama-Mazar realizado.  | 5-Entregables Intermedios | 15/10/2015         |                | 15/10/2015 |  | Sí            | 3.0           |
| 22 | EJECUCION: Limpieza de derrumbes en la carretera matrama-mazar concluido.  | 5-Entregables Intermedios | 15/11/2015         |                | 15/11/2015 |  | Sí            | 3.0           |
| 23 | EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2015 realizado a satisfacción del MTOP.                          | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |  | Sí            | 3.0           |
| 24 | EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso (antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 realizado a satisfacción del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |  | Sí            | 3.0           |
| 25 | EJECUCION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2016 contratada.  | 5-Entregables Intermedios | 29/04/2016         |                | 16/05/2016 |  | Sí            | 2.0           |
| 26 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el periodo de Enero a Junio del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.                              | 5-Entregables Intermedios | 19/07/2016         |                | 19/07/2016 |  | Sí            | 1.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 27 | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.      | 5-Entregables Intermedios              | 19/07/2016         |                | 19/07/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 28 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matramamazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.                           | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 29 | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso (antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2016 realizado a satisfacción del MTOP. | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 30 | EJECUCION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matramamazar para el 2017 contratado.   | 5-Entregables Intermedios              | 28/04/2017         |                | 28/02/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 31 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matramamazar en el periodo de enero a junio 2017 realizado a satisfacción del MTOP.                                   | 5-Entregables Intermedios              | 24/07/2017         |                | 31/12/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 32 | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2017 realizado a satisfacción del MTOP.      | 5-Entregables Intermedios              | 24/07/2017         |                | 31/12/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 33 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matramamazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2017 realizado a satisfacción del MTOP.                           | 5-Entregables Intermedios              | 29/12/2017         |                | 29/12/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 34 | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2017 realizado a satisfacción del MTOP   | 5-Entregables Intermedios              | 29/12/2017         |                | 29/12/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 35 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada.   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2017         |                | 31/12/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 36 | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a junio 2018   | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2018         |                | 30/06/2018 |  | Sí            | 1.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | realizado a satisfacción del MTOP.   |  |                    |                |            |   |               |               |
| 37 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada.   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |    | Sí            | 0.5           |
| 38 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matramazar en el periodo de Enero a Diciembre del 2018 realizado a satisfacción del MTOP                                  | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 39 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Troncal - Puerto Inca en el periodo de Enero a Diciembre del 2018 realizado a satisfacción del MTOP                               | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 40 | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio - diciembre 2018 realizado a satisfacción del MTOP           | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 41 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Febero a Marzo del 2019 realizado a satisfacción del MTOP      | 5-Entregables Intermedios              | 29/03/2019         |                | 29/03/2019 |    | Sí            | 2.0           |
| 42 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Abril a Junio del 2019 realizado a satisfacción del MTOP       | 5-Entregables Intermedios              | 28/06/2019         |                | 01/07/2019 |  | Sí            | 1.0           |
| 43 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Julio a Septiembre del 2019 realizado a satisfacción del MTOP  | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2019         | 01/10/2019     |            |  | No            | 1.0           |
| 44 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada.   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2019         | 03/02/2020     |            |  | No            | 0.5           |
| 45 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Octubre a Diciembre del 2019 realizado a satisfacción del MTOP | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |  | No            | 1.0           |
| 46 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Febero a Marzo del 2020 realizado a satisfacción del MTOP      | 5-Entregables Intermedios              | 31/03/2020         | 01/04/2020     |            |  | No            | 1.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 47 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Abril a Junio del 2020 Realizado a satisfacción del MTOP                 | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2020         | 01/07/2020     |            |    | No            | 1.0           |
| 48 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Julio a Septiembre del 2020 realizado a satisfacción del MTOP            | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2020         | 01/10/2020     |            |    | No            | 1.0           |
| 49 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada.   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2020         | 31/12/2020     |            |    | No            | 0.5           |
| 50 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Octubre a Diciembre del 2020 realizado a satisfacción del MTOP | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2020         | 01/01/2021     |            |    | No            | 1.0           |
| 51 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Febrero a Marzo del 2021 realizado a satisfacción del MTOP               | 5-Entregables Intermedios              | 31/03/2021         | 02/04/2021     |            |    | No            | 0.5           |
| 52 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Abril a mayo del 2021 realizado a satisfacción del MTOP                  | 5-Entregables Intermedios              | 31/05/2021         | 31/05/2021     |            |  | No            | 0.5           |
| 53 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Mayo a Junio del 2021 realizado a satisfacción del MTOP                  | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2021         | 30/06/2021     |            |  | No            | 0.5           |
| 54 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Junio a julio del 2021 realizado a satisfacción del MTOP                 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/07/2021         | 31/07/2021     |            |  | No            | 0.5           |
| 55 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Julio a Agosto del 2021 realizado a satisfacción del MTOP                | 5-Entregables Intermedios              | 31/08/2021         | 31/08/2021     |            |  | No            | 0.5           |
| 56 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia   | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2021         | 30/09/2021     |            |  | No            | 0.5           |

HITOS



|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | del Cañar en el periodo de Agosto a Septiembre del 2021 realizado a satisfacción del MTOP  |  |                    |                |            |   |               |               |
| 57 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Septiembre a Octubre del 2021 realizado a satisfacción del MTOP  | 5-Entregables Intermedios              | 31/10/2021         | 31/10/2021     |            |    | No            | 0.5           |
| 58 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Octubre a Noviembre del 2021 Realizado a satisfacción del MTOP   | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2021         | 30/11/2021     |            |    | No            | 0.5           |
| 59 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |    | No            | 1.0           |
| 60 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en los 227.64 Km de la Red vial Estatal de la Provincia del Cañar en el periodo de Noviembre a Diciembre del 2021 Realizado a satisfacción del MTOP | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |    | No            | 0.5           |
| 61 | CIERRE: Informes del Supervisor aprobados  | 5-Entregables Intermedios              | 04/01/2022         | 04/01/2022     |            |  | No            | 1.0           |
| 62 | CIERRE: Liquidación Económica aprobada   | 5-Entregables Intermedios              | 10/01/2022         | 10/01/2022     |            |  | No            | 1.0           |
| 63 | CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado.   | 9-Entregables Formales                 | 15/02/2022         | 15/02/2022     |            |  | No            | 2.0           |
| 64 | CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita   | 5-Entregables Intermedios              | 22/02/2022         | 22/02/2022     |            |  | No            | 1.0           |
| 65 | CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito                | 5-Entregables Intermedios              | 25/02/2022         | 25/02/2022     |            |  | No            | 1.0           |
| 66 | CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF   | 9-Entregables Formales                 | 15/03/2022         | 15/03/2022     |            |  | No            | 1.5           |
| 67 | CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado  | 9-Entregables Formales                 | 31/03/2022         | 31/03/2022     |            |  | No            | 0.5           |



**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

|   | Supervisión   | Supervisor                     | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Supervisión Positiva: Limpieza de cunetas y bordillos               | Quishpi Vélez, Luis Manuel     | {PR} - Provincia - CAÑAR | 31/08/2017        |
| 2 | Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza y mantenimiento         | Cardenas Espinoza, Juan Jorge  | {PR} - Provincia - CAÑAR | 20/07/2016        |
| 3 | Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza en la vía.              | Cardenas Espinoza, Juan Jorge  | {PR} - Provincia - CAÑAR | 24/04/2016        |
| 4 | Supervisión Positiva- Se realizan mantenimientos en diferentes vías | Cardenas Espinoza, Juan Jorge  | {PR} - Provincia - CAÑAR | 25/11/2015        |
| 5 | Limpieza de cunetas y lastrado de las vías en las Parroquias        | Cardenas Espinoza, Juan Jorge  | {PR} - Provincia - CAÑAR | 25/05/2015        |
| 6 | Verificación de la terminación del Proyecto                         | Cardenas Espinoza, Juan Jorge  | {PR} - Provincia - CAÑAR | 22/01/2015        |
| 7 | Verificación del desarrollo del proyecto                            | Cardenas Espinoza, Juan Jorge  | {PR} - Provincia - CAÑAR | 24/10/2014        |
| 8 | Mantenimiento vial, limpieza de derrumbes                           | González Zhinin, Víctor Stalin | {PR} - Provincia - CAÑAR | 21/05/2014        |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador   | Estado  | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de Km de la Red Vial en buen estado      |  | 100.00 %          | 0.3  | 0.3                   | 01/01/2014      | Junio                      |
| 2 | Porcentaje de cumplimiento economico del cronograma |  | 100.00 %          | 0.19 | 0.19                  | 01/01/2014      | Junio                      |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00            |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 2,797,233.31 ** |
| Costo Total:                  | 830,000.00      |
| Total Devengado:              | 2,481,869.00    |
| % Costo Total Devengado:      | 299.02 %        |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 299.02 %

Perfil Económico 2019

|   | Años Previos   | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total        |
|---|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado  | 1,628,872.00   | 3,140,000.00      | 0.00         | 4,768,872.00 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 2,401,029.99   | 324,433.13        | 0.00         | 2,725,463.12 |
| Ppto. Codificado  | 2,091,963.90   | 324,433.13        | 0.00         | 2,416,397.03 |
| Ppto. Comprometido                                      | 1,643,552.68   | 9,265.45          | 0.00         | 1,652,818.13 |
| Planeado - Codificado (2019)                            |                | 2,815,566.87      |              |              |
| Programado a Devengar                                   | 2,732,384.37   | 324,433.13        | 0.00         | 3,056,817.50 |
| Ppto. Devengado   | 2,472,800.18   | 9,068.82          | 0.00         | 2,481,869.00 |
| Pagado Real   | 1,576,194.53   | 9,068.82          | 0.00         | 1,585,263.35 |
| Estimado a fin de año                                   | * 2,472,800.18 | 0.00              | 0.00         | 2,472,800.18 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 259,584.19     | 324,433.13        | 0.00         | 584,017.32   |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 90.50 %      | 2.80 %            | 0.00 %       | 81.19 %      |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00         |

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

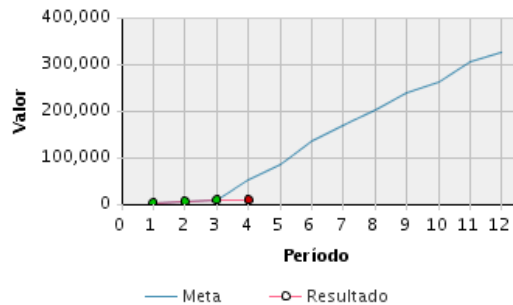

Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 2,877.22                   | 2,877.22            | 2,877.22                     | 2,877.22              | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 0.89 %       |

| Presupuesto Mensual 2019 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 2,877.22                   | 3,095.80            | 5,754.44                     | 5,973.02              | 103.80 %         |        | 1.84 %       |
| Mar                      | 2,877.22                   | 3,095.80            | 8,631.66                     | 9,068.82              | 105.06 %         |        | 2.80 %       |
| Abr                      | 43,508.23                  | 0.00                | 52,139.89                    | 9,068.82              | 17.39 %          |        | 2.80 %       |
| May                      | 32,765.16                  |                     | 84,905.05                    |                       |                  |        |              |
| Jun                      | 50,923.07                  |                     | 135,828.12                   |                       |                  |        |              |
| Jul                      | 32,923.07                  |                     | 168,751.19                   |                       |                  |        |              |
| Ago                      | 33,211.06                  |                     | 201,962.25                   |                       |                  |        |              |
| Sep                      | 37,423.06                  |                     | 239,385.31                   |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 22,388.81                  |                     | 261,774.12                   |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 43,043.80                  |                     | 304,817.92                   |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 19,615.21                  |                     | 324,433.13                   |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>324,433.13</b>          | <b>9,068.82</b>     |                              |                       |                  |        |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |   |
|----------------------|---|
| 12                   | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 13                   | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.   |
| 14                   | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.                       |
| 15                   | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.                                    |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                           | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 1  |  | Planilla_microempresa_Sageo_marzo_2017.pdf                    | 05/05/2017    |
| 2  |  | Planilla_microempresa_Matapin_marzo_2017.pdf                  | 05/05/2017    |
| 3  |  | Planilla_microempresa_Zhoray_marzo_2017.pdf                   | 05/05/2017    |
| 4  |  | Orden_de_compra_La_Primavera_-_Septiembre.pdf                 | 01/11/2017    |
| 5  | A1-Informe sitop-mayo-05-micro-Matapin           | Inf-sitop-mayo05--micro-Matapin.pdf                           | 09/06/2015    |
| 6  | A10-Inf-sitop-junio-2017                         | informe_ejecutivo_EL_Descanso.pdf                             | 05/07/2017    |
| 7  | A11-Inf-sitop-junio-2017                         | Matrama_Mazar_tramo_1.pdf                                     | 05/07/2017    |
| 8  | A12-Inf-sitop-junio-2017                         | Matrama_Mazar_tramo_2.pdf                                     | 05/07/2017    |
| 9  | A13-Inf-sitop-junio-2017                         | Informe_Troncal_Puerto_Inca.pdf                               | 05/07/2017    |
| 10 | A2-Informe-sitop-mayo-05-micro-Zhoray            | Inf-sitop-mayo-05-micro-Zhoray.pdf                            | 09/06/2015    |
| 11 | A3-Informe sitop-junio-05-micro-Sageo            | Informe_sitop_junio-05_micro-Sageo.pdf                        | 08/07/2015    |
| 12 | A4-Informe sitop junio-05-micro-Matapin          | Informe_sitop_junio-05_micro-Matapin.pdf                      | 08/07/2015    |
| 13 | A5-Informe-sitop-junio-05-micro-Zhoray           | Informe_sitop_junio-05-micro-zhoray.pdf                       | 08/07/2015    |
| 14 | A6-Informe-sitop-micro-matapin-agos-05           | Inf-sitop-matapin-agos-05.pdf                                 | 07/09/2015    |
| 15 | A7-Inf-micro-sageo-junio-06                      | A7-Inf-micro-sageo-junio-06.pdf                               | 04/07/2016    |
| 16 | A8-Inf-sitop-julio-06-Matapin                    | A8-Inf-sitop-julio-06-Matapin.pdf                             | 04/08/2016    |
| 17 | A9-Inf-sitop-julio-06-Zhoray                     | A9-Inf-sitop-julio-06-Zhoray.pdf                              | 04/08/2016    |
| 18 | Acta de planilla 4                               | ACTA.pdf  | 05/07/2018    |
| 19 | Acta de recepcion parcial Chontamarca            | 22348_Chontamarca_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf     | 05/11/2018    |
| 20 | Acta de recepcion parcial Chontamarca septiembre | 22348_Chontamarca_Acta_recepción_parcial__Septiembre_2018.pdf | 20/08/2018    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo  | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 21 | Acta de recepcion parcial LA PRIMAVERA                                    | 21009_La_Primavera_Acta_Recepción_Parcial_Octubre_2018.pdf             | 05/12/2018    |
| 22 | Acta de recepcion parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA CHONTAMARCA  | 22348_Chontamarca_Acta_Recepción_Parcial_Diciembre_2018.pdf            | 04/01/2019    |
| 23 | Acta de recepcion parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA LA PRIMAVERA | 21009_La_Primavera_Acta_Recepción_Parcial_Diciembre_2018.pdf           | 04/01/2019    |
| 24 | Acta de recepcion parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA MATAPIN      | Acta_de_recepcion_parcial_Matapin.pdf                                  | 04/01/2019    |
| 25 | Acta de recepcion parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA NUEVO JAVIN  | 21450_Nuevo_Javin_Acta_Recepción_Parcial_Noviembre_2018.pdf            | 04/01/2019    |
| 26 | Acta de recepcion parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA SAGEO        | Acta_de_recepcion_parcial_sageo_diciembre.pdf                          | 04/01/2019    |
| 27 | Acta de recepcion parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA SAN ANTONIO  | 21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_Recepción_Parcial_Noviembre_2018.pdf  | 04/01/2019    |
| 28 | Acta de recepcion parcial NUEVO JAVIN                                     | 21450_Nuevo_Javin_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf              | 05/12/2018    |
| 29 | Acta de recepcion parcial PANCHO NEGRO                                    | 21453_Américas_Pancho_Negro_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf    | 05/12/2018    |
| 30 | Acta de recepción definitiva  | Acta_de_trabajos_microempresa_primavera.pdf                            | 05/08/2017    |
| 31 | Acta de recepción definitiva  | Acta_de_trabajos_microempresa_primavera.pdf                            | 05/08/2017    |
| 32 | Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa CHONTAMARCA            | 22348_Chontamarca_Acta_Recepción_Definitiva_2018.pdf                   | 04/01/2019    |
| 33 | Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa LA PRIMAVERA           | 21009_La_Primavera_Acta_Recepción_Definitiva_2018.pdf                  | 04/01/2019    |
| 34 | Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa MATAPIN                | Acta_de_recepcion_definitivo_Matapin.pdf                               | 04/01/2019    |
| 35 | Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa NUEVO JAVIN            | 21450_Nuevo_Javin_Acta_Recepción_Definitiva.pdf                        | 04/01/2019    |
| 36 | Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa San Antonio            | 21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_Recepción_Definitiva.pdf              | 04/01/2019    |
| 37 | Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa ZHORAY                 | Acta_de_recepcion_definitiva.pdf                                       | 04/01/2019    |
| 38 | Acta de recepción microempresa AMERICAS                                   | _actalas_americas.pdf  | 05/09/2018    |
| 39 | Acta de recepción microempresa AMERICAS                                   | 21453_Américas_Pancho_Negro_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf     | 05/10/2018    |
| 40 | Acta de recepción microempresa AMERICAS                                   | 21453_Américas_Pancho_Negro_Acta_recepción_parcial_Septiembre_2018.pdf | 05/11/2018    |
| 41 | Acta de recepción microempresa matapin                                    | Acta_de_recepción_parcial_Matrama_mazar_T1.pdf                         | 05/10/2017    |
| 42 | Acta de recepción microempresa matapin                                    | Acta_Microempresa_Matapin_-_Sep.pdf                                    | 01/11/2017    |
| 43 | Acta de recepción microempresa matapin                                    | 19561_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf                                  | 05/12/2017    |
| 44 | Acta de recepción microempresa matapin                                    | 19561_Acta_de_recepción_parcial_2.pdf                                  | 05/01/2018    |
| 45 | Acta de recepción microempresa MATAPIN                                    | acta_matapin.pdf   | 05/09/2018    |
| 46 | Acta de recepción microempresa MATAPIN                                    | 21007_Acta_recepción_parcial_Matapin_Agosto_2018.pdf                   | 05/10/2018    |
| 47 | Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN                                | _actanuevo_javin.pdf   | 05/09/2018    |
| 48 | Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN                                | 21450_Nuevo_Javin_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf               | 05/10/2018    |
| 49 | Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN                                | 21450_Nuevo_Javin_Acta_recepción_parcial_Septiembre_2018.pdf           | 05/11/2018    |
| 50 | Acta de recepción microempresa PRIMAVERA                                  | Acta_de_recepción_parcial_Troncal_P.Inca.pdf                           | 05/10/2017    |
| 51 | Acta de recepción microempresa PRIMAVERA                                  | Acta_Microempresa_La_Primavera_-_Sep.pdf                               | 01/11/2017    |
| 52 | Acta de recepción microempresa PRIMAVERA                                  | 19558_-_Acta_Definitiva.pdf  | 05/12/2017    |
| 53 | Acta de recepción microempresa Primavera                                  | 20489_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf                                  | 05/01/2018    |
| 54 | Acta de recepción microempresa PRIMAVERA                                  | acta_primavera.pdf   | 05/09/2018    |
| 55 | Acta de recepción microempresa PRIMAVERA                                  | 21009_La_Primavera_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf              | 05/10/2018    |
| 56 | Acta de recepción microempresa sageo                                      | Acta_de_recepción_parcial_Descaso_Biblián.pdf                          | 05/10/2017    |
| 57 | Acta de recepción microempresa sageo                                      | Acta_Microempresa_Sageo_-_Sep.pdf                                      | 01/11/2017    |
| 58 | Acta de recepción microempresa sageo                                      | 19559_-Acta_Definitiva.pdf   | 05/12/2017    |
| 59 | Acta de recepción microempresa sageo                                      | 20488_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf                                  | 05/01/2018    |
| 60 | Acta de recepción microempresa SAGEO                                      | acta_sageo.pdf   | 05/09/2018    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo                                  | Archivo   | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 61  | Acta de recepción microempresa SAGEO                    | 21008_Acta_recepción_parcial_Sageo_Agosto_2018.pdf                    | 05/10/2018    |
| 62  | Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO              | acta_s@n_antonio_de_paguacay.pdf                                      | 05/09/2018    |
| 63  | Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO              | 21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf    | 05/10/2018    |
| 64  | Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO              | 21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_recepción_parcial_Sepiembre_2018.pdf | 05/11/2018    |
| 65  | Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO              | 21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf   | 05/12/2018    |
| 66  | Acta de recepción microempresa zhoray                   | Acta_de_recepción_parcial_Matrama_Mazar_T2.pdf                        | 05/10/2017    |
| 67  | Acta de recepción microempresa zhoray                   | Acta_Microempresa_Zhoray_-_Sep.pdf                                    | 01/11/2017    |
| 68  | Acta de recepción microempresa zhoray                   | 19562_-_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf                               | 05/12/2017    |
| 69  | Acta de recepción microempresa zhoray                   | 19562_-_Acta_de_recepción_parcial_2.pdf                               | 05/01/2018    |
| 70  | Acta de recepción microempresa ZHORAY                   | acta_zhoray.pdf   | 05/09/2018    |
| 71  | Acta de recepción microempresa ZHORAY                   | 21006_Acta_recepción_Zhoray_Agosto_2018.pdf                           | 05/10/2018    |
| 72  | Acta de recepción parcial mes de abril 2019             | 23397_Acta_Recepción_Parcial_Nuevo_Javín_Abril_2019.pdf               | 02/05/2019    |
| 73  | Acta de recepción parcial mes de abril 2019 Zhoray      | 23398_Acta_Recepción_Parcial_Zhoray_Abril_2019.pdf                    | 02/05/2019    |
| 74  | Acta de recepción parcial mes de marzo 2019             | 23397_Acta_Recepción_Parcial_Nuevo_Javín_Marzo_2019.pdf               | 02/05/2019    |
| 75  | Acta de recepción parcial mes de marzo 2019 Zhoray      | 23398_Acta_Recepción_Parcial_Zhoray_Marzo_2019.pdf                    | 02/05/2019    |
| 76  | INFOMRE SITOP SEPTIEMBRE 2016                           | MICRO_ZHORAY.pdf  | 04/10/2016    |
| 77  | INFOMRME SITOP SEPTIEMBRE 2016                          | MICRO_MATAPIN.pdf   | 04/10/2016    |
| 78  | Informe ejecutivo mes de agosto 2017                    | MICROEMPRESA_PRIMAVERA.pdf  | 05/09/2017    |
| 79  | Informe ejecutivo mes de agosto 2017                    | INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESA_MATAPIN.pdf                            | 05/09/2017    |
| 80  | Informe ejecutivo mes de agosto 2017                    | INFORME_EJECUTIVOMICROEMPRESA_SAGEO.pdf                               | 05/09/2017    |
| 81  | Informe ejecutivo mes de agosto 2017                    | INFORME_EJECUTIVO_MICRO_ZHORAY.pdf                                    | 05/09/2017    |
| 82  | Informe ejecutivo mes de julio 2018                     | INFORME_EJEC_ZHUD_-_CHILCHIL.pdf                                      | 03/08/2018    |
| 83  | Informe ejecutivo mes de julio 2018                     | INFORME_EJEC_MATRAMA_MAZAR_T2.pdf                                     | 03/08/2018    |
| 84  | Informe ejecutivo mes de julio 2018                     | INFORME_EJEC_TRONCAL_PUERTO_INCA.pdf                                  | 03/08/2018    |
| 85  | Informe ejecutivo mes de julio 2018                     | INFORME_EJEC_EL_CHORRO-_EL_TRIUNFO.pdf                                | 03/08/2018    |
| 86  | Informe ejecutivo mes de julio 2018                     | INFORME_EJEC_CHILCHIL_-_EL_CHORRO.pdf                                 | 03/08/2018    |
| 87  | Informe ejecutivo mes de julio 2018                     | INFORME_EJEC_MATRAMA_-_MAZAR_T1.pdf                                   | 03/08/2018    |
| 88  | Informe ejecutivo mes de julio 2018                     | INFORME_EJECT_DESCANSO_-_AZOG-_Bl.pdf                                 | 03/08/2018    |
| 89  | Informe ejecutivo mes de junio 2018                     | Informe_ejecutivo_mantenimiento_Chorro_el_Triunfo.pdf                 | 05/07/2018    |
| 90  | Informe ejecutivo mes de junio 2018                     | informe_ejecutivo_ZHUD-COCHANCAY.pdf                                  | 05/07/2018    |
| 91  | Informe ejecutivo mes de junio 2018                     | informe_ejecutivo_SAN_ANTONIO.pdf                                     | 05/07/2018    |
| 92  | Informe ejecutivo mes de junio 2018                     | informe_ejecutivo_Primavera.pdf                                       | 05/07/2018    |
| 93  | Informe ejecutivo mes de junio 2018                     | informe_ejecutivo_matrama_mazar_t2.pdf                                | 05/07/2018    |
| 94  | Informe ejecutivo mes de junio 2018                     | informe_ejecutivo_descanso.pdf  | 05/07/2018    |
| 95  | Informe ejecutivo mes de junio 2018                     | informe_ejecutivo_matrama_mazar_T1.pdf                                | 05/07/2018    |
| 96  | Informe ejecutivo mes de Marzo 2018 Descanso Biblián    | informe_ejecutivo_sageo.pdf   | 05/04/2018    |
| 97  | Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Matrama Mazar 1     | Informe_ejecutivo_matapin.pdf   | 05/04/2018    |
| 98  | Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Matrama Mazar 2     | Informe_ejecutivo_zhoray.pdf  | 05/04/2018    |
| 99  | Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Troncal Puerto Inca | informe_ejecutivo_PRIMAVERA.pdf                                       | 05/04/2018    |
| 100 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018                      | Informe_ejecutivo_Zhud_-_Chilchil.pdf                                 | 05/06/2018    |
| 101 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018                      | Informe_ejecutivo_Chilchil_-_El_Chorro.pdf                            | 05/06/2018    |
| 102 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018                      | Informe_ejecutivo_El_Chorro_-_El_Triunfo.pdf                          | 05/06/2018    |
| 103 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018                      | Informe_ejecutivo_tramo_1.pdf   | 05/06/2018    |
| 104 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018                      | informe_ejecutivo_Troncal_Puerto.pdf                                  | 05/06/2018    |
| 105 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018                      | informe_ejecutivo_zhoray_tramo_2.pdf                                  | 05/06/2018    |
| 106 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018                      | informe_ejecutivo_Azogues_-_Descanso.pdf                              | 05/06/2018    |
| 107 | Informe ejecutivo mes de octubre 2017                   | Informe_Mensual_Microempresa_La_Primavera_-_Sep.pdf                   | 01/11/2017    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                       | Archivo  | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 108 | Informe ejecutivo mes de octubre 2017                        | Informe_Mensual_Microempresa_Matapin_-_Sep.pdf | 01/11/2017    |
| 109 | Informe ejecutivo mes de octubre 2017                        | Informe_Mensual_Microempresa_Sageo_-_Sep.pdf   | 01/11/2017    |
| 110 | Informe ejecutivo mes de octubre 2017                        | Informe_Mensual_Microempresa_Zhoray_-_Sep.pdf  | 01/11/2017    |
| 111 | Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Descanso Biblián    | Informe_Ejecutivo_Sageo.pdf                    | 05/10/2017    |
| 112 | Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Matrama Mazar 1     | Informe_ejecutivo_Matapin.pdf                  | 05/10/2017    |
| 113 | Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Matrama Mazar 2     | Informe_ejecutivo_Zhoray.pdf                   | 05/10/2017    |
| 114 | Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Troncal Puerto Inca | Informe_Ejecutivo_Primavera.pdf                | 05/10/2017    |
| 115 | informe sitop matapin octubre                                | microempresa_matapin.pdf                       | 05/11/2016    |
| 116 | informe sitop octubre sageo                                  | miroempresa_sageo.pdf                          | 05/11/2016    |
| 117 | INFORME SITOP SEPTIEMBRE 2016                                | MICRO_SAGEO.pdf                                | 04/10/2016    |
| 118 | Informe-sitop-micro-sageo-agos-05                            | Inf-sitop-sageo-agos-05.pdf                    | 07/09/2015    |
| 119 | informese sitop octubre zhoray                               | miroempresa_zhoray.pdf                         | 05/11/2016    |
| 120 | Orden de Compra Microempresa Matapin                         | 19561_Orden_de_compra.pdf                      | 05/12/2017    |
| 121 | Planilla mes de junio de 2017 Troncal Puerto Inca            | PLANILLA_MICROEMPRESA_PRIMAVERA.pdf            | 05/07/2017    |
| 122 | Planilla mes de mayo de 2017 Tramo 1                         | PLANILLA_MICROEMPRESA_MATAPIN.pdf              | 05/07/2017    |
| 123 | Planilla mes de mayo de 2017 Tramo 2                         | PLANILLA_MICROEMPRESA_ZHORAY.pdf               | 05/07/2017    |
| 124 | Planilla mes de mayo el Descanso                             | PLANILLA_MICROEMPRESA_SAGEO.pdf                | 05/07/2017    |
| 125 | Planilla Nro 1 Microempresa Nuevo Javin                      | 23397_Planilla_1_Nuevo_Javín_Marzo_2019.pdf    | 02/05/2019    |
| 126 | Planilla Nro 1 Microempresa Zhoray 2019                      | 23398_Planilla_1_Zhoray_Marzo_2019.pdf         | 02/05/2019    |
| 127 | Planilla Nro 2 Microempresa Nuevo Javin                      | 23397_Planilla_2_Nuevo_Javín_Abril_2019.pdf    | 02/05/2019    |
| 128 | Planilla Nro 2 Microempresa Zhoray 2019                      | 23398_Planilla_2_Zhoray_Abril_2019.pdf         | 02/05/2019    |

## EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                               | Rol                                   | Puesto  | Correo Electrónico     | Teléfono(s)         |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| Dután Sanango, Italo Medardo         | Lider de Proyecto                     | Especialista Tecnico de Infraestructura Distrital           | imдутan@mtop.gob.ec    | 072240227 ext 62801 |
| Izquierdo Campoverde, Galo Fernando  | Titular                               | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar | gizquierdo@mtop.gob.ec |                     |
| Jaramillo Vintimilla, José Francisco | Patrocinador Ejecutivo                | Subsecretario Regional 6                                    | jjaramillo@mtop.gob.ec | 62751               |
| Torres Jara, Julia Brumilda          | Coordinador Administrativo Financiero | Analista Administrativa Financiero                          | jtorres@mtop.gob.ec    | 072240227 ext 62814 |

## FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo     | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 75724_1.jpg | 05/04/2018    |
