

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1

Dirección Provincial Sucumbíos

PROYECTO: K007 MTOP - Mantenimiento vial de la provincia de Sucumbíos

Líder del Proyecto:	López Mendoza, Cristhian Manuel (cmlopez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, Provincia - Sucumbíos, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, STPE - Inversión en 40km de frontera norte
Titular:	Solano Blacio, Wimper Vicente	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3829	TIR:	100.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	1,528,677.60
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	26,483,941.54
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/02/2011 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	02/09/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	29/12/2017

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

La contratación de las Microempresas obedece a la necesidad de realizar el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal de la provincia de Sucumbios, los trabajos principales que realizan las Asociaciones de Conservación Vial son: Roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de puentes, causes y quebradas; mantenimiento de la señalización vertical, entre otros.

PRODUCTO / SERVICIO:

El producto esperado, es el mantenimiento de la Red Vial Estatales en óptimas condiciones.

LÍNEA BASE:

La línea base para el Mantenimiento de la Red Vial Estatal a través de microempresas, se considera siempre a partir de cero, debido a que los contratos son anuales y los trabajos se desarrollan durante los 12 meses.

OBJETIVO GENERAL:

Mantener la Red Vial Estatal Provincial en las condiciones adecuadas para el tránsito vehicular.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Disminuir el riesgo de accidentes de tránsito

Incrementar el nivel de servicio en las carreteras de la Red Vial estatal de la Provincia de Sucumbíos

CONTRATISTA:

Asociaciones de Conservación Vial

MONTO CONTRACTUAL

992,672.34

Beneficios Cualitativos

Incrementar el nivel de servicio de las vías;

Mejorar la seguridad vial de personas, bienes y servicios

Disminuir los tiempos de viaje entre los diferentes destinos

Tipo de Beneficiario

Ciudadanía en General

Restricciones

Tiempo: La ejecución de los contratos se debe cumplir según lo establecido en los contratos. Referente a las microempresas con la catalogación en el SERCOP el tiempo de ejecución es mensual.


Costo: Lo establecido en la orden de compra generada en el Catálogo Electrónico.

Alcance: Lo estipulado en el tramo correspondiente a cada microempresa.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.27 %
 Fecha de Inicio: 15/02/2011 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

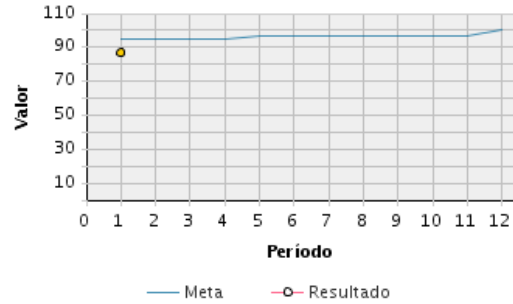

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	95 %	95 %	95 %	95 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	100 %
	Avance real acumulado											
	87 %											
	Estado											
	▼											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Julio 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUNCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO ITAYA.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	01/08/2019 - 09:21 AM
<p>Junio 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUNCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	02/07/2019 - 08:25 AM
<p>Mayo 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUNCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/06/2019 - 02:44 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica.</p>		
<p>Abril 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica.</p>	<p>López Mendoza, Cristhian Manuel</p>	<p>02/05/2019 - 08:58 AM</p>
<p>Marzo 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica.</p>	<p>López Mendoza, Cristhian Manuel</p>	<p>03/04/2019 - 01:43 PM</p>
<p>Febrero 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica.</p>	<p>López Mendoza, Cristhian Manuel</p>	<p>27/02/2019 - 07:52 AM</p>
<p>Enero 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica.</p>	<p>López Mendoza, Cristhian Manuel</p>	<p>04/02/2019 - 04:47 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA con las 23 Microempresas de conservación vial DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica.</p>	<p>López Mendoza, Cristhian Manuel</p>	<p>03/01/2019 - 03:29 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2018 Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA con las 23 Microempresas de conservación vial DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica.</p>	<p>López Mendoza, Cristhian Manuel</p>	<p>06/12/2018 - 07:59 AM</p>
<p>Octubre 2018: Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA con las 23 Microempresas de conservación vial DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. Se realizó la publicación del proceso de contratación en el SOCE, del "SOBRE EL RIO PUENTE DURENO" ubicado en la vía Nueva Loja Puerto Carmen y la contratación de del punto crítico numero 6 bicado en la vía Nueva Loja Puerto Carmen También se encuentra en Proceso de contratación sobre señalización de la red vial Estatal.</p>	<p>López Mendoza, Cristhian Manuel</p>	<p>05/11/2018 - 08:41 AM</p>
<p>Septiembre 2018: Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA con las 23 Microempresas de conservación vial DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. Se realizó la publicación del proceso de contratación en el SOCE, del "PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FE" ubicado en la vía Jivino verde Shushufindl. También se encuentra en Proceso de contratación sobre señalización de la red vial Estatal. De igual manera se firmó el contrato para la contratación de las Fiscalizaciones de la construcción del puente sobre el rio Santa Fe.</p>	<p>López Mendoza, Cristhian Manuel</p>	<p>03/10/2018 - 02:46 PM</p>
<p>Agosto: Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA con las 23 Microempresas de conservación vial DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. Se realizó la publicación del proceso de contratación en el SOCE, del "PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FE" ubicado en la vía Jivino verde Shushufindl. También se encuentra en Proceso de contratación sobre señalización de la red vial Estatal. De igual manera se elevó al SOCE los procesos para la contratación de las Fiscalizaciones de la construcción del puente sobre el rio Santa Fe.</p>	<p>López Mendoza, Cristhian Manuel</p>	<p>04/09/2018 - 02:24 PM</p>
<p>Julio 2018: Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Puerto el Carmen, con 4 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA con las 23 Microempresas de conservación vial DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. Se realizó la publicación del proceso de contratación en el SOCE, del "PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FE" ubicado en la vía Jivino verde Shushufindl. También se encuentra en Proceso de contratación sobre señalización de la red vial Estatal. De igual manera se elevó al SOCE los procesos para la contratación de las Fiscalizaciones de la construcción del puente sobre el rio Santa Fe.</p>	<p>Vinces Navarrete, Julio Cesar</p>	<p>02/08/2018 - 02:44 PM</p>
<p>Junio 2018 Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Puerto el Carmen, con 4 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO</p>	<p>López Mendoza, Cristhian Manuel</p>	<p>06/07/2018 - 07:57 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA con las 23 Microempresas de conservación vial DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. Se realizó la publicación del proceso de contratación en el SOCE, del "PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FE" ubicado en la vía Jivino verde Shushufindl. También se encuentra en Proceso de contratación sobre señalización de la red vial Estatal. De igual manera se elevó al SOCE los procesos para la contratación de las Fiscalizaciones de la construcción del puente sobre el rio Santa Fe y sobre el rio Teteyé.</p>		
<p>Mayo 2018</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Puerto el Carmen, con 4 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento rutinario de las vías NUEVA LOJA - REVENTADOR, PUENTE LUMBAQUI - LIMITE PROVINCIAL DEL CARCHI, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARME, JIVINO VERDE- AGURICO 3, YAMANUCA -PUERTO PROVIDENCIA - HITAYA con las 23 Microempresas DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, Se realizó la publicación del proceso de contratación del "PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FE" UBICADO EN LA VÍA JIVINO VERDE SHUSHUFINDI en el SOCE. también se encuentra en Proceso de contratación sobre señalización de la red vial Estatal. de igual manera se elevó al SOCE los procesos para la contratación de las Fiscalizaciones de la construcción del puente sobre el rio Santa Fe y sobre el rio Teteye</p>	<p>Enríquez Ocampos, Robín Cristian</p>	<p>01/06/2018 - 03:11 PM</p>
<p>Abril 2018</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Puerto el Carmen, con 4 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento rutinario de las vías NUEVA LOJA - REVENTADOR, PUENTE LUMBAQUI - LIMITE PROVINCIAL DEL CARCHI, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARME, JIVINO VERDE- AGURICO 3, YAMANUCA -PUERTO PROVIDENCIA - HITAYA con las 23 Microempresas DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, Se realizó la publicación del proceso de contratación del "PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FE" UBICADO EN LA VÍA JIVINO VERDE SHUSHUFINDI en el SOCE. tambien se encuentra en Proceso de contratacion sobre señalizacion de la red vial Estatal.</p>	<p>Enríquez Ocampos, Robín Cristian</p>	<p>03/05/2018 - 11:03 AM</p>
<p>Marzo 2018</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja - Reventador, con 4 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento rutinario de las vías NUEVA LOJA - REVENTADOR, PUENTE LUMBAQUI - LIMITE PROVINCIAL DEL CARCHI, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARME, JIVINO VERDE- AGURICO 3, YAMANUCA -PUERTO PROVIDENCIA - HITAYA con las 23 Microempresas DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, Se realizó la publicación del proceso de contratación del "PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FE" UBICADO EN LA VÍA JIVINO VERDE SHUSHUFINDI en el SOCE.</p>	<p>Enríquez Ocampos, Robín Cristian</p>	<p>04/04/2018 - 08:49 AM</p>
<p>Febrero 2018</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja - Reventador, con 6 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se emitió las Ordenes de Compra a 23 Microempresas, dentro del Catalogo Electrónico, quienes iniciaron su trabajo de Mantenimiento Vial Rutinario desde el 21 de Febrero hasta Diciembre de 2018 , adicional a esto, se finalizó la rehabilitación del punto crítico N°5 de la vía Nueva Loja - Puerto Carmen, y la construcción de 2 muros de hormigón en las abscisas 43+450 y 45+150 y dos muro de gaviones en las abscisas 39+550 y 44+450 en la vía Quito.</p>	<p>Enríquez Ocampos, Robín Cristian</p>	<p>09/03/2018 - 11:49 AM</p>
<p>Enero 2018</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Lumbaqui - La Bonita, con 3 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se van han contratar 23 Microempresas a partir del marzo, para los períodos Marzo - Diciembre de 2018, adicional a esto se contrató la rehabilitación del punto crítico N°5 de la vía Nueva Loja - Puerto Carmen, también la contratación de 2 muros de hormigón en las abscisas 43+450 y 45+150 y dos muro de gaviones en las abscisas 39+550 y 44+450 en la vía Quito</p>	<p>Enríquez Ocampos, Robín Cristian</p>	<p>05/02/2018 - 04:59 PM</p>
<p>Diciembre 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Lumbaqui - La Bonita, con 6 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se han contratado Microempresas a partir del 14 de Octubre, para los períodos 14 de Octubre - 14 de Noviembre y 14 de Noviembre, 14 de Diciembre de 2017, adicional a esto se contrató la rehabilitación del punto crítico N°5 de la vía Nueva Loja - Puerto Carmen, también la contratación de 2 muros de hormigón en las abscisas 43+450 y 45+150 y dos muro de gaviones en las abscisas 39+550 y 44+450 en la vía Quito</p>	<p>Enríquez Ocampos, Robín Cristian</p>	<p>05/01/2018 - 09:17 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Noviembre 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Lumbaqui - La Bonita, con 6 maquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se han contratado Microempresas a partir del 14 de Octubre, para los períodos 14 de Octubre - 14 de Noviembre y 14 de Noviembre, 14 de Diciembre de 2017, adicional a esto se contrato la rehabilitacion del punto critico N°5 de la via nueva Loja - Puerto Carmen.</p>	<p>Enríquez Ocampos, Robín Cristian</p>	<p>03/01/2018 - 04:00 PM</p>
<p>Octubre 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Lumbaqui - La Bonita, con una sola máquina y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Los equipos pertenecientes a la Dirección Distrital de Sucumbíos se encuentran dañados y no hay recursos económicos para su reparación. Se han contratado Microempresas a partir del 14 de Octubre, para los períodos 14 de Octubre - 14 de Noviembre y 14 de Noviembre, 14 de Diciembre de 2017.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>01/11/2017 - 02:49 PM</p>
<p>Septiembre 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Lumbaqui - La Bonita, con una sola máquina y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Los equipos pertenecientes a la Dirección Distrital de Sucumbíos se encuentran dañados y no hay recursos económicos para su reparación. La falta de recursos económicos, impiden la contratación de Microempresas.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>02/10/2017 - 09:01 AM</p>
<p>Agosto 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Lumbaqui - La Bonita, con una sola máquina y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se concluyó el bacheo asfáltico mayor de la red Vial estatal, en las carreteras Nueva Loja - Simón Bolívar; Nueva Loja - Chiritza ; Cuyabeno - Puerto El Carmen y Jivino Verde - Shushufindi. Los equipos pertenecientes a la Dirección Distrital de Sucumbíos se encuentran dañados y no hay recursos económicos para su reparación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>05/09/2017 - 09:14 PM</p>
<p>Julio 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puente Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se ha realizado el bacheo asfáltico mayor de la red Vial estatal, en las carreteras Nueva Loja - Simón Bolívar; Nueva Loja - Chiritza ; Cuyabeno - Puerto El Carmen y Jivino Verde - Shushufindi. Los contratos de las obras de asfalto se encuentran en archivos anexos del mes de Junio.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>02/08/2017 - 01:59 PM</p>
<p>Junio 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puente Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>El 18 e Mayo concluyeron los trabajos de las Microempresas y no se ha vuelto a contratar Microempresas para el período Mayo - Junio 2017.</p> <p>Se ha relizado contratos para el Bacheo Asfáltico mayor en la Red Vial Estatal de la Provincia de Sucumbíos los trabajos deberán terminar el 15 de Julio de 2017.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>03/07/2017 - 07:43 PM</p>
<p>Junio 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puente Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>El 18 e Mayo concluyeron los trabajos de las Microempresas y no se ha vuelto a contratar Microempresas para el período Mayo - Junio 2017.</p> <p>Se ha relizado contratos para el Bacheo Asfáltico mayor en la Red Vial Estatal de la Provincia de Sucumbíos los trabajos deberán terminar el 15 de Julio de 2017.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>22/06/2017 - 04:54 PM</p>
<p>Mayo 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puente Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>A partir del 19 de Abril se contrataron 18 Microempresas para el Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal; los trabajos concluyeron el 18 de Mayo de 2017 y no se ha vuelto a contratar Microempresas para el período Mayo - Junio 2017.</p> <p>Se ha realizado contratos para mantenimiento Vial correspondiente a bacheo asfáltico mayor en la Red Vial Estatal Provincial y construcción de accesos del puente El Oso en la carretera Lumbaqui - Julio Andrade, Tramo La Bonita - Julio Andrade.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>01/06/2017 - 10:39 AM</p>
<p>Abril 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puente Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>A partir del 19 de Abril se contrataron 18 Microempresas para el Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>03/05/2017 - 12:17 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Marzo 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puente Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>28/03/2017 - 12:32 PM</p>
<p>Febrero 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puente Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se ha contratado maquinaria para realizar mantenimientos emergentes ya que los equipos del MTOP no se abastecen. No se ha contratado Microempresas debido a la falta de asignación de recursos económicos.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>05/03/2017 - 12:39 PM</p>
<p>Enero 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puente Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se ha contratado maquinaria para realizar mantenimientos emergentes ya que los equipos del MTOP no se abastecen. No se ha contratado Microempresas debido a la falta de asignación de recursos económicos.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>05/03/2017 - 12:39 PM</p>
<p>Diciembre 2016:</p> <p>Se han contratado dieciocho (18) Asociaciones de Conservación Vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal desde el 01 Diciembre de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016 en los tramos: Lumbaqui (entrada a la Bonita) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; Río Palmar - La Bonita ; La Bonita - La Fama; La Fama - Santa Bárbara - Santa Barbara; Santa Barbara - Cocha Seca; Jivino Verde - Yamanunca; Yamanunca - Puerto Itaya; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza; Pte. Cuyabeno - Sansahuari; Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP. La Dirección Provincial se encuentra realizando el Mantenimiento Vial por Administración Directa en la Red Vial Estatal de la Provincia.</p>	<p>Benavides Morillo, Omar Alexander</p>	<p>04/01/2017 - 09:06 AM</p>
<p>Noviembre 2016:</p> <p>Se han contratado diecinueve (19) Asociaciones de Conservación Vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal desde el 01 Diciembre de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016 en los tramos: Lumbaqui (entrada a la Bonita) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; Río Palmar - La Bonita ; La Bonita - La Fama; La Fama - Santa Bárbara - Santa Barbara; Santa Barbara - Cocha Seca; Jivino Verde - Yamanunca; Yamanunca - Puerto Itaya; Shushufindi - Aguarico 3; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza; Pte. Cuyabeno - Sansahuari; Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP. La Dirección Provincial se encuentra realizando el Mantenimiento Vial por Administración Directa en la Red Vial Estatal de la Provincia.</p>	<p>Benavides Morillo, Omar Alexander</p>	<p>04/01/2017 - 09:06 AM</p>
<p>Octubre 2016:</p> <p>Se han contratado diecisiete (17) Asociaciones de Conservación Vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal desde el 24 Octubre de 2016 hasta el 23 de Noviembre de 2016 en los tramos: Lumbaqui (entrada a la Bonita) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; Río Palmar - El Higuero - Santa Barbara; Santa Barbara - Cocha Seca; Jivino Verde - Yamanunca; Yamanunca - Puerto Itaya; Shushufindi - Aguarico 3; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza; Pte. Cuyabeno - Sansahuari; Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>31/10/2016 - 11:25 AM</p>
<p>Septiembre 2016:</p> <p>Se han contratado doce Asociaciones de conservación vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal desde el 29 de agosto hasta el 28 de septiembre de 2016 en los tramos: Lumbaqui (entrada a la Bonita) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; El Higuero - Santa Barbara; Santa Barbara - Cocha Seca; Jivino Verde - Yamanunca; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza; Pte. Cuyabeno - Sansahuari; Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP.</p>	<p>Benavides Morillo, Omar Alexander</p>	<p>06/10/2016 - 04:14 PM</p>
<p>Julio 2016:</p> <p>Se han contratado nueve Asociaciones de conservación vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal desde el 05 de junio hasta 14 de julio de 2016 en los tramos: Lumbaqui (entrada a la Bonita) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; El Higuero - Santa Barbara; Santa Barbara - Cocha Seca; Jivino Verde - Yamanunca; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza; Pte. Cuyabeno - Sansahuari; Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP.</p>	<p>Benavides Paladines, Ángel Bolívar</p>	<p>29/07/2016 - 10:13 AM</p>
<p>Junio 2016:</p> <p>Se han contratado nueve Asociaciones de conservación vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal para los tramos Lumbaqui (entrada a la Bonita) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; El Higuero - Santa Barbara; Santa Barbara - Cocha Seca; Jivino Verde - Yamanunca; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza; Pte. Cuyabeno - Sansahuari; Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP.</p>	<p>Benavides Paladines, Ángel Bolívar</p>	<p>27/06/2016 - 02:20 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mayo 2016: Se han contratado once Asociaciones de conservación vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal para los tramos Lumbaqui (entrada a la Bonita) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; Río El Palmar - El Higueron; El Higueron - Santa Barbara; Santa Barbara - Cocha Seca; Puente Reventador - Simon Bolivar; Jivino Verde - Yamanunca; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza; Pte. Cuyabeno - Sansahuari; Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	03/06/2016 - 03:01 PM
<p>Abril 2016: Se han contratado seis Asociaciones de conservación vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal para los tramos Lumbaqui (entrada a la Bonita) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; Río El Palmar - El Higueron; Puente Reventador - Simon Bolivar; Jivino Verde - Yamanunca; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza. Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	04/05/2016 - 04:18 PM
<p>Marzo 2016: En espera de la asignación de los recursos económicos para contratación de microempresas de mantenimiento vial, se está trabajando con la maquinaria del MTOP por administración directa y con el personal de la institución; Se han realizado las diligencias del caso para conseguir los recursos y precautelar la inversión realizada en el Puente sobre la quebrada "El Oso".</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	08/04/2016 - 04:19 PM
<p>Febrero 2016: En espera de la asignación de los recursos económicos para contratación de microempresas de mantenimiento vial, se está trabajando con la maquinaria del MTOP por administración directa y con el personal de la institución; Se han realizado las diligencias del caso para conseguir los recursos y precautelar la inversión realizada en el Puente sobre la quebrada "El Oso".</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	08/03/2016 - 11:48 AM
<p>Enero 2016: En el mes de Mayo del 2015, concluyeron los trabajos de las Microempresas; se realizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016; A la espera de la asignación de recursos para continuar el proceso respectivo. Se están realizando mediante contratación directa (ínfima cuantía) arreglos en la vía, en los tramos de Río El Palmar-Santa Bárbara, Mantenimiento del CEBAF San Miguel, rótulos de señalización para trabajos en la vía, adquisición de repuestos y filtros para maquinaria y vehículos. La maquinaria de la Dirección Provincial se encuentra trabajando en el Colegio Pacífico Cembranos, realizando rellenos y colocando alcantarillas.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	13/02/2016 - 01:35 PM
<p>Diciembre 2015: En el mes de Mayo del 2015, concluyeron los trabajos de las Microempresas; se realizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016; A la espera de la asignación de recursos para continuar el proceso respectivo. Se están realizando mediante contratación directa (ínfima cuantía) arreglos en la vía, en los tramos de Río El Palmar-Santa Bárbara, Mantenimiento del CEBAF San Miguel, rótulos de señalización para trabajos en la vía, adquisición de repuestos y filtros para maquinaria y vehículos.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	15/12/2015 - 12:03 PM
<p>Noviembre 2015: En el mes de Mayo del 2015, concluyeron los trabajos de las Microempresas; se realizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016; A la espera de la asignación de recursos para continuar el proceso respectivo. Se están realizando mediante contratación directa (ínfima cuantía) arreglos en la vía, en los tramos de Río El Palmar-Santa Bárbara, Mantenimiento del CEBAF San Miguel, rótulos de señalización para trabajos en la vía, adquisición de repuestos y filtros para maquinaria y vehículos.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/12/2015 - 08:52 AM
<p>Octubre 2015: En el mes de Mayo del 2015, concluyeron los trabajos de las Microempresas; se realizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016; A la espera de la asignación de recursos para continuar el proceso respectivo. Se están realizando mediante contratación directa (ínfima cuantía) arreglos en la vía, en los tramos de Río El Palmar-Santa Bárbara, Mantenimiento del CEBAF San Miguel, rótulos de señalización para trabajos en la vía, adquisición de repuestos y filtros para maquinaria y vehículos.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	30/10/2015 - 09:54 AM
<p>Septiembre 2015: En el mes de Mayo del 2015, concluyeron los trabajos de las Microempresas; se realizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016; A la espera de la asignación de recursos para continuar el proceso respectivo. Se están realizando mediante contratación directa (ínfima cuantía) arreglos en la vía, en los tramos de Río El Palmar-Santa Bárbara, Mantenimiento del CEBAF San Miguel, rótulos de señalización para trabajos en la vía, adquisición de repuestos y filtros para maquinaria y vehículos.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	06/10/2015 - 11:06 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Agosto 2015: Se finalizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016; A la espera de la asignación de recursos para continuar el proceso respectivo.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/09/2015 - 10:12 AM
<p>JULIO 2015: Se finalizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/08/2015 - 10:52 AM
<p>JUNIO 2015: Se finalizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016.</p>	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	03/07/2015 - 02:42 PM
<p>MAYO 2015: Se concluye los trabajos de las Asociaciones de Conservación Vial San Francisco y Unión Amazonas, la Dirección provincial de Sucumbíos se encuentra elaborando los Términos de Referencia para los procesos de contratación 2015-2016.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/06/2015 - 11:31 AM
<p>ABRIL 2015. Las Asociaciones de Conservación Vial, han terminado su contrato, actualmente la Dirección provincial de Sucumbíos se encuentra elaborando los Terminos de Referencia para los procesos de contratación 2015-2016. Sólomente las Asociaciones de Conservación Vial San Francisco y Unión Amazonas realizaron trabajos de Mantenimiento Vial durante el mes de Abril, el MTOP está realizando Mantenimiento: Bacheo y limpieza con los equipos de la Dirección Provincial de Sucumbios.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/05/2015 - 09:19 PM
<p>MARZO 2015. Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Bárbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/04/2015 - 10:51 AM
<p>FEBRERO 2015. Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Bárbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/03/2015 - 04:31 PM
<p>ENERO 2015. Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Bárbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa, se ha realizado el bacheo asfáltico en frío, en la carretera Cuyabeno - Puerto El Carmen.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	04/02/2015 - 11:47 AM
<p>DICIEMBRE 2014. Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Bárbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa, se ha realizado el bacheo asfáltico en frío, en la carretera Cuyabeno - Puerto El Carmen.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/01/2015 - 08:37 AM
<p>NOVIEMBRE 2014. Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Bárbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa, se ha realizado el bacheo asfáltico en frío, en la carretera Cuyabeno - Puerto El Carmen.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/12/2014 - 10:49 AM
<p>ACTUBRE 2014: Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa, se ha realizado el bacheo asfáltico en frío, en la carretera Cuyabeno - Puerto El Carmen.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/11/2014 - 11:52 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014: Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa, se ha realizado el bacheo asfáltico en frío, en la carretera Cuyabeno - Puerto El Carmen.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/10/2014 - 08:56 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2014: Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa, se ha realizado el bacheo asfáltico en frío, en la carretera Cuyabeno - Puerto El Carmen.</p> <p>Se ha solicitado la Certificación para realizar la limpieza de derrumbos en la carretera Lumbaqui - La Bonita, ya que la vía se encuentra prácticamente cerrada, sin que hasta la presente fecha se autorice este pedido.</p> <p>Se ha solicitado la Autorización para la contratación de la Señalización horizontal de la carretera Lumbaqui - Río Palmar, cuyo pedido fue aprobado los ultimos días del mes de Agosto del 2014.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/09/2014 - 08:34 AM
<p>JULIO 2014: Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	21/08/2014 - 03:47 AM
<p>JUNIO 2014: Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 08:59 AM
<p>MAYO 2014: Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/06/2014 - 02:34 PM
<p>ABRIL 2014: Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/05/2014 - 04:06 PM
<p>MARZO 2014: Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/05/2014 - 04:05 PM
<p>MARzo 2014: Se firmó los contratos con las Asociaciones de Conservación Vial, las cuales iniciaron los trabajos.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	15/04/2014 - 11:13 AM
<p>Febrero 2014: Se elaboró las Actas de Recepción correspondiente a los contratos del año 2013 (falta firma de contratistas) , adicionalmente, se realizó la publicación en el portal de Compras Públicas para la contratación 2014.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	14/03/2014 - 12:34 PM
<p>Se elaboró las Actas de Recepción correspondiente a los contratos del año 2013 (falta firma de contratistas) , adicionalmente, se realizó la publicación en el portal de Compras Públicas para la contratación 2014.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/03/2014 - 11:54 AM
<p>Enero 2014 Se está realizando el proceso preparatorio para contratación de Microempresas, tales como: Presupuestos TDR's y Pliegos.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/02/2014 - 11:31 AM
<p>DICIEMBRE 2013 Las Microempresas siguen trabajando en el mantenimiento rutinario emergente de la Red Vial Estatal, su trabajo consiste en la Limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, poda, corte y retiro de árboles, limpieza de causes, ríos o quebradas, de los tramos contratados por cada una de las microempresas.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/02/2014 - 08:23 AM
<p>NOVIEMBRE 2013 Las Microempresas siguen trabajando en el mantenimiento rutinario emergente de la Red Vial Estatal, su trabajo consiste en la Limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, poda, corte y retiro de árboles, limpieza de causes, ríos o quebradas, de los tramos contratados por cada una de las microempresas.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/01/2014 - 08:46 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2013 Las Microempresas siguen trabajando en el mantenimiento rutinario emergente de la Red Vial Estatal, su trabajo consiste en la Limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, poda, corte y retiro de árboles, limpieza de causes, ríos o quebradas, de los tramos contratados por cada una de las microempresas.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/12/2013 - 12:45 AM
<p>SEPTIEMBRE 2013 Las Microempresas siguen trabajando en el mantenimiento rutinario emergente de la Red Vial Estatal, su trabajo consiste en la Limpieza de los tramos contratados por cada una de dichas microempresas.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/11/2013 - 10:19 AM
<p>AGOSTO 2013 Las Microempresas siguen trabajando en el mantenimiento rutinario emergente de la Red Vial Estatal, su trabajo consiste en la Limpieza de los tramos contratados por cada una de dichas microempresas.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/10/2013 - 09:54 AM
<p>JULIO 2013 Las Microempresas siguen trabajando en el mantenimiento rutinario emergente de la Red Vial Estatal, su trabajo consiste en la Limpieza cosntante de los tramos contratados por cada una de dichas microempresas;</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/09/2013 - 12:27 PM
<p>JUNIO 2013 Continúan los trabajos de las microempresas: Roza a mano, Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Poda, corte y retiro de árboles, Limpieza de puentes, Limpieza de cauces de ríos o queb. Conservación de señales verticales Sello de fisures o grietas Limpieza de derrumbes a mano, en las diferentes vías de la Red Estatal Provincial. Se adjunta Informe Ejecutivo mes de Junio de cada Microempresa.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/08/2013 - 02:45 PM
<p>MAYO 2013 Continúan los trabajos de las microempresas: Roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, en las diferentes vías de la Red Estatal Provincial. Se puede revisar los tramos y nombres de de microempresas en el anexo que se encuentra dentro del indicador del proyecto.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/07/2013 - 09:49 AM
<p>ABRIL 2013 Continúan los trabajos de las microempresas: Roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, en las diferentes vías de la Red Estatal Provincial. Se puede revisar los tramos y nombres de de microempresas en el anexo que se encuentra dentro del indicador del proyecto. No se ha realizado pagos de planillas a las microempresas porque existenter errores en los contratos (Asunto)</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/06/2013 - 06:33 PM
<p>MARZO 2013 Se inician los Trabajos de Mantenimiento Vial Rutinario, generado por Microempresas, en los diferentes tramos de la Red Vial Estatal Provincial. No ha sido posible pagar el anticipo a las Microempresas, debido a que aún no presentan las garantías, por lo tanto no existe registro de pago en el presupuesto</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	24/04/2013 - 03:57 PM
<p>FEBRERO 2013 Se solicita Certificación Presupuestaria para reliazar contratacion de Microempresas para que realicen los trabajos de Mantenimiento Vial Rutinario y se procede con el trámite precontractual y contractual.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	31/03/2013 - 02:06 PM
<p>ENERO 2013 No se inician los trabajos de Mantenimiento Vial Rutinario con micro empresas, debido a que aún no realizan la asignación presupuestaria.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	31/03/2013 - 02:04 PM
<p>DICIEMBRE 2012 Trabajo de Mantenimiento Vial Rutinario con micro empresas 100% de avance, bacheo asfáltico mayor en la carretera Cuyabeno - Puerto el Carmen de Putumayo 100% de avance. Con fecha 26 de Diciembre del 2012 se inician los trabajos de señalización en las carreteras: Lago Agrio - Simon Bolivar; Jivino Verde - Shushufindi; Shushufindi - Puerto Itaya y Shuhsufindi - La Primavera.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	31/03/2013 - 02:01 PM
<p>NOVIEMBRE 2012 Trabajo de Mantenimiento Vial Rutinario con micro empresas 97.32% de avance, bacheo asfáltico mayor en la carretera Cuyabeno - Puerto el Carmen de Putumayo 80% de avance.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/01/2013 - 02:15 PM
<p>Octubre 2012 Se está trabajando normalmente en los proyectos que han sido contratados y se encuentran en vigencia, así como también microempresas.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/01/2013 - 02:11 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se está elevando al portal, procesos para la implementación de señalización vertical, horizontal, porticos de señalización insformativa y BTA's a nivel de la provincia de Sucumbios.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2012 Se continúa con el Mantenimiento Vial Preventivo y Rutinario que realizan las microempresas en la Red Vial Estatal Provincial.</p> <p>AGOSTO 2012 Se continúa con la señalización horizontal, vertical e informativa y el Mantenimiento Vial Preventivo y Rutinario que realizan las microempresas en la Red Vial Estatal Provincial.</p> <p>JULIO 2012 Se continúa con la señalización horizontal, vertical e informativa y el Mantenimiento Vial Preventivo y Rutinario que realizan las microempresas en la Red Vial Estatal Provincial.</p> <p>JUNIO 2012 Se continúa con la señalización horizontal, vertical e informativa y el Mantenimiento Vial Rutinario que realizan las microempresas en la Red Vial Estatal Provincial.</p> <p>MAYO 2012 Se contrata señalización horizontal y vertical en el tramo Lumbaqui - La bonita y se continúa realizando el Mantenimiento Vial Rutinario con Microempresas en los diferentes tramos de la Red Vial Estatal Provincial.</p> <p>ABRIL 2012 El devengado del mes de Abril corresponde a 163,545.66, superando el valor programado; debido a que se liquidó un proyecto de arrastre del año 2011 (ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DE SITIO INESTABLE Y ESTUDIOS HIDROLOGICOS - HIDRAULICOS PARA LAS OBRAS DE DEFENSA EN LA RIVERAS DEL RIO CHINGUAL); Además se canceló un Contrato Complementario, reajustes de precios tanto del CC como del CO y anticipo, del mismo proyecto por un valor de 43,881.17 que fue incluido dentro del Mantenimiento Vial. El Ing Marcos Eras se encuentra desde Marzo en el Área de Conservación Vial; desde el próximo mes ya tendrá todos los Reportes Ejecutivos en el SITOP de cada uno de los contratos. Mantenimiento Vial con Microempresas.</p> <p>MARZO 2012 : Mantenimiento Rutinario con Microempresas y por Administración directa en la carretera Lumbaqui - La Bonita</p> <p>FEBRERO 2012 : Mantenimiento Rutinario con Microempresas y por Administración directa en la carretera Lumbaqui - La Bonita</p> <p>ENERO 2012 : Gestion de Recurso Economicos (Mantenimiento Rutinario con Microempresas y por Administración directa en la carretera Lumbaqui - La Bonita)</p> <p>DICIEMBRE 2011 : Sellado de Fisuras superficiales, carretera Jivino Verde - Shushufindi</p> <p>NOVIEMBRE 2011 : Sellado de Fisuras superficiales, carretera Jivino Verde - Shushufindi</p> <p>OCTUBRE 2011 : Sellado de Fisuras superficiales, carretera Jivino Verde - Shushufindi</p> <p>SEPTIEMBRE 2011 : Bacheo Asfáltico mayor carretera Jivino Verde - Shushufindi</p> <p>AGOSTO 2011: Bacheo Asfáltico mayor carretera Nueva Loja - "Y" del Eno</p> <p>JULIO 2011: Sellado de Fisuras superficiales, carretera Nueva Loja - "Y" del Eno</p> <p>JUNIO 2011: Sellado de Fisuras superficiales, carretera Nueva Loja - "Y" del Eno</p> <p>MAYO 2011: Bacheo Asfáltico mayor carretera Nueva Loja - Puente San Miguel</p> <p>ABRIL 2011: Sellado de Fisuras superficiales, carretera Nueva Loja - Puente San Miguel</p> <p>MARZO 2011: Sellado de Fisuras superficiales, carretera Nueva Loja - Puente San Miguel</p> <p>FEBRERO 2011: El mantenimiento rutinario de la Red Vial estatal está dado a través de las Microempresas o mediante la Administración directa por contratos de construcción y/o conservación vial ; lo que mantiene un nivel de servicio óptimo en las carreteras de la Provincia.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>07/11/2012 - 11:52 AM</p>

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de recursos economicos	04/04/2019	Cristhian Manuel López Mendoza	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
3- REGIONAL. * General. No reponer el equipo caminero dañado CAUSARÍA que no se atiende toda la demanda de conservación vial.	04/04/2019	Cristhian Manuel López Mendoza	10 %	10	1	0/1
3- REGIONAL. * General. La falta oportuna de asignación de recursos para el proyecto CAUSARÍA retraso en los plazos de ejecución.	04/04/2019	Cristhian Manuel López Mendoza	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Inicio proyecto de mantenimiento,	1-Solicitud de Información	16/02/2011		16/02/2011		Sí	1.0
2	EJECUCIÓN: Roza a mano en la carretera Lumbaqui - La Bonita, trabajo realizado.	1-Solicitud de Información	20/05/2011		20/05/2011		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Mantenimiento Vial Rutinario en la carretera Simón Bolívar - Reventador, trabajo realizado.	1-Solicitud de Información	30/06/2011		30/06/2011		Sí	1.0
4	DEFINICIÓN: Dictamen Senplades, obtenido.	1-Solicitud de Información	31/01/2012		31/01/2012		Sí	1.0
5	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.	1-Solicitud de Información	05/02/2012		05/02/2012		Sí	1.0
6	PLANEACIÓN: Publicación en el portal de Compras Publicas, realizado.	1-Solicitud de Información	10/02/2012		10/02/2012		Sí	1.0
7	PLANEACIÓN: Resolución de Adjudicació, realizada.	1-Solicitud de Información	15/02/2012		10/02/2012		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Suscripción de Contratos, firmado.	1-Solicitud de Información	28/02/2012		28/02/2012		Sí	1.0
9	CIERRE: Acta de Recepción, firmada.	9-Entregables Formales	31/12/2012		31/12/2012		Sí	1.0
10	DEFINICIÓN: Dictamen Senplades, obtenido.	1-Solicitud de Información	15/01/2013		15/01/2013		Sí	1.0
11	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.	1-Solicitud de Información	15/02/2013		15/02/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	PLANEACIÓN: Publicación en el portal de Compras Publicas, realizado.	2-Publicación de Pliegos	20/02/2013		20/02/2013		Sí	1.0
13	PLANEACIÓN: Resolución de Adjudicación, realizada.	3-Adjudicación	01/03/2013		01/03/2013		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Suscripción de Contratos, Firmado.	3-Adjudicación	05/03/2013		05/03/2013		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Limpieza desbroce y reposición de calzada, carretera Lumbaqui - La Bonita, terminado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2013		30/03/2013		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Alquiler de maquinaria para emergencia vial, realizado.	1-Solicitud de Información	30/05/2013		30/05/2013		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbos en la carretera Lumbaqui La Bonita, realizado.	9-Entregables Formales	30/05/2013		30/05/2013		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Bacheo asfáltico mayor en la carretera Lumbaqui - La Bonita, realizado. .	1-Solicitud de Información	01/06/2013		01/06/2013		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Mantenimiento Preventivo en la Carretera Jivino Verde Shushufindi, realizado.	5-Entregables Intermedios	01/07/2013		01/07/2013		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario y emergente de la carretera Nueva Loja - Chiritza, realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	1.0
21	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.	1-Solicitud de Información	28/01/2014		28/01/2014		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Bacheo asfáltico en el sector Jivino Verde - Shuhufindi - La Victoria - "Y" de Yamanunca, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/01/2014		30/10/2014		Sí	1.0
23	CIERRE: Liquidacion economica de contratos, realizado.	1-Solicitud de Información	05/02/2014		05/02/2014		Sí	1.0
24	PLANEACIÓN: Publicación en el portal de Compras Publicas, realizado.	2-Publicación de Pliegos	14/02/2014		14/02/2014		Sí	1.0
25	CIERRE: Acta Entrega Recepción definitiva, firmado.	1-Solicitud de Información	15/02/2014		15/02/2014		Sí	1.0
26	PLANEACIÓN: Resolución de Adjudicación, realizado.	3-Adjudicación	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Suscripción de contratos, realizado.	4-Inicio de Trabajo	01/03/2014		01/03/2014		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Limpieza y desbroce en la vía Lumbaqui - La Bonita, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		30/03/2014		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Limpieza y Desbroce en la vía "Y" de Tipishca - Palma Roja, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		30/03/2014		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Limpieza y Desbroce en la vía Puente Chiritza - Cuyabeno.	5-Entregables Intermedios	15/04/2014		15/04/2014		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbos en la carretera	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Lumbaqui - La Bonita, realizado.							
32	EJECUCIÓN: Mantenimiento Preventivo en la Carretera Jivino Verde Shuhsufindi, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		10/11/2014		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Limpieza y desbroce en la vía "Y" del Coca Km 7-Puente Chiritza, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2014		30/07/2014		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Bacheo asfáltico en el sector Cuyabeno - Palma Roja, Puerto El Carmen , realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN: Rosa a mano en la Carretera Lumbaqui - La Bonita, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
36	EJECUCIÓN: Señalización de la carretera Lumbaqui - el Palmar, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	1.0
37	CIERRE: Liquidación Económica, realizado.	9-Entregables Formales	30/03/2015		30/03/2015		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical de la carretera shushufindi - aguarico 3, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2015	29/12/2017			No	1.0
39	CIERRE: Firma de Acta Entrega Recepción, realizado.	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	1.0
40	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.	1-Solicitud de Información	05/02/2016		31/03/2016		Sí	1.0
41	PLANEACIÓN: Publicación en el portal de Compras Publicas, realizado.	2-Publicación de Pliegos	08/02/2016		31/03/2016		Sí	1.0
42	PLANEACIÓN: Resolución de Adjudicación, realizada.	3-Adjudicación	22/02/2016		31/03/2016		Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Suscripción de Contratos, firmado.	4-Inicio de Trabajo	08/03/2016		01/04/2016		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN: Construcción de muro de protección en el puente El Oso, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		29/12/2016		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y desalojo en la carretera Lumbaquí -La Bonita, tramo: Río Palmar - Río Chingual, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	1.0
46	EJECUCIÓN: Adquisición de materiales para asfalto al frio, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	1.0
47	EJECUCIÓN: Mantenimiento de la carretera Lumbaquí - Julio Andrade, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		29/12/2016		Sí	1.0
48	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario de limpieza CEBAF SAN MIGUEL, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2016		29/12/2016		Sí	1.0
49	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: "Y" de Tarapoa - Puente Chiritza, realizado	9-Entregables Formales	29/12/2016		29/12/2016		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
50	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: El Higerón - Puente Biprovincial, realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2016		29/12/2016		Sí	1.0
51	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Jambelí - Puente Puchochoa, realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2016		29/12/2016		Sí	1.0
52	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Jivino Verde - Shushufindi - Yamanunca, realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2016		29/12/2016		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Lumbaquí - Puente Chingual, realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2016		29/12/2016		Sí	2.0
54	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Nueva Loja - Jambelí, realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2016		29/12/2016		Sí	2.0
55	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Puente El Palmar - El Higerón, realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2016		29/12/2016		Sí	2.0
56	EJECUCIÓN: Mantenimiento, Instalación y reparaciones del CEBAF SAN MIGUEL (Infraestructura), ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2016		29/12/2016		Sí	2.0
57	CIERRE: Acta de Recepción, firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2016		30/12/2016		Sí	1.0
58	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.	1-Solicitud de Información	02/05/2017		29/05/2017		Sí	2.0
59	PLANEACIÓN: Publicación en el portal de Compras Públicas, realizado.	2-Publicación de Pliegos	10/05/2017		29/05/2017		Sí	2.0
60	PLANEACIÓN: Resolución de Adjudicación, realizada.	3-Adjudicación	15/05/2017		29/05/2017		Sí	2.0
61	EJECUCIÓN: Suscripción de Contratos, firmado	4-Inicio de Trabajo	25/05/2017		29/05/2017		Sí	2.0
62	EJECUCIÓN: Bacheo Asfáltico Mayor, tramo: Simón Bolívar - Nueva Loja, realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/07/2017		Sí	1.0
63	EJECUCIÓN: Bacheo Asfáltico Mayor, tramo: Lumbaquí - Cocha Seca, realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017	29/12/2017			No	1.0
64	EJECUCIÓN: Bacheo Asfáltico Mayor, tramo: Nueva Loja - Puerto El Carmen del Putumayo, realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/07/2017		Sí	1.0
65	EJECUCIÓN: Bacheo Asfáltico Mayor, tramo: Shushufindi - Aguarico 3, realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017	29/12/2017			No	1.0
66	EJECUCIÓN: Bacheo Asfáltico Mayor, tramo: Shushufindi - Puerto Itaya, realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017	29/12/2017			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
67	EJECUCIÓN: Bacheo Asfáltico Mayor, tramo: Jivino Verde - Shushufindi, realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/07/2017		Sí	1.0
68	EJECUCIÓN: Construcción de muros de sostenimiento en la Red Vial Estatal de la Provincia, realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/12/2017		Sí	1.0
69	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y desalojo en la carretera Lumbaqui -La Bonita, tramo: Lumbaqui - Río Palmar - Santa Bárbara, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/05/2017		Sí	2.0
70	EJECUCIÓN: Mantenimiento de la carretera Lumbaqui - Julio Andrade, realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/05/2017		Sí	2.0
71	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario de limpieza CEBAF SAN MIGUEL, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/05/2017		Sí	1.0
72	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Lumbaqui - Cocha Seca, realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/05/2017		Sí	2.0
73	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Nueva Loja - Puerto El Carmen del Putumayo, realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/05/2017		Sí	2.0
74	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Shushufindi - Aguarico 3, realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/05/2017		Sí	1.0
75	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Shushufindi - Puerto Itaya, realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/05/2017		Sí	1.0
76	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Simón Bolívar - Nueva Loja, realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/05/2017		Sí	1.0
77	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Jivino Verde - Shushufindi, realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		29/05/2017		Sí	1.0
78	EJECUCIÓN: Señalización Horizontal y vertical, Red Vial Estatal de la Provincia, realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2017	31/07/2018			No	1.0
79	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.	1-Solicitud de Información	01/02/2018		01/02/2018		Sí	1.0
80	EJECUCIÓN: Adquisición de material de construcción para trabajos de mantenimiento en la red vial estatal Provincial, realizado.	5-Entregables Intermedios	17/09/2018	17/09/2018			No	1.0
81	EJECUCIÓN: Limpieza y desbroce en la vía Lumbaqui - La Bonita, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2018	31/10/2018			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
82	CIERRE: Acta Entrega Recepción definitiva, firmado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018	31/12/2018			No	1.0
83	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.2019	1-Solicitud de Información	15/01/2019		15/01/2019		Sí	1.0
84	EJECUCIÓN:Contratación de microempresas	5-Entregables Intermedios	01/05/2019	01/05/2019			No	1.0
85	EJECUCIÓN: Adquisición de material de construcción para trabajos de mantenimiento en la red vial estatal Provincial, realizado.	5-Entregables Intermedios	02/05/2019	02/05/2019			No	1.0
86	EJECUCIÓN: Limpieza y desbroce en la via Lumbaqui - La Bonita, realizado.	5-Entregables Intermedios	20/12/2019	20/12/2019			No	2.0
87	CIERRE: Acta Entrega Recepción definitiva, firmado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	27/12/2019	27/12/2019			No	1.0


SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	16/09/2016
2	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	24/07/2017
3	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	16/06/2017
4	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	22/05/2017
5	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	21/04/2017
6	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	21/03/2017
7	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	20/02/2017
8	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	27/12/2016
9	Proyecto: K007M TOP MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/11/2016
10	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	16/09/2016
11	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	16/09/2016
12	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	11/05/2016
13	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	13/04/2016
14	GESTION DE RECURSOS	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	17/11/2015
15	PROYECTO: K007 M TOP - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS OCTUBRE DEL 2015.	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	20/10/2015
16	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	29/07/2015
17	NO SE ESTA EJECUTANDO	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	29/05/2015
18	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/04/2015
19	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	31/03/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
20	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENE EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	28/02/2015
21	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	28/01/2015
22	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	11/12/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Cumplimiento de activiades programadas en Mantenimiento Vial		100.00 %	40	40	01/01/2015	Abr-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	26,483,941.54 **
Costo Total:	26,772,647.20
Total Devengado:	23,686,409.29
% Costo Total Devengado:	88.47 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 88.47 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	27,707,187.14	14,749,014.15	0.00	42,456,201.29
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	27,889,960.57	4,743,380.31	0.00	32,633,340.88
Ppto. Codificado	28,360,759.20	4,743,380.31	0.00	33,104,139.51
Ppto. Comprometido	24,233,188.26	6,708.52	0.00	24,239,896.78
Planeado - Codificado (2019)		10,005,633.84		
Programado a Devengar	26,857,605.05	6,401,737.07	0.00	33,259,342.12
Ppto. Devengado	20,082,204.47	3,604,204.82	0.00	23,686,409.29
Pagado Real	12,274,813.30	6,708.52	0.00	12,281,521.82
Estimado a fin de año	* 20,082,204.47	0.00	0.00	20,082,204.47
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	6,775,400.58	6,401,737.07	0.00	13,177,137.65
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 74.77 %	56.30 %	0.00 %	71.22 %
Ppto. Codificado 998	512,873.60	0.00	0.00	512,873.60
Ppto. Devengado 998	512,873.60	0.00	0.00	512,873.60

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

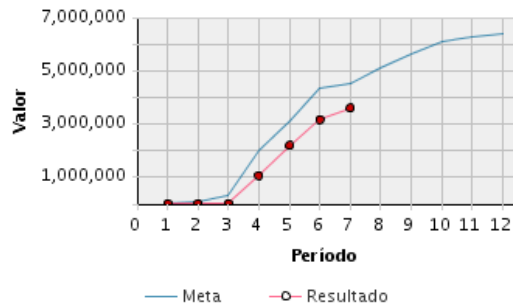

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	8,757.79	6,708.52	8,757.79	6,708.52	76.60 %		0.10 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	72,165.79	6,983.90	80,923.58	13,692.42	16.92 %		0.21 %
Mar	219,201.09	6,983.90	300,124.67	20,676.32	6.89 %		0.32 %
Abr	1,700,505.06	1,056,495.95	2,000,629.73	1,077,172.27	53.84 %		16.83 %
May	1,111,751.43	1,111,984.73	3,112,381.16	2,189,157.00	70.34 %		34.20 %
Jun	1,224,068.57	988,447.24	4,336,449.73	3,177,604.24	73.28 %		49.64 %
Jul	194,645.40	426,600.58	4,531,095.13	3,604,204.82	79.54 %		56.30 %
Ago	546,134.72		5,077,229.85				
Sep	561,870.14		5,639,099.99				
Oct	484,846.94		6,123,946.93				
Nov	138,894.91		6,262,841.84				
Dic	138,895.23		6,401,737.07				
Total	6,401,737.07	3,604,204.82					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
18	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
19	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
20	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.0031 DEVENGADO MES DE JULIO	DEVENGADO_20190-07.pdf	01/08/2019
2	A.0032 DEVENGADO MES DE JUNIO	DEVENGADO_2019-06.pdf	26/07/2019
3	A.0033 DEVENGADO MES DE MAYO	DEVENGADO_2019-05.pdf	26/07/2019
4	A.0034 DEVENGADO MES DE ABRIL	DEVENGADO_2019-04.pdf	26/07/2019
5	A.0035 DEVENGADO MES DE MARZO	DEVENGADO__2019-03.pdf	26/07/2019
6	A.0036 DEVENGADO MES DE FEBRERO	DEVENGADO__2019-02.pdf	26/07/2019
7	A.0037 ACTUALIZACION DE PROYECTOS	Actualización_de_información_de_proyectos.pdf	05/07/2019
8	A.0038 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	Solicitud_de_contratación_de_personal.pdf	05/07/2019
9	A.0039 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA	Informe_de_necesidad_de_maquinaria.pdf	05/07/2019
10	A.0040 CONTRATACIÓN DE MICROEMPESAS	k007.pdf	05/07/2019
11	A.0041 CONTRATACIÓN DE MICROEMPESAS	micro_empresa_2017_Diciembre.pdf	05/01/2018
12	A.0042 CONTRATACIÓN DE MICROEMPESAS	CONTRATACION_DE_MICROEMPRESAS.JPG	02/11/2017
13	A.0043 RESOLUCION PARA LA CONTRATACIÓN DE MICROEMPESAS	resolución_de_inicio.htm	05/09/2017
14	A.044 CONTRATO DE BACHEO ASFALTICO MAYOR CARRETERA NUEVA LOJA - CASCALES.	CONTRATO_2_CONSTRUCRUZVAL.pdf	27/06/2017
15	A.045 CONTRATO BACHEO ASFALTICO MAYOR CUYABENO - PUERTO EL CARMEN	CONTRATO_CONSTRUCRUZVAL.pdf	27/06/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	A.046 CONTRATO BACHEO ASFALTICO MAYOR - JIVINO VERDE - SHUSHUFINDI	ING._FIERRO_(JIVINO)_CONTRATO_1.pdf	27/06/2017
17	A.047 CONTRATO DE BACHEO ASFALTICO MAYOR NUEVA LOJA - CASCALES	SERVIVALENTIN_NUEVA_LOJA_CASCALES_CONTRATO_27/06/2017	27/06/2017
18	A.048 CONTRATO BACHEO ASFALTICO MAYOR SIMON BOLIVAR - CASCALES	ING._FIERRO_(SIMON_BOLIVAR_CASCALES)_contrao_2.pdf	27/06/2017
19	A.049 RESOLUCION PARA CONTRATACION DE MICROEMPRESAS ABRIL 2017	RESOLUCION_MICROEMPRESAS_ABRIL_2017.pdf	09/05/2017
20	A.050 MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DIRECTA MARZO 2017	MANTENIMIENTO_PROVINCIA_DE_SUCUMBIOS.pdf	28/03/2017
21	A.1 El Puente sobre el río El Oso está por colapsar	DSC04868.JPG	30/10/2015
22	A.2 Es necesario realizar un bacheo integral en la Provincia	baches_4.JPG	30/10/2015
23	A1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE FEBERO 2014	A1_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA_MES_DE_FEBRERO_2014.pdf	12/03/2014
24	A2 SOPORTE HITO 24 (FEBRERO 2014)	A2_SOPORTE_HITO_24.pdf	14/03/2014
25	A3 SOPORTE HITO 23 (FEBRERO DEL 2014)	A3_SOPORTE_HITO_23.pdf	14/03/2014
26	A4 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TRABAJOS 2013, ASOCIADO CON HOTO 23 (FEBRERO 2014)	A4_ACTA_ENTREGA_RECEPCIÓN_TRABAJOS_2013_ASOCIADO_CON_HITO_23_(FEBRERO_2014).pdf	04/03/2014
27	A5 EJECUCION PRESUPUESTARIA MARZO	A5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_MARZO.pdf	15/04/2014
28	A6 CONTRATO MICROEMPRESA (SOPORTE DE HITO N°25)	A6_CONTRATO_MICROEMPRESA_(SOPORTE_DE_HITO_N°25).pdf	15/04/2014
29	A7 informe trabajo Junio 2014	A7_informe_trabajo.docx	03/07/2014
30	A8 planilla 3	A8_planilla_3.docx	03/07/2014
31	A9 JUSTIFICACIÓN PROBLEMA CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA (ASOCIADO CON HITO N°30)	A9__JUSTIFICACION_PROBLEMA.pdf	03/07/2014
32	B1 INFORMES MICROEMPRESAS SUCUMBIOS_-03-2014	B1_INFORMES_MICROEMPRESAS_SUCUMBIOS_-03-2014.xls	01/08/2014
33	B2 INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE JULIO	B2_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_JULIO.pdf	21/08/2014
34	B3 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2014	B3_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AGOSTO_2014.pdf	10/09/2014
35	B4 EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2014	B4_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2014.pdf	10/09/2014
36	B5 INFORME EJECUTIVO SITOP OCT 2014	B5_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_OCT_2014.pdf	10/11/2014
37	B6 INFORME EJECUTIVO SITOP NOV2014	B6_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_NOV2014.pdf	10/12/2014
38	B7 INFORME EJECUTIVO SITOP MANT VIAL DIC	B7_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MANT_VIAL_DIC.pdf	23/01/2015
39	B8 INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO 2015	B8_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ENERO_2015.pdf	10/02/2015
40	B9 FOTOGRAFIA DE TRABAJOS REALIZADOS MES DE FEBRERO DEL 2015	B9_FOTOGRAFIA_DE_TRABAJOS_REALIZADOS_MES_DE_FEBRERO_DEL_2015.jpg	17/03/2015
41	C1 INFORME EJECUTIVO MES DE FEBRERO 2015	C1_INFORME_EJECUTIVO_MES.pdf	12/03/2015
42	C2 INFORME EEEJUTIVO SITOP ABRIL 2015	C2_INFORME_EEJUTIVO_SITOP_ABRIL_2015.pdf	11/05/2015
43	C3 ACTIVIDADES CONTRATADAS OCT-DIC 2015	mantenimiento_vial_oct-dic.pdf	04/01/2016
44	C4 INFOME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2016 - INCIO DE TRABAJOS DE MICROEMPRESAS 2016 CATALOGADAS EN EL SERCOP	ABRIL_2016_-_SERCOP_-_ORDEN_DE_COMPRA_CONTRATACIÓN_DE_MANTENIMIENTO_VIAL_RUTINARIO.pdf	05/05/2016
45	C5 INFOME EJECUTIVO SITOP MAYO 2016 - MICROEMPRESAS 2016 CATALOGADAS EN EL SERCOP	INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_MAYO_2016.pdf	06/06/2016
46	C6 INFOME EJECUTIVO JUNIO 2016 - MICROEMPRESAS 2016 CATALOGADAS EN EL SERCOP	OC_Aso_Sin_Fronteras_Junio_2016.PDF	27/06/2016
47	C7 DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA TRAMO VIA LUMBAQUI-LABONITA-JULIO ANDRADE	ACUERDO_MINISTERIAL_No__0025.pdf	29/07/2016
48	C8 REPORTE MICROEMPRESAS DE CONSERVACION VIAL SEP-OCT 2016	C8_REPORTE_MICROEMPRESAS_DE_CONSERVACION_VIAL_SEP_OCT_2016.pdf	01/11/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
49	C9 LISTADO DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACION VIAL NOVIEMBRE 2016	MICROEMPRESAS_-_Noviembre_2016.xls	07/12/2016
50	Contrato microempresa Nuevo Horizonte	Contrato_microempresa_Nuevo_Horizonte.pdf	30/09/2015
51	Contrato microempresa Nuevo Oriente	Contrato_microempresa_Nuevo_Oriente.pdf	30/09/2015
52	Contrato microempresa Santa Barbara	Contrato_microempresa_Santa_Barbara.pdf	30/09/2015
53	CONTRATOS MICROEMPRESAS Y MANTENIMIENTO VIAL SUCUMBOS	CONTRATOS_MANTE_VIAL_SUCU.xls	24/04/2012
54	D1 LISTADO DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACION VIAL DICIEMBRE 2016	Asociaciones_de_conservacion_vial_contratadas.pdf	05/01/2017
55	DEVENGADO A AGOSTO 2012	Ejecucion_Agosto_2012.pdf	05/09/2012
56	DEVENGADO JULIO	Julio_-_2012_DEVENGADO.xls	13/08/2012
57	DEVENGADO MES DE MAYO	DEVENGAD_MAYO_2.pdf	08/06/2012
58	DEVENGADO MES DE MAYO 2013	REPORTE_MES_DE_MAYO_devengado.pdf	07/06/2013
59	DEVENGADO MES DE NOVIEMBRE	REPORTE_MES_DE_NOV_2013[1].pdf	10/12/2013
60	Ejecución Junio 2012	Ejecucion_Junio_2012.pdf	09/07/2012
61	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2013	Reporte_de_Ejecucion_mes_de_Junio_2013[1].pdf	05/07/2013
62	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO 2013	Reporte_Ejecucion_Agosto_2013[1].pdf	06/09/2013
63	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE 2014	Reporte_Ejecucion_Dic2013.pdf	08/01/2014
64	Ejecución Presupuestaria Septiembre	Ejecucion_Septiembre_del_2012(1).pdf	05/10/2012
65	FOTOGRAFIA DE PROYECTO AL 23 DE AGOSTO 2013	Reporte_Ejecucion_Agosto_2013[1].pdf	06/09/2013
66	FOTOGRAFIA DE TRABAJOS REALIZADOS MES DE FEBRERO	Foto0173.jpg	11/03/2015
67	FOTOGRAFIA DEL MANTENIMIENTO VIAL SUCUMBOS	MANTENIMIENTO_VIAL_SUCUMBOS.pdf	24/04/2012
68	G INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_NOVIEMBRE_2017.pdf	06/12/2017
69	INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2013 SANTA BARBARA	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_JUNIO_2013_SANTA_BARBARA.pdf	10/05/2012
70	INFORME EJECUTIVO ABRIL MICROEMPRESA LA BONITA	la_bnita.pdf	10/05/2012
71	INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESA FLOR DEL VALE	flor_del_valle.pdf	10/05/2012
72	INFORME EJECUTIVO SITO JULIO 2013	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JULIO_2012.pdf	13/11/2013
73	INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE AGOSTO 2013, MICROEMPRESA FLOR DEL VALLE	informe_ejecutivo_mantenim_vial_mes_de_Agosto_2013.pdf	06/09/2013
74	INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE DICIEMBRE 2013	informe_ejecutivo_sitop_microempresa_rio_chingual_dic_2013.pdf	08/01/2014
75	INFORME EJECUTIVO SITOP NOV 2013	informe_ejecutivo_sitop_nov_mant_vial.pdf	09/12/2013
76	INFORME MICROEMPRESAS DIC	INFORMES_MICROEMPRESAS_SUCUMBOS_-12-_2012.xls	08/01/2013
77	INFORME MICROEMPRESAS NOV	INFORMES_MICROEMPRESAS_SUCUMBOS_-11-_2012.xls	08/01/2013
78	informe ejecutivo sitop oct 2013	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_oct_2012.pdf	14/11/2013
79	MICROEMPRESAS CONTRATADAS	INFORMES_MICROEMPRESAS_SUCUMBOS_-03-_2013.xls	06/05/2013
80	PLANILLA DE AVANCES MICROEMPRESA JULIO	PLANILLA_MICROEMPRESA_JULIO.pdf	13/08/2012
81	PLANILLA JUNIO 2012	señalizacion_junio_2012.pdf	09/07/2012
82	PLANILLA LA BONITA A JUNIO 2012	planilla_la_bonita_a_junio.pdf	09/07/2012
83	PLANILLA MICROEMPRESA SAN FRANCISCO A JUNIO 2012	san_francisco_junio_2012.pdf	09/07/2012

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
84	PLANILLA MICROEMPRESA SANTA BARBARA A MAYO 2012	planilla_santa_barbara_0512.pdf	08/06/2012
85	PLANILLA SANTA BARBARA A JULIO	PLANILLA_SANTA_BARBARA_JULIO.pdf	13/08/2012

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Benavides Morillo, Omar Alexander	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Zonal 1	obenavides@mtop.gob.ec	023974600
Noroña, Víctor	Supervisor Financiero	Analista	vnorona@mtop.gob.ec	Ext. 13706
Vinces Navarrete, Julio Cesar	Lider del Proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Sucumbios	jcvinces@mtop.gob.ec	062991930 Ext 13701
Vinces Navarrete, Julio Cesar	Director Distrital de Sucumbios	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Sucumbios	jcvinces@mtop.gob.ec	062991930 Ext 13701

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
3941_1.jpg	03/05/2017
