

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 3**

**Dirección Provincial Tungurahua**

**PROYECTO: K017 MTOP - Mantenimiento Vial De La Provincia De Tungurahua**

Líder del Proyecto:	Rodríguez Martínez, Edison Fabian (erodriguez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gamboa López, Enma Katherine	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, Provincia - Tungurahua, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	González Chávez, Alexandra del Rocío	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3799	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,611,448.32
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	13/11/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/10/2019

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Producto/Servicio: Servicio de Mantenimiento de infraestructura vial de la provincia de Tungurahua con la participación de microempresas y por administración directa.

Línea base: La Provincia de Tungurahua cuenta con 242,73 KM de red vial estatal de los cuales 188,73 KM reciben mantenimiento vial mediante microempresas y por administración directa y la diferencia a través de concesión vial.

**Objetivo General:**

Mantener la infraestructura vial de la provincia que pertenece a la red vial estatal en buenas condiciones de movilidad durante todo el año e implementar un proceso de movilidad continua, cubriendo requerimientos de infraestructura adecuada de primer nivel, y garantizando el desarrollo socioeconómico de la población.

**Objetivos Específicos:**

- .Mantener en estado óptimo la infraestructura de la Red Vial, que corresponde a la Dirección Provincial Tungurahua.
- .Garantizar vías en buenas condiciones de circulación vehicular, permitiendo seguridad en sus beneficiarios
- .Disminuir tiempos de viaje y reducir costos de operación de transporte.

**Beneficios Cualitativos**

- El tiempo de desplazamiento se reducirá.
- El comercio va a mejorar en la provincia.
- Se va a contar con mayor seguridad vial en las carreteras.
- Se contribuye con la interconexión provincial y nacional.

**Tipo de Beneficiario**

Beneficiarios Directos :  
 Mujeres 259.800  
 Hombres 244.783

**Restricciones**

Tiempo: El proyecto se planifica ejecutar hasta 2021  
 Costo: 19.019.715,59  
 Calidad: 242,73 Km de vía con mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, desbroce de maleza, señalética vertical y horizontal, bacheo y atención de derrumbes y deslizamientos  
 Recursos: Hasta 2018 recursos con financiamiento de fuente fiscal, 2019 recursos con financiamiento con crédito externo


**Restricciones**

Riesgos: La caída de ceniza volcán Tungurahua causa un mantenimiento permanente de calzada y cunetas, condiciones climáticas  
 Alcance: Provincia Tungurahua 242,73 KM que corresponde a la red vial estatal

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 79.17 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

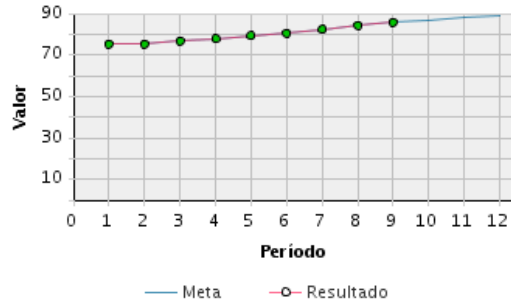

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	75 %	75 %	77 %	78 %	79 %	80 %	82 %	84 %	86 %	87 %	88 %	89 %
	Avance real acumulado											
	75 %	75 %	77 %	78 %	79 %	80 %	82 %	84 %	86 %			
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<b>OCTUBRE 2019</b> 1. El mantenimiento se lo realiza con el personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA con completa normalidad.	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/11/2019 - 09:38 PM
<b>SEPTIEMBRE 2019</b> 1. El mantenimiento se lo realiza con el personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA con completa normalidad.	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	03/10/2019 - 11:03 AM
<b>AGOSTO 2019</b> 1. El mantenimiento se lo realiza con el personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA con completa normalidad.	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/09/2019 - 11:04 AM
<b>JULIO 2019</b> 1. El mantenimiento se lo realiza con el personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA con completa normalidad.	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	01/08/2019 - 04:18 PM
<b>JUNIO 2019</b> 1. El mantenimiento se lo realiza con el personal ,maquinaria del MTOP y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantemimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA.	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	03/07/2019 - 10:36 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo realiza con el personal del MTOP. y las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/06/2019 - 11:23 AM
<p>ABRIL 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo realiza con el personal del MTOP. y Se contrato las microempresas de conservación vial, las cuales desde el 01 de Abril realizan el mantenimiento rutinario de la RVE de TUNGURAHUA.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	02/05/2019 - 03:49 PM
<p>MARZO 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo realizó con el personal del MTOP.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	01/04/2019 - 08:43 AM
<p>FEBRERO 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo esta realizando con el personal del MTOP. 2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2019</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	01/03/2019 - 12:23 PM
<p>ENERO 2019</p> <p>1. El mantenimiento se lo esta realizando con el personal del MTOP. 2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2019</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	05/02/2019 - 02:11 PM
<p>DICIEMBRE 2018</p> <p>Se cuenta con 9 Microempresas, ejecutando trabajos de mantenimiento en toda la RVE de la Dirección Distrital de Tungurahua con actividades tales como limpieza de cunetas, alcantarillas, señalética vertical, roce a mano, bacheos menores.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	04/01/2019 - 04:18 PM
<p>OCTUBRE 2018:</p> <p>1. Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. 2. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas en trámite de pago del 8vo mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/12/2018 - 03:58 PM
<p>OCTUBRE 2018:</p> <p>1. Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. 2. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el SEPTIMO mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/11/2018 - 04:45 PM
<p>SEPTIEMBRE 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el SEXTO mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/10/2018 - 07:42 PM
<p>AGOSTO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT.  Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el quinto mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/09/2018 - 06:48 PM
<p>JUNIO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el cuarto mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	Galarza García, Diego Fernando	02/08/2018 - 10:00 PM
<p>JUNIO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el segundo mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/07/2018 - 05:52 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Asociaciones de Conservación Vial, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/06/2018 - 11:34 AM
<p>ABRIL 2018:</p> <p>1. Se realizó la contratación de microempresas para atender la RVE de Tungurahua en los tramos correspondientes.</p> <p>2. Los trabajos de las asociaciones de Conservación Vial, iniciaron el 2 de abril del 2018.</p>	Galarza García, Diego Fernando	04/05/2018 - 05:19 PM
<p>FEBRERO 2018:</p> <p>1. Se realizó la contratación de microempresas para atender la RVE de Tungurahua en los tramos correspondientes.</p> <p>2. Lo strabajos iniciaron el 2 de abril del 2018</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/04/2018 - 12:38 PM
<p>FEBRERO 2018:</p> <p>1. El manteneimeto selo esta realizando con lepersonal del MTOP.</p> <p>2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/03/2018 - 07:23 PM
<p>ENERO 2018:</p> <p>1. El manteneimeto selo esta realizando con lepersonal del MTOP.</p> <p>2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/03/2018 - 07:22 PM
<p>ENERO 2018:</p> <p>1. El manteneimeto selo esta realizando con lepersonal del MTOP.</p> <p>2. Se estáen espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018</p>	Galarza García, Diego Fernando	28/02/2018 - 05:54 PM
<p>DICIEMBRE 2017:</p> <p>Las microempresas contratadas trabajaron en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), hasta el 29 de Diciembre del 2017.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/01/2018 - 05:09 PM
<p>NOVIEMBRE 2017:</p> <p>Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza),.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/12/2017 - 04:31 PM
<p>OCTUBRE 2017:</p> <p>Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a traves del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p>	Galarza García, Diego Fernando	01/11/2017 - 01:31 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <p>Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a traves del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	05/10/2017 - 06:40 PM
<p>AGOSTO 2017:</p> <p>Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a traves del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	05/09/2017 - 05:23 PM
<p>JULIO 2017:</p> <p>Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a traves del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	04/08/2017 - 07:54 PM
<p>JUNIO 2017:</p> <p>Se realizo el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/07/2017 - 04:38 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017, y actualmente se encuentran trabajando en la red estatal.		
MAYO 2017: Se realizó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017, y actualmente se encuentran trabajando en la red estatal.	Gamboa López, Enma Katherine	05/06/2017 - 04:09 PM
ABRIL 2017: Se realizó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017	Gamboa López, Enma Katherine	05/05/2017 - 10:02 AM
MARZO 2017: Se comenzó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017.	Gamboa López, Enma Katherine	05/04/2017 - 06:50 PM
FEBRERO 2017: No se han contratado Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que se contrataran por catálogo electrónico del portal de compras públicas, una vez que se cuente con el aval del ministerio de finanzas.	Gamboa López, Enma Katherine	05/03/2017 - 10:18 AM
ENERO 2017: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catálogo electrónico por el portal de compras públicas, y concluyeron sus trabajos el 15 de Enero del 2017, actualmente en recepción de los trabajos	Gamboa López, Enma Katherine	06/02/2017 - 10:16 AM
DICIEMBRE 2016: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catálogo electrónico por el portal de compras públicas, y concluyen sus trabajos el 15 de Enero del 2017.	Gamboa López, Enma Katherine	04/01/2017 - 06:28 PM
NOVIEMBRE 2016: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catálogo electrónico por el portal de compras públicas, y concluyeron sus trabajos el 02 de Noviembre, actualmente en trámite de recepción de trabajos y a la espera de recursos para proceder a contratar más microempresas	Gamboa López, Enma Katherine	05/12/2016 - 06:55 PM
OCTUBRE 2016: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catálogo electrónico por el portal de compras públicas.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	05/11/2016 - 04:30 PM
SEPTIEMBRE 2016: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catálogo electrónico por el portal de compras públicas.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	01/10/2016 - 02:23 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>AGOSTO 2016:</b> Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotalo-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños- Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas.</p>	<p>Sánchez Arévalo, Luis Rosendo</p>	<p>04/09/2016 - 11:36 AM</p>
<p><b>JULIO 2016:</b> Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Cahuaji- Pillate Cotalo), mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 01 de Junio del 2016 y rigen hasta el 30 de Junio del 2016, adicional a ello se procedio a realizar la contratación de la misma forma de dos microempresas para el trámo Pelileo- Baños- Limite provincial con Pastaza, misma que rigen hasta finales de Julio del 2016, luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado, el 15 de Julio se procedio a la compra por catalogo electronico de la microempresa Ramo de Girasol, misma que concluye su trabajo el 15 de Agosto del 2016</p>	<p>Moya Medina, Dilon German</p>	<p>03/08/2016 - 04:24 PM</p>
<p><b>JUNIO 2016:</b> Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Cahuaji- Pillate Cotalo), mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 01 de Junio del 2016 y rigen hasta el 30 de Junio del 2016, adicional a ello se procedio a realizar la contratación de la misma forma de dos microempresas para el trámo Pelileo- Baños- Limite provincial con Pastaza, misma que rigen hasta finales de Julio del 2016, luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	<p>Moya Medina, Dilon German</p>	<p>05/07/2016 - 05:51 PM</p>
<p><b>MAYO 2016:</b> Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo)., mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 22 de Abril del 2016 y rigen hasta el 24 de Mayo del 2016 Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	<p>Moya Medina, Dilon German</p>	<p>05/06/2016 - 05:01 PM</p>
<p><b>ABRIL 2016:</b> Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo)., mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 22 de Abril del 2016 y rigen hasta el 24 de Mayo del 2016 Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	<p>Moya Medina, Dilon German</p>	<p>05/05/2016 - 07:35 PM</p>
<p><b>MARZO 2016:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	<p>Moya Medina, Dilon German</p>	<p>10/04/2016 - 08:41 PM</p>
<p><b>FEBRERO 2016:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	<p>Moya Medina, Dilon German</p>	<p>04/03/2016 - 01:53 PM</p>
<p><b>ENERO 2016:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	<p>Moya Medina, Dilon German</p>	<p>11/02/2016 - 04:22 PM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p>	<p>Moya Medina, Dilon German</p>	<p>11/02/2016 - 04:21 PM</p>
<p><b>NOVIEMBRE 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo).</p>		

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.		
<b>OCTUBRE 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.	Moya Medina, Dilon German	06/11/2015 - 03:51 PM
<b>SEPTIEMBRE 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.	Moya Medina, Dilon German	06/11/2015 - 03:51 PM
<b>AGOSTO 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.	Moya Medina, Dilon German	09/09/2015 - 03:32 PM
<b>JULIO 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado	Moya Medina, Dilon German	07/08/2015 - 03:40 PM
<b>JUNIO 2015:</b> Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado	Moya Medina, Dilon German	09/07/2015 - 02:35 PM
<b>MAYO 2015:</b>  Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado  <b>ABRIL 2015:</b>  Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado  <b>Marzo 2015:</b>  Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado	Moya Medina, Dilon German	03/06/2015 - 03:20 PM
<b>DICIEMBRE 2014:</b> Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas de coronación, roza a mano, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato, limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo	Valencia Vasconez, Jairo David	07/01/2015 - 04:58 PM
<b>NOVIEMBRE 2014:</b> Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas de coronación, roza a mano, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato, limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.	Valencia Vasconez, Jairo David	05/12/2014 - 08:31 AM
<b>AGOSTO 2014:</b> Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.	Valencia Vasconez, Jairo David	03/09/2014 - 12:16 PM
<b>JULIO 2014:</b> Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas,	Valencia Vasconez, Jairo David	08/08/2014 - 12:05 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.		
JUNIO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	09/07/2014 - 05:17 PM
MAYO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	08/07/2014 - 07:41 PM
JUNIO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.		
ABRIL 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos.	Guevara Rodriguez, Luis	30/04/2014 - 03:36 PM
MARZO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodriguez, Luis	01/04/2014 - 09:13 AM
FEBRERO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodriguez, Luis	05/03/2014 - 03:55 PM
ENERO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodriguez, Luis	06/02/2014 - 09:10 AM
DICIEMBRE 2013: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodriguez, Luis	06/02/2014 - 09:09 AM
Noviembre 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Guevara Rodriguez, Luis	28/11/2013 - 01:45 PM
Octubre 2013: Se trabaja con personal y equipo de la Dirección Provincial de Tungurahua en el mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; se procedio adjudicar los procesos en el portal de compras públicas a dos Asociaciones de Conservación vial para el mantenimiento rutinario del paso lateral de Ambato y del tramo desde el redondel de Terremoto hasta Pelileo. Estos contratos inician el 1 de noviembre de 2013, el plazo es de un año.	Guevara Rodriguez, Luis	05/11/2013 - 02:54 PM
Septiembre 2013: Se trabaja con personal y equipo de la Dirección Provincial de Tungurahua en el mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; se ha elevado al portal de compras públicas dos procesos para contratar Asociaciones de Conservación vial para el mantenimiento rutinario de el paso lateral de ambato y del tramo desde el redondel de terremoto hasta Pelileo.	Guevara Rodriguez, Luis	05/11/2013 - 02:51 PM
Agosto 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a	Proaño Paredes, Marco Antonio	05/09/2013 - 03:33 PM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo		
Julio 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	07/08/2013 - 08:58 AM
Julio 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	07/08/2013 - 08:58 AM
Mayo 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	04/06/2013 - 05:24 PM
Abril 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	02/05/2013 - 11:55 AM
Marzo 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	02/05/2013 - 11:55 AM
Febrero 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	06/03/2013 - 03:53 PM
Enero 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	06/03/2013 - 03:52 PM
Diciembre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo	Proaño Paredes, Marco Antonio	06/03/2013 - 03:51 PM
Noviembre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos.	Proaño Paredes, Marco Antonio	07/12/2012 - 02:25 PM
Octubre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos.  Septiembre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos en el tramo Redondel de Terremoto Pelileo.	Proaño Paredes, Marco Antonio	21/11/2012 - 09:27 AM
Agosto 2012:		

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se trabaja con personal y Equipo de DPT en la limpieza de cunetas, , limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo. Se ha contratado a través del Portal de Compras Públicas dos Asociaciones de Conservación Vial para em mantenimiento rutinario y atención de emergencias en dos tramos de la Red Vial Estatal. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta vía.</p> <p>Julio 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo y culmina el contrato el 31 de julio de 2012, actualmente se elaborán los pliegos para la contratación de las microempresas por un año. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta vía.</p> <p>Junio 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta vía.</p> <p>Mayo 2012: Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo: en la carretera Ambato - Guaranda.</p> <p>Abril 2012: Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo: en la carretera Ambato - Guaranda.</p> <p>Marzo 2012: Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Se concluye la señalización de las vías; Paso lateral de Ambato;Redondel de terremoto - Totoras;Totoras - Pelileo Tisaleo-Cevallos-Totoras y Rita Vincés.</p> <p>Febrero 2012: Se trabaja con las microempresas en la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Atención de emergencias. Se contrata señalización para las vías; Paso lateral de Ambato;Redondel de terremoto - Totoras;Totoras - Pelileo Tisaleo-Cevallos-Totoras y Rita Vincés.</p> <p>Enero 2012: Se trabaja con las microempresas en la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Atención de emergencias.</p>		

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Temporada Invernal	04/11/2019	Edison Fabian Rodriguez Martinez	50	50	25	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. * General.</b> Deslaves y derrumbes CAUSARÍA la interrupción y posible destrucción de la vía.	04/11/2019	Edison Fabian Rodriguez Martinez	20 %	10	2	2/3

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Ambato
2	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Baños de Agua Santa
3	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Mocha
4	Zona 3 - Centro > Tungurahua > San Pedro de Pelileo
5	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Tisaleo

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2012		31/01/2012		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2012		29/02/2012		Sí	10.0
3	EJECUCION: Señalización vial de Tungurahua ejecutado.	9-Entregables Formales	15/03/2012		15/03/2012		Sí	0.65
4	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2012		31/03/2012		Sí	0.65
5	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2012		30/04/2012		Sí	0.65
6	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2012		31/05/2012		Sí	0.65
7	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/06/2012		Sí	0.65
8	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial	5-Entregables Intermedios	30/07/2012		30/07/2012		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estatal de Tungurahua ejecutado.							
9	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2012		31/08/2012		Sí	0.65
10	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.65
11	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2012		31/10/2012		Sí	0.65
12	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	0.65
13	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		30/12/2012		Sí	0.65
14	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.65
15	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.65
16	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	0.65
17	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.65
18	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		31/05/2013		Sí	0.65
19	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/06/2013		Sí	0.65
20	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	1-Solicitud de Información	30/07/2013		30/07/2013		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
21	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	1-Solicitud de Información	30/08/2013		30/08/2013		Sí	0.65
22	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.65
23	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/10/2013		Sí	0.65
24	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.65
25	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		30/12/2013		Sí	0.65
26	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.65
27	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.65
28	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.65
29	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.65
30	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.65
31	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.65
32	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.65
33	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.							
34	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.65
35	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.65
36	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.65
37	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.65
38	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.65
39	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.65
40	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.65
41	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.65
42	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.65
43	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.65
44	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.65
45	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estatal de Tungurahua ejecutado.							
46	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.65
47	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.65
48	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.65
49	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.65
50	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	0.65
51	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.65
52	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.65
53	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.65
54	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.65
55	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.65
56	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	0.65
57	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
58	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.65
59	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.65
60	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.65
61	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
62	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.65
63	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.65
64	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.65
65	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	0.65
66	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.65
67	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.65
68	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.65
69	EJECUCION: El informe anual respecto al Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua elaborado.	1-Solicitud de Información	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.65



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
70	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. Fase I	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.65
71	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.65
72	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.65
73	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.65
74	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.65
75	EJECUCIÓN: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I	5-Entregables Intermedios	15/03/2018		28/02/2018		Sí	0.65
76	EJECUCION: Firma del contrato e inicio de trabajos Rehabilitación de la carpeta asfáltica en el paso lateral sur Ambato	5-Entregables Intermedios	05/12/2018		05/12/2018		Sí	0.65
77	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
78	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
79	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
80	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
81	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
82	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
83	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
84	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
85	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
86	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
87	EJECUCIÓN: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase II	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
88	EJECUCION: Rehabilitación del Paso Lateral Sur Ambato	5-Entregables Intermedios	25/03/2019		08/03/2019		Sí	0.65
89	EJECUCION: Contratación de Microempresas para el Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.65
90	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.65
91	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.65
92	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.65
93	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.65
94	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.65
95	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.65
96	EJECUCION: Líquidación Económica Rehabilitación Paso Lateral Sur Ambato	5-Entregables Intermedios	25/07/2019		25/07/2019		Sí	0.65
97	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.65
98	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.65
99	EJECUCION: Recepción Provisional Rehabilitación Paso Lateral Sur Ambato	5-Entregables Intermedios	02/08/2019		02/08/2019		Sí	0.65
100	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.65
101	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.65
102	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.65
103	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.65

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estatal de Tungurahua ejecutado.							
104	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	31/10/2019	31/10/2019		▼	No	0.65
105	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019	31/10/2019		▼	No	0.65
106	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019		▼	No	0.65
107	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019		▼	No	0.65
108	EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas,	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2019	30/12/2019		●	No	0.45
109	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2019	30/12/2019		●	No	0.45
110	EJECUCION: Recepción Definitiva Rehabilitación Paso lateral Sur Ambato	5-Entregables Intermedios	28/02/2020	28/02/2020		●	No	0.65
111	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua periodo enero diciembre 2020 ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020		●	No	0.1
112	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua periodo enero diciembre 2021 ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021		●	No	0.1
113	CIERRE: Acta entrega recepción - Definitiva	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2021	31/12/2021		●	No	10.0


**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	TRABAJO EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	29/09/2014

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de incidentes atendidos	●	100.00 %	1	1	01/01/2019	Jul-Sep
2	Porcentaje de Km mantenidos	▼	97.12 %	1	0.9712	01/01/2019	Jul-Sep

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
3	POrcentaje de microempresas en labores de mantenimiento vial		100.00 %	1	1	01/01/2019	Jul-Sep


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,611,448.32 **
Costo Total:	2,396,994.24
Total Devengado:	6,057,916.39
% Costo Total Devengado:	252.73 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 252.73 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,832,389.62	5,206,986.00	0.00	7,039,375.62
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	6,615,358.42	2,614,863.72	0.00	9,230,222.14
Ppto. Codificado	6,875,189.51	2,614,863.72	0.00	9,490,053.23
Ppto. Comprometido	5,578,299.00	0.00	0.00	5,578,299.00
Planeado - Codificado (2019)		2,592,122.28		
Programado a Devengar	5,745,266.44	2,614,863.72	0.00	8,360,130.16
Ppto. Devengado	3,996,584.60	2,061,331.79	0.00	6,057,916.39
Pagado Real	3,434,877.33	0.00	0.00	3,434,877.33
Estimado a fin de año	* 3,996,584.60	0.00	0.00	3,996,584.60
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,748,681.84	2,614,863.72	0.00	4,363,545.56
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 69.56 %	78.83 %	0.00 %	72.46 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

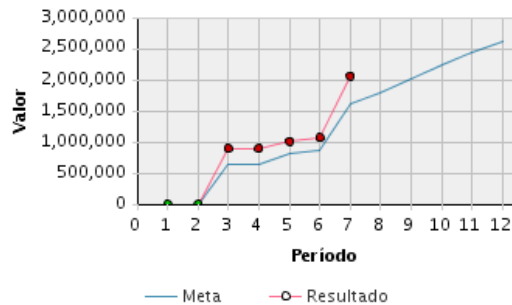

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	628,130.67	897,329.53	628,130.67	897,329.53	142.86 %		34.32 %
Abr	0.00	0.00	628,130.67	897,329.53	142.86 %		34.32 %
May	174,212.66	107,679.54	802,343.33	1,005,009.07	125.26 %		38.43 %
Jun	71,544.40	58,301.92	873,887.73	1,063,310.99	121.68 %		40.66 %
Jul	750,274.82	998,020.80	1,624,162.55	2,061,331.79	126.92 %		78.83 %
Ago	158,011.49		1,782,174.04				
Sep	221,281.60		2,003,455.64				
Oct	246,340.00		2,249,795.64				
Nov	198,793.91		2,448,589.55				
Dic	166,274.17		2,614,863.72				
<b>Total</b>	<b>2,614,863.72</b>	<b>2,061,331.79</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
18	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
19	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1: HITO 76 .- CONTRATO REHABILITACIÓN PASO LATERAL SUR	CONTRATO_PASO_LATERAL_SUR.pdf	19/08/2019
2	A2. HITO 87 .- ACTAS DE RECEPCIÓN UNICA MICROEMPRESA 2018( PARTE 1 )	Microempresas_tungurahua_2018_PARTE_1.rar	19/08/2019
3	A3. HITO 87 .- ACTAS DE RECEPCIÓN UNICA MICROEMPRESA 2018( PARTE 2 )	Microempresas_tungurahua_2018_PARTE_2.rar	19/08/2019
4	A4. HITO 89: CONTRATOS DE MICROEMPRESA 2018( PARTE 1 )	Microempresas_Tungurahua_2019_(PARTE_1).rar	19/08/2019
5	A5. HITO 89: CONTRATOS DE MICROEMPRESA 2018( PARTE 2 )	Microempresas_Tungurahua_2019_( _PARTE_2).rar	19/08/2019
6	A6. HITO 90- HITO 91: PLANILLAS 1 DE AVANCE MICROEMPRESAS	PLANILLA_No_01_MICROEMPRESAS.pdf	27/08/2019
7	A7. HITO 92- HITO 93: PLANILLAS 2 DE AVANCE MICROEMPRESAS	PLANILLA_No_02_MICROEMPRESAS.pdf	27/08/2019
8	A8. HITO 94- HITO 95: PLANILLAS 3 DE AVANCE MICROEMPRESAS	PLANILLA_No_03_MICROEMPRESAS.pdf	27/08/2019
9	A9. HITO 96: PLANILLA DE LIQUIDACIÓN REHABILITACION PASO LATERAL SUR AMBATO	PLANILLA_DE_LIQUIDACION_CAPERTA_ASAFALTICA_PASO_LATERAL_SUR_AMBATO.pdf	27/08/2019
10	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA NUEVO DÍA MAYO 2016	A6.pdf	05/06/2016
11	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2016	A7.pdf	05/06/2016
12	Asociación de Conservación Vial Nuevo Dia Informe Ejecutivo Septiembre	nuevoDia.pdf	10/10/2012

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	Asociación de Conservación Vial Ramo de Girasoles Informe Ejecutivo Septiembre	GIRASOLES.pdf	10/10/2012
14	ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00598.JPG	16/01/2012
15	ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00595.JPG	16/01/2012
16	AYUDA MEMORIA ABRIL 2016	A2.pdf	11/05/2016
17	AYUDA MEMORIA CHAUPI DICIEMBRE 2016	D2.pdf	04/01/2017
18	AYUDA MEMORIA CHAUPI ENERO 2017	D7.pdf	06/02/2017
19	AYUDA MEMORIA CHAUPI FEBRERO 2017	D8.pdf	05/03/2017
20	AYUDA MEMORIA CHAUPI JULIO 2016	B2.pdf	03/08/2016
21	AYUDA MEMORIA CHAUPI JUNIO 2017	F3.pdf	05/07/2017
22	AYUDA MEMORIA CHAUPI MAYO 2017	E4.pdf	05/06/2017
23	AYUDA MEMORIA CHAUPI NOVIEMBRE 2016	C8.pdf	05/12/2016
24	AYUDA MEMORIA CHAUPI OCTUBRE 2016	C1.pdf	05/11/2016
25	AYUDA MEMORIA CHAUPI SEPTIEMBRE 2016	B9.pdf	05/10/2016
26	AYUDA MEMORIA NUEVO AMANECER QUISAPINCHA JUNIO 2017	F4.pdf	05/07/2017
27	AYUDA MEMORIA NUEVO AMANECER QUISAPINCHA MAYO 2017	E5.pdf	05/06/2017
28	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA DICIEMBRE 2016	D1_(2).pdf	04/01/2017
29	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA ENERO 2017	D4.pdf	06/02/2017
30	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA FEBRERO 2017	E2.pdf	05/03/2017
31	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JULIO 2016	B1.pdf	03/08/2016
32	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JUNIO 2016	A7.pdf	05/07/2016
33	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JUNIO 2017	F1.pdf	05/07/2017
34	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA MAYO 2016	A5.pdf	05/06/2016
35	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA MAYO 2017	E6.pdf	05/06/2017
36	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA NOVIEMBRE 2016	C7.pdf	05/12/2016
37	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA OCTUBRE 2016	C2.pdf	05/11/2016
38	AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA S'PTIEMBRE 2016	B8.pdf	05/10/2016
39	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES ABRIL 2017	RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/05/2017
40	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES AGOSTO 2016	B4.pdf	05/09/2016
41	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES DICIEMBRE 2016	C9.pdf	04/01/2017
42	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES ENERO 2017	D5.pdf	06/02/2017
43	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES FEBRERO 2017	D9.pdf	05/03/2017
44	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JULIO 2016	A9.pdf	03/08/2016
45	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JUNIO 2016	A8.pdf	05/07/2016
46	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JUNIO 2017	F5.pdf	05/07/2017
47	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MARZO 2017	E3.pdf	05/04/2017
48	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2016	A6.pdf	05/06/2016
49	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2017	E7.pdf	05/06/2017
50	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES NOVIEMBRE 2016	C6.pdf	05/12/2016
51	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES OCTUBRE 2016	C4.pdf	05/11/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
52	AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES SEPTIEMBRE 2016	B7.pdf	05/10/2016
53	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO DICIEMBRE 2016	D3.pdf	04/01/2017
54	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO ENERO 2017	D6.pdf	06/02/2017
55	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO FEBRERO 2017	E1.pdf	05/03/2017
56	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO JULIO 2016	B3.pdf	03/08/2016
57	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO JUNIO 2017	F6.pdf	05/07/2017
58	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO MAYO 2017	E8.pdf	05/06/2017
59	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO NOVIEMBRE 2016	C5.pdf	05/12/2016
60	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO OCTUBRE 2016	C3.pdf	05/11/2016
61	AYUDA MEMORIA RIO NEGRO SEPTIEMBRE 2016	F1.pdf	05/10/2016
62	AYUDA MEMORIA SAHUATO A MAYO 2017	E9.pdf	05/06/2017
63	AYUDA MEMORIASAHUATO A JUNIO 2017	F2.pdf	05/07/2017
64	B1 INFORME EJECUTIVO ENERO 2013	NUEVO_DIA_ENERO.pdf	07/03/2013
65	B2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013	nuevo_dia_febrero.pdf	12/03/2013
66	B3 Informe ejecutivo Abril 2013	PASO_LATERAL_ABRIL.pdf	02/05/2013
67	B4 Informe ejecutivo Abril 2013	TOTORAS-PELILEO.pdf	02/05/2013
68	B5 Informe ejecutivo Mayo 2013	NUEVO_DIA_MAYO.pdf	04/06/2013
69	B6 Informe ejecutivo Mayo 2013	GIRASOLES_MAYO.pdf	04/06/2013
70	B7 INFORME EJECUTIVO JUN 2014 Nuevo día	B7_GestiónReporte_JUN_2014.pdf	10/07/2014
71	B7 INFORME EJECUTIVO JUN 2014 Ramo Girasoles	B7_GestiónReporte_JUN_2014.pdf	10/07/2014
72	BACHEO REALIZADO EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00505.JPG	16/01/2012
73	BACHEO REALIZADO EN EL PASO LATERAL DE AMBATO	DSC00508.JPG	16/01/2012
74	C1 Informe Ejecutivo Enero 2015	InformeEjecutivoEnero2015.pdf	14/04/2015
75	C10_Informe_Ejecutivo_Octubre_2015	C10_Informe_Ejecutivo_Octubre_2015.pdf	06/11/2015
76	C2 Informe Ejecutivo Febrero 2015	InformeEjecutivoFebrero2015.pdf	14/04/2015
77	C6 Informe Ejecutivo JUNIO 2015	Informe_Ejecutivo_JUNIO_2015_.pdf	09/07/2015
78	C7 Informe Ejecutivo JULIO 2015	C7_Informe_Ejecutivo_JULIO_2015.pdf	05/08/2015
79	C7 Informe Ejecutivo JULIO 2015	C8_Informe_Ejecutivo_AGOSTO_2015.pdf	11/09/2015
80	C9 Informe Ejecutivo SEPTIEMBRE 2015	C9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2015.pdf	07/10/2015
81	D02_Informe_Ejecutivo_Febrero_2016	FEBRERO_2016_.pdf	04/03/2016
82	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAN_JOSE.pdf	05/01/2018
83	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_LOS_CAMINANTES.pdf	05/01/2018
84	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_KAUSAY.pdf	05/01/2018
85	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/01/2018
86	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_CHAUPI.pdf	05/01/2018
87	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_NUEVO_AMANECER_QUISAPINCHA.pdf	05/01/2018
88	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_RIO_NEGRO.pdf	05/01/2018
89	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAHUATO A.pdf	05/01/2018
90	HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAN_ANTONIO_DE_COTALO.pdf	05/01/2018
91	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Los_Caminates_2017.PDF	05/12/2017



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
92	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Nuevo_Amanecer_Quisapincha2017.PDF	05/12/2017
93	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Nuevo_Dia2017.PDF	05/12/2017
94	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Ramo_de_Girasoles_2017.PDF	05/12/2017
95	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Rio_Negro_2017.PDF	05/12/2017
96	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Sahuatoa_2017.PDF	05/12/2017
97	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_San_Antonio_de_Cotalo_2017.PDF	05/12/2017
98	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_San_Jose_2017.PDF	05/12/2017
99	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_NUEVO_DÍA.pdf	05/01/2018
100	HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017	ACV_Chaupi_abril_2017.PDF	05/12/2017
101	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Chaupi.PDF	05/11/2017
102	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Nuevo_Día_.PDF	05/11/2017
103	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Ñukanchik_Kawsay.PDF	05/11/2017
104	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Ramo_de_Girasoles.PDF	05/11/2017
105	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Río_Negro.PDF	05/11/2017
106	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_Sahuatoa.PDF	05/11/2017
107	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_San_Antonio_de_Cotaló.PDF	05/11/2017
108	HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017	ACV_San_José.PDF	05/11/2017
109	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (CHAUPI)	Acta_entrega_recepcion_Chaupi.pdf	05/04/2018
110	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (LOS CAMINANTES)	Acta_entrega_recepcion_Los_Caminantes.pdf	05/04/2018
111	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (NUEVO AMANECER QUISAPINCHA)	Acta_entrega_recepcion_Nuevo_Amanecer_Quisapincha.pdf	05/04/2018
112	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (NUEVO DIA)	Acta_entrega_recepcion_Nuevo_Dia.pdf	05/04/2018
113	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (Ramo de Girasoles)	Acta_entrega_recepcion_Ramo_de_Girasoles.pdf	05/04/2018
114	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (RIO NEGRO)	Acta_entrega_recepcion_Rio_Negro.pdf	05/04/2018
115	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (SAHUATO A)	Acta_entrega_recepcion_Sahuatoa.pdf	05/04/2018
116	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (San Antonio de Cotalo)	Acta_entrega_recepcion_San_Antonio_de_Cotalo.pdf	05/04/2018
117	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (SAN JOSE)	Acta_entrega_recepcion_San_Jose.pdf	05/04/2018
118	HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (Ñukanchik Kawsay)	Acta_entrega_recepcion_Ñukanchik_Kawsay.pdf	05/04/2018
119	INFORME Incrementar la calidad de la información RIESGO	Informe_de_Riesgo--Incrementar_la_calidad_de_la_información_de_los_Proyectos.pdf	02/04/2019
120	INFORME DE RIESGO Condiciones Climaticas Adversas	Informe_Riesgo--Condiciones_climaticas_adversas_CAUSARIAS.pdf	02/04/2019
121	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	GestionReporteFN(24).pdf	05/09/2013
122	Informe ejecutivo abril 2014	B3.-_Informe_ejecutivo.pdf	30/04/2014
123	Informe Ejecutivo correspondiente al mes de Julio 2013	IE_RamoGirasoles_Julio_2013.pdf	07/08/2013
124	Informe ejecutivo enero	nuevo_dia_enero.pdf	08/01/2014
125	Informe ejecutivo enero	girasoles_enero.pdf	08/01/2014
126	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	A.1.1.pdf	11/03/2014
127	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013	girasoles_febrero.pdf	12/03/2013
128	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	A.2.1.pdf	11/03/2014
129	Informe Ejecutivo julio 2014	InformeEjecutivo_julio_2014.pdf	01/08/2014
130	INFORME EJECUTIVO JUNIO PASO LATERAL	paso_junio.pdf	08/07/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
131	Informe ejecutivo marzo 14	A3_Informe_ejecutivo_marzo14.pdf	07/04/2014
132	Informe ejecutivo microempresas abril 2012.	Informe_ejecutivo_micro_abril.pdf	08/06/2012
133	INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESAS ENERO 2012	INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_ENE-2012.pdf	16/03/2012
134	INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESAS FEBRERO 2012	INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_FEB-2012.pdf	16/03/2012
135	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE	conse_novie.pdf	10/12/2012
136	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2	conv_nuev.pdf	10/12/2012
137	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE	informe_octu_gi.pdf	22/11/2012
138	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE NUEVO DIA	informe_octubre_nuevo.pdf	22/11/2012
139	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESTATAL REALIZADO EN EL MES AGOSTOO 2015	PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_AGOSTO_2015_GPR	07/09/2015
140	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESTATAL REALIZADO PARA EN EL MES JULIO 2015.	PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_JULIO_2015_GPR	02/08/2015
141	MICROEMPRESA CHAUPI JULIO 2017	MICRO_CHAUPI_JULIO_201718220.pdf	30/08/2017
142	MICROEMPRESA NUEVO AMANECER JULIO 2017	NUEVO_AMANECER_JULIO_2017_-_18235.pdf	30/08/2017
143	MICROEMPRESA NUEVO DIA JULIO 2017	MICRO_NUEVO_DIA_JULIO_2017_-_17932.pdf	30/08/2017
144	MICROEMPRESA RAMO DE GIRASOLES JULIO 2017	RAMO_DE_GIRASOLES_JULIO_2017_-_18216.pdf	30/08/2017
145	MICROEMPRESA RIO NEGRO JULIO 2017	RIO_NEGRO_JULIO_2017-_18237.pdf	30/08/2017
146	MICROEMPRESA SAHUATOA JULIO 2017	SAHUATOA_JULIO_2017_-_18238.pdf	30/08/2017
147	NUEVO DIA JULIO 2017	17932.pdf	04/08/2017
148	ORDEN DE COMPRA NUEVO DIA	A3.pdf	11/05/2016
149	ORDEN DE COMPRA NUEVO DIA	A9.pdf	05/07/2016
150	ORDEN DE COMPRA RAMO DE GIRASOL	A4.pdf	11/05/2016
151	ORDEN DE COMPRA RAMO DE GIRASOLES	B1.pdf	05/07/2016
152	REPORTE ESIGEF JULIO 2016	B6.pdf	05/08/2016
153	REPORTE ESIGEF JUNIO 2016	B5.pdf	05/08/2016
154	REPORTE ESIGEF MAYO 2016	B4.pdf	05/08/2016
155	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 1	SAN_JOSE.pdf	05/10/2017
156	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 10	NUEVO_DIA.pdf	05/10/2017
157	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 2	ÑUKANCHIK_KAWSAY.pdf	05/10/2017
158	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 3	LOS_CAMINANTES.pdf	05/10/2017
159	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 4	COTALO.pdf	05/10/2017
160	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 5	SAHUATOA.pdf	05/10/2017
161	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 6	RIO_NEGRO.pdf	05/10/2017
162	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 8	CHAUPI.pdf	05/10/2017
163	SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 9	RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/10/2017
164	T- INFORME EJECUTIVO MES DE AGOSTO RAMO DE GIRASOL	INFORME_EJECUTIVO-planilla_10.GIRASOLES.pdf	01/09/2014
165	T2- INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE MICROEMPRESA RAMO DE GIRASOLES	INF._EJECUTIVO_.11.SEPT.girasoles.pdf	06/10/2014
166	T3- microempresa ramo de girasoles, septiembre 2014	INF._EJECUTIVO_.11.SEPT.girasoles.pdf	06/10/2014
167	T4- Informe Ejecutivo de la Microempresa del mes de Octubre 2014	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_microempresa_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/10/2014
168	T5- Mantenimiento Vial de la Microempresa Ramo de Girasoles-Noviembre 2014	Noviembre_Microempresas_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf	05/12/2014

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Gamboa López, Enma Katherine	Subsecretario Regional 3	Subsecretaria Zonal 3, Encargada	egamboa@mtop.gob.ec	023974600
González Chávez, Alexandra del Rocío	Director Provincial	Directora Distrital de Transporte y Obras Públicas de Tungurahua, Encargada	pamh120@hotmail.com	0223974798
Parra Cherres, María Gabriela	Analista de Presupuesto	Analista de Presupuesto	gparra@mtop.gob.ec	
Rodríguez Martínez, Edison Fabian	Lider técnico	Asistente de Infraestructura Distrital Servidor Público 1	erodriguez@mtop.gob.ec	

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
30442_1.jpg	04/09/2016
