

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial El Oro

PROYECTO: K031 MTOP- Programa de Liquidación y Ejecución de Obras por concluir Fase I de la Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo

Líder del Proyecto:	Nieto Orellana, Galo Secundino (gsnieto@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Programas Relacionados:	PROGRAMA DE LIQUIDACION Y EJECUCION DE OBRAS POR CONCLUIR FASE I DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS EX CORPECUADOR
Titular:	Bazurto Orellana, Pedro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30340000.1278.7004	TIR:	40.65 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	196,528.12
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	19,354,066.90
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	12/07/2011 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	26/11/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Bazurto Orellana, Pedro	Fecha del siguiente Hito:	01/12/2018

DATOS GENERALES

Descripción

Este proyecto corresponden a proyectos Ex Corpecuador, signados en la herramienta GPR K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo "Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salati - Ambocas, que a la fecha se encuentran terminados. Faltando el pago de parte de finanzas del reajuste definitivo de Fiscalización en el Puente Pital

Beneficios Cualitativos

- Seguridad vial: señalización, atención de incidentes
- Mantenimiento vial
- Cumplimiento de normas nacionales en infraestructura
- Cumplimiento de normas ambientales nacionales

Tipo de Beneficiario

Moradores del sector, sectores agrícola, ganadero, turistas

Restricciones

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 12/07/2011 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

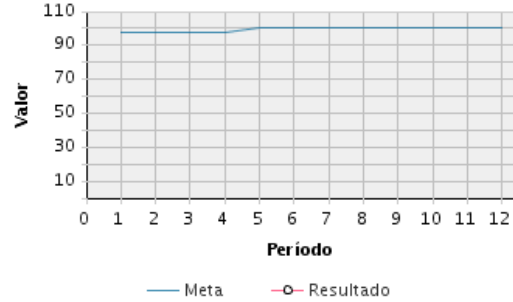

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2018: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, una vez emitido el criterio jurídico y técnico para el pago correspondiente se ha cancelado los valores pendiente de pago por parte del MTOP, sin embargo se encuentran en espera que el ministerio de Finanzas realice el pago.</p>	Bazurto Orellana, Pedro	04/01/2019 - 02:28 PM
<p>NOVIEMBRE 2018: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, una vez emitido el criterio jurídico y técnico para el pago correspondiente se ha cancelado los valores pendiente de pago por parte del MTOP, sin embargo se encuentran en espera que el ministerio de Finanzas realice el pago.</p>	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/12/2018 - 11:08 AM
<p>OCTUBRE 2018: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, una vez emitido el criterio jurídico y técnico para el pago correspondiente se ha cancelado los valores pendiente de pago por parte del MTOP, sin embargo se encuentran en espera que el ministerio de Finanzas realice el pago.</p>	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/11/2018 - 06:06 PM
<p>SEPTIEMBRE 2018: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, se ha solicitado criterio jurídico y técnico para el pago correspondiente una vez que ya se cuenta con la asignación de recursos para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salatí Ambocas</p>	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/10/2018 - 04:06 PM
<p>AGOSTO 2018: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados,</p>	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/09/2018 - 03:09 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salati Ambocas		
Julio 2018: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salati - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salati Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/08/2018 - 05:57 PM
Junio 2018: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salati - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salati Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/07/2018 - 08:43 PM
Mayo 2018: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salati - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salati Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/06/2018 - 10:57 PM
Abril 2018: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salati - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salati Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/05/2018 - 05:04 PM
Marzo 2018: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salati - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salati Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/04/2018 - 05:33 PM
Febrero 2018: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salati - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salati Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/03/2018 - 04:12 PM
Enero 2018: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salati - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salati Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	06/02/2018 - 09:01 AM
Diciembre 2017: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salati - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados,	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/01/2018 - 02:31 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salatí Ambocas		
Noviembre 2017: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salatí Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/12/2017 - 05:47 AM
Octubre 2017: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salatí Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	06/11/2017 - 08:29 AM
Septiembre 2017: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salatí Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/10/2017 - 11:18 PM
Agosto 2017: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salatí Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/09/2017 - 05:36 PM
Julio 2017: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salatí Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/08/2017 - 05:57 AM
Junio 2017: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salatí Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	03/07/2017 - 02:30 PM
Mayo 2017: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salatí Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/06/2017 - 05:36 PM
Abril 2017: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/05/2017 - 04:36 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salatí Ambocas		
Marzo 2017: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salatí Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/04/2017 - 08:55 AM
Febrero 2017: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de los reajustes definitivos de fiscalización del Proyecto Portovelo - Salatí Ambocas	Nieto Orellana, Galo Secundino	01/03/2017 - 04:47 PM
Enero 2017: Este proyecto corresponden a programa Ex Corpecuador, y competen a los proyectos signados en GPR como K021 MTOP - Construcción del Puente Pital sobre el Río Pital y accesos. Ubicado en la carretera "Y" del Cambio - Santa Rosa - Arenillas: E - 25, Tramo"Y" del Cambio - Santa Rosa Provincia de El Oro y K025 MTOP - Fiscalización y reconstrucción de la Carretera Portovelo - Salatí - Ambocas. Estos proyectos a la fecha se encuentran terminados, faltando del Puente Pital la asignación de recursos por parte de finanzas para el pago del reajuste definitivo de la fiscalización, y el pago de planilla de liquidación y de reajuste del Proyecto Portovelo - Salatí Ambocas	González Villavicencio, Volter Hernel	03/02/2017 - 03:13 PM






LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > El Oro > Portovelo
2	Zona 7 - Sur > El Oro > Santa Rosa


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Proyecto definido	1-Solicitud de Información	12/07/2011		12/07/2011		Sí	3.0
2	PLANEACION: Justificativos técnicos y económicos elaborados	1-Solicitud de Información	05/11/2012		05/11/2012		Sí	3.0
3	PLANEACION: Revisión de Pliegos concluidos	1-Solicitud de Información	15/11/2012		15/11/2012		Sí	2.0
4	PLANEACION: Publicación de Pliegos ejecutados	2-Publicación de Pliegos	13/03/2013		13/03/2013		Sí	1.0
5	PLANEACION: contrato adjudicado	3-Adjudicación	09/04/2013		09/04/2013		Sí	1.0
6	PLANEACION: Contrato firmado	3-Adjudicación	24/04/2013		24/04/2013		Sí	1.0
7	EJECUION: trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	16/05/2013		16/05/2013		Sí	1.0
8	EJECUCION: TRABAJOS PUENTE PITAL FINALIZADOS	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	9.0
9	ENTREGABLES FORMALES: ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PUENTE PITAL	9-Entregables Formales	20/08/2014		20/08/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
10	ENTREGABLES FORMALES: ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA LEGALIZADA PUENTE PITAL	9-Entregables Formales	05/02/2015		05/02/2015		Sí	2.0
11	EJECUCION: TRABAJOS DE OBRA PORTOVELO - SALATI - AMBOCAS FINALIZADO	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	71.0
12	ENTREGABLES FORMALES: ACTA TERMINACION POR MUTUO ACUERDO PORTOVELO - SALATI AMBOCAS LEGALIZADA	9-Entregables Formales	19/05/2016		19/05/2016		Sí	2.0
13	LIQUIDACION ECONOMICA PORTOVELO SALATI - AMBOCAS	V - Verificación ejecutiva	20/05/2017	01/12/2018			No	1.0
14	LIQUIDACION ECONOMICA PUENTE PITAL	V - Verificación ejecutiva	20/05/2017	01/12/2018			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de informes técnicos de control de obra.		100.00 %	1	1	01/01/2017	Jul-Dic


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	19,354,066.90 **
Costo Total:	1,480,059,571.00
Total Devengado:	19,341,139.59
% Costo Total Devengado:	1.31 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 1.31 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1.00	0.00	191,545.02	191,546.02
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	19,145,675.83	297,272.97	157,764.07	19,600,712.87
Ppto. Comprometido	18,957,340.51	233,390.31	150,408.77	19,341,139.59
Planeado - Codificado (2017)		-297,272.97		
Programado a Devengar	1,480,059,571.00	205,181.37	0.00	1,480,264,752.37
Ppto. Devengado	18,957,340.51	233,390.31	150,408.77	19,341,139.59
Pagado Real	18,900,738.68	233,390.31	28,890.77	19,163,019.76
Estimado a fin de año	* 18,957,340.51	1,480,059,571.00	191,545.02	1,499,208,456.53
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,461,102,230.49	-1,479,854,389.63	-191,545.02	-18,943,704.16
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 1.28 %	113.75 %	-	1.31 %
Ppto. Codificado 998	3,811,877.58	0.00	0.00	3,811,877.58
Ppto. Devengado 998	3,811,877.58	0.00	0.00	3,811,877.58

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

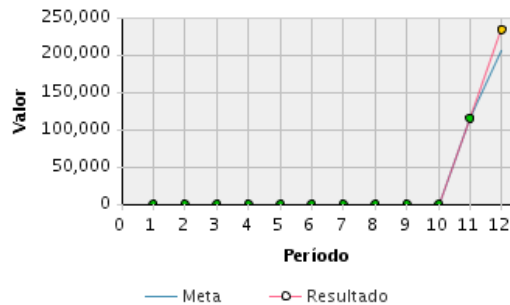

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Nov	115,113.15	115,113.15	115,113.15	115,113.15	100.00 %	●	56.10 %
Dic	90,068.22	118,277.16	205,181.37	233,390.31	113.75 %	▼	113.75 %
Total	205,181.37	233,390.31				▼	

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
14	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
15	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
17	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
19	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	PORTOVELO SALATI AMBOCAS	A_7_CONTRATO_ORIGINAL_OBRA_PORTOVELO_SALATI AMBOCAS.pdf	05/03/2017
2	PORTOVELO SALATI AMBOCAS	A_8_ACTA_DE_SUSPENSION_DE_TRABAJOS_PORTOVELO_SALATI AMBOCAS.pdf	05/03/2017
3	PORTOVELO SALATI AMBOCAS	A_9_CONTRATO_COMPLEMENTARIO_No._01_PORTOVELO_SALATI AMBOCAS.pdf	05/03/2017
4	PORTOVELO SALATI AMBOCAS	B_1_ORDEN_DE_CAMBIO_No._01_PORTOVELO_SALATI AMBOCAS.pdf	05/04/2017
5	PORTOVELO SALATI AMBOCAS	B_2_CONVENIO_POR_TERMINACION_DE_MUTUO_ACUERDO_POR_TERMINACION_DE_MUTUO_ACUERDO_POR_TERMINACION_DE_MUTUO_ACUERDO.pdf	05/04/2017
6	PORTOVELO SALATI AMBOCAS	B_3_ACTA_DE_ENTREGA_RECEPCION_-_LIQUIDACION_TECNICA_Y_ECNOMICA_POR_TERMINACION_DE_MUTUO_ACUERDO_POR_TERMINACION_DE_MUTUO_ACUERDO.pdf	05/04/2017
7	PUENTE PITAL	A_1_CONTRATO_DE_OBRA_PUENTE_PITAL.pdf	05/04/2017
8	PUENTE PITAL	A_2_ORDEN_DE_CAMBIO_No._01_PUENTE_PITAL.pdf	05/04/2017
9	PUENTE PITAL	A_3_ORDEN_DE_CAMBIO_No._02_PUENTE_PITAL.pdf	05/04/2017
10	PUENTE PITAL	A_4_ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL_PUENTE_PITAL.pdf	05/04/2017
11	PUENTE PITAL	A_5_ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_PUENTE_PITAL.pdf	05/04/2017
12	PUENTE PITAL	A_6_ACTA_DE_ENTREGA_PUENTE_PITAL.pdf	05/04/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Subsecretario Región 7	Director de Construcciones del Transporte	faltamirano@mtop.gob.ec	
Bazurto Orellana, Pedro	Director Distrital	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro	pbazurto@mtop.gob.ec	
González Villavicencio, Volter Hernel	Coordinador de infraestructura	Analista de Infraestructura Provincial 1	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600
Nieto Orellana, Galo Secundino	Líder del Proyecto	Supervisor de Construcciones Dirección Provincial de El Oro	gsnieto@mtop.gob.ec	023974600
