

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial El Oro

PROYECTO: K038 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de El Oro

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Barriga Loaiza, Jorge Antonio (jbarriga@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Altamirano Arias, Fredy Oswaldo | Programas Relacionados: | |
| Titular: | Bazurto Orellana, Pedro | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 2.56 |
| CUP: | 175200000.506.3851 | TIR: | 23.14 % |
| Objetivos Operativos: | 4 | VAN: | 24,882,633.43 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 8,850,703.38 |
| Localidad de Gestión: | Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | Inversionista internacional | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2018 - 31/12/2021 |
| Fecha de última actualización: | 30/01/2020 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2018 |
| Modificado por: | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | Fecha del siguiente Hito: | 31/01/2020 |

DATOS GENERALES

Descripción

Mantenimiento General de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro, comprende trabajos por administración directa, y trabajos realizados por Asociaciones de Conservación Vial - Microempresas: Bacheo asfáltico común, limpieza de cunetas a mano y a máquina, limpieza de alacantarillas, encausamientos, limpieza de derrumbes, sellos asfálticos, reconfiguración de rasantes, rellenos, mantenimiento de señalización vertical y horizontal. Se incluyen obras de mantenimiento a contratar, señalización, mantenimiento de puentes, obras de emergencia.

Objetivo General:

- Mantenimiento Vial de la Provincia de El Oro.

Objetivos Específicos:

- Mantener en estado óptimo la infraestructura de la red vial, edificios, maquinaria, equipos y vehículos correspondiente a la Dirección Provincial de El Oro.
- Mantener en estado óptimo la infraestructura de todas las modalidades de transporte, que tiene como competencia la Dirección provincial de El Oro.

Beneficios Cualitativos

Contribuir al Plan Maestro Vial Nacional y en concordancia con la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.

Beneficios:

- Mejorar en el tiempo de viaje
- Bajar costos de transportación
- Mejorar la calidad de vida de la población
- Mejorar la circulación vehicular

Tipo de Beneficiario

La población del área de influencia directa que se beneficiará con el Mantenimiento Vial es de 600.659 habitantes, en los sectores: agrícola, ganadero, minero, pesquero, acuícola, turístico


Restricciones

Disponibilidad de equipo, efectos colaterales de estación invernal, transporte de materia prima, abastecimiento de mezcla asfáltica, disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de los trabajos de mantenimiento vial dentro de los plazos establecidos.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 52.22 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

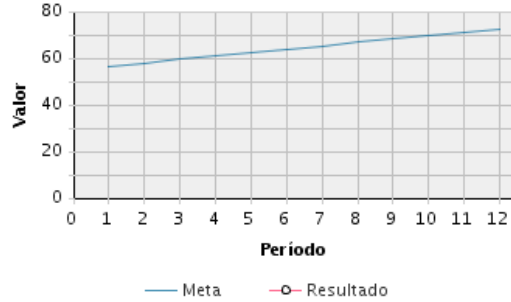

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2020 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 56 % | 58 % | 59 % | 61 % | 62 % | 64 % | 65 % | 67 % | 68 % | 70 % | 71 % | 73 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>DICIEMBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 26)</p> <p>2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 39+500 (Hito cumplido 26)</p> <p>3.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 26)</p> <p>4.- Bacheo Asfáltico en las carreteras: Paso Lateral Pasaje y Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 26)</p> <p>5.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 26)</p> <p>Para el mes de Diciembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/01/2020 - 12:28 PM |
| <p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 25)</p> <p>2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 8+500, 16+100 y 39+500 (Hito cumplido 25)</p> <p>3.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 25)</p> <p>4.- Bacheo Asfáltico en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 25)</p> <p>5.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 25)</p> <p>Para el mes de Noviembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/12/2019 - 07:04 AM |
| <p>OCTUBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 24)</p> <p>2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 8+500 y 16+100 (Hito cumplido 24)</p> <p>3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 24)</p> <p>4.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 24)</p> <p>5.- Bacheo Asfáltico en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 24)</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/11/2019 - 11:08 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>Para el mes de Octubre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | | |
| <p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 23) 2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 45+500 (Hito cumplido 23) 3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 23) 4.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 23) 5.- Reposición de señalización vertical (chevrone) en la carretera Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 23)</p> <p>Para el mes de Septiembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/10/2019 - 11:35 AM |
| <p>AGOSTO 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 22) 2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 20+400 (Hito cumplido 22) 3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 22) 4.- Bacheo Asfáltico Común en el Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 22) 5.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 22)</p> <p>Para el mes de Agosto de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/09/2019 - 02:19 PM |
| <p>JULIO 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 21) 2.- Limpieza de derrumbes menores en las carreteras: La Avanzada-Saracay; Saracay-Piñas (Hito cumplido 21) 3.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 20+400 (Hito cumplido 21) 4.- Reconformación de rasante en la carretera Saracay-Piñas sector Monos (Hito cumplido 21) 5.- Bacheo Asfáltico Común en las carreteras: Piñas-Portovelo-Zaruma y Yee del Cambio-Yee de Tillales (Hito cumplido 21)</p> <p>Para el mes de Julio de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/08/2019 - 03:50 PM |
| <p>JUNIO 2019</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 20) 2.- Limpieza de derrumbes menores en las carreteras: Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo y Arenillas-La victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 20) 3.- Estabilización de talud en la carretera Saracay-Piñas sector Las Bateas (Hito cumplido 20) 4.- Mantenimiento de Señalización Horizontal en reductores de velocidad en la carretera La Avanzada-Saracay (Hito cumplido 20) 5.- Bacheo Asfáltico Común en la carretera Piñas Portovelo-Zaruma (Hito cumplido 20)</p> <p>Para el mes de Junio de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 03/07/2019 - 02:33 PM |
| <p>MAYO 2019:</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 19) 2.- Limpieza de derrumbes en las carreteras: Portovelo- Salati-Ambocas y Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 19) 3.- Estabilización de talud en la carretera Saracay-Piñas sector Las Bateas (Hito cumplido 19) 4.- Mantenimiento de Señalización Vertical en la carretera Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 19)</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/06/2019 - 12:50 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Para el mes de Mayo de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado. | | |
| <p>ABRIL 2019:</p> <p>1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 18)</p> <p>2.- Limpieza de derrumbes en las carreteras: Portovelo-Salati-Ambocas; Saracay-Piñas; Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango y Saracay-Balsas-Pte. Rio Pindo (Hito cumplido 18)</p> <p>3.- Bacheo Asfáltico Común en las carreteras: Saracay-Piñas; Saracay-Balsas y La Avanzada-Saracay (Hito cumplido 18)</p> <p>Para el mes de Abril de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 02/05/2019 - 11:24 AM |
| <p>Marzo 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Balsas-Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Piñas; Limpieza de alcantarillas en la carretera Saracay-Piñas sector Las bateas; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/04/2019 - 10:39 AM |
| <p>Febrero 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Balsas-Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 01/03/2019 - 11:04 AM |
| <p>Enero 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reposición de rellenos, limpieza de alcantarillas, construcción de bordillos y bacheo asfáltico en la carretera Saracay-Balsas-Rio Pindo; Limpieza de alcantarillas en la carretera la Avanzada-Saracay; Reposición de delineadores retroreflectivos en el Paso Lateral Pasaje; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Bacheo asfáltico y limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Piñas; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/02/2019 - 08:24 AM |
| <p>Diciembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores y cunetas en la carretera Saracay - Piñas y Piñas - Portovelo, Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas - La Victoria - Pte. Puyango, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/01/2019 - 04:05 PM |
| <p>Noviembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores y cunetas en la carretera Saracay - Piñas, Desmontaje y traslado de puente Bailey desde la carretera Buenavista - Paccha hasta el Campamento Piñas, Reconstrucción de talud inferior en los km 38+300 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/12/2018 - 12:08 PM |
| <p>Octubre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Reconstrucción de talud inferior en los km 38+300 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/11/2018 - 03:01 PM |
| <p>Septiembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Reconstrucción de talud inferior en los km 15+500 y 25+750 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/10/2018 - 10:24 AM |
| <p>Agosto 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de alcantarillas y derrumbes menores a máquina en las carretera La Avanzada - Saracay; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reconstrucción de talud inferior en el km 15+500 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo.</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/09/2018 - 11:21 AM |
| <p>Julio 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a</p> | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/08/2018 - 08:47 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reposición de señalización vertical en las carretera La Avanzada - Saracay, Reconstrucción de talud inferior en el km 15+500 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo. | | |
| Junio 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reposición de señalización vertical en las carreteras: Corralitos - Pasaje, Piñas - Zaruma, Arenillas - La Victoria. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/07/2018 - 08:50 AM |
| Mayo 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/06/2018 - 11:19 AM |
| Abril 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras: La Avanzada - Saracay, Saracay - Piñas, Piñas - Portovelo - Zaruma. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 04/05/2018 - 01:24 PM |
| Marzo 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras: Corralitos - Pasaje, Yee del Enano - Buenavista - Pasaje. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 05/04/2018 - 09:58 AM |
| Febrero 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo, Arenillas - La Victoria - Pte. Puyango. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 02/03/2018 - 03:48 PM |
| Enero 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reconfirmación de rasante con material de mejoramiento en el km 33+500 de la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango, Limpieza de espaldones, Bacheo asfáltico común, Limpieza de derrumbes a máquina. | Barriga Loaiza, Jorge Antonio | 19/02/2018 - 04:37 PM |

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|---|
| 1 | Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICION: Proyecto definido | 1-Solicitud de Información | 01/01/2018 | | 01/01/2018 | | Sí | 10.0 |
| 2 | PLANEACION:Justificativos-técnicos-económicos elaborados y aprobados | 1-Solicitud de Información | 01/01/2018 | | 01/01/2018 | | Sí | 10.0 |
| 3 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2018 | | 31/01/2018 | | Sí | 1.46 |
| 4 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2018 | | 28/02/2018 | | Sí | 1.46 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 5 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2018 | | 31/03/2018 | | Sí | 1.46 |
| 6 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2018 | | 30/04/2018 | | Sí | 1.46 |
| 7 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018 | | 31/05/2018 | | Sí | 1.46 |
| 8 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2018 | | 30/06/2018 | | Sí | 1.46 |
| 9 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018 | | 31/07/2018 | | Sí | 1.46 |
| 10 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018 | | 31/08/2018 | | Sí | 1.46 |
| 11 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018 | | 30/09/2018 | | Sí | 1.46 |
| 12 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018 | | 31/10/2018 | | Sí | 1.46 |
| 13 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018 | | 30/11/2018 | | Sí | 1.46 |
| 14 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2018) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | | 31/12/2018 | | Sí | 1.46 |
| 15 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2019 | | 31/01/2019 | | Sí | 1.46 |
| 16 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2019 | | 28/02/2019 | | Sí | 1.46 |
| 17 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2019 | | 31/03/2019 | | Sí | 1.46 |
| 18 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019 | | 30/04/2019 | | Sí | 1.46 |
| 19 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019 | | 31/05/2019 | | Sí | 1.46 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 20 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019 | | 30/06/2019 |  | Sí | 1.46 |
| 21 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019 | | 31/07/2019 |  | Sí | 1.46 |
| 22 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2019 | | 31/08/2019 |  | Sí | 1.46 |
| 23 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019 | | 30/09/2019 |  | Sí | 1.46 |
| 24 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019 | | 31/10/2019 |  | Sí | 1.46 |
| 25 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019 | | 30/11/2019 |  | Sí | 1.46 |
| 26 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2019) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019 | | 31/12/2019 |  | Sí | 1.46 |
| 27 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2020 | 31/01/2020 | |  | No | 1.46 |
| 28 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2020 | 29/02/2020 | |  | No | 1.46 |
| 29 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2020 | 31/03/2020 | |  | No | 1.46 |
| 30 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2020 | 30/04/2020 | |  | No | 1.46 |
| 31 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2020 | 31/05/2020 | |  | No | 1.46 |
| 32 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2020 | 30/06/2020 | |  | No | 1.46 |
| 33 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2020 | 31/07/2020 | |  | No | 1.46 |
| 34 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2020 | 31/07/2020 | |  | No | 1.46 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 35 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2020 | 30/09/2020 | | | No | 1.46 |
| 36 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2020 | 31/10/2020 | | | No | 1.46 |
| 37 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2020 | 30/11/2020 | | | No | 1.46 |
| 38 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2020) realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | | No | 1.46 |
| 39 | CIERRE: Acta de terminación de trabajos | 9-Entregables Formales | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 10.0 |
| 40 | EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro Año 2021 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 17.44 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de kilómetros mantenidos | | - | - | - | 01/01/2018 | - |

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 8,850,703.38 ** |
| Costo Total: | 4,564,536.38 |
| Total Devengado: | 6,850,703.38 |
| % Costo Total Devengado: | 150.09 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 150.09 %

Perfil Económico 2020

| | Años Previos | Año Actual (2020) | Años Futuros | Total |
|--|----------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Ppto. Planeado | 8,314,429.38 | 9,170,836.63 | 0.00 | 17,485,266.01 |
| Ppto. Externo Planeado | 2,715,700.52 | 0.00 | 0.00 | 2,715,700.52 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 7,717,368.84 | 2,000,000.00 | 0.00 | 9,717,368.84 |
| Ppto. Codificado | 9,903,447.30 | 2,000,000.00 | 0.00 | 11,903,447.30 |
| Ppto. Comprometido | 4,071,694.62 | 0.00 | 0.00 | 4,071,694.62 |
| Planeado - Codificado (2020) | | 7,170,836.63 | | |
| Programado a Devengar | 9,903,447.30 | 2,000,000.00 | 0.00 | 11,903,447.30 |
| Ppto. Devengado | 6,850,703.38 | 0.00 | 0.00 | 6,850,703.38 |
| Pagado Real | 3,135,506.44 | 0.00 | 0.00 | 3,135,506.44 |
| Estimado a fin de año | * 6,850,703.38 | 0.00 | 0.00 | 6,850,703.38 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 3,052,743.92 | 2,000,000.00 | 0.00 | 5,052,743.92 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 69.17 % | 0.00 % | 0.00 % | 57.55 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 8,034.08 | | 8,034.08 | | | | |

| Presupuesto Mensual 2020 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 8,576.36 | | 16,610.44 | | | | |
| Mar | 132,551.45 | | 149,161.89 | | | | |
| Abr | 208,112.68 | | 357,274.57 | | | | |
| May | 129,732.60 | | 487,007.17 | | | | |
| Jun | 169,732.60 | | 656,739.77 | | | | |
| Jul | 207,768.15 | | 864,507.92 | | | | |
| Ago | 221,936.84 | | 1,086,444.76 | | | | |
| Sep | 316,936.84 | | 1,403,381.60 | | | | |
| Oct | 231,936.84 | | 1,635,318.44 | | | | |
| Nov | 138,936.55 | | 1,774,254.99 | | | | |
| Dic | 225,745.01 | | 2,000,000.00 | | | | |
| Total | 2,000,000.00 | | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 20 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 21 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 22 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |
| 23 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 1 | A.1 Enero 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | A_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_ENERO_2018.pdf | 02/03/2018 |
| 2 | A.2 Febrero 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | A_2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_FEBRERO_2018.pdf | 05/04/2018 |
| 3 | A.3 Marzo 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | A_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTO | 05/04/2018 |
| 4 | A.4 Marzo 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | A_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_MARZO_2018.pdf | 04/05/2018 |
| 5 | A.5 Abril 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | A_5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTO | 05/05/2018 |
| 6 | A.6 Abril 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | A_6_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_ABRIL_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 7 | A.7 Mayo 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | A_7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_MAYO_2018.pdf | 04/07/2018 |
| 8 | A.8 Junio 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | A_8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_JUNIO_2018.pdf | 04/08/2018 |
| 9 | A.9 Julio 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | A_9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_JULIO_2018.pdf | 05/09/2018 |
| 10 | B.1 Agosto 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | B_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_AGOSTO_2018.pdf | 05/10/2018 |
| 11 | B.2 Septiembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | B_2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTO | 05/09/2018 |
| 12 | B.3 Octubre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | B_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_MTO | 05/09/2018 |
| 13 | B.4 Septiembre 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial | B_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_SEPTIEMBRE_2018.pdf | 05/11/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 14 | B.5 Noviembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | B_5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2018.pdf | 05/12/2018 |
| 15 | B.6 Diciembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | B_6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2018.pdf | 05/01/2019 |
| 16 | B.7 Enero 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | B_7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2019.pdf | 05/02/2019 |
| 17 | B.8 Febrero 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | B_8_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2019.pdf | 05/03/2019 |
| 18 | B.9 Marzo 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | B_9_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2019.pdf | 05/04/2019 |
| 19 | C.1 Abril 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | C.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2019.pdf | 05/05/2019 |
| 20 | C.2 Mayo 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | C.2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2019.pdf | 05/06/2019 |
| 21 | C.3 Mayo 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | C.3_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_MAYO_2018.pdf | 03/07/2019 |
| 22 | C.4 Junio 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | C.4_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2019.pdf | 05/07/2019 |
| 23 | C.5 Junio 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | C.5_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_JUNIO_2018.pdf | 05/08/2019 |
| 24 | C.6 Julio 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | C.6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2019.pdf | 05/08/2019 |
| 25 | C.7 Julio 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | C.7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_JULIO_2019.pdf | 05/09/2019 |
| 26 | C.8 Agosto 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | C.8_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2019.pdf | 05/09/2019 |
| 27 | C.9 Agosto 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | C.9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_AGOSTO_2019.pdf | 04/10/2019 |
| 28 | D.1 Septiembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | D.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2019.pdf | 05/10/2019 |
| 29 | D.2 Septiembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | D.2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_SEPTIEMBRE_2019.pdf | 05/11/2019 |
| 30 | D.3 Octubre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | D.3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2019.pdf | 05/12/2019 |
| 31 | D.4 Octubre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | D.4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_OCTUBRE_2019.pdf | 05/12/2019 |
| 32 | D.5 Noviembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | D.5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2019.pdf | 05/12/2019 |
| 33 | D.6 Diciembre 2019 Respaldo Aprobacion Avales Mantenimiento Maquinaria | D.6_AVALES_APROBADOS_MANTENIMIENTO_MAQUINARIA_2019.pdf | 01/12/2020 |
| 34 | D.7 Diciembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial | D.7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2019.pdf | 05/12/2020 |
| 35 | D.8 Noviembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | D.8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_NOVIEMBRE_2019.pdf | 30/01/2020 |
| 36 | D.9 Diciembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial | D.9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTOR_EL_ORO_DICIEMBRE_2019.pdf | 30/01/2020 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---------------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------|
| Altamirano Arias, Fredy Oswaldo | SUBSECRETARIO REGION 7 | Subsecretario Zonal 7 | faltamirano@mtop.gob.ec | |
| Barriga Loaiza, Jorge Antonio | LIDER DEL PROYECTO | Analista de Infraestructura Provincial | jbarriga@mtop.gob.ec | 023974600 |

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------|
| Bazurto Orellana, Pedro | DIRECTOR DISTRITAL | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro | pbazurto@mtop.gob.ec | |
| González Villavicencio, Volter Hernel | COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA | Analista de Infraestructura Provincial 1 | vgonzalez@mtop.gob.ec | 023974600 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|--------------|---------------|
| 125216_1.jpg | 02/03/2018 |
