

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 2**

**Dirección Provincial Orellana**

**PROYECTO: K020 MTOP- Mantenimiento Vial de la Provincia de Orellana**

|                                |   |                                 |  |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto:            | Navarrete Gilces, Silvia Katherine (snavarrete@mtop.gob.ec) |                                 |  |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago                          | Programas Relacionados:         | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, Provincia - Orellana, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular:                       | Lara Mendoza, Richard Patricio                              | Prioridad:                      | 0  |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura   | Retorno Económico:              | 0.00   |
| CUP:                           | 175200000.506.3787  | TIR:                            | 0.00 %   |
| Objetivos Operativos:          | 4   | VAN:                            | 0.00   |
| Viabilidad Técnica:            | Media   | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 19,087,049.29  |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                            |                                 |  |
| Tipo de Ppto. Externo:         |   | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 03/01/2012 - 30/12/2021  |
| Fecha de última actualización: | 05/10/2020  | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2013   |
| Modificado por:                | Navarrete Gilces, Silvia Katherine                          | Fecha del siguiente Hito:       | 30/10/2020   |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCION:**

En vista de la necesidad de dar el mantenimiento a la red estatal de la provincia y constatando las necesidades que esta amerita, nos es posible realizar los trabajos de mantenimiento rutinario, mejoramiento de las señalizaciones tanto horizontales como verticales, reparaciones de daños a la estructura de la vía causados por los fuertes temporales invernales que esta provincia soporta, para lo cual ha sido necesario mejorar las instalaciones del campamento de la Dirección Provincial para dar un mejor servicio a los usuarios, transportistas de dichas vías que están a menester de esta entidad.

**MICROEMPRESAS:**

Las microempresas que laboran dando el mantenimiento de la RVE en la Provincia de Orellana son: CONAPA, DAYUMA, AMAZONICA, NUEVO PARAISO, JUVENIL LORETO, UNION CONSTRUCTORA FLORESTA. AUCA LIBRE, INES ARANGO.

**LINEA BASE DEL PROYECTO:**

La red vial estatal de la Provincia de Orellana actualmente se encuentra asfaltada 214.90 km y tenemos 20.00 km que aun están lastrados y se espera realizar su construcción y así mejorar la movilidad del transporte.

**OBJETIVO GENERAL:**

Mejorar el mantenimiento de las vías a través de las Microempresas con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad permanente.

**PRODUCTO:**

A través de las microempresas se logra obtener que las carreteras estén en buenas condiciones de transitabilidad y de esta manera brindar al usuario un alto confort y seguridad.

**Año 2014: Microempresas contratadas:**

Vía Coca-Dayuma Microempresa Conapa Tramo 00+000 al 23+000 Monto del proyecto : Usd. 68.619.81

Vía Coca-Dayuma Microempresa Dayuma Tramo 23+000 al 46+000 Monto del proyecto : Usd. 68.619.81

Vía Coca-loreto-Huataraco-Limite Napo Tramo Huataraco-Limite Napo Microempresa Union Constructora Floresta Tramo 63+000 al 84+000 Monto del proyecto : Usd. 68.619.81

Vía Coca-Dayuma-Ines Arango -Tiguino-Microempresa Auca Libre Tramo 46+000 al 66+000 Monto del proyecto : Usd. 68.620.00

Vía Coca-Dayuma-Ines Arango -Tiguino Microempresa Ines Arango Tramo 66+000 al 86+000 Monto del proyecto : Usd. 68.620.00

Este proyecto no dispone de Prioridad Senplades porque a partir de este año se ha regularizado a proyectos de inversión y se realizó un Informe de Gestión y un perfil de mantenimiento para su aval y prioridad.

**Beneficios Cualitativos**

Mejorar la infraestructura de las carreteras, para dar un mejor servicio tanto a los usuarios como a los transportes en general de la provincia de Orellana y el país

**Tipo de Beneficiario**

usuarios y transportistas de las vías de la provincia de Orellana y el país

**Restricciones**

**TIEMPO:**


Cumplir con los plazos establecidos en el contrato

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas ejecutor de la rehabilitación de los caminos de la Viabilidad en este caso de Red Vial Estatal, razón por la cual se procede con Contratación de micropresas y proyectos de mantenimiento vial, con la finalidad de tener las vías en buenas condiciones de transitabilidad

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 88.44 %  
 Fecha de Inicio: 03/01/2012 Fecha de Fin: 30/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

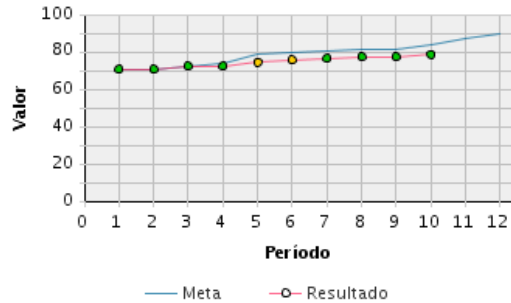

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
| 2020                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 70 %                        | 70 % | 72 % | 74 % | 78 % | 80 % | 80 % | 82 % | 82 % | 84 % | 87 % | 90 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 70 %                        | 70 % | 72 % | 72 % | 74 % | 76 % | 76 % | 78 % | 78 % | 78 % |      |      |
| Estado               |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ▼    | ▼    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                     | Fecha de última actualización |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Septiembre 2020: Durante el mes de septiembre se ha procedido al pago de nominas, se realizo la reforma al Pac, para los procesos de contratación y a la vez se ejecutan los trabajos de Servicio de Mantenimiento Rutinario, y demas actividades   | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 05/10/2020 - 11:21 AM         |
| Agosto 2020: Durante el mes de agosto se ha procedido al pago de nominas, se realizo la reforma al Pac, para los procesos de contratación y a la vez se ejecutan los trabajos de Servicio de Mantenimiento Rutinario, se estan realizando los informes para continuar con los procesos de aval y demas actividades                      | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 04/09/2020 - 02:17 PM         |
| Julio 2020: Durante el mes de julio se ha procedido al pago de nominas, se realizo la reforma al Pac , se ejecutan los trabajos de Servicio de Mantenimiento Rutinario, se estan realizando los informes para continuar con los procesos de aval y demas actividades  | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 05/08/2020 - 07:59 AM         |
| Junio 2020: Durante el mes de junio se ha procedido al pago de nominas, se realizo la reforma al Pac , a fin de poder realizar el proceso de contratación del Servicio de Mantenimiento Rutinario, se realizo a traves de Catalogo Electronico la Contratación  | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 05/07/2020 - 02:45 PM         |
| Mayo 2020: Durante el mes de mayo se ha procedido al pago de nominas, se están realizando la reformas para el el Pac a fin de poder realizar el proceso de contratación del Servicio de Mantenimiento Rutinario, tambien se estan realizando los avales para la colocación de juntas y construccion de cabezales en la RVE de Orellana. | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 05/06/2020 - 01:08 PM         |
| Abril 2020: Durante el mes de abril se ha procedido al pago de nominas, con fecha 30 de abril del 2020 se ha aprobado el aval para el servicios de mantenimiento rutinario con microempresas, para su proceso de contratación.  | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 05/05/2020 - 05:11 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                     | Fecha de última actualización |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Marzo 2020: Durante el mes de marzo se ha procedido al pago de nominas, se ha solicitado la reprogramacion del POA 2020, de la DDO, con el fin de solicitar el aval para el servicios de mantenimiento rutinario con microempresas, se han solicitado los avales de las demas actividades programadas en el POA 2020 y posteriormente su proceso de contratación.   | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 03/04/2020 - 04:31 PM         |
| Febrero 2020: Durante el mes de febrero se ha procedido al pago de nominas, mediante memorando Nro. MTOP-DDO-2020-116-ME se solicito la autorización de aval para el servicios de mantenimiento rutinario con microempresas, se elaboran los informes técnicos para solicitar los avales de las demas actividades programadas en el POA 2020 y posteriormente su proceso de contratación.   | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 03/03/2020 - 12:29 PM         |
| Enero 2020: Durante el mes de enero se ha procedido al pago de nominas, se encuentra en elaboración los informes tecnicos para la contratación de los servicios de mantenimiento y demas actividades programadas en el POA 2020 de mantenimiento para la solicitud de avales  | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 05/02/2020 - 12:42 PM         |
| Diciembre 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizaron las labores finales de mantenimiento rutinario con las microempresas, se trabajo en la colocación de señalización en varios sitios criticos, se realizo bacheo provisional en varios tramos de la RVE, con el personal operativo se trabajo en la limpieza de derrumbes, deslizamientos y además se realiza el monitoreo con la Patrulla de Caminos a fin de precautelar la integridad de los usuarios de la vías.          | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 04/01/2020 - 01:49 PM         |
| Noviembre 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan las labores de mantenimiento rutinario con las microempresas, se trabaja con el personal operativo en la limpieza de derrumbes, deslizamientos y además se realiza el monitoreo con la Patrulla de Caminos a fin de precautelar la integridad de los usuarios de la vías.   | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 05/12/2019 - 12:17 PM         |
| Octubre 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan las labores de mantenimiento rutinario con las microempresas, de igual manera se trabaja con el personal operativo en la limpieza de derrumbes, monitoreo con la Patrulla de Caminos a fin de precautelar la integridad de los usuarios de la vías.   | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 05/11/2019 - 02:04 PM         |
| Septiembre 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan las labores de mantenimiento rutinario con las microempresas, de igual manera se trabaja con el personal operativo en la limpieza de derrumbes y cualquier novedad en las vías, monitoreo con la Patrulla de Caminos a fin de precautelar la integridad de los usuarios de la vías.  | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 04/10/2019 - 10:36 AM         |
| Agosto 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan las labores de mantenimiento rutinario con las microempresas, de igual manera se trabaja con el personal operativo en la limpieza de derrumbes y cualquier novedad en las vías, monitoreo con la Patrulla de Caminos a fin de precautelar la integridad de los usuarios de la vías.  | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 05/09/2019 - 04:29 PM         |
| Julio 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan las labores de mantenimiento rutinario con las microempresas, de igual manera se trabaja con el personal operativo en la limpieza de derrumbes y cualquier novedad en las vías, monitoreo con la Patrulla de Caminos a fin de precautelar la integridad de los usuarios de la vías.   | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 03/08/2019 - 08:35 PM         |
| Junio 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan las labores de mantenimiento rutinario con las microempresas, de igual manera se trabaja con el personal operativo en la limpieza de deslizamientos, y cualquier novedad en las vías, monitoreo con la Patrulla de Caminos a fin de precautelar la integridad de los usuarios de la vías.   | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 05/07/2019 - 08:07 AM         |
| Mayo 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan las labores de mantenimiento rutinario con las microempresas, de igual manera se trabaja con el personal operativo en la limpieza de deslizamientos, y cualquier novedad en las vías. Monitoreo con la Patrulla de Caminos.  | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 04/06/2019 - 08:19 AM         |
| Abril 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizo la Orden de Compra a traves de Catalogo Electronico, para la Contratación de las microempresas, para el mantenimiento a las vías de la RVE-Orellana, se trabaja con el personal operativo en la limpieza de deslizamientos, y cualquier novedad en las vías. Monitoreo con la Patrulla de Caminos  | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 02/05/2019 - 07:23 AM         |
| Marzo 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se cuenta con el aval correspondiente para la Contratación de las microempresas, se estan realizando las respectivas resoluciones para realizar el proceso a través de Catalogo Electrónico y de esta manera dar el mantenimiento a las vías de la RVE-Orellana, pero de igual manera se trabaja con el personal operativo para realizar la limpieza de deslizamientos, y cualquier novedad en las vías. Monitoreo con la Patrulla de Caminos | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 05/04/2019 - 08:11 AM         |
| Febrero 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se esta realizando los informes técnicos a fin de realizar los procesos de Contratación de las microempresas y de esta manera dar el mantenimiento a las vías de la RVE-Orellana, pero de igual manera se trabaja con el personal operativo para realizar la limpieza de deslizamientos, y cualquier novedad en las vías.   | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 06/03/2019 - 08:44 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                     | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| Enero 2019: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se esta realizando los informes técnicos a fin de realizar los procesos de Contratación de las microempresas y de esta manera dar el mantenimiento a las vías de la RVE-Orellana, pero de igual manera se trabaja con el personal operativo para realizar la limpieza de deslizamientos, y cualquier novedad en las vías.                                      | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 05/02/2019 - 02:12 PM         |
| Diciembre 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la Red Vial Estatal de la Provincia de Orellana, se realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demás actividades, con las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo de los eventos y cualquier novedad en las vías con la patrulla de caminos  | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 04/01/2019 - 03:54 PM         |
| Noviembre 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la Red Vial Estatal de la Provincia de Orellana, se realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demás actividades, con las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo de los eventos y cualquier novedad en las vías con la patrulla de caminos  | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 05/12/2018 - 01:37 PM         |
| Octubre 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la Red Vial Estatal de la Provincia de Orellana, se realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demás actividades, con las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo de los eventos y cualquier novedad en las vías con la patrulla de caminos.   | Navarrete Gilces, Silvia Katherine | 05/11/2018 - 11:33 AM         |
| Septiembre 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la Red Vial Estatal de la Provincia de Orellana, se realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demás actividades, con las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos.   | Pita Suarez, Esteban Alejandro     | 04/10/2018 - 12:53 PM         |
| Julio 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la Red Vial Estatal de la Provincia de Orellana, se realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demás actividades, con las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos, s.e realizo el bacheo del tramo Huataraco-limite Napo  | Lara Mendoza, Richard Patricio     | 01/08/2018 - 02:33 PM         |
| Junio 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demás actividades, con las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos.   | Lara Mendoza, Richard Patricio     | 05/07/2018 - 09:52 AM         |
| Mayo 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demas actividades, con las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos, se ha realizado trabajos de señlaización en varios tramos asi como el mantenimiento de tramo lastrado Ines Arango-Tigüino.   | Lara Mendoza, Richard Patricio     | 04/06/2018 - 01:41 PM         |
| Abril 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, con los trabajos de mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y demas actividades, se contrato a las microempresas del sector, de la misma manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos, se ha realizado trabajos de señlaización en varios tramos asi como el mantenimiento de tramo lastrado Ines Arango-Tigüino | Lara Mendoza, Richard Patricio     | 04/05/2018 - 01:20 PM         |
| Marzo 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se contrato a las microempresas con el fin de dar mantenimiento a las vías de la RVE-Orellana.   | Lara Mendoza, Richard Patricio     | 05/04/2018 - 05:02 PM         |
| febrero 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se ha solicitado la emision de aval a fin de contratar las microempresas y de esta manera dar el mantenimiento a las vías de la RVE-Orellana   | Lara Mendoza, Richard Patricio     | 05/04/2018 - 05:02 PM         |
| Enero 2018: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se ha solicitado la emision de aval a fin de contratar las microempresas y de esta manera dar el mantenimiento a las vías de la RVE-Orellana   | Lara Mendoza, Richard Patricio     | 05/03/2018 - 08:39 PM         |
| Diciembre 2017: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realiza el mantenimiento rutinario con las microempresas, de la misma manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías asi mismo se realizan reparaciones provisionales en la RVE.   | Lara Mendoza, Richard Patricio     | 05/01/2018 - 12:46 PM         |
| Noviembre 2017: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realiza el mantenimiento rutinario con las microempresas, de la misma manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías asi mismo se realizan reparaciones provisionales en la RVE.   | Lara Mendoza, Richard Patricio     | 05/12/2017 - 04:20 PM         |
| Octubre 2017: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizo la nueva contratacion por 5 meses de las micropempresas, a fin de que se continue con el  | Lara Mendoza, Richard Patricio     | 03/11/2017 - 04:07 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                           | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| mantenimiento rutinario, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.   |  |                               |
| Septiembre 2017: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizo la nueva contratacion por 5 meses de las micropresas, a fin de que se continúe con el mantenimiento rutinario, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.   | Lara Mendoza,<br>Richard Patricio        | 05/10/2017 -<br>03:58 PM      |
| Agosto 2017: Con el fin de mantener las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizo la nueva contratacion por 5 meses de las micropresas, a fin de que se continúe con el mantenimiento rutinario, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, se esta realizando bacheos en la via Coca-Dayuma-Ines Arango, Huataraco-Limite Napo.  | Lara Mendoza,<br>Richard Patricio        | 05/09/2017 -<br>06:09 PM      |
| Julio 2017: Se realiza el mantenimiento rutinario de las vías que conforman la RVE de Orellana, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, se esta realizando bacheos en la via Coca-Dayuma-Ines Arango, Huataraco-Limite Napo.   | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 05/08/2017 -<br>07:28 PM      |
| Junio 2017: Con fecha 06 de marzo de 2017, se realizo las ordenes de compra para la contratacion de ocho microem presas, a fin de realizar el mantenimiento rutinario de las vías que conforman la RVE de Orellana,, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, se esta realizando bacheos en la via Coca-Dayuma-Ines Arango.   | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 05/07/2017 -<br>11:57 AM      |
| Mayo 2017: Con fecha 06 de marzo de 2017, se realizo las ordenes de compra para la contratacion de ocho microem presas, a fin de realizar el mantenimiento rutinario de las vías que conforman la RVE de Orellana,, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, se han realizado limpieza de derrumbes.  | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 05/06/2017 -<br>03:51 PM      |
| Abril 2017: Con fecha 06 de marzo de 2017, se realizo las ordenes de compra para la contratacion de ocho microem presas, a fin de realizar el mantenimiento rutinario de las vías que conforman la RVE de Orellana,, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, se han realizado limpieza de derrumbes.   | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 04/05/2017 -<br>09:56 PM      |
| Marzo 2017: Con fecha 06 de marzo de 2017, se realizo las ordenes de compra para la contratacion de ocho microem presas, a fin de realizar el mantenimiento rutinario de las vías que conforman la RVE de Orellana, se realizaron trabajos de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, se han realizado limpieza de derrumbes.                 | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 04/04/2017 -<br>09:40 AM      |
| Febrero 2017: se realizaron trabajos de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, se han realizado limpieza de derrumbes.   | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 04/03/2017 -<br>02:23 PM      |
| Enero 2017: se realizaron los trabajos de mantenimiento rutinario con una microempresa, limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.   | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 07/02/2017 -<br>03:09 PM      |
| Diciembre 2016: se realizaron los trabajos de mantenimiento rutinario con una microempresa, limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías, ademas se realizaron trabajos de bacheo en los puentes de la Via Coca Dayuma, asi como trabajos de mantenimiento en asentamientos. bacheo de accesos a puentes y varios tramos de la vi.                  | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 05/01/2017 -<br>06:50 AM      |
| Noviembre 2016: Durante este mes se realizaron los trabajos de mantenimiento rutinario con una microempresa, limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.  | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 05/01/2017 -<br>06:43 AM      |
| Diciembre 2016: Durante el mes de Noviembre se realizaron los trabajos de mantenimiento rutinario con una microempresa, limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.   | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 05/12/2016 -<br>04:18 PM      |
| Octubre 2016: Durante el mes se realizaron los trabajos de mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías. Por parte de la DDO, se realizo la contratación de Microempresas para realizar el mantenimiento rutinario para las vías Coca-Dayuma-Ines Arango-Tiguino y Coca-Joya de los Sachas y tramo Huataraco-Galeras -limite Napo. | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 07/11/2016 -<br>03:12 PM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                                    | Fecha de última actualización    |
|--|---|----------------------------------|
| <p>Noviembre 2016: Durante el mes se realizaron los trabajos de mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías. Por parte de la DDO, se realizó la contratación de Microempresas para realizar el mantenimiento rutinario para las vías Coca-Dayuma-Ines Arango-Tiguino y Coca-Joya de los Sachas y tramo Huataraco-Galeras -limite Napo.</p>  | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>07/11/2016 -<br/>03:10 PM</p> |
| <p>Septiembre 2016: Se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías. Por parte de la DDO, se realizó la contratación de Microempresas para realizar el mantenimiento rutinario para las vías Coca-Dayuma-Ines Arango-Tiguino y Coca-Joya de los Sachas y tramo Huataraco-Galeras -limite Napo. Se realizan trabajos de señalización horizontal en la vía Coca-Dayuma.</p>   | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>05/10/2016 -<br/>04:12 PM</p> |
| <p>Agosto 2016: Se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías. Por parte de la DDO, se realizó la contratación de Microempresas para realizar el mantenimiento rutinario para las vías Coca-Dayuma-Ines Arango-Tiguino y Coca-Joya de los Sachas y tramo Huataraco-Galeras -limite Napo a través del Catalogo Electronico.</p>  | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>07/09/2016 -<br/>01:50 PM</p> |
| <p>Julio 2016: Se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías. Por parte de la DDO, se realizó la contratación de Microempresas para realizar el mantenimiento rutinario para las vías Coca-Dayuma-Ines Arango-Tiguino y Coca-Joya de los Sachas y tramo Huataraco-Galeras -limite Napo a través del Catalogo Electronico.</p>   | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>05/08/2016 -<br/>02:14 PM</p> |
| <p>Junio 2016: Se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías. Por parte de la DDO se están tomando las acciones pertinentes a fin de realizar la contratación de las microempresas para el Mantenimiento Rutinario.</p>   | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>05/07/2016 -<br/>02:26 PM</p> |
| <p>Mayo 2016: Por parte de la DPO se ha realizado la gestión a fin de que las microempresas ingresen dentro del Catalogo Electronico a fin de que sean contratadas para realizar el mantenimiento rutinario de las vías, se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.</p>   | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>07/06/2016 -<br/>11:02 AM</p> |
| <p>Abril 2016: Por parte de la DPO se ha realizado la gestión a fin de que las microempresas ingresen dentro del Catalogo Electronico a fin de que sean contratadas para realizar el mantenimiento rutinario de las vías, se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.</p>  | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>06/05/2016 -<br/>11:13 AM</p> |
| <p>Marzo 2016: Por parte de la DPO se están realizando las gestiones para realizar la contratación de las microempresas y así mantener con mantenimiento rutinario las vías, para el año 2016. , también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.</p>   | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>05/04/2016 -<br/>03:43 PM</p> |
| <p>Febrero 2016: Por parte de la DPO se están realizando las gestiones para realizar la contratación de las microempresas y así mantener con mantenimiento rutinario las vías, para el año 2016. Al momento están trabajando microempresas por medio de convenio de pago, también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.</p>  | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>02/03/2016 -<br/>04:43 PM</p> |
| <p>Enero 2016: Por parte de la DPO se están realizando las gestiones para realizar la contratación de las microempresas y así mantener con mantenimiento rutinario las vías, para el año 2016. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.</p>  | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>11/02/2016 -<br/>10:51 AM</p> |
| <p>Diciembre 2015: Por parte de la DPO se tomaron las acciones pertinentes para realizar la contratación de las microempresas por el lapso de un mes para así mantener con mantenimiento rutinario las vías, se está a la espera que el ministerio de finanzas emita su aval para realizar este proceso de contratación para el año 2016. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.</p> | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>05/01/2016 -<br/>12:17 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                                    | Fecha de última actualización    |
|--|---|----------------------------------|
| <p>Noviembre 2015: Por parte de la DPO se tomaron las acciones pertinentes para realizar la contratación de las microempresas por el lapso de un mes para así mantener con mantenimiento rutinario las vías, se está a la espera que el ministerio de finanzas emita su aval para realizar este proceso de contratación. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos a fin de solventar cualquier eventualidades en las vías.</p>  | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>07/12/2015 -<br/>11:09 AM</p> |
| <p>Octubre 2015: labores el 01 de julio de 2015, y 01 de Octubre de 2015, por parte de la DPO se están tomando las acciones pertinentes para realizar las nuevas contrataciones y de esta manera lograr contratar para así mantener con mantenimiento rutinario las vías, se está a la espera que el ministerio de finanzas emita su aval para realizar este proceso de contratación. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO, de igual manera se realiza el monitoreo con la patrulla de caminos.</p>   | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>04/11/2015 -<br/>04:12 PM</p> |
| <p>Agosto 2015: Los trabajos que corresponden a las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y Huataraco-Limite Provincial Napo terminarán sus labores el 01 de julio de 2015, y 01 de Octubre de 2015, por parte de la DPO se están tomando las acciones pertinentes para realizar las nuevas contrataciones y de esta manera lograr contratar para así mantener con mantenimiento rutinario las vías, se está a la espera que el ministerio de finanzas emita su aval para realizar este proceso de contratación. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, con el personal y equipo de la DPO.</p>   | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>07/10/2015 -<br/>04:29 PM</p> |
| <p>Agosto 2015: Al momento se realizan los trabajos de mantenimiento con dos microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino tramo Dayuma-Inés Arango, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagües y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, cabe indicar que las microempresas que laboran en los tramos Coca-Dayuma y Huataraco-Limite Provincial Napo terminarán sus labores el 01 de julio de 2015, por parte de la DPO se están tomando las acciones pertinentes para realizar las nuevas contrataciones y de esta manera lograr contratar para así mantener con mantenimiento rutinario las vías, se está a la espera que el ministerio de finanzas emita su aval para realizar este proceso de contratación.</p> | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>08/09/2015 -<br/>06:03 PM</p> |
| <p>Julio 2015: Al momento se realizan los trabajos de mantenimiento con dos microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino tramo Dayuma-Inés Arango, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagües y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, limpieza de derrumbes en varios sitios de la Red Vial Estatal, mantenimiento de señalización. Cabe indicar que las microempresas que laboran en los tramos Coca-Dayuma y Huataraco-Limite Provincial Napo terminarán sus labores el 01 de julio de 2015, por parte de la DPO se están tomando las acciones pertinentes para realizar las nuevas contrataciones y de esta manera lograr contratar para así mantener con mantenimiento rutinario las vías.</p>                | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>12/08/2015 -<br/>12:02 PM</p> |
| <p>Junio 2015: Se realizaron los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagües y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, limpieza de derrumbes en varios sitios de la Red Vial Estatal, mantenimiento de señalización. Cabe indicar que las microempresas que laboran en los tramos Coca-Dayuma y Huataraco-Limite Provincial Napo terminarán sus labores el 01 de julio de 2015, por parte de la DPO se están tomando las acciones pertinentes para realizar las nuevas contrataciones.</p>  | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>09/07/2015 -<br/>03:47 PM</p> |
| <p>Mayo 2015: Se realizaron los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagües y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento también se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, limpieza de derrumbes en varios sitios de la Red Vial Estatal, mantenimiento de señalización.</p>   | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>05/06/2015 -<br/>02:13 PM</p> |
| <p>Abril 2015: Se realizaron los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagües y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento también se realizan</p>  | <p>Navarrete<br/>Gilces, Silvia<br/>Katherine</p> | <p>09/05/2015 -<br/>11:47 AM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                           | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| mantenimiento de limpieza de las paradas, derrumbes y reparacion de baches, mantenimiento de señalizacion.  |  |                               |
| Marzo 2015: Durante este mes realizaron los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagues y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento tambien se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener en buen estado estas paradas para beneficio de los usuarios.    | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 06/04/2015 -<br>03:20 PM      |
| Febrero 2015: En este mes se realizaron los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagues y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento tambien se realizan mantenimiento de limpieza de las paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener en buen estado estas paradas para beneficio de los usuarios.    | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 09/03/2015 -<br>09:04 AM      |
| Enero 2015: En este mes se realizaron los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagues y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener en buen estado estas paradas para beneficio de los usuarios.               | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 09/02/2015 -<br>11:42 AM      |
| Diciembre 2014: En este mes se realizaron los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, en los que se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagues y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener en buen estado estas paradas para beneficio de los usuarios.           | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 05/01/2015 -<br>07:14 PM      |
| Noviembre 2014: Los trabajos de mantenimiento con las microempresas de los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, se realizan con normalidad en lo que son las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagues y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener en buen estado estas paradas para beneficio de los usuarios.                   | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 01/12/2014 -<br>10:56 AM      |
| Octubre 2014: Los trabajos de mantenimiento con las microempresas de los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma -Ines Arango- Tiguino, y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, se realizan las labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagues y todas las acciones necesarias para mantener las vías que conforman la red vial estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener en buen estado estas paradas para beneficio de los usuarios.  | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 05/11/2014 -<br>10:10 AM      |
| Septiembre 2014: Los trabajos de mantenimiento con las microempresas de los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma , Y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, se realizan sus labores de mantenimiento rutinario de roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, desagues y todas las acciones necesarias para mejorar las vías de la red vial estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener la vía para beneficio de los usuarios, se realizo la adjudicacion de la contratacion de dos microempresas para el tramo Dayuma-Ines Arango. | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 07/10/2014 -<br>09:07 AM      |
| Agosto 2014: Los trabajos de mantenimiento con las microempresas de los tramos que corresponden a la vía Coca-Dayuma , Y el tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, se estan realizando sus labores de mantenimiento rutinario como son roza a mano., limpieza de cunetas, alcantarillas, desagues, limpieza de taludes y todas las acciones necesarias para mejorar las vías de la red vial estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal   | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 05/09/2014 -<br>02:28 PM      |



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                           | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| de la Direccion Provincial y de esta manera mantener la via para beneficio de los usuarios, se encuentra en proceso de contratacion la construccion de 11 paradas de buses en la red vial estatal de la provincia de Orellana y la contratacion de dos microempresas para el tramo Dayuma-Ines Arango.  |  |                               |
| Julio 2014: Los trabajos de mantenimiento con las microempresas estan ya Adjudicados para de esta manera inicien las labores de mantenimiento rutinario desde el 02/07/2014 y todas las acciones necesarias para mejorarlas vias de la red estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener la via para beneficio de los usuarios, se estan preparando los pliegos para la construccion de 11 paradas de buses en la red vial estatal de la provincia de Orellana.   | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 06/08/2014 -<br>03:18 PM      |
| Junio 2014: Los trabajos de mantenimiento con las microempresas estan ya Adjudicados para de esta manera inicien las labores de mantenimiento rutinario desde el 02/07/2014 y las que se consideren necesarias para mantener las vias de la red estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener la via para beneficio de los usuarios.  | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 08/07/2014 -<br>03:19 PM      |
| Mayo 2014: Los trabajos de mantenimiento con las microempresas estan ya en el portal de Compras Publicas para de esta manera continuar con las labores de mantenimiento rutinario y las que se consideren necesarias para mantener las vias de la red estatal de Orellana. Al momento se realizan el mantenimiento de limpieza de paradas, derrumbes y reparacion de baches por parte del equipo caminero y personal de la Direccion Provincial y de esta manera mantener la via para beneficio de los usuarios.  | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 09/06/2014 -<br>09:38 AM      |
| Abril 2014: Se culminaron con los trabajos de mantenimiento con las microempresas el 15 de Febrero de 2014 para lo cual se esta preparando los pliegos de los procesos de mantenimiento para su nueva contratacion y asi continuar con las labores de mantenimiento rutinario y las que se consideren necesarias para mantener las vias de la red estatal de Orellana Cabe indicar tambien que debido a que se hubo que realizar el pago de un proyecto como es Accesos al nuevo hospital de Puerto Francisco de Orellana, el cual fue es de USD. 863.733.25, lo que sumado con lo anterior supera el monto asignado para este proyecto de mantenimiento vial por lo tanto se debe proveer.   | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 15/05/2014 -<br>11:43 AM      |
| Marzo 2014: Se culminaron con los trabajos de mantenimiento con las microempresas el 15 d e febrero de 2014 para lo cual se esta preparando una nueva contratacion , los trabajos de desmontajes continuan segun el cronograma de trabajos.   | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 29/04/2014 -<br>11:44 AM      |
| <p>Febrero 2014: Se culminaron con los trabajos de mantenimiento con las microempresas el 15 d e febrero de 2014 para lo cual se esta preparando una nueva contratacion , los trabajos de desmontajes continuan segun el cronograma de trabajos, la colocacion de guardavias culminaron, los trabajos de pintura del puente majestuoso rio Napo culminaron .</p> <p>Enero de 2014: Se continuan con los trabajos de mantenimiento con las microempresas cabe indicar que estas terminan su periodo de trabajos en 15 d e febrero de 2014 para lo cual se esta preparando una nueva contratacion , los trabajos de desmontajes continuan segun el cronograma de trabajos.</p> <p>Diciembre 2013: Los trabajos de mantenimiento vial, con microempresas se realizan con normalidad, se continuan los trabajos de igual manera dentro del proyecto de mantenimiento vial se contrato la pintura y limpieza del Puente Nacional Majestuoso Rio Napo, la Colocacion de Guardavias en los accesos a loa nueve puentes de la via Coca-Dayuma</p> <p>Noviembre 2013: Los trabajos de mantenimiento vial, con microempresas se realizan con normalidad, se continuan los trabajos del desmontaje del Puente Napo viejo, de igual manera dentro del proyecto de mantenimiento vial se contrato la pintura y limpieza del Puente Nacional Majestuoso Rio Napo, la Colocacion de Guardavias en los accesos a loa nueve puentes de la via Coca-Dayuma ya que estos puentes solo son d e un solo carril y al momento representan un peligro para los transportistas y usuario de esta via , por lo que se espera la contratacion de los mismos.</p> <p>Octubre 2013: Los trabajos de mantenimiento vial se realizan con normalidad cumpliendo con los cronogramas establecidos, como lo son las microempresas. se realizó la contratación del Desmontaje del Puente Napo viejo el cual se esta ejecutando para seguir con el cronograma establecido y cumplir los trabajos.</p> | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 07/04/2014 -<br>04:03 PM      |
| Septiembre 2013: Dentro de los proyectos de mantenimiento vial tenemos el mantenimiento rutinario de las vias con las microempresas con el roza a mano, limpieza de cunetas , alcantarillas, desagues, al momento se esta por adjudicar un contrato para la colocacion de guardavias en los 9 puentes de la via Coca-Dayuma.  | Navarrete<br>Gilces, Silvia<br>Katherine | 05/11/2013 -<br>09:13 AM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                            | Fecha de última actualización |
|--|---|-------------------------------|
| <p>Agosto 2013: En los proyectos que tenemos de mantenimiento vial tenemos el mantenimiento rutinario de las vias con las microempresas con el roza a mano, limpieza de cunetas , alcantarillas, desagues, se terminaron la reparacion y pintura de dos puentes el Puente Payamino y Coca en la Provincia de Orellana se culminaron los trabajos de colocacion de cinco paradas de buses en la Provincia de Orellana.</p>  | <p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p> | <p>06/09/2013 - 11:38 AM</p>  |
| <p>J ulio 2013:Con el fin de precautelar la via se sigue con los trabajos de mantenimiento con las microempresas en los tramos Coca-Dayuma , Huatraco-Limite Napo, de la misma manera se realizaron los trabajos de mantenimiento y pintura de los puentes coca y payamino , tambien se continuan con la construccion de 5 parada de buses con el fin de precautelar el transito vehicular y para el buen uso del usuario de la via.</p>   | <p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p> | <p>06/08/2013 - 09:41 AM</p>  |
|  | <p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p> | <p>05/07/2013 - 10:01 AM</p>  |
| <p>Junio 2013: En los proyectos que tenemos de mantenimiento vial seguimos con el mantenimiento rutinario de las vias con las microempresas con el roza a mano, limpieza de cunetas , alcantarillas, desagues, de la misma manera estamos con la reparacion y pintura de dos puentes el Puente Payamino y Coca en la Provincia de Orellana los cuales esta abanzando los trabajos para de esta manera cumplir con lo establecido en los cronogramas.<br/>                     Mayo 2013:En los proyectos que tenemos de mantenimiento vial seguimos con el mantenimiento rutinario de las vias con las microempresas con el roza a mano, limpieza de cunetas , alcantarillas, desagues, de la misma manera estamos con la reparacion y pintura de dos puentes el Puente Payamino y Coca en la Provincia de Orellana.</p>   | <p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p> | <p>02/07/2013 - 11:18 AM</p>  |
|  | <p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p> | <p>03/06/2013 - 12:03 PM</p>  |
| <p>Abril 2013: Se siguen con los trabajos de mantenimiento vial en las vias con las microempresas: Conapa, Dayuma en la via Coca-Dayuma y la Floresta enel tramo Huataraco-limite Provincial Napo de la via Coca-Loreto-Limite Provincial Napo, estas microempresas tambien al momento realizan los trabajos de mantenimiento del Puente Nacional Majestuoso Rio Napo en vista de que es una obra emblematica y necesita de este mantenimiento los trabajos de reparacion en la via coca-dayuma estan terminados.<br/>                     Marzo 2013: Se siguen con los trabajos de mantenimiento vial en las vias con las microempresas: Conapa, Dayuma en la via Coca-Dayuma y la Floresta enel tramo Huataraco-limite Provincial Napo de la via Coca-Loreto-Limite Provincial Napo, estas microempresas tambien al momento realizan los trabajos de mantenimiento del Puente Nacional Majestuoso Rio Napo en vista de que es una obra emblematica y necesita de este mantenimiento<br/>                     De la misma manera se continuan con los trabajos de reparacion en los sitios inestables de la via Coca Dayuma</p>  | <p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p> | <p>07/05/2013 - 09:12 AM</p>  |
| <p>Febrero 2013: En este proyecto se contrato para un nuevo periodo a las microempresas Conapa,Dayuma en la via Coca -Dayuma y la microempresa Floresta en la via Coca-Loreto ,tramo Huataraco-Limite Provincial Napo, para el periodo febrero 2013-febrero 2014. Se sigue con los trabajos de reparacion de los sitios inestables en la via Coca -Dayuma, ya esta terminado el del km 11+840y 12+140, los demas siguen su cronograma de trabajos</p>  | <p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p> | <p>01/04/2013 - 03:33 PM</p>  |
| <p>Enero 2013 : :Dentro de los proyectos de mantenimiento vial tenemos se continua con los trabajos de reparacion de los sitios inestables de la via Coca -Dayuma en los tramos 11+840 se ,en el tramo 12+180 de igual manera en el tramo 25+500 se sigue con los trabajos de construccion de los muros de hormigon tenemos tambien el tramo 27+050 y el tramo 27+170 dentro del cual se esta realizando movimientos de tierra , excavacion topografia de igual manera los trabajos de mantenimiento de las microempresas se cumplen<br/>                     Diciembre 2012:Dentro de los proyectos de mantenimiento vial tenemos la reparaciones de los sitios inestables de la via Coca -Dayuma en los tramos 11+840 se empezo con la construcción del campamento, adecuación de letrinas, pozo séptico. se realizaron trabajos de excavación y relleno para estructuras , colocación de geotextil, se coloco material filtrante , tuberías para subdrenes ,en el tramo 12+180 se realizo excavación de material existente, para la colocación y construcción de los muros de gaviones se realizo excavación y relleno para estructuras, de iigual manera en el tramo 25+500 se sigue con los trabajos de construccion de los muros de hormigon en este tramo tambien tenemos los trabajos de mantenimiento de las microempresas las cuales cumplen con su cronograma de trabajos .<br/>                     Noviembre 2012: Al momento se encuentran trabajando las microempresas encargadas del mantenimiento rutinario de la RVE de Orellana tanto en la via Coca-Dayuma como en el tramo Huataraco Limite Provincial Napo, de igual manera se empezo a realizar los trabajos de reparacion en los sitios inestables de la via Coca-Dayuma en las abscisas 11+840 y 12+180, 25+500</p> | <p>Molina Larco, Diego Fernando</p>       | <p>23/02/2013 - 09:11 AM</p>  |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                            | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| <p>Octubre 2012: Al momento se encuentran laborando en el mantenimiento de la Provincia de Orellana las microempresas realizando las labores de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, desagües, también se están realizando trabajos de mantenimiento en el aeropuerto del coca, se está realizando una estabilización y drenajes para la zona de reflexión, además se contrato la construcción de muros y gaviones en la vía coca- dayuma 11+840 y 12+180</p> <p>Septiembre 2012: las microempresas continúan con sus labores de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y así mantener las vías de la RVE en buen estado.</p> <p>Agosto 2012: las microempresas continúan con sus labores de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y así mantener las vías de la RVE en buen estado, la señalización están terminados los trabajos.</p> <p>Julio 2012: Se continúan con los trabajos de mantenimiento rutinario con las microempresas contratadas para cada tramo de vía, realizando los trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, desagües, roza a mano. También tenemos los avances de los trabajos de señalización en la vía Coca- Loreto -Limite Provincial, en el tramo Huataraco-Galeras, de igual manera la señalización de la vía Coca-Dayuma están avanzando los trabajos.</p> <p>Junio 2012: Se continúan con los trabajos de mantenimiento vial, realizando el mantenimiento rutinario de limpieza de cunetas, alcantarillas, desagües, roza a mano y cualquier eventualidad que se presente en la vía. También tenemos los avances de los trabajos de señalización en la vía Coca- Loreto -Limite Provincial, en el tramo Huataraco-Galeras el cual registra un avance de 30% de igual manera la señalización de la vía Coca-Dayuma están avanzando los trabajos.</p> <p>Mayo 2012: Se continúan con los trabajos de mantenimiento vial el cual es realizado por las microempresas contratadas para realizar estos trabajos como son roza a mano, limpieza de cunetas, desagües, alcantarillas, y en caso de deslizamientos también colaboran con la limpieza de ellos. En cuanto a lo de la señalización de la vía, Huataraco-Galeras, ya se encuentra realizando los trabajos, y la vía Coca-Dayuma de igual manera se encuentra realizando los trabajos.</p> <p>Abril 2012: Se continúan con los trabajos de mantenimiento vial el cual es realizado por las microempresas contratadas para realizar estos trabajos como son roza a mano, limpieza de cunetas, desagües, alcantarillas, y en caso de deslizamientos también colaboran con la limpieza de ellos. Los trabajos referente a la Adecuación del Campamento al momento se encuentran paralizados los trabajos debido a que no contamos con información de si la obra continuará o no. En cuanto a lo de la señalización de la vía, Huataraco-Galeras, ya se encuentra adjudicada para su contratación, y la vía Coca-Dayuma de igual manera se encuentra al momento realizando la adjudicación para su debida contratación.</p> <p>Marzo 2012: continúan las labores de mantenimiento vial con las microempresas que realizan estos trabajos en la Provincia de Orellana, en los tramos coca-dayuma, coca-loreto-huataraco-limite provincial napo. coca jivino verde, en cuanto al desmontaje del puente bailey sobre el río suno, ya se encuentra terminado al momento ya presentaron la última planilla para su debida aprobación y para así realizar la recepción provisional de dichos trabajos.</p> <p>Las microempresas que laboran dando el mantenimiento de las vías son: CONAPA, DAYUMA. NUEVO PARAISO. JUVENIL LORETO, AMAZONICA, NUEVA FLORESTA.</p> <p>Febrero 2012: en este mes se continuo con los trabajos de mantenimiento rutinario de los tramos de las vías coca-loreto-huataraco-limite provincial, coca- jivino verde, vía coca- dayuma, de la misma manera se continúa con los trabajos de la adecuación del campamento de la Dirección Provincial de Orellana para de esta manera poder brindarle un mejor servicio al usuario, también se continúa con el desmontaje del puente bailey sobre el río suno,</p> | <p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p> | <p>08/11/2012 - 11:51 AM</p>  |

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

| Riesgo   | Fecha de última actualización | Responsable                              | Probabilidad | Impacto   | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|--|--------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| <p><b>3- REGIONAL. Ambiental.</b><br/>Condiciones Climaticas CAUSARÍAN inconvenientes a las vías</p> | <p>05/10/2020</p>             | <p>Silvia Katherine Navarrete Gilces</p> | <p>20 %</p>  | <p>20</p> | <p>4</p>     | <p>0/1</p>                  |

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

| Localidad de Impacto |  |
|----------------------|--|
| 1                    | Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana |

**HITOS**

|    | Hito  | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | PLANEACION: Documento entregado   | 1-Solicitud de Información | 03/01/2012         |                | 03/01/2012 |          | Sí            | 3.0           |
| 2  | PLANEACION: Proceso en el incop realizado   | 2-Publicación de Pliegos   | 24/01/2012         |                | 24/01/2012 |          | Sí            | 3.0           |
| 3  | PLANEACION: Contrato adjudicado   | 3-Adjudicación             | 03/02/2012         |                | 03/02/2012 |          | Sí            | 4.0           |
| 4  | EJECUCION:desmontaje del Puente Bailey sobre el rio Suno realizado  | 4-Inicio de Trabajo        | 27/02/2012         |                | 27/02/2012 |          | Sí            | 0.5           |
| 5  | EJECUCION:adecuacion del campamento de la Direccion Provincial de Orellana (construccion de oficinas ) 40% realizado  | 5-Entregables Intermedios  | 29/02/2012         |                | 29/02/2012 |          | Sí            | 0.5           |
| 6  | EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 40.3+00de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 50%, realizado                     | 5-Entregables Intermedios  | 30/06/2012         |                | 30/06/2012 |          | Sí            | 0.5           |
| 7  | EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 45+000 de la via coca-jivino verde (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 50%, realizado               | 5-Entregables Intermedios  | 30/06/2012         |                | 30/06/2012 |          | Sí            | 0.5           |
| 8  | EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 83+000 de la via coca-limite provincial con Napo (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 50%, realizado | 5-Entregables Intermedios  | 30/06/2012         |                | 30/06/2012 |          | Sí            | 0.5           |
| 9  | EJECUCION:adecuacion del campamento de la Direccion Provincial de Orellana (construccion de oficinas ) 70%, realizado   | 5-Entregables Intermedios  | 30/08/2012         |                | 30/08/2012 |          | Sí            | 0.5           |
| 10 | EJECUCION:señalizacion horizontal de la via coca - dayuma longitud 40.3 km (pinturas dos franjas blancas y una amarilla ,colocacion de las valizas, tachas reflectivas ), realizado                       | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2012         |                | 30/09/2012 |          | Sí            | 0.5           |
| 11 | EJECUCION:señalizacion horizontal de la via Huataraco-Limite Provincial con Napo longitud 20 km (pinturas dos franjas blancas y una amarilla ,colocacion de las   | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2012         |                | 30/09/2012 |          | Sí            | 0.5           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | valizas, tachas reflectivas ) realizado  |                            |                    |                |            |   |               |               |
| 12 | EJECUCION:Mantenimiento, Estabilizacion y Drenaje de las Zonas de Seguridad de la Pista del Aeropuerto del Coca (100%) realizado   | 5-Entregables Intermedios  | 20/10/2012         |                | 25/11/2012 |    | Sí            | 0.5           |
| 13 | EJECUCION:Construccion de Muros de Gaviones y Obras Anexas en la Via Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 11+840 y 12+180 ( CONTRATISTA : ROSERO LUCERO AQUILES REINALDO) 50% realizado            | 1-Solicitud de Información | 15/11/2012         |                | 15/12/2012 |    | Sí            | 0.5           |
| 14 | EJECUCION:Construccion de Muros de Hormigon y Obras Anexas de Drenaje en la Via Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 25+500 ( CONTRATISTA : JOEL ARIOSTO GONZALEZ CASTRO 25% realizado             | 5-Entregables Intermedios  | 06/12/2012         |                | 06/01/2013 |    | Sí            | 0.5           |
| 15 | EJECUCION:Construccion de Muros de Gaviones y Obras Anexas en la Via Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 11+840 y 12+180 ( CONTRATISTA : ROSERO LUCERO AQUILES REINALDO) 50% realizado            | 1-Solicitud de Información | 16/12/2012         |                | 16/01/2013 |    | Sí            | 0.5           |
| 16 | EJECUCION:adecuacion del campamento de la Direccion Provincial de Orellana (construccion de oficinas ) 100% ejecutado  | 5-Entregables Intermedios  | 30/12/2012         |                | 30/12/2012 |  | Sí            | 0.5           |
| 17 | EJECUCION: Elaboracion e Hincado de Micro Pilotes y otras Obras en la Via Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 27+050 y 27+170 ( CONTRATISTA : INGENIERO JOSE CLIMACO GARCIA GARCIA 50%, realizado | 5-Entregables Intermedios  | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |  | Sí            | 0.5           |
| 18 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 40.3+00de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 100%, ejecutado.                 | 5-Entregables Intermedios  | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |  | Sí            | 0.5           |
| 19 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 45+000 de la via coca-jivino verde (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 100%, ejecutado            | 5-Entregables Intermedios  | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |  | Sí            | 0.5           |
| 20 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 83+000 de la via coca-limite  | 5-Entregables Intermedios  | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |  | Sí            | 0.5           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | provincial con Napo (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 100%, ejecutado   |                            |                    |                |            |   |               |               |
| 21 | EJECUCION: Construcción de Muros de Hormigón y Obras Anexas de Drenaje en la Vía Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 25+500 ( CONTRATISTA : JOEL ARIOSTO GONZALEZ CASTRO 50%, ejecutado                                   | 1-Solicitud de Información | 03/01/2013         |                | 22/02/2013 |    | Sí            | 0.5           |
| 22 | EJECUCION: Construcción de Muros de Hormigón y Obras Anexas de Drenaje en la Vía Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 25+500 ( CONTRATISTA : JOEL ARIOSTO GONZALEZ CASTRO 75%, ejecutado                                   | 5-Entregables Intermedios  | 06/01/2013         |                | 06/02/2013 |    | Sí            | 0.5           |
| 23 | EJECUCION: Elaboración e Hincado de Micro Pilotes y otras Obras en la Vía Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 27+050 y 27+170 ( CONTRATISTA : INGENIERO JOSE CLIMACO GARCIA GARCIA 100%, ejecutado.                       | 5-Entregables Intermedios  | 18/02/2013         |                | 30/03/2013 |    | Sí            | 0.5           |
| 24 | EJECUTADO: Construcción de Muros de Hormigón y Obras Anexas de Drenaje en la Vía Coca Dayuma Provincia de Orellana Abscisas 25+500 ( CONTRATISTA : JOEL ARIOSTO GONZALEZ CASTRO 100%, ejecutado                                  | 1-Solicitud de Información | 22/04/2013         |                | 22/04/2013 |  | Sí            | 0.5           |
| 25 | EJECUCION: Reparación y mantenimiento del Puente sobre el Río Coca ,Provincia de Orellana ( CONTRATISTA VAZGO CONSTRUCCIONES ) 50% , realizado   | 5-Entregables Intermedios  | 26/04/2013         |                | 26/04/2013 |  | Sí            | 0.5           |
| 26 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 63+000 al 83+000 de la vía coca-loreto, tramo Huataraco-Límite Provincial Napo (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 50%, realizado. | 1-Solicitud de Información | 29/06/2013         |                | 29/06/2013 |  | Sí            | 0.5           |
| 27 | EJECUCION: Reparación y mantenimiento del Puente sobre el Río Payamino, Provincia de Orellana ( CONTRATISTA ING. ARTEMIO TORRES ) 50%, realizado   | 1-Solicitud de Información | 29/06/2013         |                | 29/06/2013 |  | Sí            | 0.5           |
| 28 | EJECUCION: Reparación y mantenimiento del Puente sobre el Río Coca ,Provincia de Orellana ( CONTRATISTA  | 5-Entregables Intermedios  | 30/06/2013         |                | 30/06/2013 |  | Sí            | 0.5           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | VAZGO CONSTRUCCIONES )<br>100 %, ejecutado   |                            |                    |                |            |   |               |               |
| 29 | EJECUCION: Construccion de cinco paradas de buses en la Provincia de Orellana (CONTRATISTA VAZQUEZ MALDONADO GUILLERMO OSWALDO 100%), ejecutado  | 1-Solicitud de Información | 15/08/2013         |                | 15/08/2013 |    | Sí            | 0.5           |
| 30 | EJECUCION: Reparacion y mantenimiento del Puente sobre el Rio Payamino,Provincia de Orellana ( CONTRATISTA ING. ARTEMIO TORRES ) 100%, ejecutado   | 1-Solicitud de Información | 15/08/2013         |                | 15/08/2013 |    | Sí            | 0.5           |
| 31 | EJECUCION: Mantenimiento y Pintura del Majestuoso Puente sobre el Rio Napo(Contratista Ingeniero Jaime Acosta 50%), realizado.   | 1-Solicitud de Información | 31/08/2013         |                | 31/08/2013 |    | Sí            | 0.5           |
| 32 | EJECUCION: Servicio de Desmontaje del puente Acrow ddr de 292 metros sobre el Rio Napo cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana ( Contratista: Ingeniero Honorato Vazquez Guerrón 40%), realizado                   | 5-Entregables Intermedios  | 15/12/2013         |                | 15/12/2013 |    | Sí            | 0.5           |
| 33 | EJECUCION: Colocacion de Guardavias en los Accesos a los nueve puentes de la via Coca-Dayuma ( Contratista Ingeniero Milton Lascano 50%), realizado  | 1-Solicitud de Información | 23/12/2013         |                | 30/03/2014 |  | Sí            | 0.5           |
| 34 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 63+000 al 83+000 de la via coca-loreto, tramo Huataraco-Limite Provincial Napo (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 88%, realizado | 5-Entregables Intermedios  | 29/12/2013         |                | 29/12/2013 |  | Sí            | 0.5           |
| 35 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 20+000 de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria)88%, ejecutado.   | 5-Entregables Intermedios  | 30/12/2013         |                | 30/12/2013 |  | Sí            | 0.5           |
| 36 | EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 20+000 de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria)100%, ejecutado  | 1-Solicitud de Información | 31/12/2013         |                | 31/12/2013 |  | Sí            | 0.5           |
| 37 | EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 40+300de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas,   | 1-Solicitud de Información | 31/12/2013         |                | 31/12/2013 |  | Sí            | 0.5           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 88%, ejecutado   |                            |                    |                |            |   |               |               |
| 38 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 40+300 de la vía coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 100%, ejecutado   | 1-Solicitud de Información | 17/02/2014         |                | 17/02/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 39 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 63+000 al 83+000 de la vía coca-loreto, tramo Huataraco-Límite Provincial Napo (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 100%, ejecutado | 1-Solicitud de Información | 30/05/2014         |                | 30/05/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 40 | EJECUCION: Servicio de Desmontaje del puente Acrow ddr de 292 metros sobre el Río Napo cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana (Contratista: Ingeniero Honorato Vazquez Guerrón 100%), realizado                     | 1-Solicitud de Información | 30/05/2014         |                | 30/05/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 41 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo desde 23+000 al 43+000 de la vía coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 50 %, ejecutado.                                  | 1-Solicitud de Información | 02/07/2014         |                | 02/07/2014 |   | Sí            | 0.5           |
| 42 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo desde 23+000 al 43+000 de la vía coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 100 % realizado                                   | 1-Solicitud de Información | 02/07/2014         |                | 31/12/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 43 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo desde 63+000 al 84 +000 de la vía coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 100 %, realizado.                                | 1-Solicitud de Información | 02/07/2014         |                | 02/07/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 44 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo desde 63+000 al 84 +000 de la vía coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 50 %, ejecutado.                                 | 1-Solicitud de Información | 02/07/2014         |                | 02/07/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 45 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo desde la Y del Coca tramo 00+000 al 23+000 de la vía coca-  | 1-Solicitud de Información | 02/07/2014         |                | 31/12/2014 |  | Sí            | 0.5           |



HITOS

|    | Hito  | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 100 %, ejecutado.   |                            |                    |                |            |   |               |               |
| 46 | .EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde el tramo 46+000 al 66+000 de la vía coca-dayuma tramo Dayuma-Ines Arango(roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 100 %, ejecutado.                     | 1-Solicitud de Información | 14/07/2014         |                | 31/12/2014 |    | Sí            | 0.5           |
| 47 | EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde la Y del Coca tramo 00+000 al 23+000 de la vía coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 50 %, ejecutado                                     | 1-Solicitud de Información | 14/07/2014         |                | 14/07/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 48 | EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde el tramo 46+000 al 66+000 de la vía coca-dayuma tramo Dayuma-Ines Arango(roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 50 %, ejecutado.                       | 1-Solicitud de Información | 08/10/2014         |                | 08/10/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 49 | EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde el tramo 66+000 al 86+000 de la vía coca-dayuma - tiguino tramo Ines Arango-Comunidad Andina (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 50 %, ejecutado   | 1-Solicitud de Información | 08/10/2014         |                | 08/10/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 50 | .EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde el tramo 66+000 al 86+000 de la vía Coca-Dayuma-Tiguino- tramo Ines Arango-Comunidad Andina (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 100 %, ejecutado. | 1-Solicitud de Información | 14/10/2014         |                | 14/10/2015 |  | Sí            | 0.5           |
| 51 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 00+000 al 23+000 de la vía coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagües, jardinería) 100%, ejecutado.   | 1-Solicitud de Información | 30/12/2016         |                | 30/12/2016 |  | Sí            | 0.5           |
| 52 | EJECUCION: Servicio de mantenimiento rutinario y conservación vial de la vía coca-Loreto-Huataraco, desde   | 5-Entregables Intermedios  | 30/12/2016         |                | 30/12/2016 |  | Sí            | 0.5           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|    | el tramo 31+500 hasta el km 63+000 en una longitud de 31,5 km.Ejecutado   |  |                    |                |            |          |               |               |
| 53 | EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde el tramo 46+000 al 66+000 de la via coca-dayuma tramo Dayuma-Ines Arango(roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) ejecutado.                        | 5-Entregables Intermedios              | 30/12/2016         |                | 30/12/2016 |          | Sí            | 0.5           |
| 54 | EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde el tramo 63+000 al 84+000 de la via Coca-Loreto-Huataraco-Limite Napo tramo Huataraco-Limite Provincia Napo (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues)ejecutado | 5-Entregables Intermedios              | 30/12/2016         |                | 30/12/2016 |          | Sí            | 0.5           |
| 55 | EJECUCION:mantenimiento rutinario del tramo desde el tramo 66+000 al 86+000 de la via coca-dayuma - tiguinotramo Ines Arango-Comunidad Andina (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria ejecutado      | 5-Entregables Intermedios              | 30/12/2016         |                | 30/12/2016 |          | Sí            | 0.5           |
| 56 | EJECUCIÓN: servicio de mantenimiento rutinario y conservación vial de la vía Coca-Joya de los Sachas - Limite Provincia Sucumbios, desde el tramo00+000 hasta el km 45+000 en una longitud de 45 km, Ejecutado                                  | 5-Entregables Intermedios              | 30/12/2016         |                | 30/12/2016 |          | Sí            | 0.5           |
| 57 | EJECUCION: mantenimiento rutinario del tramo 23+000 al 46+00de la via coca-dayuma (roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y desagues,jardineria) 100%, ejecutado.  | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |          | Sí            | 0.5           |
| 58 | EJECUCION: Servicio de mantenimiento rutinario y conservación vial de la vía coca-Loreto-Huataraco, desde el tramo 00+000 hasta el km 31+500 en una longitud de 31,5 km.Ejecutado   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |          | Sí            | 0.5           |
| 59 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Abril , realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 28/04/2017         |                | 28/04/2017 |          | Sí            | 0.5           |
| 60 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de mayo , realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 31/05/2017         |                | 31/05/2017 |          | Sí            | 0.5           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 61 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Junio , realizado      | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/06/2017         |                | 30/06/2017 |          | Sí            | 0.5           |
| 62 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de julio , realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 28/07/2017         |                | 28/07/2017 |          | Sí            | 0.5           |
| 63 | EJECUCIÓN; Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de para vehículos de la Dirección distrital Orellana para el 2017, mes de julio realizado            | 5-Entregables Intermedios              | 29/07/2017         |                | 29/07/2017 |          | Sí            | 0.5           |
| 64 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Agosto , realizado     | 5-Entregables Intermedios              | 29/08/2017         |                | 29/08/2017 |          | Sí            | 0.5           |
| 65 | EJECUCION: Mantenimiento de Señalización demarcadores retroreflectivos bidireccional lentes rojo -blanco, mes de septiembre realizado                             | 5-Entregables Intermedios              | 29/09/2017         |                | 29/09/2017 |          | Sí            | 0.5           |
| 66 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Noviembre , realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 29/09/2017         |                | 29/09/2017 |          | Sí            | 0.5           |
| 67 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Septiembre , realizado | 5-Entregables Intermedios              | 29/09/2017         |                | 29/09/2017 |          | Sí            | 0.5           |
| 68 | EJECUCIÓN: Reparación de hundimientos en las abscisas 40+300, 46+100, 76+500 en la Vía Coca Dayuma - Inés Arango-Tiguino, mes de septiembre realizado             | 5-Entregables Intermedios              | 29/09/2017         |                | 29/09/2017 |          | Sí            | 0.5           |
| 69 | EJECUCION: Mantenimiento de Señalización demarcadores retroreflectivos bidireccional lentes rojo -blanco, mes de octubre realizado                                | 5-Entregables Intermedios              | 31/10/2017         |                | 31/10/2017 |          | Sí            | 0.5           |
| 70 | EJECUCIÓN: Reparación de hundimientos en las abscisas 79+900, 79+500, 82+300 en la Vía Coca Dayuma -Inés Arango-Tiguino, Octubre realizado                        | 5-Entregables Intermedios              | 31/10/2017         |                | 31/10/2017 |          | Sí            | 0.5           |
| 71 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-  | 5-Entregables Intermedios              | 31/10/2017         |                | 31/10/2017 |          | Sí            | 0.5           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Octubre , realizado   |  |                    |                |            |   |               |               |
| 72 | EJECUCION: Mantenimiento del tramo Inés rango-Tiguino de 20 km lastrado, realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2017         |                | 30/11/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 73 | EJECUCION: Mantenimiento de Señalización pintura de tráfico acrílica a base de agua amarilla y blanco para la señalización horizontal de la rve de Orellana, realizado | 5-Entregables Intermedios              | 29/12/2017         |                | 29/12/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 74 | EJECUCIÓN: Mantenimiento y reparación de maquinaria de la Dirección Distrital Orellana para el 2017, realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 29/12/2017         |                | 29/12/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 75 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Diciembre , realizado       | 5-Entregables Intermedios              | 29/12/2017         |                | 29/12/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 76 | EJECUCION: Reparación de hundimientos en las abscisas 35+200, 36+100, 38+500 en la Vía Coca Dayuma -Inés Arango-Tiguino, realizado                                     | 5-Entregables Intermedios              | 29/12/2017         |                | 29/12/2017 |    | Sí            | 0.5           |
| 77 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Enero , realizado           | 5-Entregables Intermedios              | 30/12/2017         |                | 30/12/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 78 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de Marzo , realizado           | 5-Entregables Intermedios              | 30/12/2017         |                | 30/12/2017 |  | Sí            | 0.5           |
| 79 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de marzo, realizado            | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/03/2018         |                | 30/03/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 80 | EJECUCION: Reparación de hundimientos en las abscisas 17+600, 17+900, 34+300 en la Vía Coca Dayuma -Inés Arango-Tiguino, realizado                                     | 5-Entregables Intermedios              | 30/03/2018         |                | 30/03/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 81 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado           | 5-Entregables Intermedios              | 30/04/2018         |                | 30/04/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 82 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Vía Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas,  | 5-Entregables Intermedios              | 30/05/2018         |                | 30/05/2018 |  | Sí            | 1.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|    | Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado   |                           |                    |                |            |          |               |               |
| 83 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado | 9-Entregables Formales    | 30/06/2018         |                | 30/06/2018 |          | Sí            | 1.0           |
| 84 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2018         |                | 30/07/2018 |          | Sí            | 1.0           |
| 85 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2018         |                | 30/08/2018 |          | Sí            | 1.0           |
| 86 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018         |                | 30/09/2018 |          | Sí            | 1.0           |
| 87 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2018         |                | 30/10/2018 |          | Sí            | 1.0           |
| 88 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018         |                | 30/11/2018 |          | Sí            | 1.0           |
| 89 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de mayo , realizado  | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2018         |                | 30/12/2018 |          | Sí            | 1.0           |
| 90 | EJECUCION: Servicios Personales por Contrato (Contratacion Tecnico grupo 71) mes de Diciembre , realizado  | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2018         |                | 30/12/2018 |          | Sí            | 1.0           |
| 91 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de marzo , realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2019         |                | 01/05/2019 |          | Sí            | 1.0           |
| 92 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril , realizado | 5-Entregables Intermedios | 01/05/2019         |                | 01/05/2019 |          | Sí            | 1.0           |
| 93 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-   | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019         |                | 31/05/2019 |          | Sí            | 1.0           |

HITOS

|     | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|     | Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de mayo , realizado   |                           |                    |                |            |   |               |               |
| 94  | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de junio , realizado      | 5-Entregables Intermedios | 01/07/2019         |                | 01/07/2019 |    | Sí            | 1.0           |
| 95  | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de julio , realizado      | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019         |                | 31/07/2019 |    | Sí            | 1.0           |
| 96  | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de agosto , realizado     | 5-Entregables Intermedios | 30/08/2019         |                | 30/08/2019 |    | Sí            | 1.0           |
| 97  | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de septiembre , realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019         |                | 30/09/2019 |    | Sí            | 1.0           |
| 98  | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de octubre , realizado    | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2019         |                | 30/10/2019 |  | Sí            | 1.0           |
| 99  | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de noviembre , realizado  | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019         |                | 30/11/2019 |  | Sí            | 1.0           |
| 100 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de diciembre , realizado  | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2019         |                | 30/12/2019 |  | Sí            | 1.0           |
| 101 | EJECUCION: Servicios Personales por Contrato (Contratacion Tecnico grupo 71) mes de Diciembre , realizado   | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2019         |                | 30/12/2019 |  | Sí            | 1.0           |
| 102 | EJECUCION: Reparacion y mantenimiento del Puente sobre el Rio Payamino ,Provincia de Orellana , realizado   | 5-Entregables Intermedios | 18/03/2020         |                | 18/03/2020 |  | Sí            | 2.0           |
| 103 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-  | 9-Entregables Formales    | 30/04/2020         |                | 29/05/2020 |  | Sí            | 1.0           |

HITOS

|     | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|     | Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de abril 2020 , realizado  |                           |                    |                |            |   |               |               |
| 104 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de mayo 2020 , realizado       | 9-Entregables Formales    | 29/05/2020         |                | 29/05/2020 |    | Sí            | 1.0           |
| 105 | EJECUCION: Contrato De Asfaltado De La Vía Loreto Puerto Murialdo Km 0+00 Al 10+000, REALIZADO   | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2020         | 30/12/2020     |            |    | No            | 4.0           |
| 106 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de junio 2020 , realizado      | 9-Entregables Formales    | 30/06/2020         |                | 30/06/2020 |    | Sí            | 1.0           |
| 107 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de julio 2020 , realizado      | 9-Entregables Formales    | 31/07/2020         |                | 31/07/2020 |    | Sí            | 1.0           |
| 108 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de agosto 2020 , realizado     | 9-Entregables Formales    | 31/08/2020         |                | 31/08/2020 |  | Sí            | 1.0           |
| 109 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de septiembre 2020 , realizado | 9-Entregables Formales    | 01/10/2020         |                | 01/10/2020 |  | Sí            | 1.0           |
| 110 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de octubre 2020 , realizado    | 9-Entregables Formales    | 30/10/2020         | 30/10/2020     |            |  | No            | 1.0           |
| 111 | EJECUCION: Contrato De Reparación de Puntos Críticos, en Varios Tramos Coca Dayuma, Coca-Loreto-Huataraco-Limite Napo, Realizado                                       | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2020         | 30/11/2020     |            |  | No            | 2.5           |
| 112 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de noviembre 2020 , realizado  | 9-Entregables Formales    | 30/11/2020         | 30/11/2020     |            |  | No            | 1.0           |

HITOS

|     | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 113 | EJECUCION: Contrataciones Varias, realizadas   | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2020         | 30/12/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 114 | EJECUCION: Mantenimiento vial de la Via Coca-Dayuma-Inés Arango-Tiguino, Coca-Joya de los Sachas, Coca.Loreto-Huataraco-Limite Napo mes de diciembre 2020 , realizado                | 9-Entregables Formales    | 30/12/2020         | 30/12/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 115 | EJECUCION: Reparacion y mantenimiento del Puente sobre el Suno, Coca,Provincia de Orellana, relizado   | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2020         | 30/12/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 116 | CIERRE: Acta de Entrega de Recepción Definitiva, Suscrita  | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2021         | 30/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 117 | CIERRE: Acta de Entrega de Recepción Provisional, Suscrita   | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2021         | 30/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 118 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago, Suscrito. | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2021         | 30/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 119 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, Suscrito.   | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2021         | 30/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 120 | CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios contables o de tesorería pendientes por liquidar, Suscrito.  | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2021         | 30/12/2021     |            |          | No            | 1.5           |
| 121 | CIERRE: Cierre de proyecto según formato SENPLADES, aprobado   | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2021         | 30/12/2021     |            |          | No            | 2.0           |
| 122 | CIERRE: Informes de Fiscalización, aprobados   | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2021         | 30/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 123 | CIERRE: Liquidación Económica, aprobada  | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2021         | 30/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 124 | CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad, aprobado   | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2021         | 30/12/2021     |            |          | No            | 0.5           |
| 125 | COMPLETADO   | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2021         | 30/12/2021     |            |          | No            | 0.0           |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS


|   | Supervisión                                   | Supervisor                      | Organización Supervisora    | Fecha de creación |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Obra en ejecución en la Provincia de Orellana | Guevara Yáñez, Mónica Alexandra | {PR} - Provincia - ORELLANA | 24/12/2015        |
| 2 | Obra en ejecución en la Provincia de Orellana | Guevara Yáñez, Mónica Alexandra | {PR} - Provincia - ORELLANA | 22/10/2015        |
| 3 | Obra en ejecución en la Provincia de Orellana | Guevara Yáñez, Mónica Alexandra | {PR} - Provincia - ORELLANA | 24/09/2015        |
| 4 | OBRA EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA | Obando Morales, Santa Felicita  | {PR} - Provincia - ORELLANA | 20/07/2015        |
| 5 | Obra en ejecución en la Provincia de Orellana | Obando Morales, Santa Felicita  | {PR} - Provincia - ORELLANA | 18/08/2015        |



**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

|    | Supervisión   | Supervisor                        | Organización Supervisora    | Fecha de creación |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 6  | PROYECTO EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA   | Obando Morales, Santa Felicita    | {PR} - Provincia - ORELLANA | 21/05/2015        |
| 7  | TRAMO COCA - DAYUMA VIA EN MAL ESTADO   | Obando Morales, Santa Felicita    | {PR} - Provincia - ORELLANA | 12/12/2014        |
| 8  | MANTENIMIENTO DEL TRAMO COCA-DAYUMA   | Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente | {PR} - Provincia - ORELLANA | 26/08/2014        |
| 9  | PROYECTO NO EJECUTADO AL 100%   | Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente | {PR} - Provincia - ORELLANA | 03/06/2014        |
| 10 | Verificar el avance de la obra.   | Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente | {PR} - Provincia - ORELLANA | 17/03/2014        |
| 11 | Verificación del proyecto en el tramo Coca-Dayuma.  | Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente | {PR} - Provincia - ORELLANA | 01/04/2014        |
| 12 | Avance de los obras   | Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente | {PR} - Provincia - ORELLANA | 29/12/2013        |
| 13 | Rosario Cortez  | Cortez Rodriguez, Doriz Rosario   | {PR} - Provincia - ORELLANA | 06/08/2013        |
| 14 | Historico - En la visita realizada el día de ayer 25 de julio de 2012 en la vía Coca-Lago Agrio se constato el grupo de trabajo que se encuentra cerrando grietas y fisuras en la capa asfáltica, | Cortez Rodriguez, Doriz Rosario   | {PR} - Provincia - ORELLANA | 25/07/2012        |
| 15 | Historico - Avanza el rebacheo de la via coca- limite provincial con Napo, sin embargo faltan algunos baches que ya estan preparados para ser parchados..   | Cortez Rodriguez, Doriz Rosario   | {PR} - Provincia - ORELLANA | 10/03/2012        |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador   | Estado  | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentajes de mantenimiento de la Red Vial Estatal de Orellana en buen estado. |  | 102.30 %          | 70   | 71.61                 | 01/01/2014      | Septiembre                 |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 19,087,049.29 ** |
| Costo Total:                  | 46,713,335.47    |
| Total Devengado:              | 17,157,947.89    |
| % Costo Total Devengado:      | 36.73 %          |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 36.73 %

Perfil Económico 2020

|   | Años Previos    | Año Actual (2020) | Años Futuros | Total         |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado  | 13,636,735.69   | 5,302,129.29      | 0.00         | 18,938,864.98 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 17,227,965.24   | 2,000,000.00      | 0.00         | 19,227,965.24 |
| Ppto. Codificado  | 19,711,797.56   | 2,775,049.06      | 0.00         | 22,486,846.62 |
| Ppto. Comprometido                                      | 18,388,367.31   | 1,643,724.51      | 0.00         | 20,032,091.82 |
| Planeado - Codificado (2020)                            |                 | 2,527,080.23      |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 18,450,957.36   | 2,775,049.06      | 0.00         | 21,226,006.42 |
| Ppto. Devengado   | 16,312,000.23   | 845,947.66        | 0.00         | 17,157,947.89 |
| Pagado Real   | 13,038,276.05   | 348,403.59        | 0.00         | 13,386,679.64 |
| Estimado a fin de año                                   | * 16,312,000.23 | 0.00              | 0.00         | 16,312,000.23 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 2,138,957.13    | 2,775,049.06      | 0.00         | 4,914,006.19  |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 88.41 %       | 30.48 %           | 0.00 %       | 80.83 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 1,767,834.78    | 0.00              | 0.00         | 1,767,834.78  |
| Ppto. Devengado 998                                     | 1,575,571.50    | 0.00              | 0.00         | 1,575,571.50  |

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

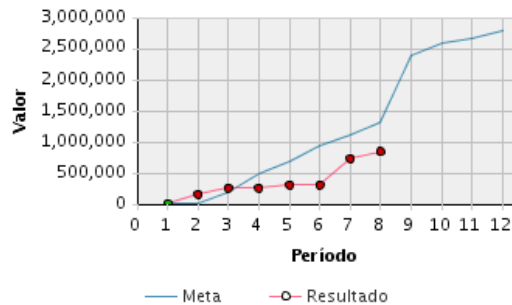

Presupuesto Mensual 2020

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 3,411.22                   | 3,411.22            | 3,411.22                     | 3,411.22              | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 0.12 %       |

| Presupuesto Mensual 2020 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 3,670.38                   | 152,591.33          | 7,081.60                     | 156,002.55            | 2,202.93 %       |        | 5.62 %       |
| Mar                      | 183,105.86                 | 102,537.72          | 190,187.46                   | 258,540.27            | 135.94 %         |        | 9.32 %       |
| Abr                      | 290,643.91                 | 259.16              | 480,831.37                   | 258,799.43            | 53.82 %          |        | 9.33 %       |
| May                      | 194,911.27                 | 43,829.12           | 675,742.64                   | 302,628.55            | 44.78 %          |        | 10.91 %      |
| Jun                      | 268,320.87                 | 259.16              | 944,063.51                   | 302,887.71            | 32.08 %          |        | 10.91 %      |
| Jul                      | 174,415.74                 | 423,511.48          | 1,118,479.25                 | 726,399.19            | 64.95 %          |        | 26.18 %      |
| Ago                      | 189,729.19                 | 119,548.47          | 1,308,208.44                 | 845,947.66            | 64.66 %          |        | 30.48 %      |
| Sep                      | 1,091,620.80               |                     | 2,399,829.24                 |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 185,836.27                 |                     | 2,585,665.51                 |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 87,340.56                  |                     | 2,673,006.07                 |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 102,042.99                 |                     | 2,775,049.06                 |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>2,775,049.06</b>        | <b>845,947.66</b>   |                              |                       |                  |        |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |   |
|----------------------|---|
| 16                   | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 17                   | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.   |
| 18                   | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.                      |
| 19                   | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.                                    |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo  | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---------|---------------|
| 1  | Fotografías Señalización Coca-Dayuma  | C.9.pdf | 08/04/2014    |
| 2  | Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de mantenimiento vial          | G.8.pdf | 28/12/2016    |
| 3  | Actividades de las Microempresas  | D.1.pdf | 08/04/2014    |
| 4  | Actividades de las Microempresas  | A.8.pdf | 08/04/2014    |
| 5  | Actividades y fotografías de microempresas                                  | C.5.pdf | 08/04/2014    |
| 6  | Actividades y fotografías Señalización                                      | A.7.pdf | 08/04/2014    |
| 7  | Asociación de Hitos 6,7,8,18,19,20 Actividades de las Microempresas         | A.3.pdf | 08/04/2014    |
| 8  | Asociación Hito 10 Fotografías Señalización                                 | A.5.pdf | 08/04/2014    |
| 9  | Asociación Hito 11 Fotografías Señalización Huataracolímite provincial Napo | A.6.pdf | 08/04/2014    |
| 10 | Asociación Hito 4 Fotografías Desmontaje Suno                               | A.2.pdf | 08/04/2014    |
| 11 | Asociación Hito 4 Informes Sitop Desmontaje Suno                            | A.1.PDF | 08/04/2014    |
| 12 | Asociado con el hito 13.15 Actividades trabajos 11+180                      | A.9.pdf | 08/04/2014    |
| 13 | Asociado con el hito 13.15 Actividades trabajos 11+840                      | C.1.pdf | 08/04/2014    |
| 14 | Asociado con el hito 14.22.23.25 Actividades trabajos 25+500                | C.2.pdf | 08/04/2014    |
| 15 | Asociado con el hito 14.22.23.25 Actividades trabajos 25+500                | D.2.pdf | 08/04/2014    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 16 | Asociado con el hito 26.29 Actividades trabajos pintura Rio Coca   | C.6.pdf  | 08/04/2014    |
| 17 | Asociado con el hito 26.29 Actividades trabajos pintura Rio Coca   | C.8.pdf  | 08/04/2014    |
| 18 | Asociado con el hito 26.29 Actividades trabajos pintura Rio Coca   | C.3.pdf  | 08/04/2014    |
| 19 | Asociado con el hito 27.30 Actividades trabajos de Pintura Rio Payamino  | C.4.pdf  | 08/04/2014    |
| 20 | Asociado con el hito 32.Actividades trabajos pintura Puente Napo   | D.3.pdf  | 08/04/2014    |
| 21 | Asociado con el hito 33.41 Actividades trabajos desmontaje napo  | D.4.PDF  | 08/04/2014    |
| 22 | Autorización para ampliación de fecha fin año 2020   | MTOP-CGP-2020-75-ME_autorizacion_ampliar_fecha_de_fin_proyectos_PAI_2020_Orellana_con_anexos.pdf | 27/01/2020    |
| 23 | AVAL APROBADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO RVE 2020   | J.3.pdf  | 05/05/2020    |
| 24 | Cedula de mantenimiento vial julio 2020  | J.7.pdf  | 05/08/2020    |
| 25 | Cedula de mantenimiento vial junio 2020  | J.6.pdf  | 05/07/2020    |
| 26 | Cedula Presupuestaria Abril 2020   | J.1.pdf  | 05/05/2020    |
| 27 | Cedula presupuestaria enero 2020   | I.7.pdf  | 05/02/2020    |
| 28 | Cedula Presupuestaria febrero 2020   | I.8.pdf  | 03/03/2020    |
| 29 | Cedula Presupuestaria MANTENIMIENTO VIAL Agosto 2020   | J.8.pdf  | 04/09/2020    |
| 30 | Cedula Presupuestaria Mantenimiento Vial Orellana.   | H.2.PDF  | 12/06/2019    |
| 31 | Cedula Presupuestaria Marzo 2020   | I.9.pdf  | 03/04/2020    |
| 32 | Cedula presupuestaria mayo 2020  | J.2.pdf  | 05/06/2020    |
| 33 | Cedula Presupuestaria Noviembre 2019   | H.4.pdf  | 16/12/2019    |
| 34 | Cedula Presupuestaria OCTUBRE 2019   | Cedula_presupuestaria_octubre_2019_orellana.pdf  | 05/11/2019    |
| 35 | Cedula Presupuestaria Orellana 2012 Mensualizada   | devengado_mantenimiento_vial_orellana_2012.pdf   | 09/01/2020    |
| 36 | Cedula Presupuestaria Orellana 2013 Mensualizada   | devengado_mantenimiento_vial_orellana_2013.pdf   | 09/01/2020    |
| 37 | Cedula Presupuestaria Orellana 2014 Mensualizada   | devengado_mantenimiento_vial_orellana_2014.pdf   | 09/01/2020    |
| 38 | Cedula Presupuestaria Orellana 2015 Mensualizada_programa 25   | devengado_mantenimiento_vial_orellana_2015_programa_25.pdf                                       | 09/01/2020    |
| 39 | Cedula Presupuestaria Orellana 2015 Mensualizada_programa 56   | devengado_mantenimiento_vial_orellana_2015_programa_56.pdf                                       | 09/01/2020    |
| 40 | Cedula Presupuestaria Orellana 2016 Mensualizada   | devengado_mantenimiento_vial_orellana_2016.pdf   | 09/01/2020    |
| 41 | Cedula Presupuestaria Orellana 2017 Mensualizada   | devengado_mantenimiento_vial_orellana_2017.pdf   | 09/01/2020    |
| 42 | Cedula Presupuestaria Orellana 2018 Mensualizada   | devengadado_mantenimiento_vial_orellana_2018.pdf   | 09/01/2020    |
| 43 | Cedula Presupuestaria Orellana 2019 Mensualizada   | cedula_presupuestaria_mantenimiento_vial_orellana_2019_mensualizada.pdf                          | 09/01/2020    |
| 44 | Cedulas presupuestarias mantenimiento vial septiembre 2019   | H.3.PDF  | 04/10/2019    |
| 45 | CERTIFICACION APROBADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO RVE 2020                                    | J.5.pdf  | 05/05/2020    |
| 46 | CERTIFICACIÓN DE PLANIFICACIÓN (CP-104-2020) SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ORELLANA MTOP-CGP-2020-586-ME | J.2.pdf  | 05/05/2020    |
| 47 | Contratos de Mantenimiento Vial  | G.6.pdf  | 28/12/2016    |
| 48 | Cronograma valorado por componentes y sus devengados desde eel año 2009  | G.2.xls  | 05/09/2015    |
| 49 | Ficha del Proyecto Mantenimiento vial  | F.9.doc  | 05/09/2015    |
| 50 | Fotografias de los trabajos realizados Pintura Puente Napo   | D.6.pdf  | 08/04/2014    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---------|---------------|
| 51 | Fotografías de trabajos de Mantenimiento Rutinario microempresas Julio 2014                        | E.2.pdf | 06/08/2014    |
| 52 | Gestion de Contratación de Microempresas Riesgo cumplido   | H.5.pdf | 04/01/2020    |
| 53 | Informe de Gestión Mantenimiento vial para aval del MCPEC  | G.1.PDF | 05/09/2015    |
| 54 | Informe de los trabajos de Mantenimiento vial Agosto 2016  | G.5.PDF | 07/09/2016    |
| 55 | Informe de Mantenimiento Vial Diciembre 2016.  | H.1.1   | 05/01/2017    |
| 56 | Informe de mantenimiento vial septiembre 2016  | G.6.PDF | 05/10/2016    |
| 57 | Informe de microempresas 2019  | H.1.pdf | 04/10/2019    |
| 58 | Informe de Sitop Abril 2015  | F.5.PDF | 09/05/2015    |
| 59 | Informe de Sitop Agosto 2015   | G.3.PDF | 08/09/2015    |
| 60 | Informe de Sitop Julio 2015  | F.8.PDF | 05/09/2015    |
| 61 | Informe de Sitop Junio 2015  | F.7.PDF | 09/07/2015    |
| 62 | Informe de Sitop Mayo 2015   | F.6.PDF | 05/06/2015    |
| 63 | Informe de Sitop Septiembre 2014.  | E.3.PDF | 09/10/2014    |
| 64 | Informe de Sitop Septiembre 2015   | G.4.PDF | 07/10/2015    |
| 65 | Informe de Termino de Mutuo Acuerdo con las Microempresas JUVENIL LORETO, AMAZONICA, NUEVO PARAISO | C.7.pdf | 08/04/2014    |
| 66 | Informe de trabajos de Mantenimiento Vial RVE-Orellana 2016  | H.1.pdf | 28/12/2016    |
| 67 | Informe Ejecutivo Sitop Noviembre 2014.  | E.5.PDF | 03/12/2014    |
| 68 | Informe Sitop 2012   | A.4.PDF | 08/04/2014    |
| 69 | Informe Sitop 2013   | D.5.PDF | 08/04/2014    |
| 70 | Informe Sitop 2014   | D.8.PDF | 08/04/2014    |
| 71 | Informe Sitop año 2014   | D.9.pdf | 29/05/2014    |
| 72 | Informe Sitop Diciembre 2014 Mantenimiento Vial Auca Libre   | F.1.pdf | 05/01/2015    |
| 73 | Informe Sitop Diciembre 2014 Mantenimiento Vial Conapa   | E.6.pdf | 05/01/2015    |
| 74 | Informe Sitop Diciembre 2014 Mantenimiento Vial Dayuma   | E.7.pdf | 05/01/2015    |
| 75 | Informe Sitop Diciembre 2014 Mantenimiento Vial Floresta   | E.8.pdf | 05/01/2015    |
| 76 | Informe Sitop Diciembre 2014 Mantenimiento Vial Ines Arango  | E.9.pdf | 05/01/2015    |
| 77 | Informe Sitop Febrero 2015   | F.3.PDF | 10/03/2015    |
| 78 | Informe Sitop Marzo 2015   | F.4.PDF | 06/04/2015    |
| 79 | Informes de Sitop Agosto 2014 mantenimiento vial Microempresas                                     | E.2.PDF | 05/09/2014    |
| 80 | Informes de Sitop Julio 2014   | E.1.PDF | 06/08/2014    |
| 81 | Informes Sitop Mantenimiento vial enero 2015.  | F.2.PDF | 09/02/2015    |
| 82 | Informes Sitop mes de Octubre 2014   | E.4.PDF | 05/11/2014    |
| 83 | Memorando MTOP-FINAN _ORE-2020-20-ME, CERTIFICACION MANTENIMIENTO MICROEMPRESAS 2020               | J.4.pdf | 05/05/2020    |
| 84 | Oredenes de Compra para realizar el Mantenimiento Rutinario de la RVE-Orellana                     | G.7.pdf | 28/12/2016    |
| 85 | Oredenes de Compra para realizar el Mantenimiento Rutinario de la RVE-Orellana Dcbre 2016          | G.9.pdf | 28/12/2016    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                             | Rol                                      | Puesto   | Correo Electrónico     | Teléfono(s)          |
|------------------------------------|--|--|------------------------|----------------------|
| Lara Mendoza, Richard Patricio     | Administrador del Proyecto               | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Orellana, Encargado | rlara@mtop.gob.ec      | 023974600            |
| Navarrete Gilces, Silvia Katherine | Supervisor del proyecto - Líder Proyecto | Analista de Infraestructura Provincial 1                                 | snavarrete@mtop.gob.ec | 023974600            |
| Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago | Patrocinador Ejecutivo                   | Subsecretario Zonal 2  | rramirez@mtop.gob.ec   |                      |
| VALENCIA CORRALES, RUBEN DARIO     | Supervisor Financiero                    | SUPERVISOR FINANCIERO  | rvalencia@mtop.gob.ec  | 062860951 ext. 23805 |

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

| Archivo     | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 30004_1.jpg | 05/07/2018    |
