

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 5**  
**Dirección Provincial Bolívar**

**PROYECTO: K009** MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de Bolívar

|                                |  |                                 |  |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto:            | Pungaña Zaruma, Sergio Washington (spungana@mtop.gob.ec) |                                 |  |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Berrezueta Velez, Gustavo David                          | Programas Relacionados:         | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, Provincia - Bolivar |
| Titular:                       | Yacchirema Chimbo, Juan Carlos                           | Prioridad:                      | 0  |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura  | Retorno Económico:              | 0.00   |
| CUP:                           | 175200000.506.3664                                       | TIR:                            | 0.00 %   |
| Objetivos Operativos:          | 4  | VAN:                            | 0.00   |
| Viabilidad Técnica:            | Alta   | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 19,331,148.23  |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                         |                                 |  |
| Tipo de Ppto. Externo:         |  | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 04/01/2012 - 31/12/2021  |
| Fecha de última actualización: | 28/12/2021   | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2013   |
| Modificado por:                | Yacchirema Chimbo, Juan Carlos                           | Fecha del siguiente Hito:       | 31/12/2021   |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN**

Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de Bolívar.

**PRODUCTO/SERVICIO**

Carreteras de la Red Vial Estatal que unen a los cantones de la provincia Bolívar, mantenida, mejorada y señalizada óptima para la circulación vehicular.

**LÍNEA BASE**

Ante la necesidad de mantener las carreteras de la Red Vial Estatal de la Provincia Bolívar en un nivel óptimo y prestando los niveles de servicio con estándares vigentes se realiza el mantenimiento rutinario y emergente de las diferentes vías, esto para fomentar el turismo, la producción agrícola y por ende mejorando la calidad de vida de los pobladores.

**OBJETIVO GENERAL**

Mantener niveles de servicio óptimos de las vías de la Red Estatal para la circulación Vehicular.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Garantizar la inversión del Estado.  
 Garantizar la permanencia de un alto nivel de servicio, en las carreteras correspondientes a esta Cartera de Estado.  
 Mantener la señalización Horizontal y vertical para mejorar la visibilidad y velocidad de circulación  
 Garantizar la libre circulación vehicular.

OBJETO: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de Bolívar.

MONTO TOTAL DEL PROYECTO: 1`526.123,31

MANTENIMIENTO EMERGENTE EN EJECUCIÓN

CONTRATISTAS:


**DATOS GENERALES**

|  |
|--|
| <b>Descripción</b>   |
| CONSTRUCTORA CONSPIBERSA S.A.: CONTRATO DE OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA E-491 TRAMO: GUARANDA BALZAPAMBA DE 77.30 KM.<br><br>RODRIGUEZ & MANCHENO INGENIEROS ASOCIADOS: CONTRATO DE OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA E-494, TRAMO: ECHEANDÍA-VENTANAS DE 27.00 KM DE LONGITUD.<br><br>SEMEG CIA. LTDA.: CONTRATO DE OBRA DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA E-495 TRAMO SAN PABLO - CHILLANES - BUCAY DE 76.00 DE LONGITUD PROVINCIA DE BOLÍVAR |
| <b>Beneficios Cualitativos</b>   |
| Red vial estatal en buen estado.<br>Circulación de vehículos sin riesgos, ni problemas.  |
| <b>Tipo de Beneficiario</b>  |
| Comercio<br>Turístico<br>Social<br>Industrial<br>Agropecuario  |
| <b>Restricciones</b>   |
| COSTO: Falta de asignación Presupuestaria.   |

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
Fecha de Inicio: 04/01/2012      Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

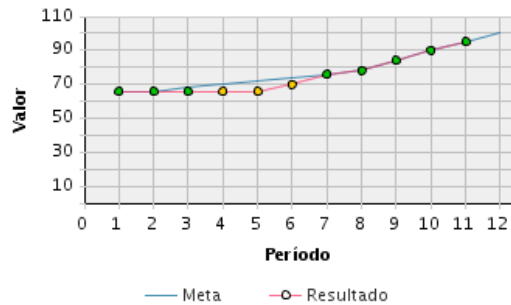

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2021                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 66 %                        | 66 % | 68 % | 70 % | 72 % | 74 % | 76 % | 78 % | 84 % | 90 % | 95 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 66 %                        | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 70 % | 76 % | 78 % | 84 % | 90 % | 95 % |       |
| Estado               |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ▼    | ▼    | ▼    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |       |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>NOVIEMBRE 2021</p> <p>- Se realizan trabajos de mantenimiento preventivo, por administración directa y microempresas de conservación vial.</p> <p>Urgente asignar recursos económicos para atender las Carreteras:<br/>- Ambato - Guaranda (Mantenimiento Carpeta Asfáltica y Señalización - Urgente),</p> | Yacchirema Chimbo, Juan Carlos | 03/12/2021 - 10:01 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guanujo - Echeandía (Atención de Puntos Críticos),</li> <li>- Guaranda - Balzapamba (Mantenimiento Carpeta asfáltica, Señalización, Atención de Puntos Críticos),</li> <li>- Chillanes - Bucay (Atención de puntos críticos, colocación de arpetas asfálticas 10 km),</li> <li>- Salinas - Simiatug (Doble tratamiento deteriorado y mantenimiento de señalización).</li> </ul>   |                                 |                               |
| <p><b>OCTUBRE 2021</b></p> <p>Se realizan trabajos de mantenimiento preventivo, por administración directa y microempresas de conservación vial.<br/>Urgente asignar recursos económicos para atender las Carreteras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambato - Guaranda (Mantenimiento Carpeta Asfáltica y Señalización - Urgente),</li> <li>- Guanujo - Echeandía (Atención de Puntos Críticos),</li> <li>- Guaranda - Balzapamba (Mantenimiento Carpeta asfáltica, Señalización, Atención de Puntos Críticos),</li> <li>- Chillanes - Bucay (Atención de puntos críticos, colocación de arpetas asfálticas 10 km),</li> <li>- Salinas - Simiatug (Doble tratamiento deteriorado y mantenimiento de señalización).</li> </ul>  | Yacchirema Chimbo, Juan Carlos  | 04/11/2021 - 04:28 PM         |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2021</b></p> <p>Se realizan trabajos de mantenimiento preventivo, por administración directa y microempresas de conservación vial.<br/>Urgente asignar recursos económicos para atender las Carreteras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambato - Guaranda (Mantenimiento Carpeta Asfáltica y Señalización - Urgente),</li> <li>- Guanujo - Echeandía (Atención de Puntos Críticos),</li> <li>- Guaranda - Balzapamba (Mantenimiento Carpeta asfáltica, Señalización, Atención de Puntos Críticos),</li> <li>- Chillanes - Bucay (Atención de puntos críticos, colocación de arpetas asfálticas 10 km),</li> <li>- Salinas - Simiatug (Doble tratamiento deteriorado y mantenimiento de señalización).</li> </ul>   | Yacchirema Chimbo, Juan Carlos  | 04/10/2021 - 02:19 PM         |
| <p><b>AGOSTO 2021</b></p> <p>Se realizan trabajos de mantenimiento preventivo, por administración directa y microempresas de conservación vial. Urgente asignar recursos económicos para atender las Carreteras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambato - Guaranda (Mantenimiento Carpeta Asfáltica y Señalización - Urgente),</li> <li>- Guanujo - Echeandía (Atención de Puntos Críticos),</li> <li>- Guaranda - Balzapamba (Mantenimiento Carpeta asfáltica, Señalización, Atención de Puntos Críticos),</li> <li>- Chillanes - Bucay (Atención de puntos críticos, colocación de arpetas asfálticas 10 km),</li> <li>- Salinas - Simiatug (Doble tratamiento deteriorado y mantenimiento de señalización).</li> </ul>   | Yacchirema Chimbo, Juan Carlos  | 05/08/2021 - 07:02 PM         |
| <p><b>JULIO 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urgente asignar recursos económicos para atender la Carretera Ambato - Guaranda (Mantenimiento Carpeta Asfáltica y Señalización - Urgente), Guanujo - Echeandía (Atención de Puntos Críticos), Guaranda - Balzapamba (Mantenimiento Carpeta asfáltica, Señalización, Atención de Puntos Críticos), Chillanes - Bucay (Atención de puntos críticos, colocación de arpetas asfálticas 10 km), Salinas - Simiatug (Doble tratamiento deteriorado y mantenimiento de señalización).</li> </ul>   | Yacchirema Chimbo, Juan Carlos  | 30/07/2021 - 11:39 AM         |
| <p><b>JUNIO 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urgente asignar recursos económicos para atender la Carretera Ambato - Guaranda (Mantenimiento Carpeta Asfáltica y Señalización - Urgente), Guanujo - Echeandía (Atención de Puntos Críticos), Guaranda - Balzapamba (Mantenimiento Carpeta asfáltica, Señalización, Atención de Puntos Críticos), Chillanes - Bucay (Atención de puntos críticos, colocación de arpetas asfálticas 10 km), Salinas - Simiatug (Doble tratamiento deteriorado y mantenimiento de señalización).</li> <li>- Via Guanujo Echeandía cerrada a partir de las 18:h00 a 05H00 am, debido a deslizamientos rocosos, caída de piedras, se realiza limpieza constante con maquinaria de la institución.</li> <li>- Remoción de material vía Chillanes - Bucay sector Perezán, limpieza de derrumbes menores Santa Rosa - Bucay, limpieza de material rocoso vía Guanujo Echeandía y vía Herrerías San Juan, con maquinaria de la Dirección Provincial.</li> </ul> | Yacchirema Chimbo, Juan Carlos  | 02/07/2021 - 08:52 AM         |
| <p><b>MAYO 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Via Guanujo Echeandía cerrada a partir de las 18:h00 a 05H00 am, debido a deslizamientos rocosos, caída de piedras, se realiza limpieza constante con maquinaria de la institución.</li> </ul>  | Pulecio Montalvo, Roger Alberto | 04/06/2021 - 04:50 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                            | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remoción de material vía Chillanes - Bucay sector Perezán, limpieza de derrumbes menores Santa Rosa - Bucay, limpieza de material rocoso vía Guanujo Echeandía y vía Herrerías San Juan, con maquinaria de la Dirección Provincial.</li> <li>- Temporada invernal fuerte en toda la Provincia.</li> <li>- Los estudios de puntos críticos , se encuentran en revisión por parte de los especialistas de la Subsecretaría Regional 5.</li> </ul>  |   |                               |
| <p>ABRIL 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Via Guanujo Echeandía cerrada a partir de las 18:h00 a 05H00 am, debido a deslizamientos rocosos, caída de piedras, se realiza limpieza constante con maquinaria de la institución.</li> <li>- Remoción de material vía Chillanes - Bucay sector Perezán, limpieza de derrumbes menores Santa Rosa - Bucay, limpieza de material rocoso vía Guanujo Echeandía y vía Herrerías San Juan, con maquinaria de la Dirección Provincial.</li> <li>- Temporada invernal fuerte en toda la Provincia.</li> <li>- Los estudios de puntos críticos , se encuentran en revisión por parte de los especialistas de la Subsecretaría Regional 5.</li> </ul>   | <p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>    | <p>05/05/2021 - 04:40 PM</p>  |
| <p>MARZO 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Via Guanujo Echeandía cerrada a partir de las 18:h00 a 05H00 am, debido a deslizamientos rocosos, caída de piedras, se realiza limpieza constante con maquinaria de la institución.</li> <li>- Remoción de material vía Chillanes - Bucay sector Perezán, limpieza de derrumbes menores Santa Rosa - Bucay, limpieza de material rocoso vía Guanujo Echeandía y vía Herrerías San Juan, con maquinaria de la Dirección Provincial.</li> <li>- Temporada invernal fuerte en toda la Provincia.</li> <li>- Los estudios de puntos críticos , se encuentran en revisión por parte de los especialistas de la Subsecretaría Regional 5.</li> </ul>   | <p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>    | <p>05/04/2021 - 07:49 AM</p>  |
| <p>FEBRERO 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Via Guanujo Echeandía cerrada a partir de las 18:h00 a 05H00 am, debido a deslizamientos rocosos, caída de piedras, se realiza limpieza constante con maquinaria de la institución.</li> <li>- Remoción de material vía Chillanes - Bucay sector Perezán, limpieza de derrumbes menores Santa Rosa - Bucay, limpieza de material rocoso vía Guanujo Echeandía y vía Herrerías San Juan, con maquinaria de la Dirección Provincial.</li> <li>- Temporada invernal fuerte en toda la Provincia.</li> <li>- Los estudios de puntos críticos , se encuentran en revisión por parte de los especialistas de la Subsecretaría Regional 5.</li> </ul> | <p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>    | <p>05/03/2021 - 03:35 PM</p>  |
| <p>ENERO 2021:</p> <p>Se realizan trabajos de mantenimiento por administración directa en toda la RVE conforme así lo amerite, según haya deslizamientos y trabajos como los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-En la vía Chillanes - Bucay y San Pablo Chillanes, se continua con la limpieza de derrumbes de mediana y gran magnitud, limpieza de cunetas y alcantarillas, construcción de terrazas etc.</li> <li>-En la vía Guanujo - Echeandía se realiza la limpieza de derrumbes en el km: 11+000 y todo el trayecto de la vía.</li> <li>-En la vía Guaranda - Las Herrerías se realizo la limpieza de derrumbes menores desde el km: 5+000 al 28+000</li> </ul>                 | <p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p> | <p>04/02/2021 - 02:52 PM</p>  |
| <p>DICIEMBRE 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuan los trabajos en las diferentes carreteras de la RVE, trabajo continuo en varios puntos críticos según lo siguiente:</li> <li>-En la vía Chillanes - Bucay y San Pablo Chillanes, se continua con la limpieza de derrumbes de mediana y gran magnitud, limpieza de cunetas y alcantarillas, construcción de terrazas etc.</li> <li>-En la vía Guanujo - Echeandía se realiza la limpieza de derrumbes en el km: 11+000 y todo el trayecto de la vía.</li> <li>-En la vía Guaranda - Las Herrerías se realizo la limpieza de derrumbes menores desde el km: 5+000 al 28+000</li> </ul>  | <p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p> | <p>07/01/2021 - 11:31 AM</p>  |
| <p>NOVIEMBRE 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuan los trabajos en las diferentes carreteras de la RVE, trabajo continuo en varios puntos críticos según lo siguiente:</li> <li>-En la vía Chillanes - Bucay y San Pablo Chillanes, se continua con la limpieza de derrumbes de mediana y gran magnitud, limpieza de cunetas y alcantarillas, construcción de terrazas etc.</li> <li>-En la vía Guanujo - Echeandía se realiza la limpieza de derrumbes en el km: 11+000 y todo el trayecto de la vía.</li> <li>-En la vía Guaranda - Las Herrerías se realizo la limpieza de derrumbes menores desde el km: 5+000 al 28+000</li> </ul>  | <p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p> | <p>02/12/2020 - 11:34 AM</p>  |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                            | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| <p>OCTUBRE 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continúan los trabajos en las diferentes carreteras de la RVE, trabajo continuo en varios puntos críticos según lo siguiente:</li> <li>-En la vía Chillanes - Bucay y San Pablo Chillanes, se continua con la limpieza de derrumbes de mediana y gran magnitud, limpieza de cunetas y alcantarillas, construcción de terrazas etc.</li> <li>-En la vía Guanujo - Echeandia se realiza la limpieza de derrumbes en el km: 11+000 y todo el trayecto de la vía.</li> <li>-En la vía Guaranda - Las Herrerías se realizo la limpieza de derrumbes menores desde el km: 5+000 al 28+000</li> </ul>    | <p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p> | <p>04/11/2020 - 01:28 PM</p>  |
| <p>SEPTIEMBRE 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continúan los trabajos en las diferentes carreteras de la RVE, trabajo continuo en varios puntos críticos según lo siguiente:</li> <li>-En la vía Chillanes - Bucay y San Pablo Chillanes, se continua con la limpieza de derrumbes de mediana y gran magnitud, limpieza de cunetas y alcantarillas, construcción de terrazas etc.</li> <li>-En la vía Guanujo - Echeandia se realiza la limpieza de derrumbes en el km: 11+000 y todo el trayecto de la vía.</li> <li>-En la vía Guaranda - Las Herrerías se realizo la limpieza de derrumbes menores desde el km: 5+000 al 28+000</li> </ul> | <p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p> | <p>05/10/2020 - 12:51 PM</p>  |
| <p>AGOSTO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continúan los trabajos en las diferentes carreteras de la RVE, trabajo continuo en varios puntos críticos según lo siguiente:</li> <li>-En la vía Chillanes - Bucay y San Pablo Chillanes, se continua con la limpieza de derrumbes de mediana y gran magnitud, limpieza de cunetas y alcantarillas, construcción de terrazas etc.</li> <li>-En la vía Guanujo - Echeandia se realiza la limpieza de derrumbes en el km: 11+000 y todo el trayecto de la vía.</li> <li>-En la vía Guaranda - Las Herrerías se realizo la limpieza de derrumbes menores desde el km: 5+000 al 28+000</li> </ul>     | <p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p> | <p>04/09/2020 - 01:53 PM</p>  |
| <p>JULIO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continúan los trabajos en las diferentes carreteras de la RVE, trabajo continuo en varios puntos críticos según lo siguiente:</li> <li>-En la vía Chillanes - Bucay y San Pablo Chillanes, se continua con la limpieza de derrumbes de mediana y gran magnitud, limpieza de cunetas y alcantarillas, construcción de terrazas etc.</li> <li>-En la vía Guanujo - Echeandia se realiza la limpieza de derrumbes en el km: 11+000 y todo el trayecto de la vía.</li> <li>-En la vía Guaranda - Las Herrerías se realizo la limpieza de derrumbes menores desde el km: 5+000 al 28+000</li> </ul>      | <p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p> | <p>04/08/2020 - 10:55 AM</p>  |
| <p>JUNIO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continúan los trabajos en las diferentes carreteras de la RVE, trabajo continuo en varios puntos críticos según lo siguiente:</li> <li>-En la vía Chillanes - Bucay y San Pablo Chillanes, se continua con la limpieza de derrumbes de mediana y gran magnitud, limpieza de cunetas y alcantarillas, construcción de terrazas etc.</li> <li>-En la vía Guanujo - Echeandia se realiza la limpieza de derrumbes en el km: 11+000 y todo el trayecto de la vía.</li> <li>-En la vía Guaranda - Las Herrerías se realizo la limpieza de derrumbes menores desde el km: 5+000 al 28+000</li> </ul>      | <p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p> | <p>05/07/2020 - 03:33 PM</p>  |
| <p>MAYO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continúan los trabajos en las diferentes carreteras de la RVE, trabajo continuo en varios puntos críticos según lo siguiente:</li> <li>-En la vía Chillanes - Bucay y San Pablo Chillanes, se continua con la limpieza de derrumbes de mediana y gran magnitud, limpieza de cunetas y alcantarillas, construcción de terrazas etc.</li> <li>-En la vía Guanujo - Echeandia se realiza la limpieza de derrumbes en el km: 11+000 y todo el trayecto de la vía.</li> <li>-En la vía Guaranda - Las Herrerías se realizo la limpieza de derrumbes menores desde el km: 5+000 al 28+000</li> </ul>       | <p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p> | <p>04/06/2020 - 08:16 PM</p>  |
| <p>ABRIL 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se realizan los siguientes trabajos con maquinaria de la Dirección Distrital y el personal operativo:</li> </ul>   | <p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p> | <p>05/05/2020 - 10:13 AM</p>  |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| <p>-En la vía Chillanes - Bucay y San Pablo Chillanes, se continua con la limpieza de derrumbes de mediana y gran magnitud, limpieza de cunetas y alcantarillas, construcción de terrazas etc.</p> <p>-En la vía Guanujo - Echeandía se realiza la limpieza de derrumbes en el km: 11+000 y todo el trayecto de la vía.</p> <p>-En la vía Guaranda - Las Herrerías se realizo la limpieza de derrumbes menores desde el km: 5+000 al 28+000.</p>  |                                      |                               |
| <p>MARZO 2020:</p> <p>-En la vía Chillanes - Bucay se continua con la limpieza de derrumbes de mediana y gran magnitud, limpieza de cunetas y alcantarilla.</p> <p>-En la vía Guanujo - Echeandía se realiza la limpieza de derrumbes en el km: 11+000.</p> <p>-En la vía Guaranda - Las Herrerías se realizo la limpieza de derrumbes menores desde el km: 5+000 al 10+000.</p>  | Agualongo Amangandi, Mercy Maribel   | 03/04/2020 - 10:11 AM         |
| <p>Febrero 2020:</p> <p>-En la vía Chillanes - Bucay se continua con la limpieza de derrumbes de mediana y gran magnitud, limpieza de cunetas y alcantarilla.</p> <p>-En la vía Guanujo - Echeandía se realiza la limpieza de derrumbes en el km: 11+000.</p> <p>-En la vía Guaranda - Las Herrerías se realizo la limpieza de derrumbes menores desde el km: 5+000 al 10+000.</p>  | Agualongo Amangandi, Mercy Maribel   | 04/03/2020 - 03:00 PM         |
| <p>Enero 2020:</p> <p>-En la vía Chillanes - Bucay se continua con la limpieza de derrumbes de mediana y gran magnitud, limpieza de cunetas y alcantarilla.</p> <p>-En la vía Guanujo - Echeandía se realiza la limpieza de derrumbes en el km: 11+000.</p> <p>-En la vía Guaranda - Las Herrerías se realizo la limpieza de derrumbes menores desde el km: 5+000 al 10+000.</p>  | Agualongo Amangandi, Mercy Maribel   | 06/02/2020 - 09:15 AM         |
| <p>Diciembre 2019:</p> <p>- Culmina los trabajos de rehabilitación del puente de Vinchoa - puente de Cachisagua de 4 km de longitud, realizado por la contratista covipal.</p> <p>- Se culmina con la colocación de la señalización en la carretera Chimbo - El Cristal.</p> <p>- Concluyen los trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</p> <p>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</p>  | Agualongo Amangandi, Mercy Maribel   | 08/01/2020 - 09:07 AM         |
| <p>NOVIEMBRE 2019:</p> <p>- Culmina los trabajos de rehabilitación del puente de Vinchoa - puente de Cachisagua de 4 km de longitud, realizado por la contratista covipal.</p> <p>- Se culmina con la colocación de la señalización en la carretera Chimbo - El Cristal.</p> <p>- Concluyen los trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</p> <p>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</p>  | Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier | 05/11/2019 - 03:46 PM         |
| <p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <p>- Culmina los trabajos de rehabilitación del puente de Vinchoa - puente de Cachisagua de 4 km de longitud, realizado por la contratista covipal.</p> <p>- Se culmina con la colocación de la señalización en la carretera Chimbo - El Cristal.</p> <p>- Concluyen los trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</p> <p>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</p> | Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier | 02/10/2019 - 09:16 AM         |
| <p>AGOSTO 2019:</p> <p>- Culmina los trabajos de rehabilitación del puente de Vinchoa - puente de Cachisagua de 4 km de longitud, realizado por la contratista covipal.</p> <p>- Se culmina con la colocación de la señalización en la carretera Chimbo - El Cristal.</p> <p>- Concluyen los trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</p>   | Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier | 12/09/2019 - 05:07 PM         |



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| - Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.   |                                      |                               |
| <p><b>JULIO 2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Culmina los trabajos de rehabilitación del puente de Vinchoa - puente de Cachisagua de 4 km de longitud, realizado por la contratista covipal.</li> <li>- Se culmina con la colocación de la señalización en la carretera Chimbo - El Cristal.</li> <li>- Concluyen los trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</li> <li>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</li> </ul>   | Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier | 06/08/2019 - 09:51 AM         |
| <p><b>JUNIO 2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Culmina los trabajos de rehabilitación del puente de Vinchoa - puente de Cachisagua de 4 km de longitud, realizado por la contratista covipal.</li> <li>- Se culmina con la colocación de la señalización en la carretera Chimbo - El Cristal.</li> <li>- Concluyen los trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</li> <li>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</li> </ul>   | Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier | 04/07/2019 - 08:38 AM         |
| <p><b>MAYO 2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Culmina los trabajos de rehabilitación del puente de Vinchoa - puente de Cachisagua de 4 km de longitud, realizado por la contratista covipal.</li> <li>- Se culmina con la colocación de la señalización en la carretera Chimbo - El Cristal.</li> <li>- Concluyen los trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</li> <li>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</li> </ul>    | Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier | 04/06/2019 - 10:09 AM         |
| <p><b>ABRIL 2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Culmina los trabajos de rehabilitación del puente de Vinchoa - puente de Cachisagua de 4 km de longitud, realizado por la contratista covipal.</li> <li>- Se culmina con la colocación de la señalización en la carretera Chimbo - El Cristal.</li> <li>- Concluyen los trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</li> <li>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</li> </ul>   | Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier | 09/05/2019 - 04:16 PM         |
| <p><b>MARZO 2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Culmina los trabajos de rehabilitación del puente de Vinchoa - puente de Cachisagua de 4 km de longitud, realizado por la contratista covipal.</li> <li>- Se culmina con la colocación de la señalización en la carretera Chimbo - El Cristal.</li> <li>- Concluyen los trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</li> <li>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</li> </ul>   | Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier | 05/04/2019 - 12:04 PM         |
| <p><b>FEBRERO 2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Culmina los trabajos de rehabilitación del puente de Vinchoa - puente de Cachisagua de 4 km de longitud, realizado por la contratista covipal.</li> <li>- Se culmina con la colocación de la señalización en la carretera Chimbo - El Cristal.</li> <li>- Concluyen los trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</li> <li>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</li> </ul> | Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier | 01/03/2019 - 02:20 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                              | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| <p>Diciembre 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Culmina los trabajos de rehabilitación del puente de Vinchoa - puente de Cachisagua de 4 km de longitud, realizado por la contratista covipal.</li> <li>- Se culmina con la colocación de la señalización en la carretera Chimbo - El Cristal.</li> <li>- Concluyen los trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</li> <li>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</li> </ul> | <p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p> | <p>27/12/2018 - 11:15 AM</p>  |
| <p>Noviembre 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se firma el contrato para la rehabilitación del puente de Vinchoa - puente de Cachisagua de 4 km de longitud.</li> <li>- Se coloca la señalización en la carretera Chimbo - El Cristal próxima a inaugurarse.</li> <li>- Se realizaron trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</li> <li>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</li> </ul>                                  | <p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p> | <p>05/12/2018 - 03:31 PM</p>  |
| <p>Octubre 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se firma el contrato para la rehabilitación del puente de Vinchoa - puente de Cachisagua de 4 km de longitud.</li> <li>- Se coloca la señalización en la carretera Chimbo - El Cristal próxima a inaugurarse.</li> <li>- Se realizaron trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</li> <li>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</li> </ul>                                    | <p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p> | <p>05/11/2018 - 03:25 PM</p>  |
| <p>Septiembre 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Por administración directa se trabaja en los puntos críticos en varias vías de la RVE.</li> <li>- Se realizaron trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</li> <li>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</li> </ul>  | <p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p> | <p>05/10/2018 - 10:21 AM</p>  |
| <p>Agosto 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Por administración directa se trabaja en los puntos críticos en varias vías de la RVE.</li> <li>- Se realizaron trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</li> <li>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</li> </ul>  | <p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p> | <p>05/09/2018 - 07:58 AM</p>  |
| <p>Julio 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Por administración directa se trabaja en los puntos críticos en varias vías de la RVE.</li> <li>- Se realizaron trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial.</li> <li>- Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</li> </ul>   | <p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p> | <p>06/08/2018 - 09:25 AM</p>  |
| <p>Junio 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano con las microempresas de conservación vial. Se concluyeron las obras emergentes de las carreteras Chimbo - El Cristal, Chillanes - Bucay, Guaranda - Balzapamba y Guanujo -Echeandía, con estos contratos se logró habilitar el tránsito vehicular en dos sentidos de circulación.</li> </ul>  | <p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p> | <p>05/07/2018 - 10:04 AM</p>  |
| <p>Mayo 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA GUANUJO-ECHEANDÍA DE 53.29 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: Como consecuencia</li> </ul>  | <p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p> | <p>05/06/2018 - 03:30 PM</p>  |



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                              | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| <p>de las fuertes lluvias presentes en la zona del proyecto, se estan produciendo una serie de deslizamientos en los puntos criticos que presenta el proyecto, a la altura del Km 19+200 sitios donde se presencia inestabilidad del talud de corte debido a la sobresaturación de los suelos, personal y maquinaria del MTOP Bolívar se encuentra dando atención a estos eventos mediante la ejecución de trabajos de limpieza y desalojo de los deslizamientos, acciones que han permitido habilitar el tránsito vehicular en la vía.</p> <p>- OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA CHIMBO-EL CRISTAL DE 38 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: continúan con los trabajos de excavación sin clasificar en las abs. 29+000 y realizan los rellenos respectivos en las diferentes descargas donde presentan socavación de la plataforma de la vía.</p> <p>- REHABILITACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA E-495 TRAMO CHILLANES-SANTA ROSA DE AGUA CLARA DE 56 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: Se requiere una evaluación técnica económica con el fin de determinar los rubros necesarios para dar atención a ciertos puntos criticos que presenta el proyecto.</p> |   |                               |
| <p>Abril 2018:</p> <p>- OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA GUANUJO-ECHEANDÍA DE 53.29 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: Excavación sin clasificar en la abs. 14+200, sitio donde se construirá un muro de hormigón ciclopeo. Excavación, perfilado y descarga talud 19+200.</p> <p>- OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA CHIMBO-EL CRISTAL DE 38 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: continúan con los trabajos de excavación sin clasificar en las abs. 29+000 y realizan los rellenos respectivos en las diferentes descargas donde presentan socavación de la plataforma de la vía.</p> <p>- REHABILITACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA E-495 TRAMO CHILLANES-SANTA ROSA DE AGUA CLARA DE 56 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: Actualmente se ejecuta trabajos de construcción del ducto cajón.</p>   | <p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p> | <p>04/05/2018 - 02:34 PM</p>  |
| <p>Diciembre 2017:</p> <p>Mantenimiento vial de Bolívar, se llevan a cabo los siguientes contratos:</p> <p>- OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA CHIMBO-EL CRISTAL DE 38 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: La Cia. Contratista concluyó con la construcción del muro de hormigón armado en la abscisa 36+720, continúa con los trabajos de excavación sin clasificar en las abs. 29+000 y realizan los rellenos respectivos en las diferentes descargas donde presentan socavación de la plataforma de la vía.</p> <p>- REHABILITACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA E-495 TRAMO CHILLANES-SANTA ROSA DE AGUA CLARA DE 56 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: Actualmente se ejecuta trabajos de construcción del ducto cajón.</p> <p>- OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA GUANUJO-ECHEANDÍA DE 53.29 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: Excavación sin clasificar en la abs. 14+200, sitio donde se construirá un muro de hormigón ciclopeo. Excavación, perfilado y descarga talud 19+200.</p>  | <p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p> | <p>05/01/2018 - 04:39 PM</p>  |
| <p>Noviembre 2017:</p> <p>Como parte del Mantenimiento vial de Bolívar, se llevan a cabo los siguientes contratos:</p> <p>- OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA CHIMBO-EL CRISTAL DE 38 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: La Cia. Contratista concluyó con la construcción del muro de hormigón armado en la abscisa 36+720, continúa con los trabajos de excavación sin clasificar en las abs. 29+000 y realizan los rellenos respectivos en las diferentes descargas donde presentan socavación de la plataforma de la vía.</p> <p>- REHABILITACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA E-495 TRAMO CHILLANES-SANTA ROSA DE AGUA CLARA DE 56 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: Actualmente se ejecuta trabajos de construcción del ducto cajón.</p> <p>- OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA GUANUJO-ECHEANDÍA DE 53.29 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: Excavación sin clasificar</p>   | <p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p> | <p>05/12/2017 - 10:41 AM</p>  |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                                      | Fecha de última actualización    |
|--|---|----------------------------------|
| <p>en la abs. 14+200, sitio donde se construirá un muro de hormigón ciclopeo. Excavación, perfilado y descarga talud 19+200.</p>   |   |                                  |
| <p>OCTUBRE 2017:</p> <p>Como parte del Mantenimiento vial de Bolívar, se llevan a cabo los siguientes contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REHABILITACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA E-495 TRAMO CHILLANES-SANTA ROSA DE AGUA CLARA DE 56 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: Actualmente se ejecuta trabajos de construcción del ducto cajón.</li> <li>- OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA CHIMBO-EL CRISTAL DE 38 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: La Cia. Contratista concluyó con la construcción del muro de hormigón armado en la abscisa 36+720, continúa con los trabajos de excavación sin clasificar en las abs. 29+000 y realizan los rellenos respectivos en las diferentes descargas donde presentan socavación de la plataforma de la vía.</li> <li>- OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA GUANUJO-ECHEANDÍA DE 53.29 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: Excavación sin clasificar en la abs. 14+200, sitio donde se construirá un muro de hormigón ciclopeo. Excavación, perfilado y descarga talud 19+200.</li> </ul> | <p>Pilamunga<br/>Llumiguano,<br/>Gustavo Xavier</p> | <p>01/11/2017 -<br/>12:03 PM</p> |
| <p>Septiembre 2017:</p> <p>Como parte del Mantenimiento vial de Bolívar, se llevan a cabo los siguientes contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REHABILITACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA E-495 TRAMO CHILLANES-SANTA ROSA DE AGUA CLARA DE 56 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: Se requiere una evaluación técnica económica con el fin de determinar los rubros necesarios para dar atención a ciertos puntos críticos que presenta el proyecto.</li> <li>- OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA CHIMBO-EL CRISTAL DE 38 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: La Cia. Contratista iniciaron con los trabajos en la abscisa 36+720.</li> <li>- OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA GUANUJO-ECHEANDÍA DE 53.29 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR: Excavación sin clasificar en la abs. 14+200, sitio donde se construya un muro de hormigón ciclopeo. Excavación, perfilado y descarga talud 19+200.</li> </ul>   | <p>Pilamunga<br/>Llumiguano,<br/>Gustavo Xavier</p> | <p>04/10/2017 -<br/>10:53 AM</p> |
| <p>Agosto 2017:</p> <p>Se realizan trabajos de Mantenimiento rutinario en el tramo Chillanes - Bucay , limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes menores, transporte de materiales. etc.<br/>Se realizan trabajos de Mantenimiento rutinario en la vía Ambato - Guaranda a cargo de la contratista, limpieza de cunetas.</p>  | <p>Pilamunga<br/>Llumiguano,<br/>Gustavo Xavier</p> | <p>07/09/2017 -<br/>03:38 PM</p> |
| <p>JULIO 2017:</p> <p>- Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario en las diferentes vías de la RVE. Trabajos de señalización en la carretera Guaranda - Balsapamba y Chimbo - El Cristal.</p>  | <p>Abedrabbo<br/>García, Jorge<br/>Farah</p>        | <p>04/08/2017 -<br/>04:10 PM</p> |
| <p>JUNIO 2017:</p> <p>- Se realizan trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, desalojo de material, en todas las carreteras de la RVE con maquinaria de la Dirección Distrital, así como se encuentran contratadas los mantenimientos emergentes de las vías: San Pablo - Chillanes - Bucay, Eheadía - Ventanas y Guaranda - Balsapamba.</p>   | <p>Abedrabbo<br/>García, Jorge<br/>Farah</p>        | <p>11/07/2017 -<br/>03:33 PM</p> |
| <p>MAYO 2017:</p> <p>De acuerdo a la evaluación técnica realizada por la Fiscalización del Proyecto, se suscribo con fecha 2 de diciembre de 2016 la Orden de Cambio Nro 1 por incremento y decremento de cantidades de obra, evaluación que ha sido realizada priorizando la intervención en los tramos más críticos del proyecto.</p>  | <p>Abedrabbo<br/>García, Jorge<br/>Farah</p>        | <p>05/06/2017 -<br/>03:23 PM</p> |
| <p>ABRIL 2017:</p> <p>Actualmente se encuentran colocando carpeta asfáltica, imprimación asfáltica y reconfiguración de la capa de base .</p>  | <p>Abedrabbo<br/>García, Jorge<br/>Farah</p>        | <p>08/05/2017 -<br/>03:49 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                               | Fecha de última actualización    |
|--|--|----------------------------------|
| <p>Marzo 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Echeandía Ventanas: Bacheo e imprimación asfáltica.</li> <li>- Guaranda Balzapamba: Se realiza los trabajos de mantenimiento rutinario como: rosa a mano, la limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y la limpieza general de la obra. Se colocó tachas reflectivas desde la abc. 0+000 hasta la abs. 22+000.</li> <li>- San Pablo Chillanes: Roza a mano y limpieza de cunetas laterales, Limpieza de Derrumbes, Limpieza de Alcantarillas, Excavación y encauzamientos (descargas).</li> </ul>   | <p>Abedrabbo<br/>García, Jorge<br/>Farah</p> | <p>05/04/2017 -<br/>04:19 PM</p> |
| <p>Febrero 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Echeandía Ventanas:</li> </ul> <p>Se encuentra realizando bache asfáltico, y rubros de mantenimiento emergente con la contratista encargada de este tramo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guaranda Balzapamba:</li> </ul> <p>Se encuentra realizando actividades de mantenimiento rutinario limpieza de cunetas con maquinaria de la institución, desbroce. etc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- San Pablo Chillanes:</li> </ul> <p>Se encuentra trabajando en desalojo de material de derrumbes ocurridos debido a la fuerte temporada invernal.</p>   | <p>Abedrabbo<br/>García, Jorge<br/>Farah</p> | <p>06/03/2017 -<br/>09:00 AM</p> |
| <p>Enero 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Echeandía Ventanas:</li> </ul> <p>Los trabajos objeto del contrato de Rehabilitación se encuentran retrasados en relación al cronograma valorados de trabajos vigente con el fin de solucionar estos inconvenientes se ha insistido al consorcio contratista para que se sirvan disponer en obras de todo el personal, equipo y material necesarios para la ejecución de los rubros, colocación de capa de base, imprimación asfáltica y carpeta asfáltica, espesor 5cm., actualmente la Contratista se encuentra realizando trabajos de conformación de la capa de base e imprimación asfáltica. De los incumplimientos en los que ha incurrido el contratista la Fiscalización se encuentra aplicando las sanciones pertinentes (multas) de acuerdo a cláusulas contractuales del contrato vigente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guaranda Balzapamba:</li> </ul> <p>Se concluyó con la construcción del muro de ala de la alcantarilla de la abscisa 47+000, sector Las Guardias.</p> <p>Se realiza los trabajos de mantenimiento rutinario como: rosa a mano, la limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y la limpieza general de la obra.</p> <p>Se realiza el bacheo desde el km. 46+000 al km. 66+000</p> <p>Se realiza la construcción de los muros de la abscisa 63+000 y la corrección de los trabajos defectuosos.</p> <p>Se solicitó el informe de multas a la Fiscalización y mediante Oficio Nro. MTOP-CONS_BOL-16-144-OF.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- San Pablo Chillanes,</li> </ul> <p>Este tramo requiere de manera urgente la intervención debido que a la actualidad la capa de rodadura de doble tratamiento bituminoso se encuentra en malas condiciones con grandes baches, de este tramo el MTOP cuenta con estudios definitivos y aprobados y la inversión para la ejecución de esta obra es de 19 millones. Tramo Chillanes-Bucay, para realizar los trabajos definitivos de todos los puntos críticos causados por la etapa invernal y el terremoto causado el 16 de abril de 2016 se requiere la contratación de estudios de ingeniería a fin de remediar definitivamente los puntos críticos.</p> | <p>Abedrabbo<br/>García, Jorge<br/>Farah</p> | <p>09/02/2017 -<br/>04:53 PM</p> |
| <p>Diciembre 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario con el equipo y maquinaria por administración directa trabajos de emergencia en el Tramo San pablo Chillanes Bucay trabajos que no estan considerados dentro de las cantidades ejecutadas por SEMEG.</li> <li>- Se ejecutan trabajos de reparación emergente con las contratistas SEMEG en la Carreteras Tramo San Pablo-Chillanes-Bucay, CONSORCIO RODRIGUEZ MANCHENO en el Tramo Echeandía - Ventanas, CONSPIBERSA CIA LTDA en el Tramo Guaranda - Balsapamba, realizando los trabajos: Limpieza de derrumbes, encausamientos a máquina, limpieza de alcantarillas, reconfiguración de la capa de rodadura.</li> </ul>   | <p>Abedrabbo<br/>García, Jorge<br/>Farah</p> | <p>05/01/2017 -<br/>04:33 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                      | Fecha de última actualización    |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <p>Noviembre 2016:</p> <p>-Se ejecutan trabajos de reparación emergente con las contratistas SEMEG en la Carreteras Tramo San Pablo-Chillanes-Bucay, CONSORCIO RODRIGUEZ MANCHENO en el Tramo Echeandía - Ventanas, CONSPIBERSA CIA LTDA en el Tramo Guaranda - Balsapamba, realizando los trabajos: Limpieza de derrumbes, encausamientos a máquina, limpieza de alcantarillas, reconfiguración de la capa de rodadura.</p> <p>- Además con maquinaria de la Dirección Distrital se procede a realizar trabajos de limpieza de derrumbes y trabajos de mantenimiento rutinario en zonas que así lo ameriten en todas las vías de la RVE.</p>   | <p>Chariguamán<br/>Mullo, Guido</p> | <p>09/12/2016 -<br/>11:09 AM</p> |
| <p>Octubre 2016:</p> <p>- Se ejecutaron los trabajos de mantenimiento rutinario en las vías Tramo Guaranda-Balzapamba desde la abscisa 48+000 - 54+000, Tramo San Pablo-Chillanes desde la abscisa 10+000 - 20+000, Tramo Echeandía - Ventanas desde la abscisa 0+000 - 10+000 con microempresas contratadas, realizando trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, limpieza de señalización vertical.</p> <p>- Además se ejecutan trabajos de reparación emergente con las contratistas SEMEG en la Carreteras Tramo Chillanes-Bucay, CONSORCIO RODRIGUEZ MANCHENO en el Tramo Echeandía - Ventanas, CONSPIBERSA CIA LTDA en el Tramo Guaranda - Balsapamba, realizando los trabajos: Limpieza de derrumbes, encausamientos a máquina, limpieza de alcantarillas, reconfiguración de la capa de rodadura.</p>    | <p>Chariguamán<br/>Mullo, Guido</p> | <p>01/11/2016 -<br/>12:29 PM</p> |
| <p>Septiembre 2016:</p> <p>- Se ejecutaron los trabajos de mantenimiento rutinario en las vías Tramo Guaranda-Balzapamba desde la abscisa 48+000 - 54+000, Tramo San Pablo-Chillanes desde la abscisa 10+000 - 20+000, Tramo Echeandía - Ventanas desde la abscisa 0+000 - 10+000 con microempresas contratadas, realizando trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, limpieza de señalización vertical.</p> <p>- Además se ejecutan trabajos de reparación emergente con las contratistas SEMEG en la Carreteras Tramo Chillanes-Bucay, CONSORCIO RODRIGUEZ MANCHENO en el Tramo Echeandía - Ventanas, CONSPIBERSA CIA LTDA en el Tramo Guaranda - Balsapamba, realizando los trabajos: Limpieza de derrumbes, encausamientos a máquina, limpieza de alcantarillas, reconfiguración de la capa de rodadura.</p> | <p>Chariguamán<br/>Mullo, Guido</p> | <p>10/10/2016 -<br/>06:33 AM</p> |
| <p>Agosto 2016</p> <p>- Se ejecutaron los trabajos de mantenimiento rutinario en las vías Tramo Guaranda-Balzapamba desde la abscisa 48+000 - 54+000, Tramo San Pablo-Chillanes desde la abscisa 10+000 - 20+000, Tramo Echeandía - Ventanas desde la abscisa 0+000 - 10+000 con microempresas contratadas, realizando trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, limpieza de señalización vertical.</p> <p>- Además se ejecutan trabajos de reparación emergente con las contratistas SEMEG en la Carreteras Tramo Chillanes-Bucay, CONSORCIO RODRIGUEZ MANCHENO en el Tramo Echeandía - Ventanas, CONSPIBERSA CIA LTDA en el Tramo Guaranda - Balsapamba, realizando los trabajos: Limpieza de derrumbes, encausamientos a máquina, limpieza de alcantarillas, reconfiguración de la capa de rodadura.</p>      | <p>Chariguamán<br/>Mullo, Guido</p> | <p>12/09/2016 -<br/>11:50 AM</p> |
| <p>Julio 2016:</p> <p>- Se ejecutaron los trabajos de mantenimiento rutinario en las vías Tramo Guaranda-Balzapamba desde la abscisa 48+000 - 54+000, Tramo San Pablo-Chillanes desde la abscisa 10+000 - 20+000, Tramo Echeandía - Ventanas desde la abscisa 0+000 - 10+000 con microempresas contratadas, realizando trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, limpieza de señalización vertical.</p> <p>- Además se ejecutan trabajos de reparación emergente con las contratistas SEMEG en la Carreteras Tramo Chillanes-Bucay, CONSORCIO RODRIGUEZ MANCHENO en el Tramo Echeandía - Ventanas, CONSPIBERSA CIA LTDA en el Tramo Guaranda - Balsapamba, realizando los trabajos: Limpieza de derrumbes, encausamientos a máquina, limpieza de alcantarillas, reconfiguración de la capa de rodadura.</p>      | <p>Chariguamán<br/>Mullo, Guido</p> | <p>04/08/2016 -<br/>03:16 PM</p> |
| <p>Junio 2016:</p> <p>- Se intervienen en la vía Guaranda-Balzapamba con microempresa contratada, realizando trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, limpieza de señalización vertical.</p> <p>- Se intervienen en la vía San Pablo-Chillanes-Bucay con microempresa contratada, realizando trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, limpieza de señalización vertical.</p>  | <p>Chariguamán<br/>Mullo, Guido</p> | <p>04/07/2016 -<br/>03:33 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por           | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| <p>- Se intervienen en la vía Echeandía - Ventanas con microempresa contratada, realizando trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, limpieza de señalización vertical.</p> <p>- Debido a la temporada invernal fuerte en la vía de la RVE E495 Tramo Chillanes - Bucay la maquinaria del MTOP realizan trabajos de mantenimiento emergente ya que en la vía se han presentado derrumbes de gran magnitud, cabe indicar que en la vía debido a este fenómeno actualmente presenta grandes fallas geológicas , pérdida de la plataforma de la vía, colapso de alcantarillas, taludes inestables, socavación de alcantarillas. etc</p> <p>- Todos estos trabajos son intervenidos con personal y maquinaria de la Dirección Provincial de Bolívar.</p>   |                          |                               |
| <p>Mayo 2016:</p> <p>- Se intervienen en la vía Guaranda-Balzapamba con microempresa contratada, realizando trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, limpieza de señalización vertical.</p> <p>- Se intervienen en la vía San Pablo-Chillanes-Bucay con microempresa contratada, realizando trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, limpieza de señalización vertical.</p> <p>- Se intervienen en la vía Echeandía - Ventanas con microempresa contratada, realizando trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, limpieza de señalización vertical.</p> <p>- Debido a la temporada invernal fuerte en la vía de la RVE E495 Tramo Chillanes - Bucay la maquinaria del MTOP realizan trabajos de mantenimiento emergente ya que en la vía se han presentado derrumbes de gran magnitud, cabe indicar que en la vía debido a este fenómeno actualmente presenta grandes fallas geológicas , pérdida de la plataforma de la vía, colapso de alcantarillas, taludes inestables, socavación de alcantarillas. etc</p> <p>- Todos estos trabajos son intervenidos con personal y maquinaria de la Dirección Provincial de Bolívar.</p> | Chariguamán Mullo, Guido | 03/06/2016 - 09:31 AM         |
| <p>Abril 2016:</p> <p>- Debido a la temporada invernal existen en las vías de la RVE deslizamientos considerables de tierra y lodo:</p> <p>- Se intervienen en la vía Guaranda-Balzapamba-Montalvo con limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas.</p> <p>- Se intervienen en la vía San Pablo-Chillanes-Bucay con limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas.</p> <p>- Se intervienen en la vía Chimbo-El Cristal con limpieza de derrumbes de gran magnitud, limpieza de cunetas.</p> <p>- Todos estos trabajos son intervenidos con personal y maquinaria de la Dirección Provincial de Bolívar, se encuentra en proceso la contratación de microempresas para las vías de la RVE.</p>   | Chariguamán Mullo, Guido | 04/05/2016 - 10:37 AM         |
| <p>Marzo 2016:</p> <p>- Debido a la temporada invernal existen en las vías de la RVE deslizamientos considerables de tierra y lodo:</p> <p>- Se intervienen en la vía Guaranda-Balzapamba-Montalvo con limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas.</p> <p>- Se intervienen en la vía San Pablo-Chillanes-Bucay con limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas.</p> <p>- Se intervienen en la vía Chimbo-El Cristal con limpieza de derrumbes de gran magnitud, limpieza de cunetas.</p>   | Chariguamán Mullo, Guido | 05/04/2016 - 04:11 PM         |
| <p>FEBRERO 2016:</p> <p>-Debido a las torrenciales lluvias debido a la fuerte temporada invernal se han producido derrumbes de mediana magnitud en la carretera Guaranda - Balsapamba los mismos que han sido desalojados rápidamente garantizando así la normal circulación vehicular. Carretera Guanujo - Echeandía se trabaja en el desalojo de derrumbes en el sector de "la Piedra" permitiendo la libre circulación vehicular.</p> <p>- Permanentemente el MTOP-BOLIVAR se encuentra ejecutando trabajos de mantenimiento emergente, limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas y alcantarillas, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios que transita por las carreteras de la Red Vial Estatal.</p>  | Chariguamán Mullo, Guido | 04/03/2016 - 09:49 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                                      | Fecha de última actualización    |
|---|---|----------------------------------|
| <p>- La etapa invernal que se presenta en la vía Chillanes - Bucay, E495, han producido taponamiento de alcantarillas ubicadas en las abs. 49+300 y 49+500, ocasionando el desbordamiento del agua por la calzada de la vía, destruyendo daños considerables a la estructura del pavimento, cunetas laterales, subdrenes laterales, de aproximadamente 1 Km. de longitud, y la pérdida de parte de la plataforma de la vía en la abs. 50+300, los mismos que será analizados por los especialistas de la Regional 5 a fin que determinen las acciones emergentes y definitivas a ejecutar en los tramos afectados y las alcantarillas colapsadas, acciones que permitirán brindar seguridad a los que transitan por la vía.</p>   |   |                                  |
| <p>ENERO 2016:</p> <p>- Actualmente el MTOP se encuentra ejecutando trabajos de mantenimiento emergente, limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas y alcantarillas, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios que transita por esta carretera.</p> <p>- Además debo aclarar que no se encuentra dentro de la proforma presupuestaria 2016, la ejecución del Proyecto de Rectificación, Rehabilitación, Mejoramiento de la carretera San Pablo - Chillanes, a nivel de carpeta asfáltica, sin embargo durante el año 2016 se realizara trabajos de mantenimiento emergente de la vía.</p> <p>- La etapa invernal que se presenta en la vía Chillanes - Bucay, E495, han producido taponamiento de alcantarillas ubicadas en las abs. 49+300 y 49+500, ocasionando el desbordamiento del agua por la calzada de la vía, destruyendo daños considerables a la estructura del pavimento, cunetas laterales, subdrenes laterales, de aproximadamente 1 Km. de longitud, y la pérdida de parte de la plataforma de la vía en la abs. 50+300, los mismos que será analizados por los especialistas de la Regional 5 a fin que determinen las acciones emergentes y definitivas a ejecutar en los tramos afectados y las alcantarillas colapsadas, acciones que permitirán brindar seguridad a los que transitan por la vía.</p> | <p>Chariguamán<br/>Mullo, Guido</p>                 | <p>05/02/2016 -<br/>11:57 AM</p> |
| <p>Diciembre 2015:</p> <p>- El MTOP-B se encuentra realizando trabajos de mantenimiento en la Red Vial Estatal E495 Tramo: San Pablo-Chillanes-Bucay, previo al impacto del fenómeno del niño, de esta manera mitigar sucesos que puedan ocurrir en la vía.</p>   | <p>Chariguamán<br/>Mullo, Guido</p>                 | <p>13/01/2016 -<br/>08:36 AM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>- El MTOP-B se encuentra realizando trabajos de mantenimiento en la Red Vial Estatal E495 Tramo: San Pablo-Chillanes-Bucay, previo al impacto del fenómeno del niño, de esta manera mitigar sucesos que puedan ocurrir en la vía.</p>   | <p>Chariguamán<br/>Mullo, Guido</p>                 | <p>09/12/2015 -<br/>04:31 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2015:</p> <p>Actualmente se ejecuta el mantenimiento de la vía Echeandía - Ventanas, donde se realiza el bacheo de la vía antes mencionada, la maquinaria del MTOP-B, se encuentra realizando trabajos en la RVProvincial, por cuanto se suscribió el convenio con el GAD Provincial de Bolívar y el MTOP.</p>   | <p>Chariguamán<br/>Mullo, Guido</p>                 | <p>09/11/2015 -<br/>03:44 PM</p> |
| <p>Septiembre 2015</p> <p>Actualmente se ejecuta el mantenimiento de la vía Echeandía - Ventanas, donde se realiza el bacheo de la vía antes mencionada, la maquinaria del MTOP-B, se encuentra realizando trabajos en la RVProvincial, por cuanto se suscribió el convenio con el GAD Provincial de Bolívar y el MTOP.</p>   | <p>Chariguamán<br/>Mullo, Guido</p>                 | <p>12/10/2015 -<br/>08:32 AM</p> |
| <p>Agosto 2015</p> <p>Actualmente se ejecuta el mantenimiento de la vía Echeandía - Ventanas, donde se realiza el bacheo de la vía antes mencionada, la maquinaria del MTOP-B, se encuentra realizando trabajos en la RVProvincial, por cuanto se suscribió el convenio con el GAD Provincial de Bolívar y el MTOP.</p>   | <p>Chariguamán<br/>Mullo, Guido</p>                 | <p>31/08/2015 -<br/>09:18 AM</p> |
| <p>JULIO 2015</p> <p>Actualmente se ejecuta el mantenimiento de la vía Echeandía - Ventanas, donde se realiza el bacheo de la vía antes mencionada, la maquinaria del MTOP-B, se encuentra realizando trabajos en la RVProvincial, por cuanto se suscribió el convenio con el GAD Provincial de Bolívar y el MTOP.</p>  | <p>Pilamunga<br/>Llumiguano,<br/>Gustavo Xavier</p> | <p>11/08/2015 -<br/>10:31 AM</p> |



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Junio 2015: Actaulamente se ejecuta el mantenimiento de la vía Echeandía - Ventanas, donde se realiza el bacheo de la vía antes mencionada, la maquinaria del MTOP-B, se encuentra realizando trabajos en la RVProvincial, por cuanto se suscribió el convenio con el GAD Provincial de Bolívar y el MTOP.  | Pungaña Zaruma, Sergio Washington    | 09/07/2015 - 03:48 PM         |
| Mayo (2015): Se realiza mantenimiento en la vía Echeandía-Ventanas en donde se realizan trabajos de frezado y bacheo correpondiente. En la Vía Guanujo - Echeandía se realiza limpieza de derrumbes en el sector denominado "La Piedra".  | Abedrabbo García, Jorge Farah        | 10/06/2015 - 09:35 AM         |
| Abril (2015):Las carreteras Guaranda - Balsapamba, Guanujo - Echeandía - Ventanas, San Pablo - Chillanes - Bucay debido al fuerte temporal invernal se producen múltiples deslizamientos de tierra, lodo, piedras que cierran las vías en mención, maquinaria de la Dirección Provincial de Transporte y obras Públicas de Bolívar junto a las maquinas de los contratistas en este casa Maquinaria del cuerpo de Ingenieros del ejercito en el caso de Guaranda - Balsapamba e Hidrobo Estrada en la vía Guanujo - Echeandía trabajan en la habilitación de los mismos. A la fecha siguen los trabajos de limpieza de derrumbes se tienen varios frentes de trabajo permanente debido a que cada día se producen deslizamientos y se debe limpiarlos.                          | Abedrabbo García, Jorge Farah        | 11/05/2015 - 10:07 AM         |
| Marzo (2015): Se declara en emergencia las cerreteras Guaranda - Balsapamba, Guanujo - Echeandía - Ventanas, San Pablo - Chillanes - Bucay debido al fuerte temoporal invernal se producen múltiples deslizamientos de tierra, lodo, piedras que cierran las vías en mención, maquinaria de la Dirección Provincial de Transporte y obras Públicas de Bolívarjunto a las maquinas de los contratistas en este casa Maquinaria del cuerpo de Ingenieros del ejercito en el caso de Guaranda - Balsapamba e Hidrobo Estrada en la vía Guanujo - Echeandía trabajan en la habilitación de los mismos. A la fecha siguen los trabajosde limpieza de derrumbes se tienen varios frentes de trabajo permanente debido a que cada día se producen deslizamientos y se debe limpiarlos. | Abedrabbo García, Jorge Farah        | 09/04/2015 - 08:00 AM         |
| Diciembre(2014): Trabajos programados para el año 2014 terminados.  | Lara Villacis, Ligia Elena           | 06/01/2015 - 09:51 AM         |
| Noviembre(2014): Se realizan reposición de tachas reflectivas Vía Guaranda - Balsapamba, se realizan trabajos de limpieza de derrumbes menores Vía Guaranda - Las Herrerías - San Juan.   | Lara Villacis, Ligia Elena           | 08/12/2014 - 12:33 PM         |
| Octubre(2014): Limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial en diferentes tramos de la red vial estatal.  | Lara Villacis, Ligia Elena           | 06/11/2014 - 02:26 PM         |
| Septiembre(2014): Limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial en diferentes tramos de la red vial estatal.   | Lara Villacis, Ligia Elena           | 06/11/2014 - 02:25 PM         |
| Agosto(2014): Limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial en diferentes tramos de la red vial estatal.   | Lara Villacis, Ligia Elena           | 09/09/2014 - 02:35 PM         |
| Julio(2014): Limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial en diferentes tramos de la red vial estatal.  | Lara Villacis, Ligia Elena           | 05/08/2014 - 11:00 AM         |
| Diciembre (2013): Limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial en diferentes tramos de la red vial estatal.   | Viscarra Gavilanes, Medardo Patricio | 06/01/2014 - 02:26 PM         |
| Noviembre(2013): Limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial en diferentes tramos de la red vial estatal. No se contratarán microempresas para este año.   | Viscarra Gavilanes, Medardo Patricio | 06/12/2013 - 03:42 PM         |
| Octubre(2013): Se realizan trabajos de limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial en diferentes tramos de la red vial estatal. No se contratarán microempresas para este año.   | Viscarra Gavilanes, Medardo Patricio | 06/12/2013 - 03:41 PM         |
| Septiembre(2013): Se realizan trabajos de limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial en diferentes tramos de la red vial estatal. No se contratarán microempresas paera este año. Se tenía provista la contratación de una microempresa pero varios proyectos se encuentran tramitando Actas Provisionales y Definitivas y varias se encuentran ejecutandose por lo que no fue viable la contratación para mantenimientos con microempresas.  | Lara Villacis, Ligia Elena           | 09/10/2013 - 09:20 AM         |
| Agosto(2013): Se realizan trabajos de limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial en diferentes tramos de la red vial estatal.   | Lara Villacis, Ligia Elena           | 06/09/2013 - 12:20 PM         |
| Julio(2013): Se continua realizando trabajos de limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial, se realiza mantenimiento rutinario en el tramo Guaranda - Gallo Rumi con maquinaria de la Institución.  | Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin      | 06/08/2013 - 03:07 PM         |
| Junio (2013): Se continua realizando trabajos de limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial, se realiza mantenimiento rutinario en el tramo Guaranda - Gallo Rumi con maquinaria de la Institución.   | Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin      | 04/07/2013 - 02:58 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Mayo (2013): Se continua realizando trabajos de limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial   | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | 06/06/2013 - 09:40 AM         |
| Abril (2013): Se realiza limpieza de taludes en las Vías San Pablo - Chillanes, derrumbes menores en las vías 4 Esquinas - Salinas y Guaranda - Balzapamba, esto con maquinaria de MTOP - Bolívar.   | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | 08/05/2013 - 11:59 AM         |
| Marzo (2013): Realizando trabajos de limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial.   | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | 08/05/2013 - 11:57 AM         |
| Febrero (2013): Realizando trabajos de limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial.   | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | 08/05/2013 - 11:57 AM         |
| Enero (2013): Realizando trabajos de limpieza de derrumbes menores, limpieza de cunetas con maquinaria de la Dirección Provincial.   | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | 08/05/2013 - 11:56 AM         |
| <p>Diciembre (2012):<br/>Trabajos de mantenimiento rutinario con Microempresas en las distintos tramos viales correspondientes, derrumbes menores, limpieza de cunetas y alcantarillas.</p> <p>Noviembre(2012):<br/>Trabajos de mantenimiento rutinario con Microempresas en las distintos tramos viales correspondientes, derrumbes menores, limpieza de cunetas y alcantarillas.</p> <p>Octubre(2012):<br/>Transporte de material de derrumbes menores, Limpieza de cunetas y alcantarillas, trabajos de mantenimiento rutinario con Microempresas en las distintos tramos viales correspondientes.</p> <p>Septiembre(2012):<br/>Limpieza de cunetas y alcantarillas, trabajos de mantenimiento rutinario con Microempresas en las distintos tramos viales correspondientes.</p> <p>Agosto(2012):<br/>Limpieza de cunetas y alcantarillas, trabajos de mantenimiento rutinario con Microempresas en las distintos tramos viales correspondientes.</p> <p>Julio(2012):<br/>Se terminó la construcción del muro de pie ubicado en la vía Guaranda-río blanco entre el km 0+910-km 0+958. Limpieza de cunetas y alcantarillas, trabajos de mantenimiento rutinario con Microempresas en las distintos tramos viales correspondientes.</p> <p>Junio(2012): Trabajos de mantenimiento rutinario con Microempresas en las distintos tramos viales correspondientes.</p> <p>Mayo(2012): Trabajos con las microempresas en las distintos tramos viales correspondientes.</p> <p>Abril(2012): Trabajos de mantenimiento rutinario con Microempresas en las Carreteras Guaranda-Puente de Piedra y Cuatro Esquinas Salinas. Se concluyó la Señalización Horizontal en los Km 26 al Km 40 en la via Rio Blanco-Guaranda.</p> <p>Marzo(2012)<br/>Señalización Horizontal de Rio Blanco-Guaranda<br/>Lluvias Fuertes<br/>Fundición Replantillo de Muro de Pie<br/>Limpieza de Cunetas<br/>Bacheo</p> <p>Febrero(2012)<br/>Deslizamiento de meza en el Km 0+910, se prolonga longitud del muro de pie</p> <p>Enero(2012)<br/>Se continúa con los trabajos en el muro de pie Km 0+910<br/>En proceso para contratación de Microempresas</p> | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | 08/05/2013 - 11:55 AM         |

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

| Localidad de Impacto |   |
|----------------------|---|
| 1                    | Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar |

**HITOS**

|    | Hito  | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes menores (Maquinaria MTOP) Enero 2013   | 4-Inicio de Trabajo        | 31/01/2013         |                | 31/01/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 2  | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes menores (Maquinaria MTOP) Febrero 2013   | 4-Inicio de Trabajo        | 28/02/2013         |                | 28/02/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 3  | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes menores (Maquinaria MTOP) Marzo 2013   | 4-Inicio de Trabajo        | 31/03/2013         |                | 31/03/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 4  | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes menores (Maquinaria MTOP) Abril 2013   | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2013         |                | 30/04/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 5  | EJECUCIÓN: Culminación de Trabajos de Mantenimiento   | 1-Solicitud de Información | 31/12/2013         |                | 31/12/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 6  | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes menores, Mantenimiento Rutinario (Maquinaria MTOP) Enero 2014 - Abril 2014           | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2014         |                | 30/04/2014 |          | Sí            | 3.0           |
| 7  | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes menores, Mantenimiento Rutinario (Maquinaria MTOP) Mayo 2014 - Agosto 2014           | 5-Entregables Intermedios  | 31/08/2014         |                | 03/09/2014 |          | Sí            | 3.0           |
| 8  | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes menores, Mantenimiento Rutinario (Maquinaria MTOP) Septiembre 2014 - Diciembre 2014  | 5-Entregables Intermedios  | 31/12/2014         |                | 31/12/2014 |          | Sí            | 3.0           |
| 9  | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario y bacheo de la vía Echeandía - Ventanas Terminado                                  | 5-Entregables Intermedios  | 03/07/2015         |                | 11/08/2015 |          | Sí            | 3.0           |
| 10 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario y bacheo de la vía 4 Esquinas - Salinas Terminado                                  | 5-Entregables Intermedios  | 24/07/2015         |                | 30/07/2015 |          | Sí            | 3.0           |
| 11 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario y bacheo de la vía San Pablo - Chillanes Terminado                                 | 5-Entregables Intermedios  | 27/11/2015         |                | 27/11/2015 |          | Sí            | 3.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes menores, Mantenimiento Rutinario (Maquinaria MTOP) Enero 2016 - Marzo 2016 Terminado | 5-Entregables Intermedios  | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |          | Sí            | 3.0           |
| 13 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario y bacheo de la vía San Pablo - Chillanes Terminado                                 | 5-Entregables Intermedios  | 31/05/2016         |                | 31/05/2016 |          | Sí            | 3.0           |
| 14 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario y bacheo de la vía Echeandía - Ventanas Terminado                                  | 5-Entregables Intermedios  | 31/07/2016         |                | 02/08/2016 |          | Sí            | 1.0           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 15 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes menores, Mantenimiento Rutinario (Maquinaria MTOP) Octubre 2016 - Diciembre 2016 Terminado                     | 5-Entregables Intermedios              | 20/12/2016         |                | 31/12/2016 |    | Sí            | 3.0           |
| 16 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Enero - Marzo 2017, Terminado       | 5-Entregables Intermedios              | 30/03/2017         |                | 13/04/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 17 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Abril - Junio 2017, Terminado       | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2017         |                | 11/07/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 18 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Julio - Septiembre 2017, Terminado  | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2017         |                | 30/09/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 19 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Octubre - Diciembre 2017, Terminado | 5-Entregables Intermedios              | 29/12/2017         |                | 31/12/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 20 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Enero - Marzo 2018, Terminado       | 9-Entregables Formales                 | 31/03/2018         |                | 31/03/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 21 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Abril - Junio 2018, Terminado       | 9-Entregables Formales                 | 30/06/2018         |                | 30/06/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 22 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Julio - Septiembre 2018, Terminado  | 9-Entregables Formales                 | 30/09/2018         |                | 30/09/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 23 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Octubre - Diciembre 2018, Terminado | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 24 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Marzo 2019, Terminado               | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 29/03/2019         |                | 29/03/2019 |  | Sí            | 1.0           |
| 25 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de  | 9-Entregables Formales                 | 28/06/2019         |                | 30/06/2019 |  | Sí            | 3.0           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | cunetas, roza a mano, bacheo menor Junio 2019, Terminado  |                           |                    |                |            |   |               |               |
| 26 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Septiembre 2019, Terminado      | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019         |                | 30/09/2019 |    | Sí            | 3.0           |
| 27 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Diciembre 2019, Terminado       | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         |                | 31/12/2019 |    | Sí            | 3.0           |
| 28 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Marzo 2020, Terminado           | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2020         |                | 31/03/2020 |    | Sí            | 2.0           |
| 29 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Junio 2020, Terminado           | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2020         |                | 30/06/2020 |    | Sí            | 2.0           |
| 30 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Septiembre 2020, Terminado      | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2020         |                | 30/09/2020 |    | Sí            | 2.0           |
| 31 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Diciembre 2020, Terminado       | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2020         |                | 30/12/2020 |  | Sí            | 2.0           |
| 32 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Enero 2021, Terminado           | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2021         |                | 31/01/2021 |  | Sí            | 2.0           |
| 33 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Febrero y Marzo 2021, Terminado | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2021         |                | 30/06/2021 |  | Sí            | 2.0           |
| 34 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Abril 2021, Terminado           | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2021         |                | 30/06/2021 |  | Sí            | 2.0           |
| 35 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Mayo 2021, Terminado            | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2021         |                | 30/07/2021 |  | Sí            | 2.0           |
| 36 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Junio 2021, Terminado           | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2021         |                | 30/07/2021 |  | Sí            | 2.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 37 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Julio 2021, Terminado      | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2021         |                | 30/07/2021 |          | Sí            | 2.0           |
| 38 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Agosto 2021, Terminado     | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2021         |                | 31/08/2021 |          | Sí            | 2.0           |
| 39 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Septiembre 2021, Terminado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2021         |                | 30/09/2021 |          | Sí            | 6.0           |
| 40 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Octubre 2021, Terminado    | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2021         |                | 31/10/2021 |          | Sí            | 6.0           |
| 41 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Noviembre 2021, Terminado  | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2021         |                | 30/11/2021 |          | Sí            | 5.0           |
| 42 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, roza a mano, bacheo menor Diciembre 2021, Terminado  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 5.0           |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS


|    | Supervisión   | Supervisor                      | Organización Supervisora   | Fecha de creación |
|----|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1  | EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTON CHIMBO             | Tenelema Taris, Piedad Norma    | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 30/04/2017        |
| 2  | EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTON CHILLANES          | Tenelema Taris, Piedad Norma    | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 31/03/2017        |
| 3  | EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTON LAS NAVES          | Tenelema Taris, Piedad Norma    | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 23/02/2017        |
| 4  | EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTON SAN MIGUEL         | Tenelema Taris, Piedad Norma    | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 27/01/2017        |
| 5  | PROYECTO NO SE ESTA EJECUTANDO EN EL CANTON CALUMA        | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 26/10/2016        |
| 6  | PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON ECHEANDIA | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 30/08/2016        |
| 7  | PROYECTO TIENE UN AVANCE DEL 75% EN EL CANTÓN CHILLANES   | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 28/07/2016        |
| 8  | PROYECTO SE EJECUTA CON DIFICULTAD EN EL CANTON CHIMBO    | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 27/06/2016        |
| 9  | EL PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON LAS NAVES          | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 21/05/2016        |
| 10 | PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO EN EL CANTON GUARANDA         | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 29/04/2016        |
| 11 | PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CALUMA    | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 28/03/2016        |



**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

|    | Supervisión  | Supervisor                      | Organización Supervisora   | Fecha de creación |
|----|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 12 | PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON SAN MIGUEL   | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 27/02/2016        |
| 13 | Proyecto de Mantenimiento Vial de las Vías que conducen a Chillanes se desarrolla con Dificultad por falta de Presupuesto.   | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 17/12/2015        |
| 14 | PROYECTO SE EJECUTA CON POCO DE DIFICULTAD EN EL CANTON ECHEANDIA  | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 22/01/2016        |
| 15 | PROYECTO SE EJECUTA CON UN POCO DE DIFICULTADES E EL CANTON CHIMBO   | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 27/11/2015        |
| 16 | EL PROYECTO SI SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN LAS NAVES  | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 26/10/2015        |
| 17 | PROYECTO SI SE ESTA EJECUTANDO   | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 30/09/2015        |
| 18 | Supervisión realizada en el tramo San Pablo - Chillanes  | Gavilánez Camacho, Fafo Holguin | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 10/10/2013        |
| 19 | Supervisión de la Vía desde la Parroquia San Pablo de Atenas del Cantón San Miguel hasta el Cantón Chillanes, Provincia Bolívar  | Bayas Duran, Angel Ovidio       | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 29/05/2013        |
| 20 | Historico - En lo que corresponde a la red vial Rio Blanco Guaranda -Balsapamba se ha venido realizando trabajos permanentes y trabajos en las variantes establecidas según el estudio de mejorame | Bayas Duran, Angel Ovidio       | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 24/04/2012        |
| 21 | Historico - En lo que corresponde a la red vial Rio Blanco Guaranda -Balsapamba se ha venido realizando trabajos permanentes de bacheo adecuación y limpieza de cunetas, se ha votado lastre de me | Bayas Duran, Angel Ovidio       | {PR} - Provincia - BOLIVAR | 22/03/2012        |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador                                | Estado  | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de la red vial en buen estado |  | 100.00 %          | 0.95 | 0.95                  | 04/01/2012      | Jul-Sep                    |

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 168,952.59       |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 19,331,148.23 ** |
| Costo Total:                  | 2,556,889.05     |
| Total Devengado:              | 19,201,200.84    |
| % Costo Total Devengado:      | 750.96 %         |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 750.96 %

Perfil Económico 2021

|   | Años Previos    | Año Actual (2021) | Años Futuros | Total         |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado  | 35,333,438.35   | 1,486,857.89      | 0.00         | 36,820,296.24 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 11,290,304.14   | 684,832.86        | 0.00         | 11,975,137.00 |
| Ppto. Codificado  | 21,676,712.26   | 1,486,857.89      | 0.00         | 23,163,570.15 |
| Ppto. Comprometido                                      | 17,409,714.73   | 0.00              | 0.00         | 17,409,714.73 |
| Planeado - Codificado (2021)                            |                 | 0.00              |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 16,911,543.34   | 1,486,857.89      | 0.00         | 18,398,401.23 |
| Ppto. Devengado   | 17,844,290.34   | 1,356,910.50      | 0.00         | 19,201,200.84 |
| Pagado Real   | 8,348,285.02    | 0.00              | 0.00         | 8,348,285.02  |
| Estimado a fin de año                                   | * 17,844,290.34 | 0.00              | 0.00         | 17,844,290.34 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | -932,747.00     | 1,486,857.89      | 0.00         | 554,110.89    |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 105.52 %      | 91.26 %           | 0.00 %       | 104.36 %      |
| Ppto. Codificado 998                                    | 922,601.25      | 0.00              | 0.00         | 922,601.25    |
| Ppto. Devengado 998                                     | 128,643.60      | 0.00              | 0.00         | 128,643.60    |

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

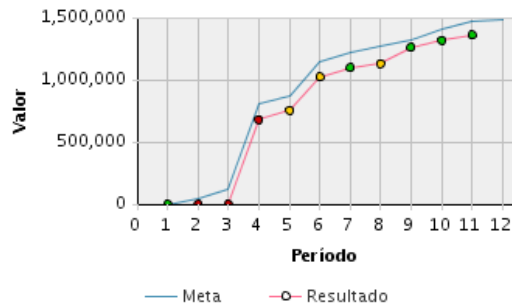

Presupuesto Mensual 2021

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2021 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 39,142.28                  | 0.00                | 39,142.28                    | 0.00                  | 0.00 %           |        | 0.00 %       |
| Mar                      | 81,621.22                  | 0.00                | 120,763.50                   | 0.00                  | 0.00 %           |        | 0.00 %       |
| Abr                      | 679,827.80                 | 679,827.80          | 800,591.30                   | 679,827.80            | 84.92 %          |        | 45.72 %      |
| May                      | 71,912.82                  | 71,912.82           | 872,504.12                   | 751,740.62            | 86.16 %          |        | 50.56 %      |
| Jun                      | 270,414.63                 | 270,414.63          | 1,142,918.75                 | 1,022,155.25          | 89.43 %          |        | 68.75 %      |
| Jul                      | 72,279.54                  | 72,279.54           | 1,215,198.29                 | 1,094,434.79          | 90.06 %          |        | 73.61 %      |
| Ago                      | 51,596.18                  | 36,229.12           | 1,266,794.47                 | 1,130,663.91          | 89.25 %          |        | 76.04 %      |
| Sep                      | 45,912.82                  | 129,722.40          | 1,312,707.29                 | 1,260,386.31          | 96.01 %          |        | 84.77 %      |
| Oct                      | 87,621.22                  | 54,454.70           | 1,400,328.51                 | 1,314,841.01          | 93.90 %          |        | 88.43 %      |
| Nov                      | 64,958.20                  | 42,069.49           | 1,465,286.71                 | 1,356,910.50          | 92.60 %          |        | 91.26 %      |
| Dic                      | 21,571.18                  |                     | 1,486,857.89                 |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>1,486,857.89</b>        | <b>1,356,910.50</b> |                              |                       |                  |        |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |   |
|----------------------|---|
| 14                   | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 15                   | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.   |
| 16                   | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.                       |
| 17                   | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.                                    |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo   | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 1  | A.1 Devengados esigef Octubre a Diciembre 2019                     | Devengados_Septiembre_a_Diciembre_2019.pdf             | 10/01/2020    |
| 2  | A2. CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2020                               | enero_2020.pdf   | 08/05/2020    |
| 3  | A3. CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2020                             | febrero_2020.pdf                                       | 08/05/2020    |
| 4  | A4. CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2020                               | marzo_2020.pdf   | 08/05/2020    |
| 5  | A5. CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2020                               | abril_2020.pdf   | 08/05/2020    |
| 6  | A6. CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2020                               | Reporte_Mantenimiento_Vial_Bolivar_mes_julio.pdf       | 18/08/2020    |
| 7  | A7. CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2020                               | Mantnimiento_Vial_Bolivar_mes_de_junio.pdf             | 19/08/2020    |
| 8  | A8. CÉDULA PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 2020.                  | Reporte_septiembre.pdf                                 | 05/10/2020    |
| 9  | A9. Cédula Presupuestaria Octubre 2020                             | cedula_prsupuestaria_octubre.pdf                       | 02/12/2020    |
| 10 | B1. Cédula presupuestaria Noviembre 2020                           | cedula_presupuestaria_noviembre.pdf                    | 02/12/2020    |
| 11 | C1. Acta Entrega recepción y liquidación por mutuo acuerdo.        | Acta_Entrega_liquidación_Emergencia_Echeandía_Ventanas | 07/08/2017    |
| 12 | C2. Acta de Entrega Recepción Definitiva Microempresa Emanuel 2011 | 3593_Acta_de_Recepcion_Definitiva.pdf                  | 25/06/2015    |
| 13 | C3. Acta de Entrega Recepción Definitiva Microempresa Emanuel 2012 | 4446_Acta_de_Recepcion_Definitiva.pdf                  | 25/06/2015    |
| 14 | C4. Acta de Entrega Recepción Definitiva Microempresa Emanuel      | 2811_Acta_de_Entrega_Recepcion_Definitiva.pdf          | 25/06/2015    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo  | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 15 | C5.Acta de Entrega Recepción Definitiva Microempresa Mushuk Ñan 2012        | 4690_Acta_de_Recepcion_Definitiva.pdf                           | 25/06/2015    |
| 16 | C6.Acta de Entrega Recepción Definitiva Microempresa Mushuk Ñan             | 3591_Acta_de_Recepcion_Definitiva.pdf                           | 25/06/2015    |
| 17 | C7.Acta de Entrega Recepción Definitiva Microempresa Ñuka LLakta 2012       | 4447_Acta_de_Recepcion_Definitiva.pdf                           | 25/06/2015    |
| 18 | C8.Acta de Entrega Recepción Definitiva Microempresa Ñuka LLakta            | 3592_Acta_de_Recepcion_Definitiva.pdf                           | 25/06/2015    |
| 19 | C9.Acta de recepción de trabajos Microempresa CURY ÑAN Junio 2016           | CURI_ACTA_1.pdf   | 05/08/2016    |
| 20 | Contrato Original Microempresa Emanuel 2012                                 | 4446_Contrato_Original.pdf                                      | 25/06/2015    |
| 21 | Contrato Original Microempresa Mushuk Ñan 2012                              | 4690_Contrato_Original.pdf                                      | 25/06/2015    |
| 22 | Contrato Original Microempresa Ñuka LLakta 2012                             | 4447_Contrato_Original.pdf                                      | 25/06/2015    |
| 23 | Contrato Original Rehabilitación Echeandía - Ventanas Mantenimiento         | 5154_Contrato_Original.pdf                                      | 25/06/2015    |
| 24 | Contrato Original Rehabilitación San Pablo - Chillanes Mantenimiento        | 5155_Contrato_Original.pdf                                      | 25/06/2015    |
| 25 | CUADRO DE CANTIDADES DE LAS CÉDULAS PRESUPUESTARIAS HASTA AGOSTO 2019       | Cedula_Presupuestaria_agosto_2019.pdf                           | 12/09/2019    |
| 26 | Cédula presupuestaria Mes de Abril 2019.                                    | ABRIL.PDF   | 02/08/2019    |
| 27 | CÉDULA PRESUPUESTARIA MES DE JULIO 2019.                                    | JULIO.PDF   | 02/08/2019    |
| 28 | CÉDULA PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2019.                                    | JUNIO.PDF   | 02/08/2019    |
| 29 | CÉDULA PRESUPUESTARIA MES DE MAYO 2019.                                     | MAYO.PDF  | 02/08/2019    |
| 30 | D1.Acta de recepción de trabajos Microempresa INTY ÑAN Junio 2016           | INTY_ACTA_1.pdf   | 05/08/2016    |
| 31 | D2.Acta de recepción de trabajos Microempresa MUSHUK ÑAN Junio 2016         | MUSHUCK_ACTA_1.pdf  | 05/08/2016    |
| 32 | D3.Avançe de mantenimiento San Pablo - Chillanes - Bucay Marzo 2017         | INFORME_CHILLANES_BUCAY.pdf                                     | 05/04/2017    |
| 33 | Emergente Chillanes Santa Rosa de Agua Clara 09_2017                        | Emergente_Chillanes_Santa_Rosa_de_Agua_Clara_09_2017.pdf        | 04/10/2017    |
| 34 | Emergente Chimbo Cristal 09-2017  | Emergente_Chimbo_Cristal_09-2017.pdf                            | 04/10/2017    |
| 35 | Emergente Guanujo Echeandía 09_2017   | Emergente_Guanujo_Echeandía_09_2017.pdf                         | 04/10/2017    |
| 36 | Informe de avance de mantenimiento San Pablo - Chillanes - Bucay Marzo 2017 | Echeandía-Ventanas_marzo_2017.pdf                               | 05/04/2017    |
| 37 | INFORME DE AVANCE MANTENIMIENTO ECHEANDÍA - VENTANAS FEBRERO 2017           | Avance_Echeandía-Ventanas_Febrero_2017.pdf                      | 06/03/2017    |
| 38 | INFORME DE AVANCE MANTENIMIENTO GUARANDA - BALSAPAMBA FEBRERO 2017          | Avance_Guaranda_-_Balsapamba_Febrero_2017.pdf                   | 06/03/2017    |
| 39 | INFORME DE AVANCE MANTENIMIENTO GUARANDA - BALSAPAMBA MARZO 2017            | Guaranda_Balzapamba_marzo_de_2017.pdf                           | 05/04/2017    |
| 40 | INFORME DE AVANCE MANTENIMIENTO SAN PABLO - CHILLANES - BUCAY FEBRERO 2017  | Avance_San_Pablo-Chillanes-Bucay_Febrero_2017.pdf               | 06/03/2017    |
| 41 | INFORME DE MANTENIMIENTO ECHEANDIA VENTANAS                                 | INFORME_DE_TRABAJO_Echeandía-Ventanas_del_2_de_mayo_de_2017.pdf | 08/05/2017    |
| 42 | INFORME DE MANTENIMIENTO SAN PABLO CHILLANES BUCAY                          | INFORME_DE_TRABAJO_San_Pablo_Chillanes_Bucay_mayo_2017.pdf      | 08/05/2017    |
| 43 | Informe de Mantenimiento Vial Echeandía Ventanas MAYO 2017                  | Echeandía-Ventanas_del_29_de_mayo_de_2017.pdf                   | 05/06/2017    |
| 44 | INFORME DE TRABAJO Y ARCHIVO FOTOGRAFICO JULIO 2017                         | Mantenimiento_Guaranda_Balzapamba_julio_2017.pdf                | 07/08/2017    |
| 45 | Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. AGOSTO 2017                       | Guanujo_Echeandia_agosto_2017.pdf                               | 07/09/2017    |
| 46 | Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. AGOSTO 2017                       | San_Pablo-Chillanes-Bucay_Agosto_2017.pdf                       | 07/09/2017    |
| 47 | Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. AGOSTO 2017                       | Guaranda_Balzapamba_AGOSTO_2017.pdf                             | 07/09/2017    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 48 | Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. JUNIO 2017                                   | Echeandía-Ventanas__junio_de_2017.pdf  | 11/07/2017    |
| 49 | Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. NOVIEMBRE 2017                               | Emergente_Chillanes_Santa_Rosa_de_Agua_Clara_27-11-2017.pdf                                  | 05/12/2017    |
| 50 | Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. NOVIEMBRE 2017                               | Emergente_Chimbo_Cristal_27-11-2017_..pdf  | 05/12/2017    |
| 51 | Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. NOVIEMBRE 2017                               | Emergente_Guanujo_Echenadía_27-11-2017_..pdf   | 05/12/2017    |
| 52 | Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. OCTUBRE 2017 Chillanes                       | Emergente_Chimbo_Cristal_10-2017.pdf   | 01/11/2017    |
| 53 | Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. OCTUBRE 2017 Chimbo - El Cristal             | Emergente_Chimbo_Cristal_10-2017.pdf   | 01/11/2017    |
| 54 | Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. OCTUBRE 2017 Guanujo Echeandía               | Emergente_Guanujo_Echeandía_10-2017.pdf  | 01/11/2017    |
| 55 | Informe Ejecutivo Abril 2016   | Informe_Ejecutivo_Abril_2016.pdf   | 04/05/2016    |
| 56 | Informe Ejecutivo Agosto 2012  | 1.0.1_Emanuel.pdf  | 08/10/2012    |
| 57 | Informe Ejecutivo Agosto 2012 Microempresa   | 1.0.1_Mushuk.pdf   | 08/10/2012    |
| 58 | Informe Ejecutivo Mayo 2016  | Informe_Ejecutivo_Mayo_2016.pdf  | 03/06/2016    |
| 59 | Informe Ejecutivo Octubre 2012   | 0.0.1.pdf  | 27/11/2012    |
| 60 | Informe Ejecutivo Septiembre 2012  | 1.0.2_Emanuel.pdf  | 08/10/2012    |
| 61 | Informe Mensual Microempresa 4Esquinas-Salinas Febrero-Marzo                           | Informe_Mensual_Nuka_LLakta_001.jpg  | 10/05/2012    |
| 62 | Informe Mensual Microempresa Guaranda-Puente de Piedra Febrero-Marzo                   | Informe_Mensual_Emanuel_001.jpg  | 10/05/2012    |
| 63 | MANTENIMIENTO ECHEANDIA VENTANAS ENERO 2017  | Informe_de_avance_Echeandía-Ventanas_ENERO_2017.pdf  | 09/02/2017    |
| 64 | Mantenimiento Emergente Contrato Original Echeandía Ventanas 2016                      | 14930_Contrato_Original_Obra_Echeandía_Ventanas.pdf  | 20/12/2016    |
| 65 | Mantenimiento Emergente Contrato Original Fiscalización Echeandía Ventanas 2016        | 012_- _FISCALIZACIÓN_DE_LA_OBRA_DE_REPARACIÓN_EMERGENTE_DE_VENTANAS.PDF                      | 20/12/2016    |
| 66 | Mantenimiento Emergente Contrato Original Fiscalización Guaranda Balsapamba 2016       | 041_- _FISCALIZACIÓN_DE_LA_OBRA_DE_REPARACIÓN_EMERGENTE_GUARANDA_- _BALZAPAMBA_BOLIVAR.PDF   | 20/12/2016    |
| 67 | Mantenimiento Emergente Contrato Original Fiscalización San Pablo Chillanes Bucay 2016 | 036_- _FISCALIZACIÓN_DE_LA_OBRA_DE_REPARACIÓN_EMERGENTE_SAN_PABLO_- _CHILLANES_- _BUCAY..PDF | 20/12/2016    |
| 68 | Mantenimiento Emergente Contrato Original Guaranda Balsapamba 2016                     | 043_- _OBRA_DE_REPARACIÓN_EMERGENTE_CARRETERA_GUARANDA_- _BALZAPAMBA..PDF                    | 20/12/2016    |
| 69 | Mantenimiento Emergente Contrato Original San Pablo Chillanes Bucay2016                | 025_- _OBRA_DE_REPARACIÓN_EMERGENTE_CARRETERA_SAN_PABLO_- _CHILLANES_- _BUCAY.PDF            | 20/12/2016    |
| 70 | MANTENIMIENTO GUARANDA BALZAPAMBA ENERO 2017   | Informe_de_Avance_Guaranda_Balzapamba_ENERO_2017.pdf   | 09/02/2017    |
| 71 | Mantenimiento Informe Ejecutivo Junio 2016   | Mantenimiento_Informe_Ejecutivo_Junio_2016.pdf   | 04/07/2016    |
| 72 | MANTENIMIENTO SAN PABLO CHILLANES ENERO 2017   | Informe_de_avance_San_Pablo-Chillanes-Bucay_ENERO_2017.pdf                                   | 09/02/2017    |
| 73 | NOVIEMBRE 2016   | Informe_Ejecutivo_Mantenimiento_Emergente_Echeandia_Ventanas_Noviembre_2016.pdf              | 09/12/2016    |
| 74 | NOVIEMBRE 2016   | Informe_Ejecutivo_Mantenimiento_Emergente_Guaranda_Balsapamba_Noviembre_2016.pdf             | 09/12/2016    |
| 75 | NOVIEMBRE 2016   | Informe_Ejecutivo_Mantenimiento_Emergente_San_Pablo_Chillanes_Noviembre_2016.pdf             | 09/12/2016    |
| 76 | P1. Informe mantenimiento Chillanes Bucay Julio 2021                                   | informe_fis_mante_chillanes-bucay_final-signed.pdf   | 05/08/2021    |
| 77 | P2. INFORME MANTENIMIENTO CHIMBO EL CRISTAL JULIO 2021                                 | informe_fis_mante_chimbo-el_cristal_final-signed.pdf   | 05/08/2021    |
| 78 | P3. INFORME MANTENIMIENTO GUARANDA LAS HERRERIAS - JULIO 2021                          | informe_fis_mante_guaranda-las_herrerias_final-signed.pdf                                    | 05/08/2021    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo                                | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 79 | P4. CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2021   | MANTENIMIENTO_MARZO.pdf                | 05/08/2021    |
| 80 | P5. CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2021   | MANTENIMIENTO_ABRIL.pdf                | 05/08/2021    |
| 81 | P6. CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2021  | MANTENIMIENTO_MAYO.pdf                 | 05/08/2021    |
| 82 | P7. CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2021   | MANTENIMIENTO_JUNIO.pdf                | 05/08/2021    |
| 83 | P8. CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2021   | MANTENIMIENTO_JULIO.pdf                | 05/08/2021    |
| 84 | P9. Cédula Presupuestaria AGOSTO 2021  | mantenimiento_y_paso.PDF               | 01/09/2021    |
| 85 | Q1. Cedula Presupuestaria Septiembre 2021  | cedula_presupuestaria_septiembre.pdf   | 05/10/2021    |
| 86 | Q2. CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2021   | Cedula_Presupuestaria_Octubre_2021.pdf | 04/11/2021    |
| 87 | Q3. Cédula presupuestaria Noviembre 2021   | REPORTE_NOVIEMBRE.pdf                  | 06/12/2021    |
| 88 | Q4. Documento de respaldo cierre de riesgos Proyecto Mantenimiento de la Provincia de Bolívar. | MTOP-DDB-2021-2637-ME.pdf              | 28/12/2021    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                            | Rol  | Puesto   | Correo Electrónico      | Teléfono(s) |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|
| Berrezueta Velez, Gustavo David   | Subsecretario Regional 5                                     | Subsecretario/a Zonal 5                                      | gberrezueta@mtop.gob.ec |             |
| Pungaña Zaruma, Sergio Washington | Supervisor Líder de Proyecto                                 | Supervisor de Conservación Vial de Bolívar                   | spungana@mtop.gob.ec    | 023974600   |
| Yacchirema Chimbo, Juan Carlos    | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolívar | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolivar | jyacchirema@mtop.gob.ec |             |

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

| Archivo     | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 30000_1.jpg | 28/12/2021    |
