

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte
Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte
PROYECTO: K010 MTOP.- Programa Nacional de Conservación de la Red Vial Estatal

Líder del Proyecto:	Barahona Dos Santos, María Cristina (mbarahona@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Izquierdo Socola, Ismael Alex	Programas Relacionados:	
Titular:	Armijo Logroño, Ángel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.387265	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	28/07/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	15/07/2022

DATOS GENERALES

Descripción

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas "MTOP" cuenta con 6.732,72 kilómetros de carreteras que el administra en forma Directa desde las Direcciones Distritales. Mediante este programa se pretende dar mantenimiento a la red vial estatal administrada a fin de que no disminuyan sus niveles de servicio y se garantice la conectividad durante cuatro años fiscales.

Beneficios Cualitativos

- Brindar conservación rutinaria evita el deterioro excesivo de las carreteras y la reconstrucción de nuevos sitios críticos.
- Brindar el mantenimiento rutinario evita desgaste de vehículos y previene el aumento del tiempo de traslado de usuarios e insumos entre poblaciones y ciudades.
- Desarrollo y crecimiento del comercio interno y externo.
- Se previene el incremento en el número de accidentes y por ende menor número de muertes y de lesionados causados por daños en infraestructura.
- Mantiene la transitabilidad y conectividad por lo tanto mantener en desarrollo las actividades económicas del sector transporte, así como permite las actividades de comercio de los productos agrícolas del país, fomentando la economía de distintos sectores productivos y generación del turismo.
- Fuentes de trabajo ocasional durante la ejecución del proyecto (especialmente con microempresas)

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios directos, población, La red vial estatal permite brindar la conectividad a la totalidad de la población ecuatoriana y de acuerdo los datos de INEC al año inicial a implementar el proyecto para el año 2022 la población total es de 18.061.453 habitantes y para el año de fin del proyecto vial es tomada en cuenta la población total como demanda efectiva, en lo cual para el año 2025 es de 18.693.140 habitantes.


Restricciones

La principal restricción del proyecto es en relación al presupuesto, ya que con el monto asignado se intentara mantener los niveles de servicio sin disminución.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 14.51 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

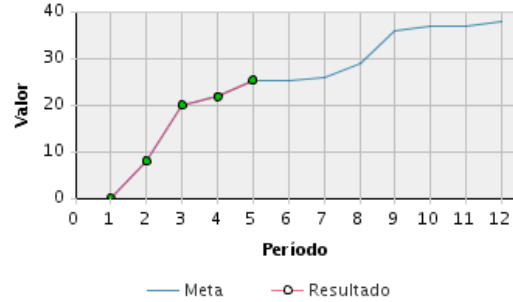

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	0 %	8 %	20 %	22 %	25 %	25 %	26 %	29 %	36 %	37 %	37 %	38 %
	Avance real acumulado											
	0 %	8 %	20 %	22 %	25 %							
	Estado											
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2022 1. Se crearon las actividades de "Seguros para maquinaria y patrullas de caminos " y "Seguridad y vigilancia para campamentos " por parte de las autoridades. 2. Se continua con la contratación de microempresas en otros tramos de la RVE de varias provincias. El devengado a 31 de mayo de 2022 es de 874,382.75	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/06/2022 - 04:46 PM
ABRIL 2022 1. Se contrataron algunas microempresas para algunos tramos de la RVE de varias provincias 2. Se creo la actividad de "Alquiler de maquinaria" con la finalidad de resolver los deslizamientos en la RVE causados por las fuertes precipitaciones que superaron la capacidad operativa del MTOP	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/06/2022 - 04:44 PM
MARZO 2022 1. Se mantuvo reuniones con la Coordinación de planificación del MTOP y Con la Secretaria Nacional de Planificación, se modifico el documento con la finalidad de absolver ciertas observaciones 2. Se obtuvo el Dictamen de prioridad con oficio SNP-SPN-2022-0332-OF de 7 de marzo de 2022 3. Se elaboro el anexo para inclusión del proyecto en PAI 4. Se asignaron recursos económicos al proyecto	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/06/2022 - 04:40 PM
FEBRERO 2022 1. Se elaboro el Documento Proyecto y sus anexos para postular para obtención del dictamen de Prioridad	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/06/2022 - 04:40 PM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2022		28/02/2022		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	9-Entregables Formales	07/03/2022		07/03/2022		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	9-Entregables Formales	07/03/2022		07/03/2022		Sí	5.0
4	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	5-Entregables Intermedios	23/03/2022		23/03/2022		Sí	2.0
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	5-Entregables Intermedios	30/03/2022		30/03/2022		Sí	3.0
6	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Bolivar	3-Adjudicación	10/04/2022		10/04/2022		Sí	0.2
7	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Los Rios	3-Adjudicación	10/04/2022		10/04/2022		Sí	0.2
8	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	13/04/2022		13/04/2022		Sí	0.2
9	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas El Oro	3-Adjudicación	20/04/2022		20/04/2022		Sí	0.2
10	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Manabi	3-Adjudicación	22/04/2022		22/04/2022		Sí	0.2
11	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Carchi	3-Adjudicación	26/04/2022		26/04/2022		Sí	0.2
12	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Santo Domingo	3-Adjudicación	27/04/2022		27/04/2022		Sí	0.2
13	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Imbabura	3-Adjudicación	29/04/2022		04/04/2022		Sí	0.2
14	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Chimborazo	3-Adjudicación	30/04/2022		25/04/2022		Sí	0.2
15	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Tungurahua	3-Adjudicación	01/05/2022		01/05/2022		Sí	0.2
16	C1.17. EJECUCIÓN: Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion contratados	5-Entregables Intermedios	02/05/2022		02/05/2022		Sí	1.5
17	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Pastaza	3-Adjudicación	03/05/2022		03/05/2022		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Santa Elena	3-Adjudicación	10/05/2022		10/05/2022		Sí	0.2
19	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Guayas	3-Adjudicación	12/05/2022		12/05/2022		Sí	0.2
20	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Sucumbios	3-Adjudicación	24/05/2022		24/05/2022		Sí	0.02
21	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Loja	3-Adjudicación	30/05/2022		30/05/2022		Sí	0.2
22	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Morona Santiago	3-Adjudicación	30/05/2022		30/05/2022		Sí	0.2
23	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Orellana	3-Adjudicación	30/05/2022		18/05/2022		Sí	0.2
24	C1.18. EJECUCIÓN: Conservacion a traves de microempresas Esmeraldas contratadas	3-Adjudicación	31/05/2022		23/05/2022		Sí	0.2
25	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Cotopaxi	3-Adjudicación	31/05/2022		03/05/2022		Sí	0.2
26	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Napo	3-Adjudicación	31/05/2022		20/05/2022		Sí	0.2
27	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Cañar	3-Adjudicación	15/07/2022	15/07/2022			No	0.1
28	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Pichincha	3-Adjudicación	15/07/2022	15/07/2022			No	0.1
29	C1.19. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Esmeraldas	3-Adjudicación	29/07/2022	29/07/2022			No	0.25
30	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Pichincha	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.1
31	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Sucumbios	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.1
32	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Pichincha	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.05
33	C1.13. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	maquinaria pesada y patrulla de caminos Imbabura							
34	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Carchi	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.05
35	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Chimborazo	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.05
36	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cotopaxi	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.05
37	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Esmeraldas	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.05
38	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Orellana	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.05
39	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pichincha	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.05
40	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santa Elena	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.05
41	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Sucumbios	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.05
42	C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Azuay	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.2
43	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Carchi	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.1
44	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Esmeraldas	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.1
45	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Imbabura	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.1
46	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Esmeraldas	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.05
47	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Imbabura	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
48	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Sucumbios	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.05
49	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Bolivar	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.05
50	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos El Oro	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.05
51	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Guayas	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.05
52	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Loja	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.05
53	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Los Rios	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.05
54	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Manabi	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.05
55	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Morona Santiago	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.05
56	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Napo	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.05
57	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pastaza	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.05
58	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Tungurahua	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.05
59	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.05
60	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Pichincha	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.25
61	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria El Oro	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.25
62	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Loja	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.25
63	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Sucumbios	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
64	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.25
65	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
66	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Bolívar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
67	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
68	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
69	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
70	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
71	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Guayas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
72	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Loja	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
73	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Los Ríos	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
74	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Manabí	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
75	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
76	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción,	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	herramientas y equipos menores Napo							
77	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
78	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Pastaza	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
79	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Santo Domingo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
80	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
81	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
82	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
83	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Bolívar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
84	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
85	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
86	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
87	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
88	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Guayas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
89	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Loja	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
90	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Los Ríos	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
91	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Manabí	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
92	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
93	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Napo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
94	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
95	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Pastaza	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
96	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
97	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
98	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
99	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
100	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
101	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Bolívar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
102	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Carchi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
103	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
104	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
105	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
106	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
107	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Esmeraldas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
108	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Guayas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
109	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Imbabura	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
110	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Loja	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
111	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Los Rios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
112	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Manabi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
113	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
114	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
115	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pastaza	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
116	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pichincha	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
117	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santa Elena	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
118	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santo Domingo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
119	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Sucumbios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
120	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
121	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
122	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
123	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Bolivar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
124	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Carchi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
125	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
126	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
127	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
128	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
129	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Esmeraldas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
130	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Guayas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
131	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Imbabura	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
132	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Loja	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
133	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Los Rios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
134	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Manabi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
135	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
136	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Napo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
137	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
138	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pastaza	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
139	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pichincha	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
140	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santa Elena	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
141	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santo Domingo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
142	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Sucumbios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
143	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
144	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
145	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
146	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Bolívar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
147	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Carchi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
148	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
149	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
150	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
151	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
152	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Esmeraldas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
153	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Guayas							
154	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Imbabura	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
155	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Loja	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
156	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Los Ríos	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
157	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Manabí	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
158	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
159	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Napo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
160	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
161	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Pastaza	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
162	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Pichincha	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
163	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Santa Elena	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
164	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Santo Domingo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
165	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Sucumbios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
166	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
167	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	maquinaria y equipo Zamora Chinchipe							
168	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.25
169	C2.I1. EJECUCIÓN: Calibracion de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2022	30/09/2022			No	0.5
170	C2.I2. EJECUCIÓN: Calibracion de equipos DELFECTOMETRIA	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.5
171	C2.I3. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica	5-Entregables Intermedios	31/10/2022	31/10/2022			No	1.0
172	C2.I1. EJECUCIÓN: Medición IRI	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	0.5
173	C2.I2. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	0.5
174	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores.	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	2.0
175	C1.I10. EJECUCIÓN: Contratación Seguros para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	0.01
176	C1.I11. EJECUCIÓN: Contratación Seguridad y vigilancia de campamentos	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	0.01
177	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	0.75
178	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.75
179	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.0
180	C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.0
181	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.0
182	C1.I7. EJECUCIÓN: Contratación Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.5
183	C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	3.0
184	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
185	C2.I1. EJECUCIÓN: Calibración de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL)	4-Inicio de Trabajo	31/12/2023	31/12/2023			No	0.5
186	C2.I1. EJECUCIÓN: Medición IRI	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.5
187	C2.I2. EJECUCIÓN: Calibración de equipos DELFECTOMETRIA	4-Inicio de Trabajo	31/12/2023	31/12/2023			No	0.5
188	C2.I2. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.5
189	C2.I3. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.85
190	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores.	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	2.0
191	C1.I10. EJECUCIÓN: Contratación Seguros para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	0.1
192	C1.I11. EJECUCIÓN: Contratación Seguridad y vigilancia de campamentos	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	0.1
193	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	0.75
194	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.75
195	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.0
196	C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.0
197	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.0
198	C1.I7. EJECUCIÓN: Contratación Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.5
199	C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	3.0
200	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	2.0
201	C2.I1. EJECUCIÓN: Calibración de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL)	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
202	C2.11. EJECUCIÓN: Medición IRI	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.5
203	C2.12. EJECUCIÓN: Calibración de equipos DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.5
204	C2.12. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.5
205	C2.13. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.8
206	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores.	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	2.0
207	C1.110. EJECUCIÓN: Contratación Seguros para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	0.1
208	C1.111. EJECUCIÓN: Contratación Seguridad y vigilancia de campamentos	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	0.1
209	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	0.75
210	C1.13. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.75
211	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
212	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
213	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
214	C1.17. EJECUCIÓN: Contratación Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.5
215	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	3.0
216	C1.19. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	2.0
217	C2.11. EJECUCIÓN: Calibración de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL)	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5
218	C2.11. EJECUCIÓN: Medición IRI	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5
219	C2.12. EJECUCIÓN: Calibración de equipos DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
220	C2.I2. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5
221	C2.I3. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.2
222	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	2.0
223	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
224	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	2.0
225	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
226	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendietes por liquidar - suscrito MEF	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.5
227	CIERRE: Cierre de proyecto según Informe Formato SNP aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
228	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
229	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
230	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	15,002,829.43
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	15,002,829.43	0.00	15,002,829.43
Ppto. Comprometido	0.00	5,459,541.98	0.00	5,459,541.98
Planeado - Codificado (2022)		-15,002,829.43		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	2,228,858.33	0.00	2,228,858.33
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
19	Incrementar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos en la fase de conservación de los proyectos de infraestructura del transporte MEDIANTE la supervisión de planes, programas y proyectos institucionales para la gestión de conservación en los procesos desconcentrados
