

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte
Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte
PROYECTO: K010 MTOP.- Programa Nacional de Conservación de la Red Vial Estatal

Líder del Proyecto:	Montalvo Jativa, Jose Luis (jmontalvo@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Abad Cordero, Paul Fernando	Programas Relacionados:	
Titular:	Llanga Cruz, Ximena Veronica	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.387265	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	72,584,878.88
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	03/04/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Montalvo Jativa, Jose Luis	Fecha del siguiente Hito:	30/08/2022

DATOS GENERALES

Descripción

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas "MTOP" cuenta con 6.732,72 kilómetros de carreteras que el administra en forma Directa desde las Direcciones Distritales. Mediante este programa se pretende dar mantenimiento a la red vial estatal administrada a fin de que no disminuyan sus niveles de servicio y se garantice la conectividad durante cuatro años fiscales.

Beneficios Cualitativos

- Brindar conservación rutinaria evita el deterioro excesivo de las carreteras y la reconstrucción de nuevos sitios críticos.
- Brindar el mantenimiento rutinario evita desgaste de vehículos y previene el aumento del tiempo de traslado de usuarios e insumos entre poblaciones y ciudades.
- Desarrollo y crecimiento del comercio interno y externo.
- Se previene el incremento en el número de accidentes y por ende menor número de muertes y de lesionados causados por daños en infraestructura.
- Mantiene la transitabilidad y conectividad por lo tanto mantener en desarrollo las actividades económicas del sector transporte, así como permite las actividades de comercio de los productos agrícolas del país, fomentando la economía de distintos sectores productivos y generación del turismo.
- Fuentes de trabajo ocasional durante la ejecución del proyecto (especialmente con microempresas)

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios directos, poblacion, La red vial estatal permite brindar la conectividad a la totalidad de la poblacion ecuatoriana y de acuerdo los datos de INEC al año inicial a implementar el proyecto para el año 2022 la población total es de 18.061.453 habitantes y para el año de fin del proyecto vial es tomada en cuenta la población total como demanda efectiva, en lo cual para el año 2025 es de 18.693.140 habitantes.

Beneficiarios indirectos, poblacion nacional y turistas, para el año 2022 la población total es de 18.061.453 habitantes y para el año de fin del proyecto vial es tomada en cuenta la población total como demanda efectiva, en lo cual para el año 2025 es de 18.693.140 habitantes.

Restricciones

TIEMPO: El proyecto durará xx años

COSTO: El valor asignado para la ejecución de este proyecto es de \$ xxxxxxxx

CALIDAD:

La principal restricción del proyecto es en relación al presupuesto, ya que con el monto asignado se intentara mantener los niveles de servicio sin disminución.

RECURSOS: personal, tecnologica, material (asfalto, cemento, señales, combustible)


RIESGOS: de caracter climatológico, ciertas políticas estatales

ALCANCE: EL ALCANCE ES LIMITADO YA QUE NO ESTA CONSIDERADO UN COMPONENTE DE MANTENIMIENTO PERIODICO

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 31.28 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

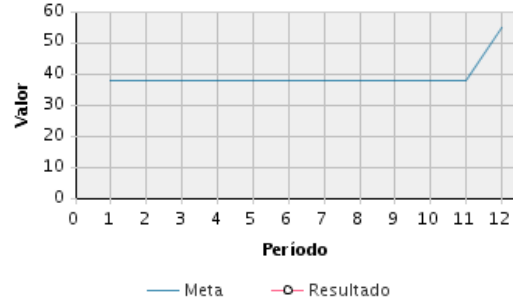

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	38 %	38 %	38 %	38 %	38 %	38 %	38 %	38 %	38 %	38 %	38 %	55 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Marzo 2023:</p> <p>Con Memorando No. MTOP-DNCOIT-2023-321-ME de 30 de marzo de 2023, se solicitó a los supervisores zonales, Coordinar con las Subsecretarías Zonales correspondientes a fin de que se genere información necesaria respecto al cumplimiento de hitos e indicadores del Programa Nacional de Conservación de la RVE.</p> <p>En el mes de marzo de 2023, se ha devengado el valor de \$735.878,21 (SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO con 21/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).</p> <p>La Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte solicitó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, con Memorando No. MTOP-DNCOIT-2023-261-ME de 23 de marzo de 2023, la incorporación al Plan Operativo Anual (POA) del Programa en mención, la Actividad Número 13, correspondiente a "INTERVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL".</p> <p>La Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte solicitó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, con Memorando No. MTOP-DNCOIT-2023-284-ME de 24 de marzo de 2023 se solicitó la incorporación al Plan Operativo Anual (POA) del Programa en mención, la Actividad Número 14, correspondiente a "VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN DEL GRUPO 71".</p> <p>Las actividades antes mencionadas fueron añadidas al POA del Programa Nacional de Conservación de la Red Vial Estatal, por parte de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.</p>	Montalvo Jativa, Jose Luis	03/04/2023 - 11:03 AM
<p>Febrero 2023</p> <p>Se ha dado mantenimiento a 1058.46 km de la RVE de acuerdo a los reportes de indicadores remitidos por los subsecretarios zonales. El devengado con corte a 28 de febrero de 2023 es de 588.572,32. Se ha contratado microempresas en algunas provincias así como personal y algunos contratos del resto de actividades.</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	03/03/2023 - 04:45 PM
<p>Enero</p> <p>Durante el mes de enero 2023, se realizó el POA y su aprobación, la ejecución presupuestaria del programa fue de 55.426,36 USD, todo corresponde al grupo 71 de acuerdo a lo reportado por talento humano y verificado en la cédula presupuestaria.</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	07/02/2023 - 09:52 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Diciembre 2022</p> <p>Se devengo un total de 15.906.511,29USD correspondiente al 83.74% de ejecución presupuestaria. Se dio atención a 6660.54km de red vial estatal a través de 264 microempresas generando 2494 fuentes de empleo directo en actividades de conservación de la red vial estatal con una inversión de 10.133.416,88 USD. Se cumplieron durante el 2022, los hitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 64, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 92, 93, 94, 97, 100, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 120, 121, 124, 128, 129, 131, 132, 134, 136, 144, 147, 149, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 159, 161, 164, 167, 171. No se realizaron y han justificado adecuadamente los hitos 32, 34, 39, 43, 48, 60, 62, 69, 72, 114, 127, 137, 139, 160 y 162.</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	04/01/2023 - 04:22 PM
<p>Noviembre</p> <p>Se solicitó información respecto al indicador del programa que corresponde a porcentaje de kilómetros mantenidos por administración directa. Lo que fue respondido mediante memorandos MTOP-DPP-2022-1760-ME, MTOP-DDN-2022-3193-ME, MTOP-CONS_ORE-2022-197-ME, MTOP-DDL-2022-2987-ME, MTOP-DDZCH-2022-2353-ME el promedio de lo reportado resulta en 70% considerando que no fue reportado Sucumbios, Imbabura, Esmeraldas, Carchi, Pastaza, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar, Azuay, Cañar, Morona. El devengado corresponde a 11.477.203,14 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 57.59%.</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	06/12/2022 - 03:32 PM
<p>Octubre</p> <p>Se solicitó información respecto al indicador del programa que corresponde a porcentaje de kilómetros mantenidos por administración directa. Lo que fue respondido mediante memorandos MTOP-SUBZ1-2022-1917-ME, MTOP-SUBZ2-2022-1539-M, MTOP-SUBZ3-2022-2052-ME, MTOP-DPM-GI-CONSV-2022-1660-ME, MTOP-DDSCH-Z4-2022-2074-ME, MTOP-SUBZ5-2022-2777-ME, MTOP-SUBZ6-2022-1608-ME, MTOP-SUBZ7-2022-1979-M, el promedio de lo reportado resulta en 71% considerando que no fue reportado Cotopaxi, Santa Elena y Los Ríos. El devengado corresponde a 9.307.785,03 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 46.40%.</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	02/11/2022 - 04:17 PM
<p>SEPTIEMBRE:</p> <p>Se realizó la gestión ante SNP para el incremento correspondiente a los 5´000.000 solicitados el mes anterior, consolidación del POA y trámites internos y externos para la acreditación del monto. Al momento se ha devengado USD 8´098.640,20. En el mes de septiembre se realizaron actividades de mantenimiento en el 82% de la red vial estatal.</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/10/2022 - 05:52 PM
<p>JULIO:</p> <p>Se ha contratado las microempresas en las provincias de azuay y cañar, se tiene cubierto el 81.14 % de los kilómetros conservados por administración directa. Se ha devengado 4.231.234.91 USD</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/08/2022 - 02:59 PM
<p>MAYO 2022</p> <p>1.Se crearon las actividades de "Seguros para maquinaria y patrullas de caminos " y "Seguridad y vigilancia para campamentos " por parte de las autoridades. 2.Se continua con la contratación de microempresas en otros tramos de la RVE de varias provincias.</p> <p>El devengado a 31 de mayo de 2022 es de 874,382.75</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/06/2022 - 04:46 PM
<p>ABRIL 2022</p> <p>1.Se contrataron algunas microempresas para algunos tramos de la RVE de varias provincias 2.Se creó la actividad de "Alquiler de maquinaria" con la finalidad de resolver los deslizamientos en la RVE causados por las fuertes precipitaciones que superaron la capacidad operativa del MTOP</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/06/2022 - 04:44 PM
<p>MARZO 2022</p> <p>1.Se mantuvo reuniones con la Coordinación de planificación del MTOP y Con la Secretaria Nacional de Planificación, se modificó el documento con la finalidad de absolver ciertas observaciones 2.Se obtuvo el Dictamen de prioridad con oficio SNP-SPN-2022-0332-OF de 7 de marzo de 2022 3.Se elaboro el anexo para inclusión del proyecto en PAI 4.Se asignaron recursos económicos al proyecto</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/06/2022 - 04:40 PM
<p>FEBRERO 2022</p> <p>1.Se elaboro el Documento Proyecto y sus anexos para postular para obtención del dictamen de Prioridad</p>	Barahona Dos Santos, María Cristina	05/06/2022 - 04:40 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Asignación parcial de presupuesto no permite continuidad de contratos de asociaciones de conservación vial	21/10/2022	María Cristina Barahona Dos Santos	30	40	12	0/1
Asignación parcial de recursos disminuye ejecución	21/10/2022	María Cristina Barahona Dos Santos	20	30	6	0/1
El alcance del Programa se limita al mantenimiento rutinario	21/10/2022	María Cristina Barahona Dos Santos	20	30	6	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 3

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2022		28/02/2022		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	9-Entregables Formales	07/03/2022		07/03/2022		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	9-Entregables Formales	07/03/2022		07/03/2022		Sí	5.0
4	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	5-Entregables Intermedios	23/03/2022		23/03/2022		Sí	2.0
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	5-Entregables Intermedios	30/03/2022		30/03/2022		Sí	3.0
6	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Bolivar	3-Adjudicación	10/04/2022		10/04/2022		Sí	0.2
7	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Los Rios	3-Adjudicación	10/04/2022		10/04/2022		Sí	0.2
8	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	13/04/2022		13/04/2022		Sí	0.2
9	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas El Oro	3-Adjudicación	20/04/2022		20/04/2022		Sí	0.2
10	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Manabi	3-Adjudicación	22/04/2022		22/04/2022		Sí	0.2
11	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion	3-Adjudicación	26/04/2022		26/04/2022		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	a traves de microempresas Carchi							
12	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Santo Domingo	3-Adjudicación	27/04/2022		27/04/2022		Sí	0.2
13	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Imbabura	3-Adjudicación	29/04/2022		04/04/2022		Sí	0.2
14	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Chimborazo	3-Adjudicación	30/04/2022		25/04/2022		Sí	0.2
15	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Tungurahua	3-Adjudicación	01/05/2022		01/05/2022		Sí	0.2
16	C1.17. EJECUCIÓN: Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion contratados	5-Entregables Intermedios	02/05/2022		02/05/2022		Sí	1.5
17	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Pastaza	3-Adjudicación	03/05/2022		03/05/2022		Sí	0.2
18	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Santa Elena	3-Adjudicación	10/05/2022		10/05/2022		Sí	0.2
19	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Guayas	3-Adjudicación	12/05/2022		12/05/2022		Sí	0.2
20	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Sucumbios	3-Adjudicación	24/05/2022		24/05/2022		Sí	0.02
21	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Loja	3-Adjudicación	30/05/2022		30/05/2022		Sí	0.2
22	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Morona Santiago	3-Adjudicación	30/05/2022		30/05/2022		Sí	0.2
23	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Orellana	3-Adjudicación	30/05/2022		18/05/2022		Sí	0.2
24	C1.18. EJECUCIÓN: Conservacion a traves de microempresas Esmeraldas contratadas	3-Adjudicación	31/05/2022		23/05/2022		Sí	0.2
25	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Cotopaxi	3-Adjudicación	31/05/2022		03/05/2022		Sí	0.2
26	C1.18. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Napo	3-Adjudicación	31/05/2022		20/05/2022		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Cañar	3-Adjudicación	15/07/2022		15/07/2022		Sí	0.1
28	C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Pichincha	3-Adjudicación	15/07/2022		15/07/2022		Sí	0.1
29	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Esmeraldas	3-Adjudicación	29/07/2022		29/07/2022		Sí	0.25
30	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Pichincha	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.1
31	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Sucumbios	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.1
32	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Pichincha	3-Adjudicación	30/08/2022	30/08/2022			No	0.05
33	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Imbabura	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
34	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Carchi	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
35	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Chimborazo	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
36	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cotopaxi	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
37	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Esmeraldas	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
38	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Orellana	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
39	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pichincha	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
40	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santa Elena	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05
41	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Sucumbios	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
42	C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas Azuay	3-Adjudicación	30/08/2022		30/08/2022		Sí	0.2
43	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Carchi	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.1
44	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Esmeraldas	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.1
45	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Imbabura	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.1
46	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Esmeraldas	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
47	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Imbabura	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
48	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Sucumbios	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
49	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Bolivar	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
50	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos El Oro	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
51	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Guayas	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
52	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Loja	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
53	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Los Rios	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
54	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Manabi	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
55	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Morona Santiago	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
56	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Napo	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
57	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pastaza	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
58	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Tungurahua	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
59	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
60	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Pichincha	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.25
61	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria El Oro	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.25
62	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Loja	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.25
63	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Sucumbios	3-Adjudicación	31/08/2022	31/08/2022			No	0.25
64	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.25
65	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
66	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Bolivar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
67	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
68	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
69	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.1
70	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.1
71	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción,	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	herramientas y equipos menores Guayas							
72	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Loja	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.1
73	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Los Rios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.1
74	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Manabi	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.1
75	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.1
76	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Napo	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.1
77	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.1
78	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Pastaza	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.1
79	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Santo Domingo	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.1
80	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.1
81	C1.11. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.1
82	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
83	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Bolivar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
84	C1.12. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
85	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
86	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
87	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
88	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Guayas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
89	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Loja	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05
90	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Los Rios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
91	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Manabi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
92	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05
93	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Napo	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05
94	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
95	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Pastaza	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
96	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
97	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05
98	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
99	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
100	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
101	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Bolívar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
102	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	maquinaria pesada y patrulla de caminos Carchi							
103	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
104	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
105	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
106	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
107	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Esmeraldas	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
108	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Guayas	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
109	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Imbabura	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
110	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Loja	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
111	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Los Rios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
112	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Manabi	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
113	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
114	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
115	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pastaza	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
116	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pichincha	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
117	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	maquinaria pesada y patrulla de caminos Santa Elena							
118	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santo Domingo	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.04
119	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Sucumbios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
120	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
121	C1.14. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.04
122	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
123	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Bolivar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
124	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Carchi	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.04
125	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
126	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
127	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
128	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.04
129	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Esmeraldas	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.04
130	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Guayas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04
131	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Imbabura	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.04
132	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	maquinaria pesada y patrulla de caminos Loja							
133	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Los Rios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
134	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Manabi	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
135	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
136	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Napo	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
137	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
138	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pastaza	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
139	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Pichincha	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
140	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santa Elena	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
141	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Santo Domingo	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
142	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Sucumbios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
143	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.04
144	C1.15. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.04
145	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
146	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Bolívar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
147	C1.16. EJECUCIÓN: Contratación Conservación	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Carchi							
148	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Cañar	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
149	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Chimborazo	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
150	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Cotopaxi	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
151	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo El Oro	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05
152	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Esmeraldas	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05
153	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Guayas	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
154	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Imbabura	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05
155	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Loja	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
156	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Los Rios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
157	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Manabi	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05
158	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Morona Santiago	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05
159	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Napo	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05
160	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Orellana	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
161	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Pastaza	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
162	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Pichincha	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
163	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Santa Elena	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
164	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Santo Domingo	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05
165	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Sucumbios	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
166	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Tungurahua	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
167	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo Zamora Chinchipe	3-Adjudicación	30/09/2022		30/09/2022	●	Sí	0.05
168	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria Azuay	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.25
169	C2.I1. EJECUCIÓN: Calibración de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.5
170	C2.I2. EJECUCIÓN: Calibración de equipos DELFECTOMETRIA	3-Adjudicación	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.5
171	C2.I3. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica	5-Entregables Intermedios	31/10/2022	31/10/2022		▼	No	1.0
172	C2.I1. EJECUCIÓN: Medición IRI	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022		▼	No	0.5
173	C2.I2. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022		▼	No	0.5
174	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores.	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023		●	No	2.0
175	C1.I10. EJECUCIÓN: Contratación Seguros para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023		●	No	0.01
176	C1.I11. EJECUCIÓN: Contratación Seguridad y vigilancia de campamentos	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023		●	No	0.01
177	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023		●	No	0.75

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
178	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.75
179	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.0
180	C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.0
181	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.0
182	C1.I7. EJECUCIÓN: Contratación Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	1.5
183	C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	3.0
184	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria	3-Adjudicación	31/12/2023	31/12/2023			No	2.0
185	C2.I1. EJECUCIÓN: Calibracion de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL)	4-Inicio de Trabajo	31/12/2023	31/12/2023			No	0.5
186	C2.I1. EJECUCIÓN: Medición IRI	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.5
187	C2.I2. EJECUCIÓN: Calibracion de equipos DELFECTOMETRIA	4-Inicio de Trabajo	31/12/2023	31/12/2023			No	0.5
188	C2.I2. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.5
189	C2.I3. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.85
190	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores.	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	2.0
191	C1.I10. EJECUCIÓN: Contratación Seguros para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	0.1
192	C1.I11. EJECUCIÓN: Contratación Seguridad y vigilancia de campamentos	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	0.1
193	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	0.75
194	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.75
195	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	maquinaria pesada y patrulla de caminos							
196	C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.0
197	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.0
198	C1.I7. EJECUCIÓN: Contratación Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	1.5
199	C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	3.0
200	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria	3-Adjudicación	31/12/2024	31/12/2024			No	2.0
201	C2.I1. EJECUCIÓN: Calibración de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL)	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.5
202	C2.I1. EJECUCIÓN: Medición IRI	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.5
203	C2.I2. EJECUCIÓN: Calibracion de equipos DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.5
204	C2.I2. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.5
205	C2.I3. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	0.8
206	C1.I1. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de materiales de construcción, herramientas y equipos menores.	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	2.0
207	C1.I10. EJECUCIÓN: Contratación Seguros para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	0.1
208	C1.I11. EJECUCIÓN: Contratación Seguridad y vigilancia de campamentos	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	0.1
209	C1.I2. EJECUCIÓN: Contratación Adquisición de señalización vial	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	0.75
210	C1.I3. EJECUCIÓN: Adquisición Combustibles para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.75
211	C1.I4. EJECUCIÓN: Adquisición Repuestos para maquinaria pesada y patrulla de caminos	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
212	C1.I5. EJECUCIÓN: Adquisición Lubricantes para	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	maquinaria pesada y patrulla de caminos							
213	C1.I6. EJECUCIÓN: Contratación Conservación preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
214	C1.I7. EJECUCIÓN: Contratación Tecnicos asignado a las inspecciones actividades de conservacion	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	1.5
215	C1.I8. EJECUCIÓN: Contratación Conservacion a traves de microempresas	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	3.0
216	C1.I9. EJECUCIÓN: Contratación Alquiler de maquinaria	3-Adjudicación	31/12/2025	31/12/2025			No	2.0
217	C2.I1. EJECUCIÓN: Calibracion de equipos IRI (INDICE DE RUGOSIDAD LONGITUDINAL)	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5
218	C2.I1. EJECUCIÓN: Medición IRI	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5
219	C2.I2. EJECUCIÓN: Calibracion de equipos DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5
220	C2.I2. EJECUCIÓN: Medición DELFECTOMETRIA	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5
221	C2.I3. EJECUCIÓN: Herramientas sistemas de información geográfica	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.2
222	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	2.0
223	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
224	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	2.0
225	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
226	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendietes por liquidar - suscrito MEF	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.5
227	CIERRE: Cierre de proyecto según Informe Formato SNP aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
228	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
229	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0
230	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2025	31/12/2025			No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	72,584,878.88 **
Costo Total:	15,002,829.43
Total Devengado:	17,230,961.82
% Costo Total Devengado:	114.85 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 114.85 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	15,115,974.91	62,537,792.45	0.00	77,653,767.36
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	17,040,525.00	0.00	17,040,525.00
Ppto. Codificado	18,994,056.94	62,537,792.45	0.00	81,531,849.39
Ppto. Comprometido	16,463,337.04	327,082.71	0.00	16,790,419.75
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	18,994,056.94	56,678,367.59	0.00	75,672,424.53
Ppto. Devengado	15,906,511.29	1,324,450.53	0.00	17,230,961.82
Pagado Real	15,901,808.81	201,342.42	0.00	16,103,151.23
Estimado a fin de año	* 15,906,511.29	0.00	0.00	15,906,511.29
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	3,087,545.65	56,678,367.59	0.00	59,765,913.24
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 83.74 %	2.34 %	0.00 %	22.77 %
Ppto. Codificado 998	0.00	11,077.38	0.00	11,077.38
Ppto. Devengado 998	0.00	11,077.38	0.00	11,077.38

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023

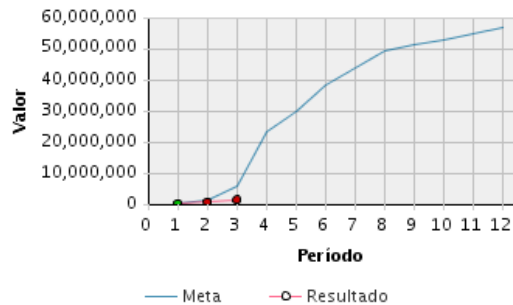

Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	55,426.36	55,426.36	55,426.36	55,426.36	100.00 %	●	0.10 %

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	1,051,910.86	533,145.96	1,107,337.22	588,572.32	53.15 %		1.04 %
Mar	4,435,349.45	735,878.21	5,542,686.67	1,324,450.53	23.90 %		2.34 %
Abr	17,742,844.27		23,285,530.94				
May	6,302,285.59		29,587,816.53				
Jun	8,669,592.63		38,257,409.16				
Jul	5,437,510.47		43,694,919.63				
Ago	5,713,999.07		49,408,918.70				
Sep	1,959,447.29		51,368,365.99				
Oct	1,501,160.00		52,869,525.99				
Nov	1,744,553.17		54,614,079.16				
Dic	2,064,288.43		56,678,367.59				
Total	56,678,367.59	1,324,450.53					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
19	Incrementar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos en la fase de conservación de los proyectos de infraestructura del transporte MEDIANTE la supervisión de planes, programas y proyectos institucionales para la gestión de conservación en los procesos desconcentrados

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	cedula agosto 2022	cup_175200000.0000.387265_R2022-12-12_08-39-18_AGO	08/12/2022
2	cedula julio 2022	cup_175200000.0000.387265_R2022-12-12_08-39-18_JUL	08/12/2022
3	cedula junio 2022	CUP_175200000.0000.387265_ACT_30-06-2022(5).pdf	08/12/2022
4	cedula mayo 2022	CUP_175200000.0000.387265_ACT_31-05-2022.pdf	08/12/2022
5	cedula noviembre 2022	CUP_175200000.0000.387265_ACT_30-11-2022.pdf	08/12/2022
6	cedula octubre 2022	cup_175200000.0000.387265_R2022-12-12_08-39-18_OCT	08/12/2022
7	cedula septiembre 2022	cup_175200000.0000.387265_R2022-12-12_08-39-18_SEPT	08/12/2022
8	HITO100_REPUESTOS AZUAY	Infima_Cuantía_azuay_repuestos.pdf	08/12/2022
9	HITO101_REPUESTOS BOLIVAR	Bolivar_Infimas_Cuantías_repuestos.pdf	08/12/2022
10	HITO102_REPUESTOS CARCHI	contrato_repuestos(1).rar	07/12/2022
11	HITO105_REPUESTOS COTOPAXI	orden_de_compra_repuestos_para_maquinaria09176450016872272022.rar	08/12/2022
12	HITO107_REPUESTOS ESMERALDAS	REPUESTOS.rar	08/12/2022
13	HITO108_REPUESTOS GUAYAS	REPUESTOS.rar	08/12/2022
14	HITO109_REPUESTOS IMBABURA	CONTRATO_REPUESTOS_2022-signed-signed.pdf	08/12/2022
15	HITO110_REPUESTOS LOJA	orden_de_compra_bomba_REPUESTOS_LOJA.pdf	14/11/2022
16	HITO112_REPUESTOS MANABI	REPUESTOS.rar	07/12/2022
17	HITO115_REPUESTOS PASTAZA	REPUESTOS.rar	07/12/2022
18	HITO115_REPUESTOS ZAMORA	adquisicion_de_repuestos_1.rar	08/12/2022
19	HITO116_REPUESTOS PICHINCHA	13.2_No_DPP-ORD-20220708-0010-neumaticosmini_signed.pdf	08/11/2022
20	HITO117_REPUESTOS SANTA ELENA	REPUESTOS.rar	08/12/2022
21	HITO11_ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) CARCHI CONTRATADAS	micros.rar	08/11/2022
22	HITO120_REPUESTOS TUNGURAHUA	REPUESTOS.rar	07/12/2022
23	HITO120_REPUESTOS TUNGURAHUA	contrato_adquisicion_de_repuestos_y_accesorios_signed-signed.pdf	07/12/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
24	HITO121_REPUESTOS ZAMORA	ADQUISICION_DE_REPUESTOS.rar	07/12/2022
25	HITO124_IUBRICANTES CARCHI	acta_entrega_lubricantes.zip	07/12/2022
26	HITO128_LUBRICANTES EL ORO	CONTRATO_LUBRICANTES.pdf	14/11/2022
27	HITO129_LUBRICANTES ESMERALDAS	lubricantes_esmeraldas.rar	08/11/2022
28	HITO12_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) SANTO DOMINGO	microempresas_santo_domingo.rar	08/12/2022
29	HITO131_IUBRICANTES IMBAURA	ACTA_ENTREGA_RECEPCIÓN_26may22-_ACEITE_Y_GRASA.pdf	08/12/2022
30	HITO132_IUBRICANTES LOJA	c1.i5_-_acta_de_entrega_aceites_maquinaria_2022-signed-signed-signed.pdf	08/12/2022
31	HITO134_IUBRICANTES MANABI	Adjudicación_Manabi_adquisición_lubricantes_para_equipo	07/12/2022
32	HITO136_IUBRICANTES NAPO	ITEM_2_LUBRICANTES_ITEMS_4_Y_5_COMBUSTIBLE.xps	07/12/2022
33	HITO13_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) IMBABURA	MICROS_IMBAURA.rar	08/11/2022
34	HITO144_IUBRICANTES ZAMORA	ADQUISICION_DE_LUBRICANTES.rar	07/12/2022
35	HITO144_IUBRICANTES ZAMORA	c1.i15.ejecución.lubricantes.zip	08/12/2022
36	HITO147_CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO CARCHI	mantenimiento_mcs_2022.rar	07/12/2022
37	HITO149_CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO CHIMBORAZO	Infima_Cuantía_mantenimiento_CHIMBORAZO.pdf	07/12/2022
38	HITO14_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) CHIMBORAZO	micros.rar	07/12/2022
39	HITO151_CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO EL ORO	conservacion_maquinaria_y_equipo.rar	14/11/2022
40	HITO154_CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO ZAMORA	CONTRATO_MANTENIMIENTO_DE_MAQUINARIA_2022_signed-signed.pdf	08/12/2022
41	HITO155_CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO LOJA	MANTENIMIENTO_LOJA.rar	08/12/2022
42	HITO157_CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO MANABI	CONSERVACIONMAQUINARIA_MANABI.rar	07/12/2022
43	HITO158_CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO ESMERALDAS	estado_por_registro_de_contrato_MANTENIMIENTO_TRACTOR_CANTON.pdf	08/12/2022
44	HITO159_CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO NAPO	MANTENIMIENTO_MAQUINARIA.pdf	07/12/2022
45	HITO15_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) TUNGURAHUA 2	MICROS_TUNGU_1.1.rar	07/12/2022
46	HITO15_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) TUNGURAHUA 3	MICROS_TUNGU_1.2.rar	07/12/2022
47	HITO161_CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO PASTAZA	MANTENIMIENTO.rar	07/12/2022
48	HITO164_CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO SANTO DOMINGO	c1.i.6.ejecución.mantenimiento_maquinaria.zip	08/12/2022
49	HITO167_CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO ZAMORA	MANTENIMIENTO_DE_MAQUINARIA.rar	07/12/2022
50	HITO167_CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO ZAMORA	c1.i.6.ejecución.mantenimiento_maquinaria.zip	08/12/2022
51	HITO17_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) PASTAZA	micros.rar	07/12/2022
52	HITO17_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) PASTAZA	micros.rar	07/12/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
53	HITO18_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) SANTA ELENA	microempresas_santa_elena.rar	08/12/2022
54	HITO19_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) GUAYAS	microempresas_guayas.rar	08/12/2022
55	HITO1_formato senplades	PNCRVE_07-03-2022.pdf	17/10/2022
56	HITO20_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) SUCUMBOS	MICROS.rar	08/11/2022
57	HITO21_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) LOJA	MICROS_LOJA.rar	14/11/2022
58	HITO22_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) MORONA	MICROS.rar	08/12/2022
59	HITO23_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) ORELLANA	micros_orellana.rar	07/12/2022
60	HITO24_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) ESMERALDAS	micro_esmeraldas.rar	08/11/2022
61	HITO24_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) ESMERALDAS	ORDEN_DE_COMPRAMICRO_ESMERALDAS.pdf	07/12/2022
62	HITO25_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) COTOPAXI	ordenes_de_compra_microempresas_20220124973001667227701.pdf	07/12/2022
63	HITO26_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) napo	micros.rar	28/12/2022
64	HITO27_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) CAÑAR	MICROS_CAÑAR.rar	08/12/2022
65	HITO28_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) PICHINCHA	16.1_ORDEN_DE_COMPRA_PROVEEDOR_microempresa-signed-signed.pdf	08/11/2022
66	HITO29_ALQUILERMAQUINARIA ESMERALDAS	alquiler_maquinaria_esmeraldas.rar	08/11/2022
67	HITO2_Dictamen de prioridad	SNP-SPN-2022-0332-OF.pdf	17/10/2022
68	HITO30_MATERIALES PICHINCHA	35.1_No._DPP-ORD-20220930-0012-cemento_signed.pdf	08/11/2022
69	HITO33_COMBUSTIBLES IMABURA	RESPALDOS_SOCE_MATERIALES_ITEM_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_Y_C	07/12/2022
70	HITO33_COMBUSTIBLES IMABURA	COMBUSTIBLE.rar	08/12/2022
71	HITO36_COMBUSTIBLES COTOPAXI	orden_de_compra_combustible_20220394216001667227703141	14/11/2022
72	HITO36_COMBUSTIBLES COTOPAXI	orden_de_compra_combustible_20220394216001667227703071	07/12/2022
73	HITO37_COMBUSTIBLES ESMERALDAS	combustibles_esmeraldas.rar	08/11/2022
74	HITO38_COMBUSTIBLES ORELLANA	COBUSTIBLE_ORELLANA.rar	07/12/2022
75	HITO3_PRIORIDAD SEMPLADES EMITIDA	SNP-SPN-2022-0332-OF.pdf	28/12/2022
76	HITO40_COMBUSTIBLES SANTA ELENA	Santa_Elena_Infima_Cuantía_combustibles.pdf	08/12/2022
77	HITO41_COMBUSTIBLES SUCUMBOS	COMBUSTIBLES.rar	08/11/2022
78	HITO42_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) AZUAY	micros.rar	08/12/2022
79	HITO44_MATERIALES ESMERALDAS	informe_administradormezcla_asfaltica-CONTRSTO_ADQUISICIÓN_DE_MATERIALES_CEMENETO_PÉTREOS.pdf	08/12/2022
80	HITO45_MATERIALES IMBAURA	RESPALDOS_SOCE_MATERIALES_ITEM_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_Y_C	07/12/2022
81	HITO45_MATERIALES IMBAURA	CONTRATO_MATERIALES_DE_CONSTRUCCION_2022-signed-signed.pdf	08/12/2022
82	HITO47_SEÑALIZACION IMBABURA	RESPALDOS_SOCE_MATERIALES_ITEM_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_Y_C	07/12/2022
83	HITO47_SEÑALIZACION IMBABURA	ACTA_ENTREGA_RECEPCIÓN_PINTURA_THINER_TACOS.pdf	08/12/2022
84	HITO49_COMBUSTIBLES BOLIVAR	Bolivar_Infimas_Cuantías_combustible.pdf	08/12/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
85	hito4_PROYECTO EN PAI	SNP-SPN-2022-0366-OF_(MTOPI-MTOPI-2022-0590-EXT).pdf	28/12/2022
86	HITO50_COMBUSTIBLES EL ORO	COMBUSTIBLE_INFIMA_CUANTIA.rar	07/12/2022
87	HITO51_COMBUSTIBLES GUAYAS	COMBUSTIBLE.rar	08/12/2022
88	HITO52_COMBUSTIBLES LOJA	orden_de_compra_combustible_LOJA.pdf	14/11/2022
89	HITO54_COMBUSTIBLES MANABI	COMBUSTIBLES_MANABI.rar	07/12/2022
90	HITO54_COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO	c1.i3.ejecución.combustible.zip	08/12/2022
91	HITO56_COMBUSTIBLES NAPO	COMBUSTIBLE_ITEM_6_CONSERVACION_MAQUINARIA	07/12/2022
92	HITO58_COMBUSTIBLES TUNGURAHUA	COMBUSTIBLE.rar	28/12/2022
93	HITO59_COMBUSTIBLES ZAMORA	ADQUISICION_DE_COMBUSTIBLES.rar	07/12/2022
94	HITO59_COMBUSTIBLES ZAMORA	c1.i3.ejecución.combustible.zip	08/12/2022
95	HITO5_ASSIGNACION RECURSOS	SNP-SPN-2022-0366-OF_(MTOPI-MTOPI-2022-0590-EXT).pdf	14/11/2022
96	HITO5_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) bolivar	micros_1.rar	08/12/2022
97	HITO5_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) bolivar	micros_2.rar	08/12/2022
98	HITO61_ALQUILERMAQUINARIA EL ORO	CONTRATO_ALQUILER_DE_MAQUINARIA.pdf	14/11/2022
99	HITO64_ALQUILERMAQUINARIA ZAMORA	alquiler_de_maquinaria.rar	07/12/2022
100	HITO70_MATERIALES EL ORO	materiales.rar	14/11/2022
101	HITO71_MATERIALES GUAYAS	Guayas_contrato_adquisición_mezcla_asfaltica.pdf	08/12/2022
102	HITO73_MATERIALES LOS RIOS	Los_Rios_Adjudicación_compra_mezcla_asfaltica.pdf	08/12/2022
103	HITO74_MATERIALES MANABI	MATERIALES_MANABI.rar	07/12/2022
104	HITO75_MATERIALES MORONA	MATERIALES.rar	08/12/2022
105	HITO76_MATERIALES NAPO	MATERIALES_DE_CONSTRUCCIÓN.pdf	07/12/2022
106	HITO77_MATERIALES ORELLANA	MATERIALES_ORELLANA.rar	07/12/2022
107	HITO78_MATERIALES PASTAZA	MATERIALES.rar	07/12/2022
108	HITO79_MATERIALES SANTO DOMINGO	Contrato_Sto_Domingo_Adquisición_mezcla_asfáltica_en_cad	07/12/2022
109	HITO79_MATERIALES SANTO DOMINGO	c1.i1.ejecución.materiales_de_construcción.zip	08/12/2022
110	HITO7_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) LOS RIOS	microempresas_los_rios.rar	08/12/2022
111	HITO80_MATERIALES TUNGURAHUA	Orden_de_compra_asfalto-signed-signed.pdf	07/12/2022
112	HITO81_MATERIALES ZAMORA	adquisicion_de_materiales.rar	07/12/2022
113	HITO81_MATERIALES ZAMORA	c1.i1.ejecución.materiales_de_construcción.zip	08/12/2022
114	HITO87_SEÑALIZACION EL ORO	NIC-0760026220001-2022-00022_MATERIALES_DE_CONSTRUCCIÓN	07/12/2022
115	HITO89_SEÑALIZACION LOJA	orden_de_compra_delineadores_SEÑALIZACION_LOJA.pdf	14/11/2022
116	HITO8_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) ZAMORA	docs_zamora.rar	28/12/2022
117	HITO93_SEÑALIZACION NAPO	SEÑALIZACIÓN.pdf	07/12/2022
118	HITO94_SEÑALIZACION ORELLANA	infima_señalizacion.pdf	07/12/2022
119	HITO97_SEÑALIZACION NAPO	SEÑALIZACION.rar	08/12/2022
120	HITO9_CONTRATOS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS) EL ORO	asociaciones_conservacion_el_oro.rar	14/11/2022
121	HITO_ALQUILERMAQUINARIA SANTO DOMINGO	c1.i9.ejecución.alquiler_maquinaria.zip	08/12/2022
122	hitos 114, 137 y 160 justificativo no se realizo mantenimiento preventivo, repuesto y lubricantes	MODIFICACION.pdf	28/12/2022
123	Hitos 32, 39, 60 y 139 justificativos disminucion pichincha	justificativo_LUBRICANTES_SEÑALIZACIÓN_ALQUILER_COTOPAXI	28/12/2022
124	hitos 55, 92,113 y 118, captura pantalla SOCE infimas	señalizacion_repuestos_mantenimiento_y_combustibles_morona	06/12/2022
125	justificativo hitos 69 y 105	Anexo_2_-_Informe_justificativo_materiales_lubricantes_cotopaxi.pdf	07/12/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
126	RIESGO1_ SE MITIGA EL RIESGO CLIMATICO CON EL ALQUILER DE MAQUINARIA SE AJUNTA LA CREACION DE ACTIVIDAD Y CONTRATOS	MITIGACION_RIESGO_1_ALQUILER_DE_MAQUINARIA.rar	14/11/2022
127	RIESGO2_ SE MITIGA EL RIESGO AL HABERSE ASIGNADO LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA	MITIGACION_RIESGO_2_ASIGNACION_RECURSOS.rar	14/11/2022
