

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Azuay

PROYECTO: K020 MTOP - Mantenimiento vial de la Provincia del Azuay

Líder del Proyecto:	Rodas Andrade, Daniel Enrique (drodas@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, Provincia - Azuay, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3653	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	17,781,723.24
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/02/2012 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	03/08/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Fecha del siguiente Hito:	31/08/2018

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

El Proyecto de Mantenimiento Vial de la Provincia del Azuay contempla la realización de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en las carreteras, E582, E35, E40 tramo Chicti -Sevilla de Oro; y el Mantenimiento por Niveles de servicio de las carreteras E40 tramo Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y E594 Tramo Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig. Productos-servicios: a la fecha se da el mantenimiento rutinario en la Provincia de 255 Km, y el mantenimiento por niveles de servicio de 57 km.

Línea Base: Las vías E40 tramo Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y E594 Tramo Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, intervenidas a nivel de pavimento asfáltico, con señalización horizontal y vertical, se entrega en condiciones óptimas para los usuarios. las vías recién intervenidas y que están a nivel de pavimento rígido, con señalización horizontal y vertical, entre ellas la E35 Cumbe- Oña, E582 Cuenca-Molleturo-El Empalme, están en condiciones óptimas de transitabilidad para los usuarios.

OBJETIVO GENERAL:

Realizar el mantenimiento vial de la red vial estatal a cargo de la Dirección Provincial del Azuay del MTOP con la finalidad de evitar accidentes, disminuir tiempos de viaje y actuar de manera adecuada y eficiente cuando ocurran emergencias.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Realizar trabajos de mantenimientos rutinarios en la red vial estatal de la Provincia del Azuay.
 Realizar trabajos de mantenimiento a vehiculos y equipo caminero de la Dirección Provincial del Azuay.
 Mantener y Mejorar las carreteras E40 y E594 en los tramos Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig.

Beneficios Cualitativos

Mantener en buen estado las vías de la Red Provincial Estatal
 Mejorar el nivel de servicio mediante el mantenimiento de la calzada como de las obras menores que se disponen en las vías a cargo de la Dirección Provincial del Azuay
 Disminuir el tiempo de traslado vehicular.

Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios directos son los habitantes de los cantones Cuenca, Oña, Paute, Gualaceo, Chordeleg, Sígsig, Guachapala, El Pan, Sevilla de Oro, Naranjal, Méndez; indirectamente el resto de cantones de la Provincial del Azuay, y los habitantes de Loja, Cañar, Guayas y Morona Santiago.

Restricciones

TIEMPO: La temporada invernal no permite tener 100 % expeditas las vías, aún así se mantiene el tráfico normal, sin interrupciones.


Restricciones

COSTO: Falta de recursos económicos que permitan la liquides de las empresas contratistas.
ALCANCE:
 El parque automotor de la Dirección Provincial del MTOP-Azuay en la mayoría de casos han cumplido con el tiempo de vida útil.
 En cuanto a personal para operadores de los equipos se han reducido significativamente.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 95.25 %
 Fecha de Inicio: 01/02/2012 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

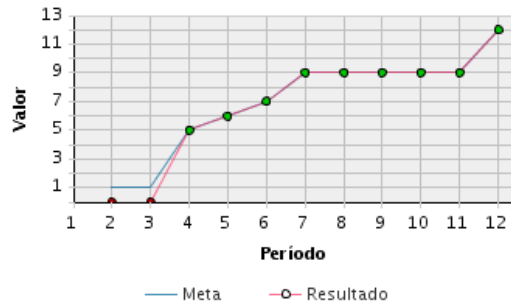

Porcentaje de Avance													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2012	Avance programado acumulado												
		1 %	1 %	5 %	6 %	7 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	12 %
	Avance real acumulado												
		0 %	0 %	5 %	6 %	7 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	12 %
Estado													
	🔴	🔴	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de calzada, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	02/08/2018 - 03:43 PM
JUNIO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	03/07/2018 - 10:32 AM
MAYO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	04/06/2018 - 05:11 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.		
ABRIL 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 11 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	03/05/2018 - 08:42 AM
MARZO 2018: Mantenimiento vial por Administración Directa con 9 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E35-E40-E594: Tramos: Puente Guangarcucho-El Descanso-Lumagpamba-Paute, Paute-Puente Chicti-Sevilla de Oro, Sevilla de Oro-San Pablo, Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/04/2018 - 03:47 PM
DICIEMBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/01/2018 - 08:22 AM
NOVIEMBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/12/2017 - 02:08 PM
OCTUBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	01/11/2017 - 02:50 PM
SEPTIEMBRE 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Mantenimiento de señalización horizontal y vertical y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Brito Puni, Andrea Valerie	03/10/2017 - 04:32 PM
AGOSTO 2017: Mantenimiento vial por Administración Directa con 8 Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano, Restitución de señalización y Atención de Emergencias, distribuidas en las vías Cuenca-Molleturo-El Empalme, Cumbe-Oña, E40: Tramo Puente Chicty-Sevilla de Oro. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Brito Puni, Andrea Valerie	04/09/2017 - 03:31 PM
MAYO 2017: El mantenimiento vial por Administración Directa con Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sigsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/06/2017 - 02:31 PM
ABRIL 2017: El mantenimiento vial por Administración Directa con Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594,	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/05/2017 - 03:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.		
MARZO 2017: El mantenimiento vial por Administración Directa con Microempresas, se realiza rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/04/2017 - 02:25 PM
FEBRERO 2017: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	07/03/2017 - 08:01 AM
ENERO 2017: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	08/02/2017 - 08:07 AM
DICIEMBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	06/01/2017 - 03:42 PM
NOVIEMBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/12/2016 - 10:36 AM
OCTUBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/12/2016 - 10:35 AM
SEPTIEMBRE 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	27/10/2016 - 12:00 PM
AGOSTO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	03/10/2016 - 04:37 PM
JULIO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento del contrato.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	04/08/2016 - 01:21 PM
JUNIO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio, contrato que está en proceso de terminación anticipada por incumplimiento de la contratista.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	29/07/2016 - 07:54 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	02/06/2016 - 01:28 PM
ABRIL 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, se ejecuta rubros como: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Brito Puni, Andrea Valerie	06/05/2016 - 11:25 AM
MARZO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	01/04/2016 - 08:15 AM
FEBRERO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano restitución de señalización y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	05/02/2016 - 07:47 AM
ENERO 2016: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	08/01/2016 - 07:34 AM
DICIEMBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, la compañía CONSERMÍN tiene a su cargo el contrato Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	04/01/2016 - 01:58 PM
NOVIEMBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	06/11/2015 - 02:03 PM
OCTUBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, los trabajos que se realizan son: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio.		
SEPTIEMBRE 2015: El mantenimiento vial se lo realiza por Administración Directa y con Microempresas, en lo que corresponde a: Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Limpieza de derrumbes, Roza a mano y Atención de Emergencias. En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	06/10/2015 - 10:30 AM
AGOSTO 2015: Mantenimiento por Administración Directa y con Microempresas, en los diferentes tramos el personal de las microempresas se encuentran realizando los siguientes trabajos: Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias En las carreteras E40 y E594, tramos El Descanso-Lumagpamba-Paute-Chicti y Lumagpamba-Gualaceo-Sígsig, se realiza el Mantenimiento por niveles de servicio.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	07/09/2015 - 11:56 AM
JULIO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	06/08/2015 - 03:07 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>		
<p>JUNIO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	10/07/2015 - 07:52 AM
<p>MAYO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/06/2015 - 04:21 PM
<p>ABRIL 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	06/05/2015 - 12:04 PM
<p>MARZO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	07/04/2015 - 03:03 PM
<p>FEBRERO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/03/2015 - 12:58 PM
<p>ENERO 2015: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/03/2015 - 12:58 PM
<p>DICIEMBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 23 a 26, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano Atención de emergencias</p>	Sánchez Zamora, Iván Patricio	06/01/2015 - 08:12 AM
<p>NOVIEMBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p>	Sánchez Zamora, Iván Patricio	01/12/2014 - 10:31 AM
<p>Se realiza el mantenimiento por niveles de servicio en las vías E40 y E594.</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p> <p>Se coloca señalización horizontal y vertical en las vías E40 y E594. Se inicia con trabajos de mantenimiento a lo largo de esta vías.</p>	Sánchez Zamora, Iván Patricio	01/12/2014 - 10:29 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	09/10/2014 - 08:33 AM
<p>JULIO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	18/08/2014 - 09:04 AM
<p>AGOSTO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p>	Galvis Fernández, Mario Ramiro	05/08/2014 - 02:26 PM
<p>JULIO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución.</p>	Galvis Fernández, Mario Ramiro	05/08/2014 - 02:24 PM
<p>JUNIO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p>	Galvis Fernández, Mario Ramiro	03/07/2014 - 12:20 PM
<p>MAYO 2014: Se realizan las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, y a través de microempresas contratadas. hitos 22 a 25, en ejecución. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p>	Galvis Fernández, Mario Ramiro	04/06/2014 - 11:02 AM
<p>ABRIL 2014: Desde el mes de Marzo se reiniciaron las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas contratadas para este año. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p>	Galvis Fernández, Mario Ramiro	07/05/2014 - 11:13 AM
<p>MARZO 2014 (ALCANCE): Se incrementarán hitos en vista de que se están firmando nuevos contratos con Asociaciones de Conservación Vial, a partir de esto se realizará la reprogramación respectiva (tanto de Hitos como de presupuesto)</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	14/04/2014 - 10:45 AM
<p>MARZO 2014: Desde este mes de Marzo se reinician las labores del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas contratadas para este año. Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Limpieza de derrumbes Roza a mano</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	02/04/2014 - 10:11 AM
<p>DICIEMBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	12/03/2014 - 12:20 PM
<p>NOVIEMBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa, hitos 11 a 16, trabajos que realizan las microempresas</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/12/2013 - 03:45 PM
<p>OCTUBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	01/11/2013 - 01:49 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	07/10/2013 - 11:35 AM
AGOSTO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	02/09/2013 - 02:52 PM
JULIO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/08/2013 - 03:07 PM
JUNIO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	02/07/2013 - 10:54 AM
MAYO 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/06/2013 - 11:27 AM
ABRIL 2013: Continuación del mantenimiento rutinario y atención de emergencias por administración directa.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/05/2013 - 09:06 AM
MARZO 2013: Se realiza el mantenimiento rutinario de las diferentes vías, tanto por administración directa como por contratos con microempresas, limpieza de cunetas, derrumbes, alcantarillas, roza a mano.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	30/04/2013 - 08:53 AM
NOVIEMBRE 2012: Los trabajos se desarrollan con total normalidad, las vías se encuentran habilitadas, las labores de limpieza de alcantarillas, cunetas, roza a mano, se realizan con normalidad, se realiza bacheo en tramos que se requieran, de manera continua. OCTUBRE 2012: Las microempresas continúan trabajando con normalidad, las vías se encuentran habilitadas, actividades que realizan: bacheo asfáltico, desbroce, limpieza alcantarillas, limpieza cunetas, construcción muros secos. SEPTIEMBRE 2012: Las microempresas continúan trabajando con normalidad, las vías se encuentran habilitadas, actividades que realizan: bacheo asfáltico, desbroce, limpieza alcantarillas, limpieza cunetas, construcción muros secos. AGOSTO 2012: Las microempresas trabajan con normalidad, las vías se encuentran habilitadas, actividades que realizan: bacheo asfáltico, Sellado fisuras, desbroce, limpieza alcantarillas, limpieza cunetas, construcción muros secos. JULIO 2012. Las microempresas trabajan con normalidad, las vías se encuentran habilitadas. JUNIO 2012. Las vías se encuentran abiertas en su totalidad al tráfico vehicular. MAYO 2012: Se continúa con los trabajos de mantenimiento realizada por las microempresas contratadas para el efecto. ABRIL 2012: Se continúan los trabajos de las cinco microempresas, además de tres nuevas contratadas para el mantenimiento del tramo El Descanso hasta el Sigsig y Gualaceo, las vías se encuentran en buen estado, totalmente transitables. MARZO 2012: Se mantienen los trabajos de las cinco microempresas contratadas, las vías están totalmente transitables a pesar del invierno FEBRERO 2012: Se procede a la contratación de cinco microempresas para mantenimiento rutinario y control de emergencias en las vías de la Red vial Estatal a cargo de la Dirección Provincial del Azuay, las mismas que inician los trabajos desde el mes de febrero 2012	Soria Novoa, César	03/12/2012 - 11:52 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Incumplimiento de contrato	02/08/2018	Olmedo Justiniano Tintin Ordoñez	90	100	90	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. El exceso de lluvias CAUSARÍA que las vías presenten derrumbes	02/08/2018	Olmedo Justiniano Tintin Ordoñez	40 %	60	24	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCION: Señalización de puentes, realizado	5-Entregables Intermedios	29/02/2012		09/04/2012		Sí	1.0
2	EJECUCION: Contratación de implementación de BTA's en la vía Cuenca-Molleturo-Las Mercedes, realizado	2-Publicación de Pliegos	12/04/2012		12/04/2012		Sí	1.0
3	EJECUCION: Contratación de implementación de BTA's en la vía El Salado-Léntag, Asociación de conservación vial Sarayunga, realizado	2-Publicación de Pliegos	12/04/2012		12/04/2012		Sí	1.0
4	EJECUCION: Señalética para la vía El Salado-El Descanso-Puente Río Déleg, realizado	3-Adjudicación	15/04/2012		15/04/2012		Sí	1.0
5	EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la vía Lumagpamba-Gualaceo-Matanga, realizado	1-Solicitud de Información	20/04/2012		20/04/2012		Sí	1.0
6	EJECUCION: Matriculación y seguro de vehículos, realizado	1-Solicitud de Información	02/05/2012		02/05/2012		Sí	1.0
7	EJECUCION: Adquisición de equipos y vehículos, realizado	1-Solicitud de Información	15/06/2012		15/06/2012		Sí	1.0
8	EJECUCION: Señalética para la vía Léntag-Quera, realizado	1-Solicitud de Información	02/07/2012		02/07/2012		Sí	1.0
9	EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía El Descanso-Chicty, Asociaciones de Conservación vial: Zhumir, Unidos Venceremos y Sígsig, realizado	1-Solicitud de Información	20/07/2012		20/07/2012		Sí	1.0
10	EJECUCION: Contratación de implementación de BTA's en la vía Cumbe-Oña, realizado	1-Solicitud de Información	29/12/2012		29/12/2012		Sí	1.0
11	EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la Vía El Salado El Descanso, Asociaciones de conservación vial: Vía Rápida Cuenca-El Descanso y Turi-Tarqui, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	1.0
12	EJECUCION: Contratación de 3 microempresas para la vía Léntag-Quera, Asociaciones de Conservación Vial: Léntag, Santa Isabel, Sarayunga, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	1.0
13	EJECUCION: Contratación de 3 microempresas para la vía Léntag-Quera, Asociaciones de Conservación Vial: Léntag, Santa Isabel, Sarayunga, realizado	1-Solicitud de Información	29/05/2013		29/05/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
14	EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la Vía El Salado El Descanso, Asociaciones de conservación vial: Vía Rápida Cuenca-El Descanso y Turi-Tarqui, realizado	1-Solicitud de Información	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
15	EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía El Descanso-Chicty, Asociaciones de Conservación vial: Zhumir, realizado	1-Solicitud de Información	15/06/2013		15/06/2013		Sí	1.0
16	EJECUCION: Contratación de 2 microempresas para la vía Lumagpamba-Gualaceo-Matanga, realizado	1-Solicitud de Información	15/06/2013		15/06/2013		Sí	1.0
17	EJECUCION: Matriculación y seguro de vehículos, realizado	1-Solicitud de Información	28/10/2013		28/10/2013		Sí	1.0
18	EJECUCION: Señalización vial, realizado	1-Solicitud de Información	28/12/2013		28/12/2013		Sí	1.0
19	EJECUCION: Contratación de 4 microempresas para la vía Léntag-Quera, Asociaciones de Conservación Vial: el Salado Portete, GirónLéntag, Sarayunga, realizado	5-Entregables Intermedios	20/02/2014		20/02/2014		Sí	1.0
20	EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía Medio Ejido - Sayausí, Asociación de Conservación Vial Turi Tarqui, realizado	5-Entregables Intermedios	05/03/2014		05/03/2014		Sí	1.0
21	EJECUCION: Contratación de 1 microempresa para la vía Cumbe - Oña, Asociación de Conservación Vial Susudel, realizado	5-Entregables Intermedios	22/04/2014		22/04/2014		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Mantenimiento y mejoramiento de las vías E40 E594 (intervención).	5-Entregables Intermedios	25/09/2014		25/09/2014		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Atención de emergencias realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas y alcantarillas realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Roza a mano realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Atención de emergencias realizado	5-Entregables Intermedios	01/01/2015		31/12/2015		Sí	5.0
28	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas y alcantarillas realizado	5-Entregables Intermedios	01/01/2015		31/12/2015		Sí	5.0
29	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes realizado	5-Entregables Intermedios	01/01/2015		31/12/2015		Sí	5.0
30	EJECUCIÓN: Roza a mano realizado	5-Entregables Intermedios	01/01/2015		31/12/2015		Sí	5.0
31	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
32	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	5.0
33	PLANEACIÓN: Contratación de microempresas	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	5.0
34	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	5.0
35	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario: limpieza, desbroce, roza a mano	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	9.0
36	PLANEACIÓN: Contratación de Microempresas	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		26/02/2016		Sí	5.0
37	EJECUCIÓN: Atención de emergencias realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2016	31/08/2018			No	5.0
38	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2016	31/08/2018			No	5.0
39	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas y alcantarillas realizado	5-Entregables Intermedios	01/09/2016	31/08/2018			No	5.0
40	EJECUCIÓN: Roza a mano realizado	5-Entregables Intermedios	01/09/2016	31/08/2018			No	5.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión de seguimiento	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	16/06/2017
2	Supervisión Seguimiento Negativa	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	26/04/2017
3	Supervisión de Seguimiento	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	24/03/2017
4	Supervisión negativa	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	21/02/2017
5	Supervisión positiva al cumplimiento del programa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	20/01/2016
6	Supervisión exitosa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	30/12/2015
7	#Supervisión satisfactoria a el estado de las vías y su mantenimiento en la provincia del Azuay	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	24/04/2015
8	SUPERVISAR A LOS HITOS DEL MES	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	24/12/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de la Red Vial en buen estado.		100.00 %	100	100	01/02/2012	Diciembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	17,781,723.24 **
Costo Total:	12,000,000.00
Total Devengado:	13,927,447.33
% Costo Total Devengado:	116.06 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 116.06 %

Perfil Económico 2012

	Años Previos	Año Actual (2012)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	310,894.89	17,470,828.35	17,781,723.24
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	3,422,926.68	4,540,801.21	7,963,727.89
Ppto. Codificado	0.00	1,919,394.09	19,073,766.43	20,993,160.52
Ppto. Comprometido	0.00	1,893,211.39	15,759,508.73	17,652,720.12
Planeado - Codificado (2012)		-1,608,499.20		
Programado a Devengar	0.00	310,894.89	13,175,443.54	13,486,338.43
Ppto. Devengado	0.00	316,223.50	13,611,223.83	13,927,447.33
Pagado Real	0.00	0.00	12,738,778.49	12,738,778.49
Estimado a fin de año	* 0.00	310,894.89	12,400,000.00	12,710,894.89
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	775,443.54	775,443.54
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	101.71 %	103.31 %	103.27 %
Ppto. Codificado 998	0.00	30,405.34	3,097,199.08	3,127,604.42
Ppto. Devengado 998	0.00	30,405.34	3,096,825.08	3,127,230.42

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2012

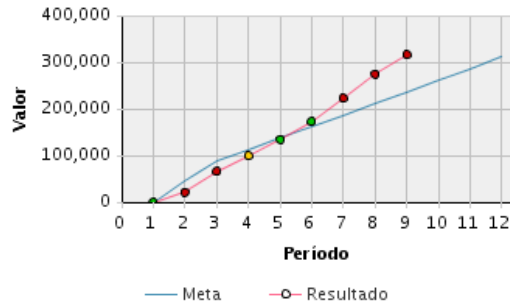

Presupuesto Mensual 2012

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2012							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	43,525.29	20,976.36	43,525.29	20,976.36	48.19 %		6.75 %
Mar	43,525.29	44,215.73	87,050.58	65,192.09	74.89 %		20.97 %
Abr	24,871.59	34,469.67	111,922.17	99,661.76	89.05 %		32.06 %
May	24,871.59	34,472.18	136,793.76	134,133.94	98.06 %		43.14 %
Jun	24,871.59	38,437.32	161,665.35	172,571.26	106.75 %		55.51 %
Jul	24,871.59	50,688.32	186,536.94	223,259.58	119.69 %		71.81 %
Ago	24,871.59	50,688.32	211,408.53	273,947.90	129.58 %		88.12 %
Sep	24,871.59	42,275.60	236,280.12	316,223.50	133.83 %		101.71 %
Oct	24,871.59		261,151.71				
Nov	24,871.59		286,023.30				
Dic	24,871.59		310,894.89				
Total	310,894.89	316,223.50					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Informe Ejecutivo microempresa Turi-Tarqui, marzo 2014	A.1_Informe_Ejecutivo_microempresa_Turi-Tarqui_marzo_2014.pdf	07/05/2014
2	A.10 Informe ejecutivo Dic 2014	A.10_informe_ejecutivo_dic_2014.pdf	06/01/2015
3	A.15 Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2015	Informe_ejecutivo_SITOP_Microempresa_Molleturo_febrero_2015.pdf	2015/2015
4	A.16 Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2015	A.16_Informe_Ejecutivo_SITOP_marzo_2015.pdf	07/04/2015
5	A.2 Informe Ejecutivo microempresa Turi-Tarqui, abril 2014	A.2_Informe_Ejecutivo_microempresa_Turi-Tarqui_abril_2014.pdf	07/05/2014
6	A.3 Informe Ejecutivo SITOP mes de Mayo 2014.	A.3_Informe_ejecutivo_SITOP_microempresa_Turi_-_Tarqui.pdf	04/06/2014
7	A.4 Informe Ejecutivo SITOP mes de Junio 2014.	A.4_Informe_Ejecutivo_SITOP_Junio_2014.pdf	03/07/2014
8	A.6 Informe Ejecutivo SITOP, Asoc.Conserv.Vial. Turi-Tarqui, julio 2014	A.8_Informe_Ejecutivo_SITOP_julio_2014.pdf	18/08/2014
9	A.6 Informe Ejecutivo SITOP, Asoc.Conserv.Vial. Turi-Tarqui, septiembre 2014	A.6_Informe_Ejecutivo_SITOP_Turi-Tarqui_septiembre_2014.pdf	09/10/2014
10	A.7 Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2014	A.9_Informe_Ejecutivo_SITOP_agosto_2014.pdf	04/09/2014
11	A.8 Informe ejecutivo SITOP Octubre 2014	A.8_Informe_ejecutivo_mes_de_Octubre_2014(Susudel).pdf	06/11/2014
12	A.9 Informe ejecutivo mes de Noviembre 2014	A.9_Informe_ejecutivo_mes_de_Noviembre_2014.pdf	01/12/2014
13	A5. Inf. Ejecutivo Julio 2014 Micro Salado Portete	A5._Informe_Ejecutivo_Julio_2014_Micro_SaladoPortete.pdf	05/08/2014
14	Acta Cumplimiento mensual de trabajo Hierba Buena Junio 2017	Acta_Hierba_Buena_Junio_2017.pdf	04/08/2017
15	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Agosto 2017	ACTA_EL_CAJAS_AGOSTO.pdf	03/10/2017
16	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Diciembre 2017	ACTA_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
17	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Enero 2018	ACTA_EL_CAJAS_ENERO_2018.pdf	05/04/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Noviembre 2017	ACTA_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
19	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Octubre 2017	ACTA_EL_CAJAS_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
20	Acta Cumplimiento mensual de trabajos El Cajas Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_EL_CAJAS.pdf	01/11/2017
21	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Agosto 2017	ACTA_HIERBA_BUENA_AGOSTO.pdf	03/10/2017
22	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Diciembre 2017	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
23	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Enero 2018	ACTA_HIERBA_BUENA_ENERO.pdf	05/04/2018
24	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Julio 2017	Acta_Hierba_Buena_Centro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
25	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Noviembre 2017	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
26	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Octubre 2017	ACTA_HIERBA_BUENA_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
27	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Hierba Buena Centro Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	01/11/2017
28	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Agosto 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_AGOSTO.pdf	03/10/2017
29	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Diciembre 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
30	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Enero 2018	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_ENERO.pdf	05/04/2018
31	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Julio 2017	Acta_Nueva_Esperanza_Julio_2017.pdf	05/09/2017
32	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Junio 2017	Acta_Nueva_Esperanza_Junio_2017.pdf	04/08/2017
33	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Noviembre 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
34	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Octubre 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
35	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Nueva Esperanza Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	01/11/2017
36	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Agosto 2017	ACTA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
37	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Diciembre 2017	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
38	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Enero 2018	ACTA_MOLLETIRO_ENERO.pdf	05/04/2018
39	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Julio 2017	Acta_San_Santiago_de_Molleturo_Julio_2017.pdf	05/09/2017
40	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Junio 2017	Acta_San_Santiago_de_Molleturo_Junio_2017.pdf	04/08/2017
41	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Noviembre 2017	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
42	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Octubre 2017	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
43	Acta Cumplimiento mensual de trabajos San Santiago de Molleturo Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	01/11/2017
44	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Agosto 2017	ACTA_SAYAUSI_AGOSTO.pdf	03/10/2017
45	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Diciembre 2017	ACTA_SAYAUSI_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
46	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Julio 2017	Acta_Sayausi_Julio_2017.pdf	05/09/2017
47	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Junio 2017	Acta_Sayausi_Junio_2017.pdf	04/08/2017
48	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Noviembre 2017	ACTA_SAYAUSI_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
49	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Octubre 2017	ACTA_SAYAUSI_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
50	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_SAYAUSI.pdf	01/11/2017
51	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sayausi Enero 2018	ACTA_SAYAUSI_ENERO.pdf	05/04/2018
52	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Agosto 2017	ACTA_SEVILLA_SE_ORO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
53	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Diciembre 2017	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
54	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Enero 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_ENERO.pdf	05/04/2018
55	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Julio 2017	Acta_Sevilla_de_Oro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
56	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Junio 2017	Acta_Sevilla_de_Oro_Junio_2017.pdf	04/08/2017
57	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Noviembre 2017	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
58	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Octubre 2017	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
59	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Sevilla de Oro Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	01/11/2017
60	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Agosto 2017	ACTA_SUSUDEL_AGOSTO.pdf	03/10/2017
61	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Diciembre 2017	ACTA_SUSUDEL_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
62	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Enero 2018	ACTA_SUSUDEL_ENERO.pdf	05/04/2018
63	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Julio 2017	Acta_Susudel_Julio_2017.pdf	05/09/2017
64	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Junio 2017	Acta_Susudel_Junio_2017.pdf	04/08/2017
65	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Noviembre 2017	ACTA_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
66	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Octubre 2017	ACTA_SUSUDEL_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
67	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Susudel Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_SUSUDEL.pdf	01/11/2017
68	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Agosto 2017	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
69	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Diciembre 2017	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
70	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Enero 2018	ACTA_TAMARINDO_ENERO.pdf	05/04/2018
71	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Julio 2017	Acta_Tamarindo_Centro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
72	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Junio 2017	Acta_Tamarindo_Centro_Junio_2017.pdf	04/08/2017
73	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Noviembre 2017	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
74	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Octubre 2017	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
75	Acta Cumplimiento mensual de trabajos Tamarindo Centro Septiembre 2017	Acta_Septiembre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	01/11/2017
76	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS EL CAJAS FEBRERO 2017	ACTA_EL_CAJAS_mes_Febrero_2017.pdf	02/03/2017
77	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS EL CAJAS MARZO 2017	ACTA_EL_CAJAS_mes_Marzo_2017.pdf	05/04/2017
78	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS HIERBA BUENA CENTRO DICIEMBRE 2016	ACTA_DE_CUMPLIMIENTO_DE TRABAJOS_HIERBA BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2016.pdf	03/02/2017
79	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS MICROEMPRESA SAN SANTIAGO DE MOLLETURO DICIEMBRE 2016	ACTA_DE_CUMPLIMIENTO_DE TRABAJOS_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2016.pdf	03/02/2017
80	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS NUEVA ESPERANZA MARZO 2017	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_mes_Marzo_2017.pdf	05/04/2017
81	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS SAN SANTIAGO DE MOLLETURO MARZO 2017	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_mes_Marzo_2017.pdf	05/04/2017
82	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS SUSUDEL MARZO 2017	ACTA_SUSUDEL_mes_Marzo_2017.pdf	05/04/2017
83	Acta El Cajas Abril 2018	ACTA_EL_CAJAS_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
84	Acta El Cajas Junio 2018	ACTA_EL_CAJAS_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
85	Acta El Cajas Marzo 2018	ACTA_EL_CAJAS_MARZO.pdf	04/05/2018
86	Acta El Cajas Mayo 2018	ACTA_EL_CAJAS_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
87	Acta Hierba Buena Centro Abril 2018	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
88	Acta Hierba Buena Centro Junio 2018	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
89	Acta Hierba Buena Centro Mayo 2018	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
90	Acta Nueva Esperanza Abril 2018	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
91	Acta Nueva Esperanza Junio 2018	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
92	Acta Nueva Esperanza Mayo 2018	ACTA_NUEVA_ESPERANZA_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
93	Acta Recepción Definitiva EL CAJAS ENERO 2018	ACTA_EL_CAJAS.pdf	05/04/2018
94	Acta Recepción Definitiva HIERBA BUENA CENTRO ENERO 2018	ACTA_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/04/2018
95	Acta Recepción Definitiva NUEVA ESPERANZA ENERO 2018	ACTA_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/04/2018
96	Acta Recepción Definitiva PANAVAL DEL SUR	Acta_Recepción_Definitiva_PANAVAL_DEL_SUR.pdf	06/09/2016
97	Acta Recepción Definitiva SAN SANTIAGO DE MOLLETURO ENERO 2018	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/04/2018
98	Acta Recepción Definitiva SAYAUSI	Acta_Recepción_Definitiva_SAYAUSI.pdf	06/09/2016
99	Acta Recepción Definitiva SAYAUSI ENERO 2018	ACTA_SAYAUSI.pdf	05/04/2018
100	Acta Recepción Definitiva SEVILLA DE ORO	Acta_Recepción_Definitiva_SEVILLA_DE_ORO.pdf	06/09/2016
101	Acta Recepción Definitiva SEVILLA DE ORO ENERO 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/04/2018
102	Acta Recepción Definitiva SUSUDEL	Acta_Recepción_Definitiva_SUSUDEL.pdf	06/09/2016
103	Acta Recepción Definitiva SUSUDEL ENERO 2018	ACTA_SUSUDEL.pdf	05/04/2018
104	Acta Recepción Definitiva TAMARINDO CENTRO	Acta_Recepción_Definitiva_TAMARINDO_CENTRO.pdf	06/09/2016
105	Acta Recepción Definitiva TAMARINDO CENTRO ENERO 2018	ACTA_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/04/2018
106	Acta San Felipe de Oña Abril 2018	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
107	Acta San Felipe de Oña Junio 2018	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
108	Acta San Felipe de Oña Marzo 2018	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MARZO.pdf	04/05/2018
109	Acta San Felipe de Oña Mayo 2018	ACTA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
110	Acta San Santiago de Molleturo Abril 2018	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
111	Acta San Santiago de Molleturo Junio 2018	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
112	Acta San Santiago de Molleturo Marzo 2018	ACTA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MARZO.pdf	04/05/2018
113	Acta San Santiago de Molleturo Mayo 2018	ACTA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
114	Acta Santa Rita Abril 2018	ACTA_SANTA_RITA_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
115	Acta Santa Rita Junio 2018	ACTA_SANTA_RITA_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
116	Acta Santa Rita Marzo 2018	ACTA_SANTA_RITA_MARZO.pdf	04/05/2018
117	Acta Santa Rita Mayo 2018	ACTA_SANTA_RITA_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
118	Acta Sayausí Abril 2018	ACTA_SAYAUSI_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
119	Acta Sayausí Junio 2018	ACTA_SAYAUSI_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
120	Acta Sayausí Marzo 2018	ACTA_SAYAUSI_MARZO.pdf	04/05/2018
121	Acta Sayausí Mayo 2018	ACTA_SAYAUSI_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
122	Acta Sevilla de Oro Abril 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
123	Acta Sevilla de Oro Junio 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
124	Acta Sevilla de Oro Marzo 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_MARZO.pdf	04/05/2018
125	Acta Sevilla de Oro Mayo 2018	ACTA_SEVILLA_DE_ORO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
126	Acta Susudel Abril 2018	ACTA_SUSUDEL_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
127	Acta Susudel Junio 2018	ACTA_SUSUDEL_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
128	Acta Susudel Marzo 2018	ACTA_SUSUDEL_MARZO.pdf	04/05/2018
129	Acta Susudel Mayo 2018	ACTA_SUSUDEL_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
130	Acta Tamarindo Centro Abril 2018	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
131	Acta Tamarindo Centro Junio 2018	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
132	Acta Tamarindo Centro Marzo 2018	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_MARZO.pdf	04/05/2018
133	Acta Tamarindo Centro Mayo 2018	ACTA_TAMARINDO_CENTRO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
134	Acta Unidos Venceremos Abril 2018	ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
135	Acta Unidos Venceremos Junio 2018	ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
136	Acta Unidos Venceremos Marzo 2018	ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_MARZO.pdf	04/05/2018
137	Acta Unidos Venceremos Mayo 2018	ACTA_UNIDOS_VENCEREMOS_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
138	E Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Mar 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Mar_2017.pdf	05/02/2017
139	Fotos asociaciones de conservación vial Paute, Gualaceo y Sigsig	Fotos_Asociación_de_Conservación_vial.docx	13/11/2012
140	Fotos Asociaciones de conservación vial Paute, Gualaceo y Sigsig, noviembre 2012	Fotos_Microempresas_Noviembre-1.doc	10/12/2012
141	Fotos microempresas Lentag, Santa Isabel y Sarayunga	fotos_microempresas_léntag_-_quera.doc	26/10/2012
142	Fotos microempresas Turi-Tarqui y Cuenca-El Descanso	Fotos_Micro_Empresas.docx	26/10/2012
143	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Mar_2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Mar_2016.pdf	01/04/2016
144	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_Mar_2016	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_Mar_2016..pdf	01/04/2016
145	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Mar_2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Mar_2016.pdf	01/04/2016
146	GestionReporteFN_E40_y_E594_Mar_2016	GestionReporteFN_E40_y_E594_Mar_2016.pdf	01/04/2016
147	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel_Mar_2016	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel_Mar_2016..pdf	01/04/2016
148	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Mar_2016	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Mar_2016..pdf	01/04/2016
149	IE Carretera E40 y E594 Abr 2017	GestionReporteFN_E40_y_E594_abr_2017.pdf	05/04/2017
150	IE Carretera E40 y E594 Ago 2016	GestionReporteFN_E40_y_E594_Ago_2016.pdf	06/09/2016
151	IE Carretera E40 y E594 Dic 2015	GestionReporteFN_E40_y_E594_dic_2015.pdf	04/01/2016
152	IE Carretera E40 y E594 Ene 2016.	GestionReporteFN_E40_y_E594_ene_2016.pdf	03/02/2016
153	IE Carretera E40 y E594 Feb 2016.	GestionReporteFN_E40_y_E594_feb_2016.pdf	01/03/2016
154	IE Carretera E40 y E594 Feb 2017.	GestionReporteFN_E40_y_E594_feb_2017..pdf	08/02/2017
155	IE Carretera E40 y E594 Jun 2016	GestionReporteFN_E40_y_E594_Jun_2016.pdf	05/07/2016
156	IE Carretera E40 y E594 Mar 2017	GestionReporteFN_E40_y_E594_mar_2017.pdf	07/03/2017
157	IE Carretera E40 y E594 May 2016	GestionReporteFN_E40_y_E594_May_2016.pdf	02/06/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
158	IE Carretera E40 y E594 Nov 2015.	GestionReporteFN_E40_y_E594_nov_2015.pdf	01/12/2015
159	IE Carretera E40 y E594 Oct 2015.	GestionReporteFN_E40_y_E594_oct_2015..pdf	04/11/2015
160	IE Carretera E40 y E594 Sep 2016.	IE_Carretera_E40_y_E594_Sep_2016..pdf	04/10/2016
161	IE Carretera E40 y E594 Sep2015	GestionReporteFN_E40_y_E594.pdf	07/10/2015
162	IE Consermin Julio 2016	ID_Consermin_Julio_2016.pdf	09/08/2016
163	IE Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausi Octubre 2017	IE_Octubre_2017_SAYAUSI.pdf	01/11/2017
164	IE Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausi Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_SAYAUSI.pdf	04/10/2017
165	IE EL CAJAS ABRIL 2018	IE_EL_CAJAS_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
166	IE EL CAJAS DICIEMBRE 2017	IE_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
167	IE EL CAJAS ENERO 2018	IE_EL_CAJAS_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
168	IE EL CAJAS JULIO 2018	21034_IE_EL_CAJAS_JULIO_2018.pdf	03/08/2018
169	IE EL CAJAS JUNIO 2018	IE_EL_CAJAS_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
170	IE EL CAJAS MARZO 2018	IE_EL_CAJAS_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
171	IE EL CAJAS MAYO 2018	IE_EL_CAJAS_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
172	IE EL CAJAS NOVIEMBRE 2017	IE_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
173	IE HIERBA BUENA CENTRO NOVIEMBRE 2017	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
174	IE HIERBA BUENA CENTRO ABRIL 2018	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
175	IE HIERBA BUENA CENTRO DICIEMBRE 2017	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
176	IE HIERBA BUENA CENTRO ENERO 2018	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
177	IE HIERBA BUENA CENTRO JUNIO 2018	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
178	IE HIERBA BUENA CENTRO MAYO 2018	IE_HIERBA_BUENA_CENTRO_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
179	IE Informe_Ejecutivo_ago_2016_Esc._Milen	IE_Informe_Ejecutivo_ago_2016_Esc._Milen.pdf	06/09/2016
180	IE Informe_Ejecutivo_jun_2016_Esc._Milen	IE_Informe_Ejecutivo_jun_2016_Esc._Milen.pdf	05/07/2016
181	IE Informe_Ejecutivo_sep_2016_Esc._Milen	IE_Informe_Ejecutivo_sep_2016_Esc._Milen.pdf	04/10/2016
182	IE Microempresa Chicty - Sevilla Dic 2015	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_dic_2015.pdf	04/01/2016
183	IE Microempresa Chicty - Sevilla Ene 2016	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_ene_2016.pdf	03/02/2016
184	IE Microempresa Chicty - Sevilla Feb 2016	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_feb_2016.pdf	01/03/2016
185	IE Microempresa Chicty - Sevilla Jun 2016	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_Jun_2016.pdf	05/07/2016
186	IE Microempresa Chicty - Sevilla May 2016	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_May_2016.pdf	02/06/2016
187	IE Microempresa Chicty - Sevilla Nov 2015	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_nov_2015..pdf	01/12/2015
188	IE Microempresa Chicty - Sevilla Oct2015	Chicti-Sevilla_de_Oro_Octubre_2015.pdf	13/11/2015
189	IE Microempresa Chicty - Sevilla Sep2015	GestionReporteFN_Chicty_-_Sevilla_Sep_2015.pdf	07/10/2015
190	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Dic 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_dic_2015.pdf	04/01/2016
191	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Ene 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_ene_2016.pdf	03/02/2016
192	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Feb 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_feb_2016.pdf	01/03/2016
193	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Jun 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Jun_2016.pdf	05/07/2016
194	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km May 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_May_2016.pdf	02/06/2016
195	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Nov 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_nov_2015.pdf	01/12/2015
196	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Oct 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Oct_2015.pdf	13/11/2015
197	IE Microempresa Cuenca Molleturo 15 - 36 km Sep2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km15_al_36_Sep_2015.pdf	07/10/2015
198	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Dic 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_dic_2015.pdf	04/01/2016
199	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Ene 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_ene_2016.pdf	03/02/2016
200	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Feb 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_feb_2016.pdf	01/03/2016
201	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Jun 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Jun_2016.pdf	05/07/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
202	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km May 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_May_2016.pdf	05/09/2017
203	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Nov 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_nov_2015.pdf	05/09/2017
204	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Oct 2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Oct_2015.pdf	05/09/2017
205	IE Microempresa Cuenca Molleturo 91 - 119 km Sep2015	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_Km_91_al_119_Sep_2015.pdf	05/09/2017
206	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Ago 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Ago_2016..pdf	05/09/2017
207	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Dic 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Dic_2016.pdf	05/09/2017
208	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Ene 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Ene_2017.pdf	05/09/2017
209	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Feb 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Feb_2017.pdf	05/09/2017
210	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Nov 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Nov_2016.pdf	05/09/2017
211	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Oct 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Oct_2016.pdf	05/09/2017
212	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Km Sep 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km0_al_15_Sep_2016..pdf	05/09/2017
213	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SAYAUSI.pdf	05/05/2017
214	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_SAYAUSI.pdf	05/09/2017
215	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SAYAUSI.pdf	04/08/2017
216	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Junio 2017	IE_Junio_2017_SAYAUSI.pdf	05/07/2017
217	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 0 - 15 Sayausí - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SAYAUSI.pdf	05/06/2017
218	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/09/2017
219	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/09/2017
220	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	04/08/2017
221	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Junio 2017	IE_Junio_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/07/2017
222	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/06/2017
223	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	01/11/2017
224	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 15 - 36 San Santiago de Molleturo - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	04/10/2017
225	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/05/2017
226	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/09/2017
227	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	04/08/2017
228	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Junio 2017	IE_Junio_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/07/2017
229	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	05/06/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
230	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	01/11/2017
231	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Hierba Buena Centro - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	04/10/2017
232	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Km Ago 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36 - 03/09/2016	03/09/2016
233	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Km Oct 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36 - 01/11/2016	01/11/2016
234	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 Km Sep 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36 - 01/10/2016	01/10/2016
235	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 36 - 64 San Santiago de Molleturo - Marzo 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36 - 05/04/2017	05/04/2017
236	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Km Ago 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64 - 03/09/2016	03/09/2016
237	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Km Oct 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64 - 01/11/2016	01/11/2016
238	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Km Sep 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64 - 01/10/2016	01/10/2016
239	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/04/2017
240	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/09/2017
241	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	04/08/2017
242	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Junio 2017	IE_Junio_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/07/2017
243	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/06/2017
244	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	01/11/2017
245	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 64 - 91 Tamarindo Centro - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	04/10/2017
246	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/05/2017
247	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/09/2017
248	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	04/08/2017
249	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Junio 2017	IE_Junio_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/07/2017
250	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Marzo 2017	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km91 - 05/04/2017	05/04/2017
251	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	05/06/2017
252	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	01/11/2017
253	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme 91 - 119 Nueva Esperanza - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	04/10/2017
254	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 36 - KM 64 Dic 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36 - 03/01/2017	03/01/2017
255	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 36 - KM 64 Nov 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km36 - 05/12/2016	05/12/2016
256	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 64 - KM 91 Dic 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64 - 03/01/2017	03/01/2017
257	IE Microempresa Cuenca Molleturo El Empalme KM 64 - KM 91 Nov 2016	GestionReporteFN_Cuenca_Molleturo_El_Empalme_Km64 - 05/12/2016	05/12/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
258	IE Microempresa Cumbe - Oña km 40+600 - km 62+500 Susudel - Marzo 2017	GestionReporteFN_Cumbe_Oña_Km40+600_al_62+500_Susudel_Marzo_2017.pdf	04/04/2017
259	IE Microempresa Cumbe Oña 40+600 - 62+500 El Cajas - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_El_Cajas.pdf	04/10/2017
260	IE Microempresa Cumbe Oña 40+600 - 62+500 El Cajas - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_El_Cajas.pdf	04/10/2017
261	IE Microempresa Cumbe Oña 40+600 - 62+500 El Cajas - Septiembre 2017	IE_Octubre_2017_EL_CAJAS.pdf	01/11/2017
262	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SUSUDEL.pdf	05/05/2017
263	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_SUSUDEL.pdf	05/09/2017
264	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SUSUDEL.pdf	04/08/2017
265	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Junio 2017	IE_Junio_2017_SUSUDEL.pdf	05/07/2017
266	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SUSUDEL.pdf	05/06/2017
267	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_SUSUDEL.pdf	01/11/2017
268	IE Microempresa Cumbe-Oña 40+600 - 62+500 Susudel - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_SUSUDEL.pdf	04/10/2017
269	IE Microempresa El Cajas Julio 2016	IE_Microempresa_El_Cajas_Julio_2016.pdf	09/08/2016
270	IE Microempresa La Jarata - Susudel Dic 2015	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__dic_2015.pdf	04/01/2016
271	IE Microempresa La Jarata - Susudel Ene 2016	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__ene_2016.pdf	03/02/2016
272	IE Microempresa La Jarata - Susudel Feb 2016	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__feb_2016.pdf	01/03/2016
273	IE Microempresa La Jarata - Susudel Jun 2016	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__Jun_2016.pdf	05/07/2016
274	IE Microempresa La Jarata - Susudel May 2016	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__May_2016.pdf	02/06/2016
275	IE Microempresa La Jarata - Susudel Nov 2015	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__nov_2015..pdf	01/12/2015
276	IE Microempresa La Jarata - Susudel Oct 2015	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__Oct_2015..pdf	06/11/2015
277	IE Microempresa La Jarata - Susudel Sep 2015	GestionReporteFN_la_Jarata_-_Susudel__Sept_2015.pdf	07/10/2015
278	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Abril 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Abril_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/05/2017
279	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Agosto 2017	IE_Agosto_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/09/2017
280	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Julio 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Julio_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	04/08/2017
281	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Junio 2017	IE_Junio_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/07/2017
282	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_mes_de_Mayo_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/06/2017
283	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Octubre 2017	IE_Octubre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	01/11/2017
284	IE Microempresa Sevilla de Oro 0+000 - 25+720 Sevilla de Oro - Septiembre 2017	IE_Septiembre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	04/10/2017
285	IE Microempresa Susudel - Oña Dic 2015	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_dic_2015.pdf	04/01/2016
286	IE Microempresa Susudel - Oña Ene 2016	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_ene_2016.pdf	03/02/2016
287	IE Microempresa Susudel - Oña Feb 2016	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_feb_2016.pdf	01/03/2016
288	IE Microempresa Susudel - Oña Jun 2016	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Jun_2016.pdf	05/07/2016
289	IE Microempresa Susudel - Oña May 2016	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_May_2016.pdf	02/06/2016
290	IE Microempresa Susudel - Oña Nov 2015	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_nov_2015..pdf	01/12/2015
291	IE Microempresa Susudel - Oña Oct 2015	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Oct_2015..pdf	06/11/2015
292	IE Microempresa Susudel - Oña Sep 2015	GestionReporteFN_Susudel_-_Oña_Sep_2015.pdf	07/10/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
293	IE NUEVA ESPERANZA ABRIL 2018	IE_NUEVA_ESPERANZA_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
294	IE NUEVA ESPERANZA DICIEMBRE 2017	IE_NUEVA_ESPERANZA_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
295	IE NUEVA ESPERANZA ENERO 2018	IE_NUEVA_ESPERANZA_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
296	IE NUEVA ESPERANZA JUNIO 2018	IE_NUEVA_ESPERANZA_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
297	IE NUEVA ESPERANZA MAYO 2018	IE_NUEVA_ESPERANZA_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
298	IE NUEVA ESPERANZA NOVIEMBRE 2017	IE_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
299	IE SAN FELIPE DE OÑA ABRIL 2018	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
300	IE SAN FELIPE DE OÑA JULIO 2018	21036_IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JULIO_2018.pdf	03/08/2018
301	IE SAN FELIPE DE OÑA JUNIO 2018	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
302	IE SAN FELIPE DE OÑA MARZO 2018	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
303	IE SAN FELIPE DE OÑA MAYO 2018	IE_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
304	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO ABRIL 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
305	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO DICIEMBRE 2017	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
306	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO ENERO 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
307	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO JUNIO 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
308	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO MARZO 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
309	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO MAYO 2018	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
310	IE SAN SANTIAGO DE MOLLETURO NOVIEMBRE 2017	IE_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
311	IE SANTA RITA ABRIL 2018	IE_SANTA_RITA_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
312	IE SANTA RITA JULIO 2018	21038_IE_SANTA_RITA_JULIO_2018.pdf	03/08/2018
313	IE SANTA RITA JUNIO 2018	IE_SANTA_RITA_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
314	IE SANTA RITA MARZO 2018	IE_SANTA_RITA_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
315	IE SANTA RITA MAYO 2018	IE_SANTA_RITA_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
316	IE SAYAUSI ABRIL 2018	IE_SAYAUSI_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
317	IE SAYAUSI DICIEMBRE 2017	IE_SAYAUSI_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
318	IE SAYAUSI ENERO 2018	IE_SAYAUSI_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
319	IE SAYAUSI MARZO 2018	IE_SAYAUSI_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
320	IE SAYAUSI NOVIEMBRE 2017	IE_SAYAUSI_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
321	IE SAYAUSÍ JUNIO 2018	IE_SAYAUSI_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
322	IE SAYAUSÍ MAYO 2018	IE_SAYAUSI_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
323	IE SEVILLA DE ORO ABRIL 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
324	IE SEVILLA DE ORO DICIEMBRE 2017	IE_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
325	IE SEVILLA DE ORO ENERO 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
326	IE SEVILLA DE ORO JULIO 2018	21035_IE_SEVILLA_DE_ORO_JULIO_2018.pdf	03/08/2018
327	IE SEVILLA DE ORO JUNIO 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
328	IE SEVILLA DE ORO MARZO 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
329	IE SEVILLA DE ORO MAYO 2018	IE_SEVILLA_DE_ORO_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
330	IE SEVILLA DE ORO NOVIEMBRE 2017	IE_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
331	IE SUSUDEL ABRIL 2018	IE_SUSUDEL_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
332	IE SUSUDEL DICIEMBRE 2017	IE_SUSUDEL_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
333	IE SUSUDEL ENERO 2018	IE_SUSUDEL_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
334	IE SUSUDEL JULIO 2018	21033_IE_SUSUDEL_JULIO_2018.pdf	03/08/2018
335	IE SUSUDEL JUNIO 2018	IE_SUSUDEL_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
336	IE SUSUDEL MARZO 2018	IE_SUSUDEL_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
337	IE SUSUDEL MAYO 2018	IE_SUSUDEL_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
338	IE SUSUDEL NOVIEMBRE 2017	IE_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
339	IE TAMARINDO CENTRO ABRIL 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
340	IE TAMARINDO CENTRO DICIEMBRE 2017	IE_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
341	IE TAMARINDO CENTRO ENERO 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
342	IE TAMARINDO CENTRO JUNIO 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
343	IE TAMARINDO CENTRO MARZO 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
344	IE TAMARINDO CENTRO MAYO 2018	IE_TAMARINDO_CENTRO_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
345	IE TAMARINDO CENTRO NOVIEMBRE 2017	IE_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
346	IE UNIDOS VENCEREMOS ABRIL 2018	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
347	IE UNIDOS VENCEREMOS JULIO 2018	21037_IE_UNIDOS_VENCEREMOS_JULIO_2018.pdf	03/08/2018
348	IE UNIDOS VENCEREMOS JUNIO 2018	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
349	IE UNIDOS VENCEREMOS MARZO 2018	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
350	IE UNIDOS VENCEREMOS MAYO 2018	IE_UNIDOS_VENCEREMOS_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
351	Informe Ejecutivo correspondiente al mes de agosto carreteras E40 y E594	Informe_Ejecutivo_SITOP_Agosto_E40_E594..pdf	07/09/2015
352	Informe ejecutivo septiembre 2012	Informe_ejecutivo_septiembre_2012.pdf	24/10/2012
353	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013 Micro Empresa Cuenca Descanso	MICROEMPRESA_EL_DESCANSO.pdf	03/05/2013
354	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Santa Isabel	MICROEMPRESA_SANTA_ISABEL.pdf	03/05/2013
355	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Sarayunga	MICROEMPRESA_SARAYUNGA.pdf	03/05/2013
356	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Sigsig	MICROEMPRESA_SIGSIG.pdf	03/05/2013
357	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Turi Tarqui	MICROEMPRESA_TARQUI.pdf	03/05/2013
358	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Unidos Venceremos	MICROEMPRESA_UNIDOS_VENCEREMOS.pdf	03/05/2013
359	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Empresa Zhumir	MICROEMPRESA_ZHUMIR.pdf	03/05/2013
360	Informe Ejecutivo SITOP de Abril 2013, Micro Lentag	MICROEMPRESA_LENTAG.pdf	03/05/2013
361	Informe ejecutivo SITOP, agosto 2013, asoc. conserv. vial Sigsig	Informe_ejecutivo_SITOP_asoc_cons_vial_Sigsig_agosto_2013.pdf	02/09/2013
362	Informe ejecutivo SITOP, agosto 2013, asoc. conserv. vial Turi-Tarqui	Informe_ejecutivo_SITOP_asoc_cons_vial_Turi-Tarqui_agosto_2013.pdf	02/09/2013
363	Informe ejecutivo SITOP, agosto 2013, asoc. conserv. vial Unidos Venceremos	Informe_ejecutivo_SITOP_asoc_cons_vial_Unidos_Venceremos_agosto_2013.pdf	02/09/2013
364	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Lentag, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP_mant.lentag_noviembre_2012.pdf	10/12/2012
365	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Sarayunga, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP_asoc_cons_vial_Sarayunga_noviembre_2012.pdf	10/12/2012
366	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Sigsig, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP_asoc_cons_vial_Sigsig_noviembre_2012.pdf	10/12/2012
367	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Unidos Venceremos, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP_asoc_cons_vial_Unidos_Venceremos_noviembre_2012.pdf	10/12/2012
368	Informe ejecutivo SITOP, asociación conservación vial Zhumir, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP_asoc_cons_vial_Zhumir_noviembre_2012.pdf	10/12/2012
369	Informe ejecutivo SITOP, julio 2013, asoc. conserv. vial Sigsig	Informe_ejecutivo_SITOP_asoc_cons_vial_Sigsig_julio_2013.pdf	05/08/2013
370	Informe ejecutivo SITOP, julio 2013, asoc. conserv. vial Unidos Venceremos	Informe_ejecutivo_SITOP_asoc_cons_vial_Unidos_Venceremos_julio_2013.pdf	05/08/2013
371	Informe ejecutivo SITOP, junio 2013	Informe_ejecutivo_SITOP_junio_2013_Asoc_Consev_vial_Sigsig.pdf	22/07/2013
372	Informe ejecutivo SITOP, junio 2013	Informe_ejecutivo_SITOP_asoc_conserv_vial_SIGSIG_junio_2013.pdf	22/07/2013
373	Informe ejecutivo SITOP, junio 2013	Informe_ejecutivo_SITOP_asoc_cons_vial_Unidos_Venceremos_junio_2013.pdf	22/07/2013
374	Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013, asociación de conservación vial Lentag	Informe_ejecutivo_SITOP_asoc.cons.vial_Lentag_noviembre_2013.pdf	05/12/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
375	Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013, asociación de conservación vial Sarayunga	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sarayunga__noviembre_2013.pdf	05/12/2013
376	Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013, asociación de conservación vial Sigsig	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig__noviembre_2013.pdf	05/12/2013
377	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2012, El descanso	Informe_ejecutivo_SITOP__octubre_2012.pdf.descanso.pdf	13/11/2012
378	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2012, lentag	Informe_ejecutivo_SITOP__octubre_2012.pdf.lentag.pdf	13/11/2012
379	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2012, Santa Isabel	Informe_ejecutivo_SITOP__octubre_2012.pdf.santa_isabel.pdf	13/11/2012
380	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Sigsig__octubre_2013.pdf	06/10/2013
381	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos__octubre_2013.pdf	06/10/2013
382	Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2013, asoc. conserv. vial Unidos Venceremos	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Unidos_Venceremos__septiembre_2013.pdf	07/10/2013
383	Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2013, asoc. conserv. vial Zhumir	Informe_ejecutivo_SITOP__asoc._cons._vial_Zhumir__septiembre_2013.pdf	07/10/2013
384	Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2015.	Informe_ejecutivo_SITOP__septiembre_2015..pdf	06/10/2015
385	Informes ejecutivos SITOP, proyectos de mantenimiento.	Informe_ejecutivo_Abril_2012.pdf	28/05/2012
386	Mantenimiento red vial estatal mes de abril 2015	8.7_abr-%mrve_azuay.xls	06/05/2015
387	Mantenimiento red vial estatal mes de junio 2015	8.7_jun-%mrve_azuay.xls	06/08/2015
388	Matriz mantenimiento junio 2015	8.7_jun-%mrve_azuay.xls	10/07/2015
389	Matriz mantenimiento mayo 2015	8.7_may-%mrve_azuay.xls	05/06/2015
390	Oficios_290716	Oficios_290716.rar	29/07/2016
391	Orden de Compra Microempresa "El Cajas" 5 meses desde 23 Agosto 2017	ORDEN_DE_COMPRA_EL_CAJAS_AGOSTO_2017.PDF	03/10/2017
392	Orden de Compra Microempresa "El Cajas" mes Marzo 2018	A.C.V._EL_CAJAS.pdf	05/04/2018
393	Orden de Compra Microempresa "Hieba Buena Centro" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	12/05/2017
394	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Diciembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2016.pdf	05/07/2016
395	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Julio 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JULIO_2016.pdf	20/10/2016
396	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Junio 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2016.pdf	20/10/2016
397	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Noviembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2016.pdf	05/07/2016
398	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Octubre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_Octubre_2016.pdf	01/12/2016
399	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" mes Septiembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO_MES_SEPTIEMBRE_2016.pdf	01/12/2016
400	Orden de Compra Microempresa "Hierba Buena Centro" plazo 8 meses 2018	ORDEN_DE_COMPRA_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	04/05/2018
401	Orden de Compra Microempresa "Nueva Esperanza" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_NUEVA_ESPERANZA.pdf	12/05/2017
402	Orden de Compra Microempresa "Nueva Esperanza" mes Marzo 2017	ORDEN_DE_COMPRA_NUEVA_ESPERANZA_MARZO_2017.pdf	10/04/2017
403	Orden de Compra Microempresa "Nueva Esperanza" plazo 8 meses 2018	ORDEN_DE_COMPRA_NUEVA_ESPERANZA.pdf	04/05/2018
404	Orden de Compra Microempresa "San Felipe de Oña" mes Marzo 2018	A.C.V._SAN_FELIPE_DE_OÑA.pdf	05/04/2018
405	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Marzo 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MARZO_2017.pdf	03/10/2017
406	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	12/05/2017
407	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Agosto 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_AGO_2016.pdf	01/10/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
408	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Diciembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO	03/2017
409	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Julio 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO	07/2016
410	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Junio 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO	06/2016
411	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Marzo 2018	A.C.V._SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	05/04/2018
412	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Noviembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO	11/2016
413	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Octubre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO	10/2016
414	Orden de Compra Microempresa "San Santiago de Molleturo" mes Septiembre 2016	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO	09/2016
415	Orden de Compra Microempresa "Santa Rita" mes Marzo 2018	A.C.V._SANTA_RITA.pdf	05/04/2018
416	Orden de Compra Microempresa "Sayausí" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SAYAUSI.pdf	12/05/2017
417	Orden de Compra Microempresa "Sayausí" mes Marzo 2018	A.C.V._SAYAUSI.pdf	05/04/2018
418	Orden de Compra Microempresa "Sevilla de Oro" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SEVILLA_DE_ORO.pdf	12/05/2017
419	Orden de Compra Microempresa "Sevilla de Oro" mes Marzo 2018	A.C.V._SEVILLA_DE_ORO.pdf	05/04/2018
420	Orden de Compra Microempresa "Susudel" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SUSUDEL.pdf	12/05/2017
421	Orden de Compra Microempresa "Susudel" mes Marzo 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SUSUDEL_MARZO_2017.pdf	05/04/2017
422	Orden de Compra Microempresa "Susudel" mes Marzo 2018	A.C.V._SUSUDEL.pdf	05/04/2018
423	Orden de Compra Microempresa "Tamarindo Centro" 9 meses desde 13 Abril 2017	ORDEN_DE_COMPRA_TAMARINDO_CENTRO.pdf	12/05/2017
424	Orden de Compra Microempresa "Tamarindo Centro" mes Marzo 2018	A.C.V._TAMARINDO_CENTRO.pdf	05/04/2018
425	Orden de Compra Microempresa "Unidos Venceremos" mes Marzo 2018	A.C.V._UNIDOS_VENCEREMOS.pdf	05/04/2018
426	Reporte de pagos rubros mantenimiento, marzo 2015	REPORTE_PAGOS_MTTO.MES_DE_MARZO-15.pdf	08/04/2015
427	Solicitud para creación de contratos en el eSIGEF - Microempresas	MTOP-DPAZ-2015-000258-OF(Creación_de_Contratos_ESIGEF).pdf	07/10/2015
428	Sábana El Cajas Abril 2018	SABANA_EL_CAJAS_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
429	Sábana El Cajas Agosto 2017	SABANA_EL_CAJAS_AGOSTO.pdf	03/10/2017
430	Sábana El Cajas Diciembre 2017	SABANA_EL_CAJAS_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
431	Sábana El Cajas Enero 2018	SABANA_EL_CAJAS_ENERO.pdf	05/04/2018
432	Sábana El Cajas Junio 2018	SABANA_EL_CAJAS_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
433	Sábana El Cajas Marzo 2018	SABANA_EL_CAJAS_MARZO.pdf	04/05/2018
434	Sábana El Cajas Mayo 2018	SABANA_EL_CAJAS_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
435	Sábana El Cajas Noviembre 2017	SABANA_EL_CAJAS_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
436	Sábana El Cajas Octubre 2017	SABANA_EL_CAJAS_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
437	Sábana El Cajas Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_EL_CAJAS.pdf	01/11/2017
438	Sábana Hierba Buena Centro Abril 2018	SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
439	Sábana Hierba Buena Centro Agosto 2017	SABANA_HIERBA_BUENA_AGOSTO.pdf	03/10/2017
440	Sábana Hierba Buena Centro Diciembre 2017	SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
441	Sábana Hierba Buena Centro Enero 2018	SABANA_HIERBA_BUENA_ENERO.pdf	05/04/2018
442	Sábana Hierba Buena Centro Julio 2017	Sábana_Hierba_Buena_Centro_Julio_2017.pdf	05/09/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
443	Sábana Hierba Buena Centro Junio 2017	Sábana_Hierba_Buena_Centro_Junio_2017.pdf	04/08/2017
444	Sábana Hierba Buena Centro Junio 2018	SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
445	Sábana Hierba Buena Centro Mayo 2018	SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
446	Sábana Hierba Buena Centro Noviembre 2017	SABANA_HIERBA_BUENA_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
447	Sábana Hierba Buena Centro Octubre 2017	SABANA_HIERBA_BUENA_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
448	Sábana Hierba Buena Centro Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_HIERBA_BUENA_CENTRO.pdf	01/11/2017
449	Sábana Nueva Esperanza Abril 2018	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
450	Sábana Nueva Esperanza Agosto 2017	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_AGOSTO.pdf	03/10/2017
451	Sábana Nueva Esperanza Diciembre 2017	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
452	Sábana Nueva Esperanza Enero 2018	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_ENERO.pdf	05/04/2018
453	Sábana Nueva Esperanza Julio 2017	Sábana_Nueva_Esperanza_Julio_2017.pdf	05/09/2017
454	Sábana Nueva Esperanza Junio 2017	Sábana_Nueva_Esperanza_Junio_2017.pdf	04/08/2017
455	Sábana Nueva Esperanza Junio 2018	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
456	Sábana Nueva Esperanza Mayo 2018	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
457	Sábana Nueva Esperanza Noviembre 2017	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
458	Sábana Nueva Esperanza Octubre 2017	SABANA_NUEVA_ESPERANZA_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
459	Sábana Nueva Esperanza Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_NUEVA_ESPERANZA.pdf	01/11/2017
460	Sábana San Felipe de Oña Abril 2018	SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
461	Sábana San Felipe de Oña Junio 2018	SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
462	Sábana San Felipe de Oña Marzo 2018	SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MARZO.pdf	04/05/2018
463	Sábana San Felipe de Oña Mayo 2018	SABANA_SAN_FELIPE_DE_OÑA_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
464	Sábana San Santiago de Molleturo Abril 2018	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
465	Sábana San Santiago de Molleturo Agosto 2017	SABANA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
466	Sábana San Santiago de Molleturo Diciembre 2017	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
467	Sábana San Santiago de Molleturo Enero 2018	SABANA_MOLLETURO_ENERO.pdf	05/04/2018
468	Sábana San Santiago de Molleturo Julio 2017	Sábana_San_Santiago_de_Molleturo_Julio_2017.pdf	05/09/2017
469	Sábana San Santiago de Molleturo Junio 2017	Sábana_San_Santiago_de_Molleturo_Junio_2017.pdf	04/08/2017
470	Sábana San Santiago de Molleturo Junio 2018	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
471	Sábana San Santiago de Molleturo Marzo 2018	SABANA_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MARZO.pdf	04/05/2018
472	Sábana San Santiago de Molleturo Mayo 2018	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
473	Sábana San Santiago de Molleturo Noviembre 2017	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
474	Sábana San Santiago de Molleturo Octubre 2017	SABANA_SAN_SANTIAGO_DE_MOLLETURO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
475	Sábana San Santiago de Molleturo Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_SANTIAGO_DE_MOLLETURO.pdf	01/11/2017
476	Sábana Santa Rita Abril 2018	SABANA_SANTA_RITA_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
477	Sábana Santa Rita Junio 2018	SABANA_SANTA_RITA_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
478	Sábana Santa Rita Marzo 2018	SABANA_SANTA_RITA_MARZO.pdf	04/05/2018
479	Sábana Santa Rita Mayo 2018	SABANA_SANTA_RITA_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
480	Sábana Sayausí Abril 2018	SABANA_SAYAUSI_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
481	Sábana Sayausí Agosto 2017	SABANA_SAYAUSI_AGOSTO.pdf	03/10/2017
482	Sábana Sayausí Diciembre 2017	SABANA_SAYAUSI_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
483	Sábana Sayausí Enero 2018	SABANA_SAYAUSI_ENERO.pdf	05/04/2018
484	Sábana Sayausí Julio 2017	Sábana_Sayausí_Julio_2017.pdf	05/09/2017
485	Sábana Sayausí Junio 2017	Sábana_Sayausí_Junio_2017.pdf	04/08/2017
486	Sábana Sayausí Junio 2018	SABANA_SAYAUSI_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
487	Sábana Sayausí Marzo 2018	SABANA_SAYAUSI_MARZO.pdf	04/05/2018
488	Sábana Sayausí Mayo 2018	SABANA_SAYAUSI_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
489	Sábana Sayausí Noviembre 2017	SABANA_SAYAUSI_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
490	Sábana Sayausí Octubre 2017	SABANA_SAYAUSI_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
491	Sábana Sayausí Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_SAYAUSI.pdf	01/11/2017
492	Sábana Sevilla de Oro Abril 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
493	Sábana Sevilla de Oro Agosto 2017	SABANA_SEVILLA_SE_ORO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
494	Sábana Sevilla de Oro Diciembre 2017	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
495	Sábana Sevilla de Oro Enero 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_ENERO.pdf	05/04/2018
496	Sábana Sevilla de Oro Julio 2017	Sábana_Sevilla_de_Oro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
497	Sábana Sevilla de Oro Junio 2017	Sábana_Sevilla_de_Oro_Junio_2017.pdf	04/08/2017
498	Sábana Sevilla de Oro Junio 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
499	Sábana Sevilla de Oro Marzo 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO.pdf	04/05/2018
500	Sábana Sevilla de Oro Mayo 2018	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
501	Sábana Sevilla de Oro Noviembre 2017	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
502	Sábana Sevilla de Oro Octubre 2017	SABANA_SEVILLA_DE_ORO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
503	Sábana Sevilla de Oro Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_SEVILLA_DE_ORO.pdf	01/11/2017
504	Sábana Susudel Abril 2018	SABANA_SUSUDEL_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
505	Sábana Susudel Agosto 2017	SABANA_SUSUDEL_AGOSTO.pdf	03/10/2017
506	Sábana Susudel Diciembre 2017	SABANA_SUSUDEL_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
507	Sábana Susudel Enero 2018	SABANA_SUSUDEL_ENERO.pdf	05/04/2018
508	Sábana Susudel Julio 2017	Sábana_Susudel_Julio_2017.pdf	05/09/2017
509	Sábana Susudel Junio 2017	Sábana_Susudel_Junio_2017.pdf	04/08/2017
510	Sábana Susudel Junio 2018	SABANA_SUSUDEL_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
511	Sábana Susudel Marzo 2018	SABANA_SUSUDEL_MARZO.pdf	04/05/2018
512	Sábana Susudel Mayo 2018	SABANA_SUSUDEL_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
513	Sábana Susudel Noviembre 2017	SABANA_SUSUDEL_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
514	Sábana Susudel Octubre 2017	SABANA_SUSUDEL_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
515	Sábana Susudel Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_SUSUDEL.pdf	01/11/2017
516	Sábana Tamarindo Centro Abril 2018	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
517	Sábana Tamarindo Centro Agosto 2017	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_AGOSTO.pdf	03/10/2017
518	Sábana Tamarindo Centro Diciembre 2017	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/04/2018
519	Sábana Tamarindo Centro Julio 2017	Sábana_Tamarindo_Centro_Julio_2017.pdf	05/09/2017
520	Sábana Tamarindo Centro Junio 2017	Sábana_Tamarindo_Centro_Junio_2017.pdf	04/08/2017
521	Sábana Tamarindo Centro Junio 2018	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
522	Sábana Tamarindo Centro Marzo 2018	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_MARZO.pdf	04/05/2018
523	Sábana Tamarindo Centro Mayo 2018	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_MAYO_2018.pdf	03/07/2018
524	Sábana Tamarindo Centro Noviembre 2017	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
525	Sábana Tamarindo Centro Octubre 2017	SABANA_TAMARINDO_CENTRO_OCTUBRE_2017.pdf	05/12/2017
526	Sábana Tamarindo Centro Septiembre 2017	Sábana_Septiembre_2017_TAMARINDO_CENTRO.pdf	01/11/2017
527	Sábana Unidos Venceremos Abril 2018	SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
528	Sábana Unidos Venceremos Junio 2018	SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_JUNIO_2018.pdf	03/08/2018
529	Sábana Unidos Venceremos Marzo 2018	SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_MARZO.pdf	04/05/2018
530	Sábana Unidos Venceremos Mayo 2018	SABANA_UNIDOS_VENCEREMOS_MAYO_2018.pdf	03/07/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600
Rodas Andrade, Daniel Enrique	Lider del Proyecto	Analista de Infraestructura Distrital 1	drodas@mtop.gob.ec	
Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	Administrador	Miembro de Equipo del Azuay	otintin@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
36750_1.jpg	03/08/2018
