

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 6**  
**Dirección Provincial Cañar**

**PROYECTO: K023 MTOP-Mantenimiento Vial de la Provincia del Cañar**

Líder del Proyecto:	Dután Sanango, Italo Medardo (imдутан@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, Provincia - Cañar, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Dután Sanango, Italo Medardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3657	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,621,399.05
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	05/11/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Dután Sanango, Italo Medardo	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2018

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCION:**

MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR

EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA MTOP

SERVICIO: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las poblaciones que se encuentran en las vías que se dan mantenimiento vial permanente.

LINEA BASE: A lo largo del proyecto, Las viviendas están concentradas en las cercanías de los centros comunales y otras dispersas. Para la construcción de las viviendas se usa principalmente el cemento, ladrillo, bloque, techos de eternit, ardex, teja vidriada de fibra plástica. Las casas son de variados modelos y colores, en algunos casos modelos adoptados de las ciudades con espacios de parqueaderos, corredores amplios.

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la capacidad de circulación en la vía, imagen y seguridad, de las poblaciones que se encuentran en la vía con la dotación de infraestructura vial en buen estado.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

- 1.1 Limpieza de cunetas.
- 1.2 Limpieza de bordillos
- 1.3 Limpieza de Alcantarillas
- 1.4 limpieza de derrumbes.
- 1.5 Bacheo Asfáltico.
- 1.6 Estabilización de sitios críticos.

**MICROEMPRESAS:**

- Cantera Chauca
- Matapin
- Zhoray

**Beneficios Cualitativos**

Mediante el mantenimiento vial se reduce el costo del transporte, los tiempos de traslado, se extiende el tiempo de vida útil de la vía y se brinda seguridad al conductor y peaton.

**Tipo de Beneficiario**

Comerciantes  
Agricultores  
Sector Turístico  
Población en general


**Restricciones**

Tiempo: El plazo para el mantenimiento es anual.  
Costo: El valor total para el mantenimiento es aproximadamente de USD \$500.000,00 por año.  
Alcance Se espera contar con la red vial estatal de la provincia del Cañar en condiciones óptimas para el Tránsito vehicular y peatonal.  
Recursos: Personal y maquinaria del MTOP- Cañar, así como contratación de Asociación de Microempresarios.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 98.47 %  
Fecha de Inicio: 01/01/2014      Fecha de Fin: 31/12/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

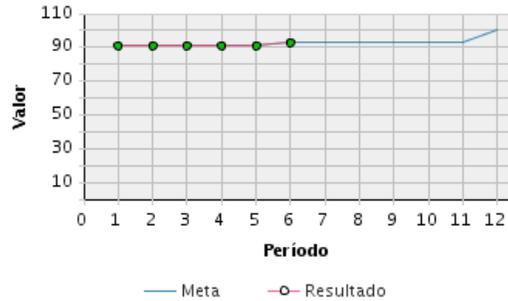

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	91 %	91 %	91 %	91 %	91 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	100 %
	Avance real acumulado											
	91 %	91 %	91 %	91 %	91 %	93 %						
2018	Estado											
	●	●	●	●	●	●						

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2018</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; Y Zhud - Río Angas.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/11/2018 - 04:09 PM
<p>SEPTIEMBRE 2018</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/10/2018 - 12:31 PM
<p>AGOSTO 2018</p> <p>Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.</p>	Buestan Toral, José Remigio	05/09/2018 - 05:30 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JULIO 2018</b></p> <p>Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	03/08/2018 - 10:45 AM
<p><b>JUNIO 2018</b></p> <p>Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/07/2018 - 12:31 PM
<p><b>Mayo2018</b></p> <p>Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/06/2018 - 04:46 PM
<p><b>Abril 2018</b></p> <p>Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 4 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/05/2018 - 02:08 PM
<p><b>Marzo 2018</b></p> <p>Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 4 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/04/2018 - 04:18 PM
<p><b>Febrero 2018</b></p> <p>Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Descanso - Azogues, y Troncal - Puerto Inca. No se ha logrado contratar a las microempresas por falta de aprobación del aval para el servicio de voluntariado.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:52 AM
<p><b>ENERO 2018</b></p> <p>Se realiza mantenimiento de la vía matrama - Mazar por administración directa, puesto que no se ha podido contratar a las microempresas.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:50 AM
<p><b>DICIEMBRE 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, con el propósito de mantener la vía en condiciones de transitabilidad confiable para los usuarios.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/01/2018 - 04:48 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, con el propósito de mantener la vía en condiciones de transitabilidad confiable para los usuarios.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/12/2017 - 04:15 PM
<p><b>OCTUBRE 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 11:48 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
y roza a mano. Además se coloca tachas en la vía Azogues - Matrama con la ayuda de los microempresarios.		
SEPTIEMBRE 2017  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/10/2017 - 03:38 PM
AGOSTO 2017  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/09/2017 - 05:53 PM
JULIO 2017  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano	García González, Mariana Alexandra	05/08/2017 - 09:29 AM
JUNIO 2017  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante la limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal.. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano.	García González, Mariana Alexandra	05/07/2017 - 10:29 AM
MAYO 2017  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal.. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar con tres microempresas de conservación vial contratadas	Guillen Luna, Andrés Ismael	01/06/2017 - 11:28 AM
ABRIL 2017  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal.. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar con tres microempresas de conservación vial contratadas	García González, Mariana Alexandra	05/05/2017 - 12:37 PM
MARZO 2017  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 02:13 PM
FEBRERO 2017  Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 02:12 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>FEBRERO 2017</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.</p>	<p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p>	<p>05/03/2017 - 01:35 PM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2016</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes y bacheo en la carretera Matrama-Mazar, en la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana) Y en la carretera Zhud-Biblián se encuentran realizando limpieza de cunetas, bordillos y roza a mano</p>	<p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p>	<p>05/01/2017 - 07:03 PM</p>
<p><b>NOVIEMBRE 2016</b></p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes y bacheo en la carretera Matrama-Mazar, en la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana) Y en la carretera Zhud-Biblián se encuentran realizando limpieza de cunetas, bordillos y roza a mano</p>	<p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p>	<p>05/12/2016 - 03:07 PM</p>
<p><b>OCTUBRE 2016</b></p> <p>los contratos de las microempresas culmino por falta de recursos . Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazary la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana)</p>	<p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p>	<p>05/11/2016 - 06:33 PM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2016</b></p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de alcantarillas desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p>	<p>04/10/2016 - 07:46 PM</p>
<p><b>AGOSTO 2016:</b></p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de alcantarillas desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>01/09/2016 - 07:51 AM</p>
<p><b>JULIO 2016:</b></p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 5+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>04/08/2016 - 12:30 PM</p>
<p><b>JUNIO 2016:</b></p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 10+000 al 19+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>04/07/2016 - 02:32 PM</p>
<p><b>MAYO 2016:</b></p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>05/06/2016 - 08:12 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 30+000 al Km 60+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/05/2016 - 07:43 AM
<p>MARZO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 00+000 al Km 30+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/04/2016 - 09:32 PM
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 30+000 al Km 50+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/03/2016 - 05:26 PM
<p>ENERO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 20+000 al Km 50+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2016 - 10:45 AM
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 30+000 al Km 69+000 de la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2016 - 07:38 AM
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 30+000 al Km 69+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/12/2015 - 10:21 AM
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP continua con la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/11/2015 - 10:25 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP continua con la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/10/2015 - 04:22 PM
<p>AGOSTO 2015</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2015 - 10:24 AM
<p>JULIO 2015</p> <p>Por la fuerte temporada invernal En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de derrumbes y alcantarillas con personal y maquinaria del MTOP Km 30 +000 al 69+000..</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2015 - 09:28 PM
<p>JUNIO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños desde el Km 40 +000 al 69+000..</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/07/2015 - 03:42 PM
<p>MAYO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/06/2015 - 02:17 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 10+000 al 19+000.		
<p>ABRIL 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños.</p> <p>En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 00+000 al 10+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/05/2015 - 07:48 AM
<p>MARZO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños.</p> <p>En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 10+000 al 19+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2015 - 03:35 PM
<p>FEBRERO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos.</p> <p>E la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/03/2015 - 09:41 AM
<p>ENERO 2014</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y limpieza del derecho de via.</p> <p>en la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando el bacheo asfaltico desde el Km 6+000 al 19+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/02/2015 - 03:21 PM
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>Se esta realizando el bacheo asfaltico en la carretera Biblian-Azogues-Descanso, antigua panamericana, tambien la limioieza de cunetas y bordillos en la carretera Azogues-Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2015 - 11:49 AM
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar.</p> <p>Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos.</p> <p>Tambien se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos del tramo Azogues a Matrama.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/12/2014 - 03:21 PM
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar.</p> <p>Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos.</p> <p>Tambien se esta realizando la limpieza de derrumbes pequeños en el tramo comprendido entre el Km 50 + 000 al 60 +000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/11/2014 - 09:31 PM
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar.</p> <p>Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de derrumbes pequeños.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/10/2014 - 12:09 PM
<p>AGOSTO 2014</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar.</p> <p>Se esta restituyendo una alcantarilla en el sector de Buenos Aires en la carretera Matrama-Mazar</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2014 - 08:44 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JULIO 2014</b></p> <p>En la carretera Matrama-mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos, como tambien de derrumbes pequeños con personal y maquinaria del MTOP y la microempresa.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2014 - 10:39 PM
<p><b>JUNIO 2014</b></p> <p>En la carretera Matrama-mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos, como tambine de derrumbes pequeños.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	10/07/2014 - 08:31 AM
<p><b>MAYO 2014</b></p> <p>En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos y tambien alcantarillas. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos como tambien la limpieza de derrumbes pequeños.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	03/06/2014 - 02:34 PM
<p><b>ABRIL 2014</b></p> <p>En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos como tambien la limpieza de alcantarillas.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/05/2014 - 08:05 PM
<p><b>MARZO 2014</b></p> <p>En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando el sellado de fisuras. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos. Se esta limpiando alcantarillas con ayuda de la excavadora 320 en el sector de Buenos Aires.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2014 - 07:40 AM
<p><b>FEBRERO 2014</b></p> <p>En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando mla limpieza de cunetas, En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de Alcantarillas.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	28/02/2014 - 09:31 AM
<p><b>ENERO 2014</b></p> <p>En la carrtera Matrama-Mazar, en el tramo entre Buenos Aires y Rivera se esta realizando el bacheo con mezcla asfaltica.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2014 - 07:27 AM

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p><b>5- PROYECTO. Recursos.</b> Falta de recursos CAUSARÍA el retraso del mantenimiento de la vía</p>	05/04/2018	Ivan Patricio Chaca Álvarez	60 %	80	48	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar

**HITOS**

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera	3-Adjudicación	10/01/2014		10/01/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Azogues-Matrama-mazar para el 2014							
2	PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2014	3-Adjudicación	10/01/2014		10/01/2014		Sí	2.0
3	EJECUCION: Bacheo asfáltico realizado desde el Km 30+000 al 60+000 en la carretera Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	15/05/2014		15/05/2014		Sí	2.0
4	EJECUCION: Bacheo asfáltico realizado desde el Km 00+000 al 19+000 en la carretera Descanso-Biblian	5-Entregables Intermedios	15/06/2014		15/06/2014		Sí	2.0
5	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	15/07/2014		15/07/2014		Sí	2.0
6	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	15/07/2014		15/07/2014		Sí	2.0
7	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera Azogues-Matrama-Mazar Realizado	5-Entregables Intermedios	15/08/2014		15/08/2014		Sí	3.0
8	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera biblian-Azogues-Descanso Realizado	5-Entregables Intermedios	15/09/2014		15/09/2014		Sí	3.0
9	EJECUCION: Bacheo asfáltico realizado desde el Km 00+000 al 30+000 en la carretera Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	15/10/2014		15/10/2014		Sí	2.0
10	EJECUCION: Limpieza de derrumbes en la carretera matrama-mazar	5-Entregables Intermedios	15/11/2014		15/11/2014		Sí	3.0
11	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
12	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2015	3-Adjudicación	10/01/2015		10/01/2015		Sí	2.0
14	PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2015	3-Adjudicación	10/01/2015		10/01/2015		Sí	2.0
15	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 30+000 al 60+000 en la carretera Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	15/05/2015		15/05/2015		Sí	2.0
16	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 00+000 al 19+000 en la carretera Descanso-Biblian	5-Entregables Intermedios	15/06/2015		15/06/2015		Sí	2.0
17	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2015 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	15/07/2015		15/07/2015		Sí	3.0
18	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2015 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	15/07/2015		15/07/2015		Sí	4.0
19	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera Azogues-Matrama-Mazar Realizado	5-Entregables Intermedios	15/08/2015		15/08/2015		Sí	4.0
20	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera biblian-Azogues-Descanso Realizado	5-Entregables Intermedios	15/09/2015		15/09/2015		Sí	4.0
21	EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 00+000 al 30+000 en la carretera Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		15/10/2015		Sí	4.0
22	EJECUCION: Limpieza de derrumbes en la carretera matrama-mazar	5-Entregables Intermedios	15/11/2015		15/11/2015		Sí	4.0
23	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2015 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	4.0
24	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Julio a Diciembre del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP							
25	EJECUCION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2016	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		16/05/2016		Sí	2.0
26	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	19/07/2016		19/07/2016		Sí	2.0
27	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	19/07/2016		19/07/2016		Sí	2.0
28	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	2.0
29	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	2.0
30	EJECUCION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2017	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/02/2017		Sí	2.0
31	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de enero a junio 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	24/07/2017		31/12/2017		Sí	3.0
32	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	24/07/2017		31/12/2017		Sí	3.0
33	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	3.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP							
34	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	3.0
35	CIERRE: Terminación del proyecto, elaboracion de actas	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	1.0
36	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a junio 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	2.0
37	CIERRE: Terminación del proyecto, elaboracion de actas	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	1.0
38	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Diciembre del 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	2.0
39	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Troncal - Puerto Inca en el periodo de Enero a Diciembre del 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	2.0
40	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio - diciembre 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	2.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión Positiva: Limpieza de cunetas y bordillos	Quishpi Vélez, Luis Manuel	{PR} - Provincia - CAÑAR	31/08/2017
2	Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza y mantenimiento	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	20/07/2016
3	Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza en la vía.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/04/2016
4	Supervisión Positiva- Se realizan mantenimientos en diferentes vías	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/11/2015

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
5	Limpieza de cunetas y lastrado de las vías en las Parroquias	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/05/2015
6	Verificación de la terminación del Proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2015
7	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/10/2014
8	Mantenimiento vial, limpieza de derrumbes	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/05/2014

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Km de la Red Vial en buen estado	▼	96.88 %	0.8	0.775	01/01/2014	Octubre
2	Porcentaje de cumplimiento económico del cronograma	▼	96.88 %	0.8	0.775	01/01/2014	Octubre


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,621,399.05 **
Costo Total:	830,000.00
Total Devengado:	1,621,399.05
% Costo Total Devengado:	195.35 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 195.35 %

**Perfil Económico 2018**

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,628,872.00	0.00	0.00	<b>1,628,872.00</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	<b>2,401,029.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,401,029.99</b>
Ppto. Codificado	2,091,963.90	0.00	0.00	<b>2,091,963.90</b>
Ppto. Comprometido	1,643,552.68	0.00	0.00	<b>1,643,552.68</b>
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
<b>Programado a Devengar</b>	<b>1,704,274.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,704,274.25</b>
Ppto. Devengado	1,621,399.05	0.00	0.00	<b>1,621,399.05</b>
Pagado Real	1,576,194.53	0.00	0.00	<b>1,576,194.53</b>
Estimado a fin de año	* 1,621,399.05	0.00	0.00	<b>1,621,399.05</b>
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	82,875.20	0.00	0.00	<b>82,875.20</b>
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 95.14 %	0.00 %	0.00 %	<b>95.14 %</b>
<b>Ppto. Codificado 998</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ppto. Devengado 998</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* Ppto. Devengado

**OBJETIVOS ALINEADOS**

**Objetivos Operativos**

12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. (Mejorar e incrementar la señalización horizontal y vertical en toda RVE. Identificando puntos críticos)
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
15	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		Planilla_microempresa_Sageo_marzo_2017.pdf	05/05/2017
2		Planilla_microempresa_Matapin_marzo_2017.pdf	05/05/2017
3		Planilla_microempresa_Zhoray_marzo_2017.pdf	05/05/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
4		Orden_de_compra_La_Primavera_-_Septiembre.pdf	01/11/2017
5	A1-Informe sitop-mayo-05-micro-Matapin	Inf-sitop-mayo05--micro-Matapin.pdf	09/06/2015
6	A10-Inf-sitop-junio-2017	informe_ejecutivo_El_Descanso.pdf	05/07/2017
7	A11-Inf-sitop-junio-2017	Matrama_Mazar_tramo_1.pdf	05/07/2017
8	A12-Inf-sitop-junio-2017	Matrama_Mazar_tramo_2.pdf	05/07/2017
9	A13-Inf-sitop-junio-2017	Informe_Troncal_Puerto_Inca.pdf	05/07/2017
10	A2-Informe-sitop-mayo-05-micro-Zhoray	Inf-sitop-mayo-05-micro-Zhoray.pdf	09/06/2015
11	A3-Informe sitop-junio-05-micro-Sageo	Informe_sitop_junio-05_micro-Sageo.pdf	08/07/2015
12	A4-Informe sitop junio-05-micro-Matapin	Informe_sitop_junio-05_micro-Matapin.pdf	08/07/2015
13	A5-Informe-sitop-junio-05-micro-Zhoray	Informe_sitop_junio-05-micro-zhoray.pdf	08/07/2015
14	A6-Informe-sitop-micro-matapin-agos-05	Inf-sitop-matapin-agos-05.pdf	07/09/2015
15	A7-Inf-micro-sageo-junio-06	A7-Inf-micro-sageo-junio-06.pdf	04/07/2016
16	A8-Inf-sitop-julio-06-Matapin	A8-Inf-sitop-julio-06-Matapin.pdf	04/08/2016
17	A9-Inf-sitop-julio-06-Zhoray	A9-Inf-sitop-julio-06-Zhoray.pdf	04/08/2016
18	Acta de planilla 4	ACTA.pdf	05/07/2018
19	Acta de recepcion parcial Chontamarca	22348_Chontamarca_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf	05/11/2018
20	Acta de recepcion parcial Chontamarca septiembre	22348_Chontamarca_Acta_recepción_parcial_Septiembre_2018.pdf	05/11/2018
21	Acta de recepción definitiva	Acta_de_trabajos_microempresa_primavera.pdf	05/08/2017
22	Acta de recepción definitiva	Acta_de_trabajos_microempresa_primavera.pdf	05/08/2017
23	Acta de recepción microempresa AMERICAS	_actalas_americas.pdf	05/09/2018
24	Acta de recepción microempresa AMERICAS	21453_Américas_Pancho_Negro_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
25	Acta de recepción microempresa AMERICAS	21453_Américas_Pancho_Negro_Acta_recepción_parcial_Septiembre_2018.pdf	05/11/2018
26	Acta de recepción microempresa matapin	Acta_de_recepción_parcial_Matrama_mazar_T1.pdf	05/10/2017
27	Acta de recepción microempresa matapin	Acta_Microempresa_Matapin_-_Sep.pdf	01/11/2017
28	Acta de recepción microempresa matapin	19561_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf	05/12/2017
29	Acta de recepción microempresa matapin	19561_Acta_de_recepción_parcial_2.pdf	05/01/2018
30	Acta de recepción microempresa MATAPIN	acta_matapin.pdf	05/09/2018
31	Acta de recepción microempresa MATAPIN	21007_Acta_recepción_parcial_Matapin_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
32	Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN	_actanuevo_javin.pdf	05/09/2018
33	Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN	21450_Nuevo_Javin_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
34	Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN	21450_Nuevo_Javin_Acta_recepción_parcial_Septiembre_2018.pdf	05/11/2018
35	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	Acta_de_recepción_parcial_Troncal_P.Inca.pdf	05/10/2017
36	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	Acta_Microempresa_La_Primavera_-_Sep.pdf	01/11/2017
37	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	19558_-_Acta_Definitiva.pdf	05/12/2017
38	Acta de recepción microempresa Primavera	20489_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf	05/01/2018
39	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	acta_primavera.pdf	05/09/2018
40	Acta de recepción microempresa PRIMAVERA	21009_La_Primavera_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
41	Acta de recepción microempresa sageo	Acta_de_recepción_parcial_Descaso_Biblián.pdf	05/10/2017
42	Acta de recepción microempresa sageo	Acta_Microempresa_Sageo_-_Sep.pdf	01/11/2017
43	Acta de recepción microempresa sageo	19559_-_Acta_Definitiva.pdf	05/12/2017
44	Acta de recepción microempresa sageo	20488_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf	05/01/2018
45	Acta de recepción microempresa SAGEO	acta_sageo.pdf	05/09/2018
46	Acta de recepción microempresa SAGEO	21008_Acta_recepción_parcial_Sageo_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
47	Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO	acta_s@n_antonio_de_paguacay.pdf	05/09/2018
48	Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO	21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
49	Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO	21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_recepción_parcial_Septiembre_2018.pdf	05/11/2018
50	Acta de recepción microempresa zhoray	Acta_de_recepción_parcial_Matrama_Mazar_T2.pdf	05/10/2017
51	Acta de recepción microempresa zhoray	Acta_Microempresa_Zhoray_-_Sep.pdf	01/11/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
52	Acta de recepción microempresa zhoray	19562_-_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf	05/12/2017
53	Acta de recepción microempresa zhoray	19562_-_Acta_de_recepción_parcial_2.pdf	05/01/2018
54	Acta de recepción microempresa ZHORAY	acta_zhoray.pdf	05/09/2018
55	Acta de recepción microempresa ZHORAY	21006_Acta_recepción_Zhoray_Agosto_2018.pdf	05/10/2018
56	INFOMRE SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_ZHORAY.pdf	04/10/2016
57	INFOMRME SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_MATAPIN.pdf	04/10/2016
58	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	MICROEMPRESA_PRIMAVERA.pdf	05/09/2017
59	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESA_MATAPIN.pdf	05/09/2017
60	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVOMICROEMPRESA_SAGEO.pdf	05/09/2017
61	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVO_MICRO_ZHORAY.pdf	05/09/2017
62	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_ZHUD_-_CHILCHIL.pdf	03/08/2018
63	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_MATRAMA_MAZAR_T2.pdf	03/08/2018
64	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_TRONCAL_PUERTO_INCA.pdf	03/08/2018
65	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_EL_CHORRO-_EL_TRIUNFO.pdf	03/08/2018
66	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_CHILCHIL_-_EL_CHORRO.pdf	03/08/2018
67	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_MATRAMA_-_MAZAR_T1.pdf	03/08/2018
68	Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJECT_DESCANSO_-_AZOG-_BI.pdf	03/08/2018
69	Informe ejecutivo mes de junio 2018	Informe_ejecutivo_mantenimiento_Chorro_el_Triunfo.pdf	05/07/2018
70	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_ZHUD-COCHANCAY.pdf	05/07/2018
71	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_SAN_ANTONIO.pdf	05/07/2018
72	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_Primavera.pdf	05/07/2018
73	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_matrama_mazar_t2.pdf	05/07/2018
74	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_descanso.pdf	05/07/2018
75	Informe ejecutivo mes de junio 2018	informe_ejecutivo_matrama_mazar_T1.pdf	05/07/2018
76	Informe ejecutivo mes de Marzo 2018 Descanso Biblián	informe_ejecutivo_sageo.pdf	05/04/2018
77	Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Matrama Mazar 1	Informe_ejecutivo_matapin.pdf	05/04/2018
78	Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Matrama Mazar 2	Informe_ejecutivo_zhoray.pdf	05/04/2018
79	Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Troncal Puerto Inca	informe_ejecutivo_PRIMAVERA.pdf	05/04/2018
80	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	Informe_ejecutivo_Zhud_-_Chilchil.pdf	05/06/2018
81	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	Informe_ejecutivo_Chilchil_-_El_Chorro.pdf	05/06/2018
82	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	Informe_ejecutivo_El_Chorro_-_El_Triunfo.pdf	05/06/2018
83	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	Informe_ejecutivo_tramo_1.pdf	05/06/2018
84	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	informe_ejecutivo_Troncal_Puerto.pdf	05/06/2018
85	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	informe_ejecutivo_zhoray_tramo_2.pdf	05/06/2018
86	Informe ejecutivo mes de mayo 2018	informe_ejecutivo_Azogues_-_Descanso.pdf	05/06/2018
87	Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Mensual_Microempresa_La_Primavera_-_Sep.pdf	01/11/2017
88	Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Mensual_Microempresa_Matapin_-_Sep.pdf	01/11/2017
89	Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Mensual_Microempresa_Sageo_-_Sep.pdf	01/11/2017
90	Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Mensual_Microempresa_Zhoray_-_Sep.pdf	01/11/2017
91	Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Descanso Biblián	Informe_Ejecutivo_Sageo.pdf	05/10/2017
92	Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Matrama Mazar 1	Informe_ejecutivo_Matapin.pdf	05/10/2017
93	Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Matrama Mazar 2	Informe_ejecutivo_Zhoray.pdf	05/10/2017
94	Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Troncal Puerto Inca	Informe_Ejecutivo_Primavera.pdf	05/10/2017
95	informe sitop matapin octubre	microempresa_matapin.pdf	05/11/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
96	informe sitop octubre sageo	miroempresa_sageo.pdf	05/11/2016
97	INFORME SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_SAGEO.pdf	04/10/2016
98	Informe-sitop-micro-sageo-agos-05	Inf-sitop-sageo-agos-05.pdf	07/09/2015
99	informese sitop octubre zhoray	miroempresa_zhoray.pdf	05/11/2016
100	Orden de Compra Microempresa Matapin	19561_Orden_de_compra.pdf	05/12/2017
101	Planilla mes de junio de 2017 Troncal Puerto Inca	PLANILLA_MICROEMPRESA_PRIMAVERA.pdf	05/07/2017
102	Planilla mes de mayo de 2017 Tramo 1	PLANILLA_MICROEMPRESA_MATAPIN.pdf	05/07/2017
103	Planilla mes de mayo de 2017 Tramo 2	PLANILLA_MICROEMPRESA_ZHORAY.pdf	05/07/2017
104	Planilla mes de mayo el Descanso	PLANILLA_MICROEMPRESA_SAGEO.pdf	05/07/2017

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Chaca Álvarez, Ivan Patricio	Titular	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	ichaca@mtop.gob.ec	023974600
Chaca Álvarez, Ivan Patricio	Lider de Proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	ichaca@mtop.gob.ec	023974600
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
75724_1.jpg	05/04/2018
