

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6

Dirección Provincial Morona Santiago

PROYECTO: K043 MTOP- Mantenimiento Vial de la Provincia de Morona Santiago

Líder del Proyecto:	Tipan Guañuna, Jairo Fernando (jtipan@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, Provincia - Morona Santiago
Titular:	Saavedra Correa, Jose Luis	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3661	TIR:	20.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,884,092.90
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2012 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	05/11/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2018

DATOS GENERALES

Descripción

La realización del Manteamiento de las vías que se encuentran a cargo del MTOP en la Provincia de Morona Santiago.

Contratista: Varios contratos con diferentes contratistas, como Microempresas, etc.

Microempresas: 21 de Marzo, Valle del río, Esperanzas del futuro, Luchando por el Futura, Brisas del Sangay, Brisas del Upano,

Objetivo: Mejorar el nivel de servicio del usuario, integrando zonas productivas agrícolas, ganaderas, turísticas y mineras, implementando mano de obra directa e indirecta, servicio directo a las poblaciones de las Provincias del Azuay, Morona y el resto del país.

Linea base.- proyecto se encuentra a nivel de carpeta asfáltica con cunetas revestidas, con señalización horizontal y vertical.

monto mantenimiento año 2012\$ 4.408.599,39
 monto mantenimiento año 2013\$ 1.287.429,58
 monto mantenimiento año 2014\$ 924.557,59
 monto mantenimiento año 2015\$ 3.058.380,48
 monto mantenimiento año 2016\$ 2.000.000,00
 Valor Total \$ 11.678.967,04

Beneficios Cualitativos

Realizando el Mantenimiento se tiene las vías en buenas condiciones, lo que mejora el Comercio, la fácil salida de los productos agrícolas y ganaderos, se incrementa el Turismo tanto nacional como internacional. Es decir, mejorar el nivel de servicio, seguridad vial y costo de viaje.

Tipo de Beneficiario

Directos:
 Indirectos:
 Población de la Provincia de Morona Santiago y Provincia aledañas


Restricciones

Tiempo: la fecha limite para culmiar las obras es el 31 de Diciembre de 2014

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.88 %
 Fecha de Inicio: 01/03/2012 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

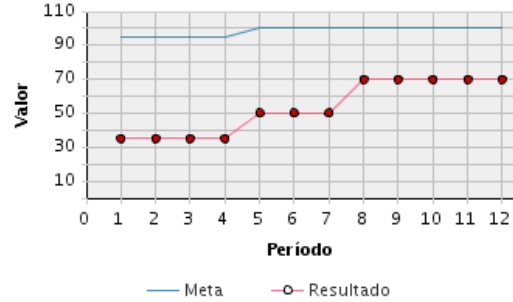

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	35 %	35 %	35 %	35 %	50 %	50 %	50 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
(HITO ASOCIADO 9) OCTUBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/11/2018 - 04:01 PM
(HITO ASOCIADO 9) SEPTIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/10/2018 - 01:28 PM
(HITO ASOCIADO 9) AGOSTO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/09/2018 - 11:58 AM
HITO ASOCIADO 9) JULIO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/08/2018 - 02:58 PM
HITO ASOCIADO 9) JUNIO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos	Idrovo Aguirre, Romeo Alexander	06/07/2018 - 07:25 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc</p>		
<p>MAYO 2018. Con fecha 28 de mayo de 2018, se analizo y aprobó los avales de servicio de voluntariado, se inicio con el proceso para la contratación, mientras tanto el mes de mayo hubieron fuertes precipitaciones a lo largo de la RVE, los mismos que provocaron el cierre parcial en algunos tramos, se trabajo con maquinaria por administración directa y con colaboración de la empresa privada se despejo las vías, además existió el apoyo de maquinarias de otras Direcciones Distritales.</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>05/06/2018 - 09:52 AM</p>
<p>HITO ASOCIADO 9) ABRIL 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>04/05/2018 - 03:07 PM</p>
<p>(HITO ASOCIADO 9) MARZO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>04/04/2018 - 04:14 PM</p>
<p>(HITO ASOCIADO 9) FEBRERO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>20/03/2018 - 02:34 PM</p>
<p>(HITO ASOCIADO 9) ENERO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>20/03/2018 - 02:33 PM</p>
<p>(HITO ASOCIADO 9) DICIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>04/01/2018 - 04:45 PM</p>
<p>(HITO ASOCIADO 9) NOVIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>06/12/2017 - 11:06 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
(HITO ASOCIADO 9) OCTURE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	01/11/2017 - 03:42 PM
SEPTIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/10/2017 - 11:46 AM
AGOSTO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	06/09/2017 - 04:08 PM
JULIO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	04/08/2017 - 12:18 PM
JUNIO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	04/07/2017 - 03:20 PM
MAYO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	05/06/2017 - 04:57 PM
ABRIL 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	03/05/2017 - 02:42 PM
MARZO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	05/04/2017 - 09:58 AM
FEBRERO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., ha realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se	Saavedra Correa, Jose Luis	07/03/2017 - 12:25 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.		
ENERO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Saavedra Correa, Jose Luis	07/02/2017 - 09:26 AM
DICIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco - Kalaglas, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Saavedra Correa, Jose Luis	05/01/2017 - 05:33 PM
NOVIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco - Kalaglas, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Arias Castro, Franklin	02/12/2016 - 12:25 PM
OCTUBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP MS., en este periodo ha realizado labores de mantenimiento rutinario especialmente en los rubros limpieza y estabilización de taludes, limpieza de drenaje, señalización, roza a mano y bacheo menor y mayor de la calzada, especialmente con contratos de microempresas, y por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital, dandose énfasis y prioridad al paso de la vía Cebadas - 09 de Octubre km. 49+000, vía Mendez Morona y Bella Unión - Limón, además se ha tenido el aporte de maquinaria de otras Direcciones Provinciales para afrontar sectores críticos y evitar que se suspenda el tráfico vehicular.	Arias Castro, Franklin	01/11/2016 - 11:15 AM
SEPTIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP MS., en este periodo ha realizado labores de mantenimiento rutinario especialmente en los rubros limpieza y estabilización de taludes, limpieza de drenaje, señalización, roza a mano y bacheo menor y mayor de la calzada, especialmente con contratos de microempresas, y por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital, dandose énfasis y prioridad al paso de la vía Cebadas - 09 de Octubre km. 49+000, vía Mendez Morona y Bella Unión - Limón.	Arias Castro, Franklin	04/10/2016 - 10:35 AM
AGOSTO 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a trabajado con microempresas de acuerdo a orden de compra en la red vial estatal, además se a ejecutado trabajos por administración directa en sitios críticos para habilitar el paso vehicular debido a derrumbes por desestabilización de taludes, se debe informar que toda la red estatal de la provincia se encuentra a cargo de la Dirección Distrital de Morona Santiago a excepción de la carretera Sigsig - Matanga - Gualaquiza que se encuentra en construcción y cargo de la Cia. Sinohydro, es necesario repotenciar la maquinaria para cubrir el mantenimiento rutinario de toda la red vial	Arias Castro, Franklin	06/09/2016 - 04:20 PM
JULIO 2016.- La Dirección Distrital de Morona Santiago ha realizado el mantenimiento por administración directa, con microempresas, y con las Cias. Contratistas dando prioridad a las siguientes vías: Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Bella Unión, Macas 09 de octubre, Cebadas 09 de octubre, Méndez Morona, Sigsig - Gualaquiza; Méndez Guarumales.	Arias Castro, Franklin	05/08/2016 - 03:15 PM
JUNIO 2016.- Se ha realizado mantenimiento rutinario de la provincia con el siguiente detalle: vía Plan de Milagro - Limón a cargo de la Cia. Hidrobo Estrada, Méndez - Morona a cargo de la Cia. Fopeco, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral a cargo de la Cia. Fopeco, Plan de Milagro - San Juan Bosco a cargo de la microempresa Transformando Vías, Sucua Logroño - Bella Unión Tramo Sucua - Logroño a cargo de la microempresa Brisas del Upano, Tramo Logroño Méndez a cargo de la microempresa Esperanza del Futuro, Bella Unión - Limón; Bella Unión - Cumtza, a cargo de la microempresa Luchando por el futuro, San Juan Bosco - Gualaquiza, a cargo del MTOP M.S., Macas - Puente Pastaza a cargo del MTOP M.S., Cebadas 09 de octubre a cargo del MTOP M.S., Sigsig - Matanga - Gualaquiza a cargo de la Cia. Sinohydro	Arias Castro, Franklin	05/07/2016 - 12:50 PM
MAYO 2016.- Maquinaria de la Dirección Distrital del MTOP M.S., se encuentra realizando mantenimiento a las siguientes vías: Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza; Bella Unión - Cumtza - Limón, Cebadas - 09 de octubre, además la Cia. Hidrobo Estrada pro medio de contrato vigente se encuentra ejecutando mantenimiento rutinario de la vía Plan de Milagro - Limón, Cia Fopeco de las vías Mendez - Morona, 09 de octubre - Macas y Paso Lateral, vía Mendez - Guarumales, además por medio de orden de trabajo se contrato trabajos de conservación vial	Arias Castro, Franklin	03/06/2016 - 11:06 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
con la Asociación Brisas del Upano, tramo Sucua - Logroño, con fecha 12 de mayo de 2016, se adjunta respaldo.		
ABRIL 2016.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., debido a la fuerte estación imperante en la red vial estatal ha priorizado los trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, especialmente en la vía 9 de Octubre -Cebadas, Bella Unión - Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco, además la Cia. Fopeca ha realizado el mantenimiento de la vía, Macas - 9 de octubre y Paso Lateral, Méndez - San José de Morona, lograndose habilitar el tráfico vehicular de manera oportuna	Arias Castro, Franklin	04/05/2016 - 12:04 PM
MARZO 2016.- Los trabajos de mantenimiento rutinario se han realizado con los Contratistas Fopeca e Hidrobo Estrada por medio de contratos vigentes, en el mantenimiento rutinario por administración directa estamos trabajando en la vía Bella Unión - Limón y Cebadas 9 de octubre y Plan de Milagro - Gualaquiza, donde se han producido deslizamientos de taludes, taponamiento de vías, por lo que se a priorizado algunos sectores procediendo a la limpieza de materiales y habilitación al tráfico vehicular	Arias Castro, Franklin	04/04/2016 - 02:32 PM
FEBRERO 2016.- Los trabajos de mantenimiento rutinario se han realizado con los Contratistas Fopeca e Hidrobo Estrada por medio de contratos vigentes, en el mantenimiento rutinario por administración directa estamos trabajando en la vía Bella Unión -- Limón y Cebadas 9 de octubre, donde se han producido deslizamientos de taludes, taponamiento de vías, por lo que se a priorizado algunos sectores procediendo a la limpieza de materiales.	Arias Castro, Franklin	02/03/2016 - 11:44 AM
ENERO 2016.- Las empresas contratistas Cia. Hidrobo Estrada, Fopeca estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa, situación que deberá definirse en el mes de febrero 2016, a fin de poder programar los indicadores de cumplimiento para este año, se adjuntan documentos de respaldo	Arias Castro, Franklin	04/02/2016 - 03:46 PM
DICIEMBRE 2015.- Las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeca estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa, situación que deberá definirse en el mes de enero a fin de poder programar los indicadores de cumplimiento para este año	Arias Castro, Franklin	05/01/2016 - 02:53 PM
NOVIEMBRE 2015.- Las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeca estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa	Arias Castro, Franklin	02/12/2015 - 02:40 PM
OCTUBRE 2015.- Autoridades Superiores del MTOP deberán pronunciarse y darles disposiciones referente a la remediación de fallas geologicas, a la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeca estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas	Arias Castro, Franklin	04/11/2015 - 03:35 PM
SEPTIEMBRE 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red via l estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos economicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeca estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a	Arias Castro, Franklin	07/10/2015 - 08:31 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos económicos para contratar microempresas</p>		
<p>AGOSTO 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red vía I estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos económicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos económicos para contratar microempresas</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>01/09/2015 - 10:15 AM</p>
<p>JULIO 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red vía I estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos económicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>12/08/2015 - 11:51 AM</p>
<p>JUNIO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015, estos trabajos deberán ser de manera permanente sin interrupciones.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>08/07/2015 - 11:28 AM</p>
<p>Mayo 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015, estos trabajos deberán ser de manera permanente sin interrupciones.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>04/06/2015 - 04:13 PM</p>
<p>Abril 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>06/05/2015 - 03:51 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>06/04/2015 - 03:29 PM</p>
<p>FEBRERO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>05/03/2015 - 10:49 AM</p>
<p>ENERO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>05/03/2015 - 10:49 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas se han cumplido totalmente el periodo 2014, no ha si con las contratistas que deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa se ha cumplido con lo programado en el año 2014.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>07/01/2015 - 10:41 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>02/12/2014 - 02:23 PM</p>
<p>OCTUBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>07/11/2014 - 11:33 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Foepca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.		
SEPTIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S, trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Foepca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.	Arias Castro, Franklin	03/10/2014 - 10:01 AM
AGOSTO 2014.- Se trabaja con 7 microempresas de conservación vial en el mantenimiento de la red vial troncal amazonica E45 desde Puente Pastaza hasta Llmón, además existen microempresas de conservación vial a cargo de la Cia Foepca 9 de octubre - Macas y Paso lateral de Macas y la Carretera Méndez - San José, realizandose los siguientes trabajos: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, roza a mano, sello de fisuras, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, arreglo de sectores de hundimientos y asentamientos además se trabaja con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago en los tramos: Sucua - Limón y Plan de Milagro - San Juan Bosco, limpieza de derrumbes, colocación de material en asentamientos, hundimientos, sello de fisuras y nivelación de hundimientos con material asfáltico.	Arias Castro, Franklin	02/09/2014 - 03:58 PM
JULIO 2014.- Se encuentra ejecutando mantenimiento vial limpieza de alcantarillas, limpieza de drenaje, derrumbes a mano, desde el Puente Pastaza hasta Limón. con 6 microempresas, además se encuentra ejecutando mantenimiento rutinario por administración directa en el tramo Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco y Gualaquiza Chiguinda, especialmente en el rubro limpieza de derrumbes y reconfiguración de rasante existente.	Arias Castro, Franklin	05/08/2014 - 11:39 AM
JUNIO 2014.- Las Microempresas continuan trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la via troncal amazonica Puente Pastaza - Macas - Limón, además también se encuentra trabajando la maquinaria del MTOP M.S., en el mantenimiento de la carretera Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza; Tramo Plan de Milagro - San Juan Bosco y Carretera Sigsig - Matanga - Gualaquiza; Tramo: El Ideal - La Pradera.	Arias Castro, Franklin	01/08/2014 - 10:08 AM
MAYO 2014.- Las Microempresas continuan trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la via troncal amazonica Puente Pastaza - Macas - Limón	Arias Castro, Franklin	04/06/2014 - 09:43 AM
ABRIL 2014.- Microempresas se encuentran trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la via troncal amazonica Puente Pastaza - Macas - Limón	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:03 PM
MARZO 2014.- La Dirección Provincial se encuentra realizando los tramites para el proceso de contratación en el portal de compras publicas en el mantenimiento rutinario	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:02 PM
FEBRERO 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá iniciar el proceso para la contratación de las microempresas a nivel provincial.	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:01 PM
ENERO 2014: Trabajos de mantenimiento rutinario con microempresas, estan suspendidos hasta efectuar el proceso de contratación para el año 2014.	Arias Castro, Franklin	18/02/2014 - 01:35 PM
DICIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	06/01/2014 - 09:21 AM
NOVIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	01/12/2013 - 03:14 PM
OCTUBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	01/12/2013 - 03:14 PM
SEPTIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/11/2013 - 09:49 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	02/10/2013 - 07:09 AM
JULIO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/09/2013 - 07:33 AM
JUNIO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	29/06/2013 - 03:20 PM
MAYO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	29/06/2013 - 03:20 PM
ABRIL 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	28/05/2013 - 02:39 PM
MARZO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	04/05/2013 - 08:30 AM
FEBRERO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:05 PM
ENERO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM
DICIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM
NOVIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM
OCTUBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	02/12/2012 - 10:06 AM
SEPTIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre		
AGOSTO 2012.- Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre		
JULIO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento		
JUNIO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento		
MAYO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento		
ABRIL 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento		
MARZO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento		
FEBRERO 2012.-Se ha iniciado con varios trabajos de mantenimiento como la Señalización Vertical y Horizontal en varios tramos de las vías de la Provincia de Morona Santiago, Microempresas para realizar mantenimiento rutinario,		
ENERO 2012.-Se han considerado varios Proyectos de Mantenimiento dentro de la Provincia		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Requerimiento equipo caminero	05/11/2018	Jairo Fernando Tipan Guañuna	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 8, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. El fuerte temporada invernal CAUSARÍA el retaraso de la obra	05/11/2018	Jairo Fernando Tipan Guañuna	30 %	10	3	0/1

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Inicio Mantenimiento vial con empresas constructoras ejecutado	4-Inicio de Trabajo	02/01/2015		02/01/2015		Sí	5.0
2	EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento rutinario por administración directa, limpieza de derrumbes, ejecutado 10%	4-Inicio de Trabajo	05/01/2015		05/01/2015		Sí	15.0
3	EJECUCIÓN: Mantenimiento Vial por administración directa, limpieza de derrumbes, ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	02/06/2015		02/06/2015		Sí	10.0
4	EJECUCIÓN: Contratos con Microempresas de mantenimiento rutinario ejecutado	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/05/2016		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Mantenimiento por administracion directa , limpieza de derrumbes ejecutado 60%	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario con Microempresas contrato legalizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		16/05/2016		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario roza a mano con microempresas ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	01/09/2015		31/08/2016		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario limpieza de drenajes con microempresa ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		31/08/2016		Sí	10.0
9	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario roza a mano, con microempresas ejecutado 100%	5-Entregables Intermedios	30/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
10	EJECUCIÓN: Culminación trabajos mantenimiento rutinario por administración directa concluido	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2017		Sí	10.0
11	EJECUCIÓN: Limpieza del Campamento Patuca ejecutado	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial con microempresas, drenaje ejecutado 100%	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
13	CIERRE: Culminación contratos con microempresas de mantenimiento rutinario concluido	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2016	31/12/2018			No	2.5
14	COMPLETADO: informe de mantenimientos rutinarios aprobado	9-Entregables Formales	30/05/2016	31/12/2018			No	2.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión positiva se pudo verificar los trabajos de mantenimiento	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	16/03/2016
2	Supervisión positiva del mantenimiento vial en el via del sector del Rosario a General Plaza en Limón Indanza	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	19/10/2015
3	Supervisión negativa de la ejecución de proyecto de acuerdo al hito 3 de Mantenimiento Vial por administración directa programado	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	17/07/2015
4	Historico - Existen inconvenientes en el mantenimiento de la vía, en el tramo Bella Unión # Cumtza, por falta de equipo caminero.	Arcos Tuitza, Juan Rafael	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	02/05/2012
5	Historico - El Ministerio ha procedido a contratar los servicios de conservación vial de la Troncal Amazónica, los mismos que mantienen un buen nivel de servicio.	Arcos Tuitza, Juan Rafael	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	30/03/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Estatal en Buen Estado		69.02 %	100	69.02	01/01/2012	Oct-Dic


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,503,690.11
Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,884,092.90 **
Costo Total:	11,678,967.04
Total Devengado:	9,247,827.62
% Costo Total Devengado:	79.18 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 79.18 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	4,864,000.00	0.00	3,681,508.00	8,545,508.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	6,964,154.63	759,181.84	11,543,956.24	19,267,292.71
Ppto. Codificado	6,051,547.67	666,152.72	12,385,654.04	19,103,354.43
Ppto. Comprometido	1,478,115.80	361,620.11	3,884,098.91	5,723,834.82
Planeado - Codificado (2016)		-666,152.72		
Programado a Devengar	6,121,254.63	271,553.65	1,237,817.21	7,630,625.49
Ppto. Devengado	5,931,031.25	361,620.04	2,955,176.33	9,247,827.62
Pagado Real	1,344,693.09	361,620.04	2,753,090.17	4,459,403.30
Estimado a fin de año	* 5,931,031.25	0.00	0.00	5,931,031.25
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	190,223.38	271,553.65	1,237,817.21	1,699,594.24
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 96.89 %	133.17 %	238.74 %	121.19 %
Ppto. Codificado 998	104,574.36	0.00	235,379.01	339,953.37
Ppto. Devengado 998	104,574.36	0.00	186,241.99	290,816.35

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

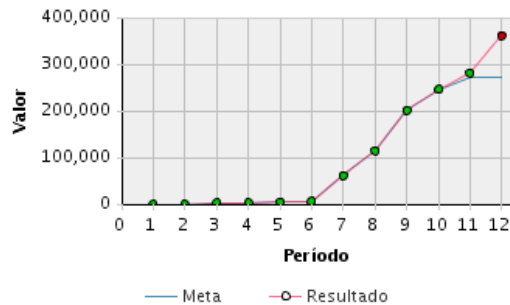

Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	2,667.98	2,667.98	2,667.98	2,667.98	100.00 %		0.98 %
Abr	439.82	439.82	3,107.80	3,107.80	100.00 %		1.14 %
May	1,516.72	1,516.72	4,624.52	4,624.52	100.00 %		1.70 %
Jun	2,006.15	2,006.15	6,630.67	6,630.67	100.00 %		2.44 %
Jul	53,955.84	53,955.84	60,586.51	60,586.51	100.00 %		22.31 %
Ago	54,376.32	54,376.32	114,962.83	114,962.83	100.00 %		42.34 %
Sep	85,348.73	85,348.73	200,311.56	200,311.56	100.00 %		73.77 %
Oct	45,505.06	45,505.06	245,816.62	245,816.62	100.00 %		90.52 %
Nov	25,737.03	34,587.95	271,553.65	280,404.57	103.26 %		103.26 %
Dic	0.00	81,215.47	271,553.65	361,620.04	133.17 %		133.17 %
Total	271,553.65	361,620.04					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	16 DE ABRIL - KALAGLAS	W.5.pdf	05/08/2016
2	1_Informe de cumplimiento_Mantenimiento Vial	1_Informe_de_cumplimiento_Mantenimiento_Vial.pdf	23/01/2018
3	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL UPANO	T.2.pdf	06/05/2015
4	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18637_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(9_DE_OCTUBRE).pdf	04/01/2018
5	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18639_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(21_MARZO).pdf	04/01/2018
6	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18640_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(BRISAS_SANGAY).pdf	06/05/2018
7	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18641_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(BRISAS_UPANO).pdf	06/05/2018
8	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18643_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(ESPERANZAS_FUTURO).pdf	04/01/2018
9	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18644_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(HEROES_AMAZONIA).pdf	04/01/2018
10	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18659_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(RIO_BLANCO).pdf	04/01/2018
11	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 21 DE MARZO	G.6.pdf	06/05/2014
12	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL SANGAY	G.7.pdf	06/05/2014
13	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL SANGAY	T.1.pdf	06/05/2015
14	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL UPANO	G.8.pdf	06/05/2014
15	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CHIGUINDA MATANGA	G.9.pdf	06/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA ESPERANZAS DEL FUTURO	T.3.pdf	06/05/2015
17	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LA ESPERANZA	H.1.pdf	06/05/2014
18	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LAS 3 CHORRERAS	H.2.pdf	06/05/2014
19	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LUCHANDO POR EL FUTURO	H.3.pdf	06/05/2014
20	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LUCHANDO POR EL FUTURO	T.4.pdf	06/05/2015
21	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA TRES DE OCTUBRE	T.5.pdf	06/05/2015
22	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA VALLE DEL RIO	H.4.pdf	06/05/2014
23	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA VALLE DEL RIO	T.6.pdf	06/05/2015
24	ACTA RECEPCIÓN DEFINITVA 21 DE MARZO	S.9.pdf	06/05/2015
25	certificacion_presupuestaria_microempresas	certificacion_presupuestaria_microempresas_201160802527007064812949.pdf	06/06/2015
26	CONTRATO COMPLEMENTARIO ING. JENRY MENDOZA	A.1.pdf	06/05/2014
27	CONTRATO MANTENIMIENTO 21 DE MARZO	A.5.pdf	06/05/2014
28	CONTRATO MANTENIMIENTO 21 DE MARZO 2014	I.2.pdf	07/05/2014
29	CONTRATO MANTENIMIENTO 3 DE OCTUBRE 2014	I.5.pdf	07/05/2014
30	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL SANGAY	A.6.pdf	06/05/2014
31	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL SANGAY 2014	I.1.pdf	07/05/2014
32	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL UPANO	A.9.pdf	06/05/2014
33	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL UPANO 2014	I.4.pdf	07/05/2014
34	CONTRATO MANTENIMIENTO ESPERANZA DEL FUTURO	A.4.pdf	06/05/2014
35	CONTRATO MANTENIMIENTO LA ESPERANZA	A.3.pdf	06/05/2014
36	CONTRATO MANTENIMIENTO LAS 3 CHORRERAS	A.8.pdf	06/05/2014
37	CONTRATO MANTENIMIENTO LUCHANDO POR EL FUTURO	A.2.pdf	06/05/2014
38	CONTRATO MANTENIMIENTO VALLE DEL RIO	A.7.pdf	06/05/2014
39	CONTRATO MANTENIMIENTO VALLE DEL RIO 2014	I.3.pdf	07/05/2014
40	FOTOS DE MANTENIMIENTO	S.9.doc	04/06/2015
41	FOTOS DE MANTENIMIENTO ENERO 2016	W.1.doc	04/02/2016
42	FOTOS DE TRABAJOS REALIZADOS	M.6.doc	06/10/2014
43	FOTOS DEL PROYECTO	T.8.doc	01/12/2015
44	FOTOS DEL PROYECTO	U.1.doc	01/12/2015
45	FOTOS HIDROBO ENERO 2016	W.2.PDF	04/02/2016
46	FOTOS MANTENIMIENTO DE LA VIA NOVIEMBRE 2014	O.3.doc	05/12/2014
47	FOTOS MANTENIMIENTO DE LA VIA OCTUBRE 2014	N.5.pdf	05/11/2014
48	FOTOS MANTENIMIENTO PROVINCIA	FOTOS_MANTENIMIENTO_PROVINCIA.pdf	05/07/2016
49	FOTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	J.8.pdf	31/07/2014
50	INFORME 074 C - Nov. 2015	U.2.doc	02/12/2015
51	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.1.pdf	06/05/2014
52	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.2.pdf	06/05/2014
53	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.3.pdf	06/05/2014
54	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.4.pdf	06/05/2014
55	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.5.pdf	06/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
56	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.6.pdf	06/05/2014
57	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.7.pdf	06/05/2014
58	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	I.7.pdf	07/05/2014
59	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	I.9.pdf	07/05/2014
60	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.2.pdf	07/05/2014
61	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.4.pdf	07/05/2014
62	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.6.pdf	07/05/2014
63	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	9_DE_OCTUBRE.pdf	04/05/2017
64	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	16_DE_ABRIL_-_KALAGLAS.pdf	04/05/2017
65	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	21_DE_MARZO.pdf	04/05/2017
66	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	04/05/2017
67	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	BRISAS_DEL_UPANO.pdf	04/05/2017
68	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	CASCADAS_DE_CUGUSHA.pdf	04/05/2017
69	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	ESPERANZA_DEL_FUTURO.pdf	04/05/2017
70	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	LOS_CEDROS.pdf	04/05/2017
71	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	04/05/2017
72	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	MIRADOR_SHAIME.pdf	04/05/2017
73	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	04/05/2017
74	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	TIWINTZA.pdf	04/05/2017
75	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	04/05/2017
76	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	18932.pdf	04/05/2018
77	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20556.pdf	04/05/2018
78	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20557.pdf	04/05/2018
79	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20558.pdf	04/05/2018
80	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20560.pdf	04/05/2018
81	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20561.pdf	04/05/2018
82	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20562.pdf	04/05/2018
83	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20563.pdf	04/05/2018
84	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20564.pdf	04/05/2018
85	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20565.pdf	04/05/2018
86	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20566.pdf	04/05/2018
87	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20567.pdf	04/05/2018
88	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20568.pdf	04/05/2018
89	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20559.pdf	04/05/2018
90	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20569.pdf	04/05/2018
91	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	B.8.pdf	06/05/2014
92	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	B.9.pdf	06/05/2014
93	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.1.pdf	06/05/2014
94	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.2.pdf	06/05/2014
95	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.3.pdf	06/05/2014
96	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.4.pdf	06/05/2014
97	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.5.pdf	06/05/2014
98	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.6.pdf	06/05/2014
99	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.7.pdf	03/09/2014
100	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.8.pdf	03/09/2014
101	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.9.pdf	03/09/2014
102	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.1.pdf	03/09/2014
103	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.2.pdf	03/09/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
104	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.3.pdf	03/09/2014
105	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.4.pdf	05/09/2014
106	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21489.pdf	04/09/2018
107	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21493.pdf	04/09/2018
108	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21494.pdf	04/09/2018
109	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21495.pdf	04/09/2018
110	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21498.pdf	04/09/2018
111	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21499.pdf	04/09/2018
112	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21500.pdf	04/09/2018
113	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21501.pdf	04/09/2018
114	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21502.pdf	04/09/2018
115	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21503.pdf	04/09/2018
116	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21504.pdf	04/09/2018
117	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21505.pdf	04/09/2018
118	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21507.pdf	04/09/2018
119	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21508.pdf	04/09/2018
120	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21509.pdf	04/09/2018
121	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21510.pdf	04/09/2018
122	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21512.pdf	04/09/2018
123	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21513.pdf	04/09/2018
124	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21514.pdf	04/09/2018
125	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21515.pdf	04/09/2018
126	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21545.pdf	04/09/2018
127	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21546.pdf	04/09/2018
128	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21560.pdf	04/09/2018
129	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	H.7.pdf	07/05/2014
130	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.7.pdf	06/01/2015
131	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.8.pdf	06/01/2015
132	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.9.pdf	06/01/2015
133	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.1.pdf	06/01/2015
134	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.2.pdf	06/01/2015
135	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.3.pdf	06/01/2015
136	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.4.pdf	06/01/2015
137	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	H.8.pdf	07/05/2014
138	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.5.pdf	04/03/2015
139	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.6.pdf	04/03/2015
140	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.7.pdf	04/03/2015
141	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.8.pdf	04/03/2015
142	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.9.pdf	04/03/2015
143	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	R.1.pdf	04/03/2015
144	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	R.2.pdf	04/03/2015
145	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	H.9.pdf	07/05/2014
146	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.3.pdf	04/03/2015
147	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.4.pdf	04/03/2015
148	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.5.pdf	04/03/2015
149	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.6.pdf	04/03/2015
150	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.7.pdf	04/03/2015
151	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.8.pdf	04/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
152	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.9.pdf	04/03/2015
153	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.7.pdf	06/05/2014
154	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.8.pdf	06/05/2014
155	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.9.pdf	06/05/2014
156	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.1.pdf	06/05/2014
157	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.2.pdf	06/05/2014
158	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.3.pdf	06/05/2014
159	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.4.pdf	06/05/2014
160	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.5.pdf	06/05/2014
161	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.6.pdf	06/05/2014
162	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.5.pdf	05/08/2014
163	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.6.pdf	05/08/2014
164	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.7.pdf	05/08/2014
165	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.8.pdf	05/08/2014
166	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.9.pdf	05/08/2014
167	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	I.1.pdf	05/08/2014
168	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21489.pdf	02/08/2018
169	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21494.pdf	02/08/2018
170	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21495.pdf	02/08/2018
171	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21498.pdf	02/08/2018
172	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21499.pdf	02/08/2018
173	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21501.pdf	02/08/2018
174	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21502.pdf	02/08/2018
175	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21505.pdf	02/08/2018
176	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21507.pdf	02/08/2018
177	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21509.pdf	02/08/2018
178	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21510.pdf	02/08/2018
179	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21514.pdf	02/08/2018
180	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21515.pdf	02/08/2018
181	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21545.pdf	02/08/2018
182	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21560.pdf	02/08/2018
183	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.7.pdf	06/05/2014
184	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.8.pdf	06/05/2014
185	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.9.pdf	06/05/2014
186	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.1.pdf	06/05/2014
187	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.2.pdf	06/05/2014
188	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.3.pdf	06/05/2014
189	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.4.pdf	06/05/2014
190	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.5.pdf	06/05/2014
191	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	K.8.pdf	08/07/2014
192	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	K.9.pdf	08/07/2014
193	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.1.pdf	08/07/2014
194	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.2.pdf	08/07/2014
195	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.3.pdf	08/07/2014
196	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.4.pdf	08/07/2014
197	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.5.pdf	08/07/2014
198	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	5_DE_AGOSTO.pdf	06/07/2018
199	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	9_de_octubre.pdf	06/07/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
200	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	16_DE_ABRIL-KALAGLAS.pdf	06/07/2018
201	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	21_DE_MARZO.pdf	06/07/2018
202	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	06/07/2018
203	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	BRISAS_DEL_UPANO.pdf	06/07/2018
204	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	EL_FUTURO_DE_PATUCA.pdf	06/07/2018
205	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	ESPERANZAS_DEL_FUTURO.pdf	06/07/2018
206	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	HEROES_DE_LA_AMAZONIA.pdf	06/07/2018
207	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	KIMIUS.pdf	06/07/2018
208	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	LOS_CEDROS.pdf	06/07/2018
209	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	06/07/2018
210	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	MIRADOR_SHAIME.pdf	06/07/2018
211	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	PACHECO_ALVAREZ.pdf	06/07/2018
212	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	RIO_BLANCO.pdf	06/07/2018
213	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	06/07/2018
214	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	SAN_VICENTE_FERRER.pdf	06/07/2018
215	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TIWINZA.pdf	06/07/2018
216	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	06/07/2018
217	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TRES_DE_OCTUBRE.pdf	06/07/2018
218	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	UNIDOS_CONSERVANDO_VIAS.pdf	06/07/2018
219	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	VALLE_DEL_RIO.pdf	06/07/2018
220	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	ZUÑAG-19_DE_AGOSTO.pdf	06/07/2018
221	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.6.pdf	06/05/2014
222	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.7.pdf	06/05/2014
223	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.8.pdf	06/05/2014
224	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.9.pdf	06/05/2014
225	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.1.pdf	06/05/2014
226	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.2.pdf	06/05/2014
227	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.3.pdf	06/05/2014
228	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	I.6.pdf	07/05/2014
229	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	I.8.pdf	07/05/2014
230	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.1.pdf	07/05/2014
231	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.3.pdf	07/05/2014
232	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.5.pdf	07/05/2014
233	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.1.pdf	06/04/2015
234	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.2.pdf	06/04/2015
235	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.3.pdf	06/04/2015
236	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.4.pdf	06/04/2015
237	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.5.pdf	06/04/2015
238	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.6.pdf	06/04/2015
239	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.7.pdf	06/04/2015
240	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	3_DE_OCTUBRE_20564.pdf	05/04/2018
241	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	9_DE_OCTUBRE_20559.pdf	05/04/2018
242	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	16_DE_ABRIL_- _KALAGLAS__20565.pdf	05/04/2018
243	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	21_DE_MARZO_20557.pdf	05/04/2018
244	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	BRISAS_DEL_SANGAY_20558.pdf	05/04/2018
245	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	ESPERANZA_DEL_FUTURO_20561.pdf	05/04/2018
246	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	FUTURO_DE_PATUCA_20568.pdf	05/04/2018
247	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	HEROES_DE_LA_AMAZONIA_20556.pdf	05/04/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
248	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	KIMIUS_20569.pdf	05/04/2018
249	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	LOS_CEDROS_20566.pdf	05/04/2018
250	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO_20563.pdf	05/04/2018
251	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	RIO_BLANCO_20560.pdf	05/04/2018
252	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA_20567.pdf	05/04/2018
253	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	VALLE_DEL_RIO_20562.pdf	05/04/2018
254	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	20566.pdf	04/05/2018
255	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.4.pdf	06/05/2014
256	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.5.pdf	06/05/2014
257	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.6.pdf	06/05/2014
258	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.7.pdf	06/05/2014
259	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.8.pdf	06/05/2014
260	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.9.pdf	06/05/2014
261	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	G.1.pdf	06/05/2014
262	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	G.2.pdf	06/05/2014
263	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	J.8.pdf	04/06/2014
264	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	J.9.pdf	04/06/2014
265	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.1.pdf	04/06/2014
266	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.2.pdf	04/06/2014
267	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.3.pdf	04/06/2014
268	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.4.pdf	04/06/2014
269	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	H.6.pdf	07/05/2014
270	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.5.pdf	02/12/2014
271	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.6.pdf	02/12/2014
272	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.7.pdf	02/12/2014
273	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.8.pdf	02/12/2014
274	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.9.pdf	02/12/2014
275	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	O.1.pdf	02/12/2014
276	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	O.2.pdf	02/12/2014
277	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18638.pdf	04/12/2017
278	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18642.pdf	04/12/2017
279	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18645.pdf	04/12/2017
280	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18646.pdf	04/12/2017
281	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18656.pdf	04/12/2017
282	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18658.pdf	04/12/2017
283	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18660.pdf	04/12/2017
284	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18661.pdf	04/12/2017
285	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18662.pdf	04/12/2017
286	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18682.pdf	04/12/2017
287	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18931.pdf	04/12/2017
288	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18644_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
289	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18659_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
290	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18932_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
291	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_19118_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
292	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18641_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
293	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18643_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
294	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18640_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
295	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18639_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
296	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18637_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
297	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013	H.5.pdf	07/05/2014
298	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.7.pdf	05/11/2014
299	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.8.pdf	05/11/2014
300	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.9.pdf	05/11/2014
301	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.1.pdf	05/11/2014
302	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.2.pdf	05/11/2014
303	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.3.pdf	05/11/2014
304	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.4.pdf	05/11/2014
305	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18637.pdf	01/11/2017
306	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18639.pdf	01/11/2017
307	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18641.pdf	01/11/2017
308	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18643.pdf	01/11/2017
309	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18644.pdf	01/11/2017
310	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18659.pdf	01/11/2017
311	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18932.pdf	01/11/2017
312	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_19118.pdf	01/11/2017
313	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21493.pdf	05/11/2018
314	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21498.pdf	05/11/2018
315	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21500.pdf	05/11/2018
316	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21503.pdf	05/11/2018
317	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21504.pdf	05/11/2018
318	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21507.pdf	05/11/2018
319	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21508.pdf	05/11/2018
320	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21512.pdf	05/11/2018
321	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21513.pdf	05/11/2018
322	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21546.pdf	05/11/2018
323	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.3.pdf	06/05/2014
324	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.4.pdf	06/05/2014
325	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.5.pdf	06/05/2014
326	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	L.8.pdf	06/10/2014
327	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	L.9.pdf	06/10/2014
328	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.1.pdf	06/10/2014
329	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.2.pdf	06/10/2014
330	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.3.pdf	06/10/2014
331	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.4.pdf	06/10/2014
332	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.5.pdf	06/10/2014
333	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21489.pdf	04/10/2018
334	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21493.pdf	04/10/2018
335	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21494.pdf	04/10/2018
336	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21495.pdf	04/10/2018
337	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21499.pdf	04/10/2018
338	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21501.pdf	04/10/2018
339	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21502.pdf	04/10/2018
340	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21503.pdf	04/10/2018
341	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21504.pdf	04/10/2018
342	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21505.pdf	04/10/2018
343	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21508.pdf	04/10/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
344	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21509.pdf	04/10/2018
345	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21510.pdf	04/10/2018
346	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21512.pdf	04/10/2018
347	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21513.pdf	04/10/2018
348	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21514.pdf	04/10/2018
349	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21515.pdf	04/10/2018
350	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21545.pdf	04/10/2018
351	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21546.pdf	04/10/2018
352	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21560.pdf	04/10/2018
353	INFORME MECANICO JULIO 2016	W.7.xls	05/08/2016
354	INFORME MECANICO ABRIL 2015	S.8.xls	06/05/2015
355	INFORME MECANICO ABRIL 2016	W.3.xls	04/05/2016
356	INFORME MECANICO AGOSTO 2014	K.4.xls	05/09/2014
357	INFORME MECANICO DICIEMBRE 2015	U.6.xls	06/01/2016
358	INFORME MECANICO ENERO 2016	U.8.xls	03/02/2016
359	INFORME MECANICO JULIO 2015	T.2.xls	12/08/2015
360	INFORME MECANICO JUNIO 2015	T.1.xls	08/07/2015
361	INFORME MECANICO MARZO 2015	S.8.xls	06/04/2015
362	INFORME MECANICO MARZO 2016	INFORME_MECANICO_MARZO_2016.xls	05/04/2016
363	INFORME MECANICO MAYO 2015	S.9.xls	05/06/2015
364	INFORME MECANICO MAYO 2016	V.8.xls	03/06/2016
365	INFORME MECANICO NOVIEMBRE 2015	U.4.xls	03/12/2015
366	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2014	M.6.xls	07/10/2014
367	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2016	Y.1.pdf	04/10/2016
368	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2016	Y.2.xls	04/10/2016
369	INFORME MECÁNICO NOVIEMBRE 2014	O.3.xls	05/12/2014
370	INSPECCIÓN FALLAS GEOLOGICAS PARA MANTENIMIENTO	K.8.doc	08/09/2014
371	INSPECCIÓN FALLAS GEOLOGICAS PARA MANTENIMIENTO	K.9.doc	08/09/2014
372	MANTENIMIENTO CARRETERA GUALAQUIZA - MATANGA	K.6.pdf	03/07/2014
373	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS	T.8.doc	06/11/2015
374	MANTENIMIENTO VIAL PLAN DE MILAGRO - SAN JUAN BOSCO	K.7.pdf	03/07/2014
375	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA	K.5.pdf	03/07/2014
376	MTOP-ADM_MOR-2016-8-ME	V.1.pdf	03/02/2016
377	mtop-cgp-2016-30-me	V.4.pdf	04/02/2016
378	MTOP-CON_MOR-2016-22-ME	V.2.pdf	03/02/2016
379	MTOP-CON_MOR-2016-24-ME	V.3.pdf	03/02/2016
380	MTOP-CON_MOR-2016-24-ME	V.5.pdf	04/02/2016
381	MTOP-CONS_MOR-2016-1-ME	V.6.pdf	04/02/2016
382	MTOP-DDMS-2016-390-ME	W.5.pdf	04/05/2016
383	MTOP-DDMS-2016-465-ME	V.9.pdf	03/06/2016
384	MTOP-DDMS-2016-491-ME	MTOP-DDMS-2016-491-ME.pdf	05/07/2016
385	MTOP-DDMS-2016-609-ME	W.9.pdf	05/08/2016
386	MTOP-DDMS-2016-808-ME	W.9.pdf	05/12/2016
387	MTOP-DPMS-2015-605-ME	T.3.pdf	12/08/2015
388	MTOP-DPMS-2015-945-ME-1	U.3.pdf	03/12/2015
389	MTOP-DPMS-2016-53-ME	V.7.pdf	04/02/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
390	MTOP-DPMS-2016-79-ME	V.8.pdf	04/02/2016
391	MTOP-FINAN_MOR-2016-3-ME	V.9.pdf	04/02/2016
392	ORDEN DE COMPRA 16 DE ABRIL - KALAGLAS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_16_DE_ABRIL_-_KALAGLAS.pdf	05/04/2017
393	ORDEN DE COMPRA 21 DE MARZO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_21_DE_MARZO.pdf	05/04/2017
394	ORDEN DE COMPRA 9 DE OCTUBRE/2017	ORDEN_DE_COMPRA_9_DE_OCTUBRE.pdf	05/04/2017
395	ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL SANGAY 2017	ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	05/04/2017
396	ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL UPANO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_UPANO.pdf	05/04/2017
397	ORDEN DE COMPRA CASCADAS DE CUGUSHA	ORDEN_DE_COMPRA_CASCADAS_DE_CUGUSHA.pdf	03/05/2017
398	ORDEN DE COMPRA ESPERANZAS DEL FUTURO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_ESPERANZAS_DEL_FUTURO.pdf	05/04/2017
399	ORDEN DE COMPRA LOS CEDROS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_LOS_CEDROS.pdf	05/04/2017
400	ORDEN DE COMPRA LUCHANDO POR EL FUTURO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	05/04/2017
401	ORDEN DE COMPRA MARZO2017_MIRADOR SHAIME 2017	ORDEN_DE_COMPRA_MARZO2017_MIRADOR_SHAIME-105104	05/04/2017
402	ORDEN DE COMPRA PACHECO ALVAREZ	ORDEN_DE_COMPRA_PACHECO_ALVAREZ.pdf	03/05/2017
403	ORDEN DE COMPRA SAN PEDRO DE GUALAQUIZA 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	05/04/2017
404	ORDEN DE COMPRA TIWINTZA 2017	ORDEN_DE_COMPRA_TIWINTZA.pdf	05/04/2017
405	ORDEN DE COMPRA TRANSFORMANDO VIAS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	05/04/2017
406	orden de compra_mantenimiento vial-sucua-logroño	V.7.pdf	03/06/2016
407	PINTURA DE LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS JURUMBAINO, BLANCO, TIMBIANA Y ARAPICOS	L.6.pdf	16/09/2014
408	RECORRIDO INSPECCION FUNCIONARIOS	T.9.doc	01/12/2015
409	REPORTE DE MAQUINARIA NOVIEMBRE 2015	U.5.pdf	03/12/2015
410	REPORTE DE PRESUPUESTO ABRIL 2014	O.7.pdf	24/12/2014
411	REPORTE DE PRESUPUESTO AGOSTO 2014	P.2.pdf	24/12/2014
412	REPORTE DE PRESUPUESTO DICIEMBRE 2014	P.6.pdf	24/12/2014
413	REPORTE DE PRESUPUESTO ENERO 2014	O.4.pdf	24/12/2014
414	REPORTE DE PRESUPUESTO FEBRERO 2014	O.5.pdf	24/12/2014
415	REPORTE DE PRESUPUESTO JULIO 2014	P.1.pdf	24/12/2014
416	REPORTE DE PRESUPUESTO JUNIO 2014	O.9.pdf	24/12/2014
417	REPORTE DE PRESUPUESTO MARZO 2014	O.6.pdf	24/12/2014
418	REPORTE DE PRESUPUESTO MAYO 2014	O.8.pdf	24/12/2014
419	REPORTE DE PRESUPUESTO NOVIEMBRE 2014	P.5.pdf	24/12/2014
420	REPORTE DE PRESUPUESTO OCTUBRE 2014	P.4.pdf	24/12/2014
421	REPORTE DE PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2014	P.3.pdf	24/12/2014
422	REPORTE GRAFICO ABRIL 2016	W.4.pdf	04/05/2016
423	REPORTE LEGALIZADO ENERO 2016	U.9.pdf	03/02/2016
424	REPORTE MECANICO OCTUBRE 2015	T.7.xls	06/11/2015
425	REPORTE MECANICO SEPTIEMBRE	T.5.pdf	07/10/2015
426	REPORTE MECANICO SEPTIEMBRE	T.6.xls	07/10/2015
427	resolucion_de_contratacion_transformando_vias	resolucion_de_contratacion_transformando_vias.doc	05/07/2016
428	RESUMEN DICIEMBRE 2015	U.7.pdf	06/01/2016
429	RESUMEN INFORME MECANICO JULIO 2016	W.8.pdf	05/08/2016
430	SAN PEDRO DE GUALAQUIZA	W.6.pdf	05/08/2016
431	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIA GUALAQUIZA - CHIGUINDA	J.7.pdf	07/05/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	FINANCIERO MTOP			
	ANALISTA ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO MTOP			
Quezada Jara, Mónica Fabiola	PATROCINADOR EJECUTIVO MTOP	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600
Saavedra Correa, Jose Luis	ADMINISTRADOR DEL PROYECTO MTOP	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Morona Santiago	jsaavedra@mtop.gob.ec	64021
Tipan Guañuna, Jairo Fernando	SUPERVISOR VIAL MTOP ETAPA DE MANTENIMIENTO	Coordinador Técnico de Infraestructura Distrital/ Líder de Proyecto	jtipan@mtop.gob.ec	64213

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
38711_1.jpg	05/11/2018
