

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6

Dirección Provincial Morona Santiago

PROYECTO: K043 MTOP- Mantenimiento Vial de la Provincia de Morona Santiago

Líder del Proyecto:	Tipan Guañuna, Jairo Fernando (jtipan@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, Provincia - Morona Santiago
Titular:	Saavedra Correa, Jose Luis	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3661	TIR:	20.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	12,031,896.72
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2012 - 31/01/2022
Fecha de última actualización:	15/08/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	Fecha del siguiente Hito:	30/09/2019

DATOS GENERALES

Descripción

La realización del Manteamiento de las vías que se encuentran a cargo del MTOP en la Provincia de Morona Santiago.

Contratista: Varios contratos con diferentes contratistas, como Microempresas, etc.

Microempresas: 21 de Marzo, Valle del río, Esperanzas del futuro, Luchando por el Futura, Brisas del Sangay, Brisas del Upano,

Objetivo: Mejorar el nivel de servicio del usuario, integrando zonas productivas agrícolas, ganaderas, turísticas y mineras, implementando mano de obra directa e indirecta, servicio directo a las poblaciones de las Provincias del Azuay, Morona y el resto del país.

Linea base.- proyecto se encuentra a nivel de carpeta asfáltica con cunetas revestidas, con señalización horizontal y vertical.

monto mantenimiento año 2012\$ 4.408.599,39
 monto mantenimiento año 2013\$ 1.287.429,58
 monto mantenimiento año 2014\$ 924.557,59
 monto mantenimiento año 2015\$ 3.058.380,48
 monto mantenimiento año 2016\$ 2.000.000,00
 Valor Total \$ 11.678.967,04

Beneficios Cualitativos

Realizando el Mantenimiento se tiene las vías en buenas condiciones, lo que mejora el Comercio, la fácil salida de los productos agrícolas y ganaderos, se incrementa el Turismo tanto nacional como internacional. Es decir, mejorar el nivel de servicio, seguridad vial y costo de viaje.

Tipo de Beneficiario

Directos:
 Indirectos:
 Población de la Provincia de Morona Santiago y Provincia aledañas


Restricciones

Tiempo: la fecha limite para culmiar las obras es el 31 de Diciembre de 2014

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 75.63 %
 Fecha de Inicio: 01/03/2012 Fecha de Fin: 31/01/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

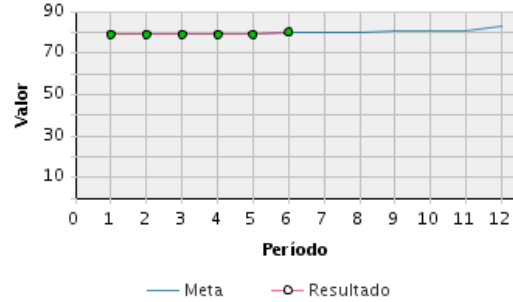

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %	80 %	80 %	80 %	81 %	81 %	81 %	83 %
	Avance real acumulado											
	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %	80 %						
	Estado											
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 22 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/08/2019 - 04:25 PM
JUNIO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/07/2019 - 03:23 PM
MAYO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/07/2019 - 11:36 AM
ABRIL 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/05/2019 - 09:56 AM
MARZO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc a nivel de la red vial estatal.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/04/2019 - 07:17 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc a nivel de la red vial estatal.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	01/03/2019 - 07:38 AM
ENERO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/02/2019 - 10:58 AM
(HITO ASOCIADO 9) DICIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/01/2019 - 09:13 AM
(HITO ASOCIADO 9) NOVIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/12/2018 - 09:05 AM
(HITO ASOCIADO 9) OCTUBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/11/2018 - 04:01 PM
(HITO ASOCIADO 9) SEPTIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/10/2018 - 01:28 PM
(HITO ASOCIADO 9) AGOSTO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/09/2018 - 11:58 AM
HITO ASOCIADO 9) JULIO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/08/2018 - 02:58 PM
HITO ASOCIADO 9) JUNIO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos	Idrovo Aguirre, Romeo Alexander	06/07/2018 - 07:25 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc</p>		
<p>MAYO 2018. Con fecha 28 de mayo de 2018, se analizo y aprobó los avales de servicio de voluntariado, se inicio con el proceso para la contratación, mientras tanto el mes de mayo hubieron fuertes precipitaciones a lo largo de la RVE, los mismos que provocaron el cierre parcial en algunos tramos, se trabajo con maquinaria por administración directa y con colaboración de la empresa privada se despejo las vías, además existió el apoyo de maquinarias de otras Direcciones Distritales.</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>05/06/2018 - 09:52 AM</p>
<p>HITO ASOCIADO 9) ABRIL 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>04/05/2018 - 03:07 PM</p>
<p>(HITO ASOCIADO 9) MARZO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>04/04/2018 - 04:14 PM</p>
<p>(HITO ASOCIADO 9) FEBRERO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>20/03/2018 - 02:34 PM</p>
<p>(HITO ASOCIADO 9) ENERO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>20/03/2018 - 02:33 PM</p>
<p>(HITO ASOCIADO 9) DICIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>04/01/2018 - 04:45 PM</p>
<p>(HITO ASOCIADO 9) NOVIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc</p>	<p>Tipan Guañuna, Jairo Fernando</p>	<p>06/12/2017 - 11:06 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
(HITO ASOCIADO 9) OCTURE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	01/11/2017 - 03:42 PM
SEPTIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/10/2017 - 11:46 AM
AGOSTO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	06/09/2017 - 04:08 PM
JULIO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	04/08/2017 - 12:18 PM
JUNIO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	04/07/2017 - 03:20 PM
MAYO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	05/06/2017 - 04:57 PM
ABRIL 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	03/05/2017 - 02:42 PM
MARZO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	05/04/2017 - 09:58 AM
FEBRERO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., ha realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se	Saavedra Correa, Jose Luis	07/03/2017 - 12:25 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.		
ENERO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Saavedra Correa, Jose Luis	07/02/2017 - 09:26 AM
DICIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco - Kalaglas, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Saavedra Correa, Jose Luis	05/01/2017 - 05:33 PM
NOVIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco - Kalaglas, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Arias Castro, Franklin	02/12/2016 - 12:25 PM
OCTUBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP MS., en este periodo ha realizado labores de mantenimiento rutinario especialmente en los rubros limpieza y estabilización de taludes, limpieza de drenaje, señalización, roza a mano y bacheo menor y mayor de la calzada, especialmente con contratos de microempresas, y por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital, dandose énfasis y prioridad al paso de la vía Cebadas - 09 de Octubre km. 49+000, vía Mendez Morona y Bella Unión - Limón, además se ha tenido el aporte de maquinaria de otras Direcciones Provinciales para afrontar sectores críticos y evitar que se suspenda el tráfico vehicular.	Arias Castro, Franklin	01/11/2016 - 11:15 AM
SEPTIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP MS., en este periodo ha realizado labores de mantenimiento rutinario especialmente en los rubros limpieza y estabilización de taludes, limpieza de drenaje, señalización, roza a mano y bacheo menor y mayor de la calzada, especialmente con contratos de microempresas, y por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital, dandose énfasis y prioridad al paso de la vía Cebadas - 09 de Octubre km. 49+000, vía Mendez Morona y Bella Unión - Limón.	Arias Castro, Franklin	04/10/2016 - 10:35 AM
AGOSTO 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a trabajado con microempresas de acuerdo a orden de compra en la red vial estatal, además se a ejecutado trabajos por administración directa en sitios críticos para habilitar el paso vehicular debido a derrumbes por desestabilización de taludes, se debe informar que toda la red estatal de la provincia se encuentra a cargo de la Dirección Distrital de Morona Santiago a excepción de la carretera Sigsig - Matanga - Gualaquiza que se encuentra en construcción y cargo de la Cia. Sinohydro, es necesario repotenciar la maquinaria para cubrir el mantenimiento rutinario de toda la red vial	Arias Castro, Franklin	06/09/2016 - 04:20 PM
JULIO 2016.- La Dirección Distrital de Morona Santiago ha realizado el mantenimiento por administración directa, con microempresas, y con las Cias. Contratistas dando prioridad a las siguientes vías: Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Bella Unión, Macas 09 de octubre, Cebadas 09 de octubre, Méndez Morona, Sigsig - Gualaquiza; Méndez Guarumales.	Arias Castro, Franklin	05/08/2016 - 03:15 PM
JUNIO 2016.- Se ha realizado mantenimiento rutinario de la provincia con el siguiente detalle: vía Plan de Milagro - Limón a cargo de la Cia. Hidrobo Estrada, Méndez - Morona a cargo de la Cia. Fopeco, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral a cargo de la Cia. Fopeco, Plan de Milagro - San Juan Bosco a cargo de la microempresa Transformando Vías, Sucua Logroño - Bella Unión Tramo Sucua - Logroño a cargo de la microempresa Brisas del Upano, Tramo Logroño Méndez a cargo de la microempresa Esperanza del Futuro, Bella Unión - Limón; Bella Unión - Cumtza, a cargo de la microempresa Luchando por el futuro, San Juan Bosco - Gualaquiza, a cargo del MTOP M.S., Macas - Puente Pastaza a cargo del MTOP M.S., Cebadas 09 de octubre a cargo del MTOP M.S., Sigsig - Matanga - Gualaquiza a cargo de la Cia. Sinohydro	Arias Castro, Franklin	05/07/2016 - 12:50 PM
MAYO 2016.- Maquinaria de la Dirección Distrital del MTOP M.S., se encuentra realizando mantenimiento a las siguientes vías: Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza; Bella Unión - Cumtza - Limón, Cebadas - 09 de octubre, además la Cia. Hidrobo Estrada pro medio de contrato vigente se encuentra ejecutando mantenimiento rutinario de la vía Plan de Milagro - Limón, Cia Fopeco de las vías Mendez - Morona, 09 de octubre - Macas y Paso Lateral, vía Mendez - Guarumales, además por medio de orden de trabajo se contrato trabajos de conservación vial	Arias Castro, Franklin	03/06/2016 - 11:06 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
con la Asociación Brisas del Upano, tramo Sucua - Logroño, con fecha 12 de mayo de 2016, se adjunta respaldo.		
ABRIL 2016.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., debido a la fuerte estación imperante en la red vial estatal ha priorizado los trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, especialmente en la vía 9 de Octubre -Cebadas, Bella Unión - Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco, además la Cia. Fopeco ha realizado el mantenimiento de la vía, Macas - 9 de octubre y Paso Lateral, Méndez - San José de Morona, lograndose habilitar el tráfico vehicular de manera oportuna	Arias Castro, Franklin	04/05/2016 - 12:04 PM
MARZO 2016.- Los trabajos de mantenimiento rutinario se han realizado con los Contratistas Fopeco e Hidrobo Estrada por medio de contratos vigentes, en el mantenimiento rutinario por administración directa estamos trabajando en la vía Bella Unión - Limón y Cebadas 9 de octubre y Plan de Milagro - Gualaquiza, donde se han producido deslizamientos de taludes, taponamiento de vías, por lo que se a priorizado algunos sectores procediendo a la limpieza de materiales y habilitación al tráfico vehicular	Arias Castro, Franklin	04/04/2016 - 02:32 PM
FEBRERO 2016.- Los trabajos de mantenimiento rutinario se han realizado con los Contratistas Fopeco e Hidrobo Estrada por medio de contratos vigentes, en el mantenimiento rutinario por administración directa estamos trabajando en la vía Bella Unión -- Limón y Cebadas 9 de octubre, donde se han producido deslizamientos de taludes, taponamiento de vías, por lo que se a priorizado algunos sectores procediendo a la limpieza de materiales.	Arias Castro, Franklin	02/03/2016 - 11:44 AM
ENERO 2016.- Las empresas contratistas Cia. Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa, situación que deberá definirse en el mes de febrero 2016, a fin de poder programar los indicadores de cumplimiento para este año, se adjuntan documentos de respaldo	Arias Castro, Franklin	04/02/2016 - 03:46 PM
DICIEMBRE 2015.- Las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa, situación que deberá definirse en el mes de enero a fin de poder programar los indicadores de cumplimiento para este año	Arias Castro, Franklin	05/01/2016 - 02:53 PM
NOVIEMBRE 2015.- Las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa	Arias Castro, Franklin	02/12/2015 - 02:40 PM
OCTUBRE 2015.- Autoridades Superiores del MTOP deberán pronunciarse y darles disposiciones referente a la remediación de fallas geologicas, a la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas	Arias Castro, Franklin	04/11/2015 - 03:35 PM
SEPTIEMBRE 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red via l estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos economicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a	Arias Castro, Franklin	07/10/2015 - 08:31 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos económicos para contratar microempresas</p>		
<p>AGOSTO 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red vía I estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos económicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos económicos para contratar microempresas</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>01/09/2015 - 10:15 AM</p>
<p>JULIO 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red vía I estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos económicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>12/08/2015 - 11:51 AM</p>
<p>JUNIO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015, estos trabajos deberán ser de manera permanente sin interrupciones.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>08/07/2015 - 11:28 AM</p>
<p>Mayo 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015, estos trabajos deberán ser de manera permanente sin interrupciones.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>04/06/2015 - 04:13 PM</p>
<p>Abril 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>06/05/2015 - 03:51 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>06/04/2015 - 03:29 PM</p>
<p>FEBRERO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>05/03/2015 - 10:49 AM</p>
<p>ENERO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>05/03/2015 - 10:49 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas se han cumplido totalmente el periodo 2014, no ha si con las contratistas que deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa se ha cumplido con lo programado en el año 2014.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>07/01/2015 - 10:41 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>02/12/2014 - 02:23 PM</p>
<p>OCTUBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>07/11/2014 - 11:33 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.		
SEPTIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S, trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.	Arias Castro, Franklin	03/10/2014 - 10:01 AM
AGOSTO 2014.- Se trabaja con 7 microempresas de conservación vial en el mantenimiento de la red vial troncal amazonica E45 desde Puente Pastaza hasta Llmón, además existen microempresas de conservación vial a cargo de la Cia Fopeca 9 de octubre -. Macas y Paso lateral de Macas y la Carretera Méndez - San José, realizandose los siguientes trabajos: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, roza a mano, sello de fisuras, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, arreglo de sectores de hundimientos y asentamientos además se trabaja con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago en los tramos: Sucua - Limón y Plan de Milagro - San Juan Bosco, limpieza de derrumbes, colocación de material en asentamientos, hundimientos, sello de fisuras y nivelación de hundimientos con material asfáltico.	Arias Castro, Franklin	02/09/2014 - 03:58 PM
JULIO 2014.- Se encuentra ejecutando mantenimiento vial limpieza de alcantarillas, limpieza de drenaje, derrumbes a mano, desde el Puente Pastaza hasta Limón. con 6 microempresas, además se encuentra ejecutando mantenimiento rutinario por administración directa en el tramo Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco y Gualaquiza Chiguinda, especialmente en el rubro limpieza de derrumbes y reconformación de rasante existente.	Arias Castro, Franklin	05/08/2014 - 11:39 AM
JUNIO 2014.- Las Microempresas continuan trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la via troncal amazonica Puente Pastaza - Macas - Limón, además también se encuentra trabajando la maquinaria del MTOP M.S., en el mantenimiento de la carretera Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza; Tramo Plan de Milagro - San Juan Bosco y Carretera Sigsig - Matanga - Gualaquiza; Tramo: El Ideal - La Pradera.	Arias Castro, Franklin	01/08/2014 - 10:08 AM
MAYO 2014.- Las Microempresas continuan trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la via troncal amazonica Puente Pastaza - Macas - Limón	Arias Castro, Franklin	04/06/2014 - 09:43 AM
ABRIL 2014.- Microempresas se encuentran trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la via troncal amazonica Puente Pastaza - Macas - Limón	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:03 PM
MARZO 2014.- La Dirección Provincial se encuentra realizando los tramites para el proceso de contratación en el portal de compras publicas en el mantenimiento rutinario	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:02 PM
FEBRERO 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá iniciar el proceso para la contratación de las microempresas a nivel provincial.	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:01 PM
ENERO 2014: Trabajos de mantenimiento rutinario con microempresas, estan suspendidos hasta efectuar el proceso de contratación para el año 2014.	Arias Castro, Franklin	18/02/2014 - 01:35 PM
DICIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	06/01/2014 - 09:21 AM
NOVIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	01/12/2013 - 03:14 PM
OCTUBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	01/12/2013 - 03:14 PM
SEPTIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/11/2013 - 09:49 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	02/10/2013 - 07:09 AM
JULIO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/09/2013 - 07:33 AM
JUNIO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	29/06/2013 - 03:20 PM
MAYO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	29/06/2013 - 03:20 PM
ABRIL 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	28/05/2013 - 02:39 PM
MARZO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	04/05/2013 - 08:30 AM
FEBRERO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:05 PM
ENERO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM
DICIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM
NOVIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM
OCTUBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	02/12/2012 - 10:06 AM
SEPTIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre		
AGOSTO 2012.- Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre		
JULIO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento		
JUNIO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento		
MAYO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento		
ABRIL 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento		
MARZO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento		
FEBRERO 2012.-Se ha iniciado con varios trabajos de mantenimiento como la Señalización Vertical y Horizontal en varios tramos de las vías de la Provincia de Morona Santiago, Microempresas para realizar mantenimiento rutinario,		
ENERO 2012.-Se han considerado varios Proyectos de Mantenimiento dentro de la Provincia		

Problemas cerrados: 9, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. El fuerte temporada invernal CAUSARÍA el retraso de la obra	05/08/2019	Jairo Fernando Tipan Guañuna	30 %	10	3	1/2

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	01/03/2012		01/03/2012		Sí	5.0
2	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	01/03/2012		01/03/2012		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Inicio Mantenimiento vial con empresas constructoras ejecutado	4-Inicio de Trabajo	02/01/2015		02/01/2015		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento rutinario por administración directa, limpieza de derrumbes, ejecutado 10%	4-Inicio de Trabajo	05/01/2015		05/01/2015		Sí	8.0
5	EJECUCIÓN: Mantenimiento Vial por administración directa, limpieza de derrumbes, ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	02/06/2015		02/06/2015		Sí	8.0
6	EJECUCIÓN: Contratos con Microempresas de mantenimiento rutinario ejecutado	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/05/2016		Sí	8.0
7	EJECUCIÓN: Mantenimiento por administracion directa , limpieza de derrumbes ejecutado 60%	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario con Microempresas contrato legalizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		16/05/2016		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario roza a mano con microempresas ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	01/09/2015		31/08/2016		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario limpieza de drenajes con microempresa ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		31/08/2016		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario roza a mano, con microempresas ejecutado 100%	5-Entregables Intermedios	30/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	EJECUCIÓN: Culminación trabajos mantenimiento rutinario por administración directa concluido	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Limpieza del Campamento Patuca ejecutado	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial con microempresas, drenaje ejecutado 100%	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2019	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2019	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019			No	1.0
17	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2019	5-Entregables Intermedios	30/12/2019	30/12/2019			No	1.0
18	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2019	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
19	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2019	5-Entregables Intermedios	31/01/2020	31/01/2020			No	1.0
20	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2020	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	1.0
21	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2020	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	2.0
22	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2020	5-Entregables Intermedios	30/12/2020	30/12/2020			No	1.0
23	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2020	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2020	31/12/2020			No	1.0
24	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2020	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/01/2021	31/01/2021			No	1.0
25	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2021	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	1.0
26	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2021	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2021	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	1.0
28	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5
29	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2021	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	26/01/2022	26/01/2022			No	0.5
30	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	27/01/2022	27/01/2022			No	1.0
31	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	28/01/2022	28/01/2022			No	1.0
32	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	29/01/2022	29/01/2022			No	1.0
33	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	30/01/2022	30/01/2022			No	1.0
34	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2022	31/01/2022			No	1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión positiva se pudo verificar los trabajos de mantenimiento	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	16/03/2016
2	Supervisión positiva del mantenimiento vial en el via del sector del Rosario a General Plaza en Limón Indanza	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	19/10/2015
3	Supervisión negativa de la ejecución de proyecto de acuerdo al hito 3 de Mantenimiento Vial por administración directa programado	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	17/07/2015
4	Historico - Existen inconvenientes en el mantenimiento de la vía, en el tramo Bella Unión # Cumtza, por falta de equipo caminero.	Arcos Tuitza, Juan Rafael	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	02/05/2012
5	Historico - El Ministerio ha procedido a contratar los servicios de conservación vial de la Troncal Amazónica, los mismos que mantienen un buen nivel de servicio.	Arcos Tuitza, Juan Rafael	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	30/03/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Estatal en Buen Estado		98.22 %	0.7636	0.75	01/01/2012	Abr-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,503,690.11
Estimado Al Fin Del Proyecto:	12,031,896.72 **
Costo Total:	11,678,967.04
Total Devengado:	10,240,584.91
% Costo Total Devengado:	87.68 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 87.68 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	8,545,508.00	18,228,932.08	0.00	26,774,440.08
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	19,267,292.71	2,441,839.82	0.00	21,709,132.53
Ppto. Codificado	17,140,900.47	2,441,839.82	0.00	19,582,740.29
Ppto. Comprometido	7,526,305.91	0.00	0.00	7,526,305.91
Planeado - Codificado (2019)		15,787,092.26		
Programado a Devengar	15,022,870.50	2,441,839.82	0.00	17,464,710.32
Ppto. Devengado	9,590,056.90	650,528.01	0.00	10,240,584.91
Pagado Real	4,712,727.08	0.00	0.00	4,712,727.08
Estimado a fin de año	* 9,590,056.90	0.00	0.00	9,590,056.90
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	5,432,813.60	2,441,839.82	0.00	7,874,653.42
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 63.84 %	26.64 %	0.00 %	58.64 %
Ppto. Codificado 998	290,816.35	0.00	0.00	290,816.35
Ppto. Devengado 998	290,816.35	0.00	0.00	290,816.35

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

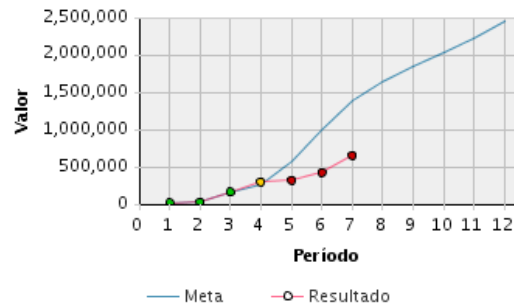

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	11,022.82	11,022.82	11,022.82	11,022.82	100.00 %	●	0.45 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	13,603.71	11,785.53	24,626.53	22,808.35	92.62 %		0.93 %
Mar	121,748.50	137,010.53	146,375.03	159,818.88	109.18 %		6.55 %
Abr	120,407.93	138,044.81	266,782.96	297,863.69	111.65 %		12.20 %
May	311,493.52	22,827.05	578,276.48	320,690.74	55.46 %		13.13 %
Jun	418,255.69	102,570.88	996,532.17	423,261.62	42.47 %		17.33 %
Jul	386,561.54	227,266.39	1,383,093.71	650,528.01	47.03 %		26.64 %
Ago	262,050.74		1,645,144.45				
Sep	190,682.80		1,835,827.25				
Oct	186,782.80		2,022,610.05				
Nov	186,782.80		2,209,392.85				
Dic	232,446.97		2,441,839.82				
Total	2,441,839.82	650,528.01					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
18	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
19	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
20	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo
21	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	16 DE ABRIL - KALAGLAS	W.5.pdf	05/08/2016
2	1_Informe de cumplimiento_Mantenimiento Vial	1_Informe_de_cumplimiento_Mantenimiento_Vial.pdf	23/01/2018
3	22609_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	22609_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
4	22681_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	22681_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
5	23604_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23604_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
6	23605_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23605_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
7	23606_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23606_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
8	23607_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23607_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
9	23608_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23608_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
10	23609_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23609_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
11	23610_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23610_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
12	23611_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23611_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
13	23612_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23612_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
14	23614_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23614_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
15	23615_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23615_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
16	23616_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23616_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
17	23617_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23617_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
18	23618_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23618_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
19	23619_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23619_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
20	23621_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23621_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
21	23622_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23622_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
22	23623_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23623_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
23	23624_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23624_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
24	23625_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23625_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
25	23626_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23626_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
26	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL UPANO	T.2.pdf	06/05/2015
27	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18637_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(9_DE_OCTUBRE).pdf	04/01/2018
28	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18639_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(21_MARZO).pdf	04/01/2018
29	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18640_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(BRISAS_SANGAY).pdf	04/01/2018
30	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18641_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(BRISAS_UPANO).pdf	04/01/2018
31	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18643_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(ESPERANZAS_DEL_FUTURO).pdf	04/01/2018
32	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18644_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(HEROES_AMAZONIA).pdf	04/01/2018
33	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18659_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(RIO_BLANCO).pdf	04/01/2018
34	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 21 DE MARZO	G.6.pdf	06/05/2014
35	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL SANGAY	G.7.pdf	06/05/2014
36	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL SANGAY	T.1.pdf	06/05/2015
37	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL UPANO	G.8.pdf	06/05/2014
38	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CHIGUINDA MATANGA	G.9.pdf	06/05/2014
39	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA ESPERANZAS DEL FUTURO	T.3.pdf	06/05/2015
40	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LA ESPERANZA	H.1.pdf	06/05/2014
41	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LAS 3 CHORRERAS	H.2.pdf	06/05/2014
42	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LUCHANDO POR EL FUTURO	H.3.pdf	06/05/2014
43	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LUCHANDO POR EL FUTURO	T.4.pdf	06/05/2015
44	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA TRES DE OCTUBRE	T.5.pdf	06/05/2015
45	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA VALLE DEL RIO	H.4.pdf	06/05/2014
46	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA VALLE DEL RIO	T.6.pdf	06/05/2015
47	ACTA RECEPCIÓN DEFINITVA 21 DE MARZO	S.9.pdf	06/05/2015
48	certificacion_presupuestaria_microempresas	certificacion_presupuestaria_microempresas_20116080257003064812949.pdf	06/05/2014
49	CONTRATO COMPLEMENTARIO ING. JENRY MENDOZA	A.1.pdf	06/05/2014
50	CONTRATO MANTENIMIENTO 21 DE MARZO	A.5.pdf	06/05/2014
51	CONTRATO MANTENIMIENTO 21 DE MARZO 2014	I.2.pdf	07/05/2014
52	CONTRATO MANTENIMIENTO 3 DE OCTUBRE 2014	I.5.pdf	07/05/2014
53	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL SANGAY	A.6.pdf	06/05/2014
54	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL SANGAY 2014	I.1.pdf	07/05/2014
55	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL UPANO	A.9.pdf	06/05/2014
56	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL UPANO 2014	I.4.pdf	07/05/2014
57	CONTRATO MANTENIMIENTO ESPERANZA DEL FUTURO	A.4.pdf	06/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
58	CONTRATO MANTENIMIENTO LA ESPERANZA	A.3.pdf	06/05/2014
59	CONTRATO MANTENIMIENTO LAS 3 CHORRERAS	A.8.pdf	06/05/2014
60	CONTRATO MANTENIMIENTO LUCHANDO POR EL FUTURO	A.2.pdf	06/05/2014
61	CONTRATO MANTENIMIENTO VALLE DEL RIO	A.7.pdf	06/05/2014
62	CONTRATO MANTENIMIENTO VALLE DEL RIO 2014	I.3.pdf	07/05/2014
63	FOTOS DE MANTENIMIENTO	S.9.doc	04/06/2015
64	FOTOS DE MANTENIMIENTO ENERO 2016	W.1.doc	04/02/2016
65	FOTOS DE TRABAJOS REALIZADOS	M.6.doc	06/10/2014
66	FOTOS DEL PROYECTO	T.8.doc	01/12/2015
67	FOTOS DEL PROYECTO	U.1.doc	01/12/2015
68	FOTOS HIDROBO ENERO 2016	W.2.PDF	04/02/2016
69	FOTOS MANTENIMIENTO DE LA VIA NOVIEMBRE 2014	O.3.doc	05/12/2014
70	FOTOS MANTENIMIENTO DE LA VIA OCTUBRE 2014	N.5.pdf	05/11/2014
71	FOTOS MANTENIMIENTO PROVINCIA	FOTOS_MANTENIMIENTO_PROVINCIA.pdf	05/07/2016
72	FOTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	J.8.pdf	31/07/2014
73	INFORME 074 C - Nov. 2015	U.2.doc	02/12/2015
74	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.1.pdf	06/05/2014
75	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.2.pdf	06/05/2014
76	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.3.pdf	06/05/2014
77	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.4.pdf	06/05/2014
78	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.5.pdf	06/05/2014
79	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.6.pdf	06/05/2014
80	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.7.pdf	06/05/2014
81	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	I.7.pdf	07/05/2014
82	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	I.9.pdf	07/05/2014
83	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.2.pdf	07/05/2014
84	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.4.pdf	07/05/2014
85	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.6.pdf	07/05/2014
86	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	9_DE_OCTUBRE.pdf	04/05/2017
87	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	16_DE_ABRIL_- KALAGLAS.pdf	04/05/2017
88	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	21_DE_MARZO.pdf	04/05/2017
89	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	04/05/2017
90	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	BRISAS_DEL_UPANO.pdf	04/05/2017
91	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	CASCADAS_DE_CUGUSHA.pdf	04/05/2017
92	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	ESPERANZA_DEL_FUTURO.pdf	04/05/2017
93	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	LOS_CEDROS.pdf	04/05/2017
94	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	04/05/2017
95	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	MIRADOR_SHAIME.pdf	04/05/2017
96	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	04/05/2017
97	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	TIWINTZA.pdf	04/05/2017
98	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	04/05/2017
99	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	18932.pdf	04/05/2018
100	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20556.pdf	04/05/2018
101	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20557.pdf	04/05/2018
102	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20558.pdf	04/05/2018
103	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20560.pdf	04/05/2018
104	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20561.pdf	04/05/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
105	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20562.pdf	04/05/2018
106	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20563.pdf	04/05/2018
107	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20564.pdf	04/05/2018
108	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20565.pdf	04/05/2018
109	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20566.pdf	04/05/2018
110	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20567.pdf	04/05/2018
111	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20568.pdf	04/05/2018
112	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20559.pdf	04/05/2018
113	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20569.pdf	04/05/2018
114	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	B.8.pdf	06/05/2014
115	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	B.9.pdf	06/05/2014
116	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.1.pdf	06/05/2014
117	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.2.pdf	06/05/2014
118	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.3.pdf	06/05/2014
119	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.4.pdf	06/05/2014
120	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.5.pdf	06/05/2014
121	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.6.pdf	06/05/2014
122	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.7.pdf	03/09/2014
123	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.8.pdf	03/09/2014
124	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.9.pdf	03/09/2014
125	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.1.pdf	03/09/2014
126	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.2.pdf	03/09/2014
127	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.3.pdf	03/09/2014
128	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.4.pdf	05/09/2014
129	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21489.pdf	04/09/2018
130	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21493.pdf	04/09/2018
131	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21494.pdf	04/09/2018
132	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21495.pdf	04/09/2018
133	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21498.pdf	04/09/2018
134	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21499.pdf	04/09/2018
135	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21500.pdf	04/09/2018
136	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21501.pdf	04/09/2018
137	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21502.pdf	04/09/2018
138	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21503.pdf	04/09/2018
139	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21504.pdf	04/09/2018
140	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21505.pdf	04/09/2018
141	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21507.pdf	04/09/2018
142	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21508.pdf	04/09/2018
143	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21509.pdf	04/09/2018
144	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21510.pdf	04/09/2018
145	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21512.pdf	04/09/2018
146	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21513.pdf	04/09/2018
147	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21514.pdf	04/09/2018
148	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21515.pdf	04/09/2018
149	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21545.pdf	04/09/2018
150	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21546.pdf	04/09/2018
151	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21560.pdf	04/09/2018
152	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	H.7.pdf	07/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
153	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.7.pdf	06/01/2015
154	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.8.pdf	06/01/2015
155	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.9.pdf	06/01/2015
156	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.1.pdf	06/01/2015
157	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.2.pdf	06/01/2015
158	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.3.pdf	06/01/2015
159	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.4.pdf	06/01/2015
160	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21493.pdf	04/01/2019
161	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21494.pdf	04/01/2019
162	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21495.pdf	04/01/2019
163	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21498.pdf	04/01/2019
164	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21500.pdf	04/01/2019
165	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21503.pdf	04/01/2019
166	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21504.pdf	04/01/2019
167	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21507.pdf	04/01/2019
168	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21508.pdf	04/01/2019
169	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21512.pdf	04/01/2019
170	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21513.pdf	04/01/2019
171	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21514.pdf	04/01/2019
172	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21546.pdf	04/01/2019
173	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21489.pdf	04/01/2019
174	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21509.pdf	04/01/2019
175	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21515.pdf	04/01/2019
176	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	H.8.pdf	07/05/2014
177	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.5.pdf	04/03/2015
178	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.6.pdf	04/03/2015
179	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.7.pdf	04/03/2015
180	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.8.pdf	04/03/2015
181	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.9.pdf	04/03/2015
182	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	R.1.pdf	04/03/2015
183	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	R.2.pdf	04/03/2015
184	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21493.pdf	05/02/2019
185	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21501.pdf	05/02/2019
186	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21502.pdf	05/02/2019
187	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21505.pdf	05/02/2019
188	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21508.pdf	05/02/2019
189	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21510.pdf	05/02/2019
190	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21512.pdf	05/02/2019
191	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21513.pdf	05/02/2019
192	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21545.pdf	05/02/2019
193	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21546.pdf	05/02/2019
194	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21560.pdf	05/02/2019
195	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21507.pdf	05/02/2019
196	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21500.pdf	05/02/2019
197	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21498.pdf	05/02/2019
198	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	H.9.pdf	07/05/2014
199	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.3.pdf	04/03/2015
200	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.4.pdf	04/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
201	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.5.pdf	04/03/2015
202	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.6.pdf	04/03/2015
203	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.7.pdf	04/03/2015
204	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.8.pdf	04/03/2015
205	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.9.pdf	04/03/2015
206	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21493.pdf	01/03/2019
207	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21494.pdf	01/03/2019
208	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21495.pdf	01/03/2019
209	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21503.pdf	01/03/2019
210	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21504.pdf	01/03/2019
211	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21508.pdf	01/03/2019
212	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21512.pdf	01/03/2019
213	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21513.pdf	01/03/2019
214	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21514.pdf	01/03/2019
215	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21546.pdf	01/03/2019
216	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21510.pdf	01/03/2019
217	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21505.pdf	01/03/2019
218	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21560.pdf	01/03/2019
219	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21545.pdf	01/03/2019
220	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21502.pdf	01/03/2019
221	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21499.pdf	01/03/2019
222	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21501.pdf	01/03/2019
223	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21498.pdf	01/03/2019
224	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21507.pdf	01/03/2019
225	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21500.pdf	01/03/2019
226	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21489.pdf	01/03/2019
227	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21515.pdf	01/03/2019
228	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21509.pdf	01/03/2019
229	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.7.pdf	06/05/2014
230	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.8.pdf	06/05/2014
231	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.9.pdf	06/05/2014
232	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.1.pdf	06/05/2014
233	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.2.pdf	06/05/2014
234	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.3.pdf	06/05/2014
235	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.4.pdf	06/05/2014
236	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.5.pdf	06/05/2014
237	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.6.pdf	06/05/2014
238	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.5.pdf	05/08/2014
239	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.6.pdf	05/08/2014
240	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.7.pdf	05/08/2014
241	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.8.pdf	05/08/2014
242	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.9.pdf	05/08/2014
243	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	I.1.pdf	05/08/2014
244	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21489.pdf	02/08/2018
245	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21494.pdf	02/08/2018
246	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21495.pdf	02/08/2018
247	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21498.pdf	02/08/2018
248	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21499.pdf	02/08/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
249	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21501.pdf	02/08/2018
250	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21502.pdf	02/08/2018
251	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21505.pdf	02/08/2018
252	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21507.pdf	02/08/2018
253	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21509.pdf	02/08/2018
254	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21510.pdf	02/08/2018
255	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21514.pdf	02/08/2018
256	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21515.pdf	02/08/2018
257	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21545.pdf	02/08/2018
258	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21560.pdf	02/08/2018
259	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.7.pdf	06/05/2014
260	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.8.pdf	06/05/2014
261	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.9.pdf	06/05/2014
262	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.1.pdf	06/05/2014
263	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.2.pdf	06/05/2014
264	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.3.pdf	06/05/2014
265	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.4.pdf	06/05/2014
266	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.5.pdf	06/05/2014
267	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	K.8.pdf	08/07/2014
268	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	K.9.pdf	08/07/2014
269	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.1.pdf	08/07/2014
270	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.2.pdf	08/07/2014
271	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.3.pdf	08/07/2014
272	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.4.pdf	08/07/2014
273	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.5.pdf	08/07/2014
274	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	5_DE_AGOSTO.pdf	06/07/2018
275	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	9_de_octubre.pdf	06/07/2018
276	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	16_DE_ABRIL-KALAGLAS.pdf	06/07/2018
277	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	21_DE_MARZO.pdf	06/07/2018
278	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	06/07/2018
279	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	BRISAS_DEL_UPANO.pdf	06/07/2018
280	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	EL_FUTURO_DE_PATUCA.pdf	06/07/2018
281	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	ESPERANZAS_DEL_FUTURO.pdf	06/07/2018
282	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	HEROES_DE_LA_AMAZONIA.pdf	06/07/2018
283	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	KIMIUS.pdf	06/07/2018
284	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	LOS_CEDROS.pdf	06/07/2018
285	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	06/07/2018
286	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	MIRADOR_SHAIME.pdf	06/07/2018
287	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	PACHECO_ALVAREZ.pdf	06/07/2018
288	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	RIO_BLANCO.pdf	06/07/2018
289	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	06/07/2018
290	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	SAN_VICENTE_FERRER.pdf	06/07/2018
291	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TIWINZA.pdf	06/07/2018
292	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	06/07/2018
293	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TRES_DE_OCTUBRE.pdf	06/07/2018
294	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	UNIDOS_CONSERVANDO_VIAS.pdf	06/07/2018
295	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	VALLE_DEL_RIO.pdf	06/07/2018
296	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	ZUÑAG-19_DE_AGOSTO.pdf	06/07/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
297	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23604.pdf	05/07/2019
298	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23605.pdf	05/07/2019
299	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23606.pdf	05/07/2019
300	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23607.pdf	05/07/2019
301	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23608.pdf	05/07/2019
302	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23609.pdf	05/07/2019
303	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23610.pdf	05/07/2019
304	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23611.pdf	05/07/2019
305	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23612.pdf	05/07/2019
306	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23614.pdf	05/07/2019
307	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.6.pdf	06/05/2014
308	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.7.pdf	06/05/2014
309	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.8.pdf	06/05/2014
310	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.9.pdf	06/05/2014
311	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.1.pdf	06/05/2014
312	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.2.pdf	06/05/2014
313	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.3.pdf	06/05/2014
314	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	I.6.pdf	07/05/2014
315	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	I.8.pdf	07/05/2014
316	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.1.pdf	07/05/2014
317	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.3.pdf	07/05/2014
318	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.5.pdf	07/05/2014
319	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.1.pdf	06/04/2015
320	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.2.pdf	06/04/2015
321	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.3.pdf	06/04/2015
322	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.4.pdf	06/04/2015
323	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.5.pdf	06/04/2015
324	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.6.pdf	06/04/2015
325	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.7.pdf	06/04/2015
326	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	3_DE_OCTUBRE_20564.pdf	05/04/2018
327	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	9_DE_OCTUBRE_20559.pdf	05/04/2018
328	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	16_DE_ABRIL_- KALAGLAS_20565.pdf	05/04/2018
329	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	21_DE_MARZO_20557.pdf	05/04/2018
330	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	BRISAS_DEL_SANGAY_20558.pdf	05/04/2018
331	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	ESPERANZA_DEL_FUTURO_20561.pdf	05/04/2018
332	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	FUTURO_DE_PATUCA_20568.pdf	05/04/2018
333	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	HEROES_DE_LA_AMAZONIA_20556.pdf	05/04/2018
334	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	KIMIUS_20569.pdf	05/04/2018
335	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	LOS_CEDROS_20566.pdf	05/04/2018
336	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO_20563.pdf	05/04/2018
337	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	RIO_BLANCO_20560.pdf	05/04/2018
338	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA_20567.pdf	05/04/2018
339	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	VALLE_DEL_RIO_20562.pdf	05/04/2018
340	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	20566.pdf	04/05/2018
341	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21489.pdf	05/04/2019
342	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21493.pdf	05/04/2019
343	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21494.pdf	05/04/2019
344	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21495.pdf	05/04/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
345	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21498.pdf	05/04/2019
346	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21500.pdf	05/04/2019
347	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21503.pdf	05/04/2019
348	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21504.pdf	05/04/2019
349	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21507.pdf	05/04/2019
350	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21508.pdf	05/04/2019
351	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21509.pdf	05/04/2019
352	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21512.pdf	05/04/2019
353	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21513.pdf	05/04/2019
354	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21514.pdf	05/04/2019
355	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21515.pdf	05/04/2019
356	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21546.pdf	05/04/2019
357	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21501.pdf	05/04/2019
358	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21499.pdf	05/04/2019
359	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21545.pdf	05/04/2019
360	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21560.pdf	05/04/2019
361	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21510.pdf	05/04/2019
362	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21505.pdf	05/04/2019
363	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21502.pdf	05/04/2019
364	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.4.pdf	06/05/2014
365	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.5.pdf	06/05/2014
366	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.6.pdf	06/05/2014
367	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.7.pdf	06/05/2014
368	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.8.pdf	06/05/2014
369	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.9.pdf	06/05/2014
370	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	G.1.pdf	06/05/2014
371	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	G.2.pdf	06/05/2014
372	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	J.8.pdf	04/06/2014
373	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	J.9.pdf	04/06/2014
374	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.1.pdf	04/06/2014
375	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.2.pdf	04/06/2014
376	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.3.pdf	04/06/2014
377	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.4.pdf	04/06/2014
378	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	H.6.pdf	07/05/2014
379	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.5.pdf	02/12/2014
380	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.6.pdf	02/12/2014
381	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.7.pdf	02/12/2014
382	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.8.pdf	02/12/2014
383	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.9.pdf	02/12/2014
384	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	O.1.pdf	02/12/2014
385	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	O.2.pdf	02/12/2014
386	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18638.pdf	04/12/2017
387	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18642.pdf	04/12/2017
388	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18645.pdf	04/12/2017
389	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18646.pdf	04/12/2017
390	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18656.pdf	04/12/2017
391	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18658.pdf	04/12/2017
392	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18660.pdf	04/12/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
393	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18661.pdf	04/12/2017
394	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18662.pdf	04/12/2017
395	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18682.pdf	04/12/2017
396	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18931.pdf	04/12/2017
397	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18644_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
398	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18659_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
399	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18932_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
400	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_19118_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
401	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18641_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
402	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18643_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
403	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18640_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
404	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18639_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
405	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18637_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
406	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21489.pdf	05/12/2018
407	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21493.pdf	05/12/2018
408	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21503.pdf	05/12/2018
409	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21504.pdf	05/12/2018
410	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21508.pdf	05/12/2018
411	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21509.pdf	05/12/2018
412	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21512.pdf	05/12/2018
413	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21513.pdf	05/12/2018
414	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21515.pdf	05/12/2018
415	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21546.pdf	05/12/2018
416	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21489.pdf	05/12/2018
417	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21494.pdf	05/12/2018
418	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21495.pdf	05/12/2018
419	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21498.pdf	05/12/2018
420	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21500.pdf	05/12/2018
421	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21507.pdf	05/12/2018
422	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21514.pdf	05/12/2018
423	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013	H.5.pdf	07/05/2014
424	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.7.pdf	05/11/2014
425	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.8.pdf	05/11/2014
426	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.9.pdf	05/11/2014
427	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.1.pdf	05/11/2014
428	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.2.pdf	05/11/2014
429	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.3.pdf	05/11/2014
430	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.4.pdf	05/11/2014
431	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18637.pdf	01/11/2017
432	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18639.pdf	01/11/2017
433	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18641.pdf	01/11/2017
434	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18643.pdf	01/11/2017
435	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18644.pdf	01/11/2017
436	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18659.pdf	01/11/2017
437	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18932.pdf	01/11/2017
438	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_19118.pdf	01/11/2017
439	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21493.pdf	05/11/2018
440	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21498.pdf	05/11/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
441	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21500.pdf	05/11/2018
442	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21503.pdf	05/11/2018
443	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21504.pdf	05/11/2018
444	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21507.pdf	05/11/2018
445	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21508.pdf	05/11/2018
446	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21512.pdf	05/11/2018
447	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21513.pdf	05/11/2018
448	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21546.pdf	05/11/2018
449	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.3.pdf	06/05/2014
450	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.4.pdf	06/05/2014
451	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.5.pdf	06/05/2014
452	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	L.8.pdf	06/10/2014
453	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	L.9.pdf	06/10/2014
454	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.1.pdf	06/10/2014
455	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.2.pdf	06/10/2014
456	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.3.pdf	06/10/2014
457	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.4.pdf	06/10/2014
458	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.5.pdf	06/10/2014
459	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21489.pdf	04/10/2018
460	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21493.pdf	04/10/2018
461	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21494.pdf	04/10/2018
462	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21495.pdf	04/10/2018
463	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21499.pdf	04/10/2018
464	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21501.pdf	04/10/2018
465	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21502.pdf	04/10/2018
466	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21503.pdf	04/10/2018
467	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21504.pdf	04/10/2018
468	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21505.pdf	04/10/2018
469	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21508.pdf	04/10/2018
470	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21509.pdf	04/10/2018
471	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21510.pdf	04/10/2018
472	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21512.pdf	04/10/2018
473	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21513.pdf	04/10/2018
474	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21514.pdf	04/10/2018
475	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21515.pdf	04/10/2018
476	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21545.pdf	04/10/2018
477	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21546.pdf	04/10/2018
478	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21560.pdf	04/10/2018
479	INFORME MECANICO JULIO 2016	W.7.xls	05/08/2016
480	INFORME MECANICO ABRIL 2015	S.8.xls	06/05/2015
481	INFORME MECANICO ABRIL 2016	W.3.xls	04/05/2016
482	INFORME MECANICO AGOSTO 2014	K.4.xls	05/09/2014
483	INFORME MECANICO DICIEMBRE 2015	U.6.xls	06/01/2016
484	INFORME MECANICO ENERO 2016	U.8.xls	03/02/2016
485	INFORME MECANICO JULIO 2015	T.2.xls	12/08/2015
486	INFORME MECANICO JUNIO 2015	T.1.xls	08/07/2015
487	INFORME MECANICO MARZO 2015	S.8.xls	06/04/2015
488	INFORME MECANICO MARZO 2016	INFORME_MECANICO_MARZO_2016.xls	05/04/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
489	INFORME MECANICO MAYO 2015	S.9.xls	05/06/2015
490	INFORME MECANICO MAYO 2016	V.8.xls	03/06/2016
491	INFORME MECANICO NOVIEMBRE 2015	U.4.xls	03/12/2015
492	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2014	M.6.xls	07/10/2014
493	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2016	Y.1.pdf	04/10/2016
494	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2016	Y.2.xls	04/10/2016
495	INFORME MECÁNICO NOVIEMBRE 2014	O.3.xls	05/12/2014
496	INSPECCIÓN FALLAS GEOLOGICAS PARA MANTENIMIENTO	K.8.doc	08/09/2014
497	INSPECCIÓN FALLAS GEOLOGICAS PARA MANTENIMIENTO	K.9.doc	08/09/2014
498	MANTENIMIENTO CARRETERA GUALAQUIZA - MATANGA	K.6.pdf	03/07/2014
499	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS	T.8.doc	06/11/2015
500	MANTENIMIENTO VIAL PLAN DE MILAGRO - SAN JUAN BOSCO	K.7.pdf	03/07/2014
501	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA	K.5.pdf	03/07/2014
502	MTOP-ADM_MOR-2016-8-ME	V.1.pdf	03/02/2016
503	mtop-cgp-2016-30-me	V.4.pdf	04/02/2016
504	MTOP-CON_MOR-2016-22-ME	V.2.pdf	03/02/2016
505	MTOP-CON_MOR-2016-24-ME	V.3.pdf	03/02/2016
506	MTOP-CON_MOR-2016-24-ME	V.5.pdf	04/02/2016
507	MTOP-CONS_MOR-2016-1-ME	V.6.pdf	04/02/2016
508	MTOP-DDMS-2016-390-ME	W.5.pdf	04/05/2016
509	MTOP-DDMS-2016-465-ME	V.9.pdf	03/06/2016
510	MTOP-DDMS-2016-491-ME	MTOP-DDMS-2016-491-ME.pdf	05/07/2016
511	MTOP-DDMS-2016-609-ME	W.9.pdf	05/08/2016
512	MTOP-DDMS-2016-808-ME	W.9.pdf	05/12/2016
513	MTOP-DPMS-2015-605-ME	T.3.pdf	12/08/2015
514	MTOP-DPMS-2015-945-ME-1	U.3.pdf	03/12/2015
515	MTOP-DPMS-2016-53-ME	V.7.pdf	04/02/2016
516	MTOP-DPMS-2016-79-ME	V.8.pdf	04/02/2016
517	MTOP-FINAN_MOR-2016-3-ME	V.9.pdf	04/02/2016
518	ORDEN DE COMPRA 16 DE ABRIL - KALAGLAS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_16_DE_ABRIL_-_KALAGLAS.pdf	05/04/2017
519	ORDEN DE COMPRA 16 DE ABRIL - KALAGLAS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_16_DE_ABRIL_-_KALAGLAS_2019.pdf	02/05/2019
520	ORDEN DE COMPRA 21 DE MARZO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_21_DE_MARZO.pdf	05/04/2017
521	ORDEN DE COMPRA 21 DE MARZO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_21_DE_MARZO_2019.pdf	02/05/2019
522	ORDEN DE COMPRA 5 DE AGOSTO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_5_DE_AGOSTO_2019.pdf	02/05/2019
523	ORDEN DE COMPRA 9 DE OCTUBRE 2019	ORDEN_DE_COMPRA_9_DE_OCTUBRE_2019.pdf	02/05/2019
524	ORDEN DE COMPRA 9 DE OCTUBRE/2017	ORDEN_DE_COMPRA_9_DE_OCTUBRE.pdf	05/04/2017
525	ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL SANGAY 2017	ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	05/04/2017
526	ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL SANGAY 2019	ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_SANGAY_2019.pdf	02/05/2019
527	ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL UPANO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_UPANO.pdf	05/04/2017
528	ORDEN DE COMPRA CASCADAS DE CUGUSHA	ORDEN_DE_COMPRA_CASCADAS_DE_CUGUSHA.pdf	03/05/2017
529	ORDEN DE COMPRA EL FUTURO DE PATUCA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_EL_FUTURO_DE_PATUCA_2019.pdf	02/05/2019
530	ORDEN DE COMPRA ESPERANZAS DEL FUTURO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_ESPERANZAS_DEL_FUTURO.pdf	05/04/2017
531	ORDEN DE COMPRA ESPERANZAS DEL FUTURO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_ESPERANZAS_DEL_FUTURO_2019.pdf	02/05/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
532	ORDEN DE COMPRA HEROES DE LA AMAZONIA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_HEROES_DE_LA_AMAZONIA_2019.pdf	02/05/2019
533	ORDEN DE COMPRA KIMIUS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_KIMIUS_2019.pdf	02/05/2019
534	ORDEN DE COMPRA LOS CEDROS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_LOS_CEDROS.pdf	05/04/2017
535	ORDEN DE COMPRA LOS CEDROS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_LOS_CEDROS_2019.pdf	02/05/2019
536	ORDEN DE COMPRA LUCHANDO POR EL FUTURO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	05/04/2017
537	ORDEN DE COMPRA MARZO2017_MIRADOR SHAIME 2017	ORDEN_DE_COMPRA_MARZO2017_MIRADOR_SHAIME-1050.pdf	05/04/2017
538	ORDEN DE COMPRA PACHECO ALVAREZ	ORDEN_DE_COMPRA_PACHECO_ALVAREZ.pdf	03/05/2017
539	ORDEN DE COMPRA RIO BLANCO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_RIO_BLANCO_2019.pdf	02/05/2019
540	ORDEN DE COMPRA SAN PEDRO DE GUALAQUIZA 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	05/04/2017
541	ORDEN DE COMPRA SAN PEDRO DE GUALAQUIZA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA_2019.pdf	02/05/2019
542	ORDEN DE COMPRA SAN VICENTE FERRER 2019	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_VICENTE_FERRER_2019.pdf	02/05/2019
543	ORDEN DE COMPRA TIWINTZA 2017	ORDEN_DE_COMPRA_TIWINTZA.pdf	05/04/2017
544	ORDEN DE COMPRA TIWINTZA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_TIWINTZA_2019.pdf	02/05/2019
545	ORDEN DE COMPRA TRANSFORMANDO VIAS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	05/04/2017
546	ORDEN DE COMPRA TRANSFORMANDO VIAS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_TRANSFORMANDO_VIAS_2019.pdf	02/05/2019
547	ORDEN DE COMPRA UNIDOS CONSERVANDO VIAS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_UNIDOS_CONSERVANDO_VIAS_2019.pdf	02/05/2019
548	ORDEN DE COMPRA VALLE DEL RIO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_VALLE_DEL_RIO_2019.pdf	02/05/2019
549	ORDEN DE COMPRA ZUÑAC 19 DE AGOSTO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_ZUÑAC_19_DE_AGOSTO_2019.pdf	02/05/2019
550	orden de compra_mantenimiento vial-sucua-logroño	V.7.pdf	03/06/2016
551	PINTURA DE LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS JURUMBAINO, BLANCO, TIMBIANA Y ARAPICOS	L.6.pdf	16/09/2014
552	RECORRIDO INSPECCION FUNCIONARIOS	T.9.doc	01/12/2015
553	REPORTE DE MAQUINARIA NOVIEMBRE 2015	U.5.pdf	03/12/2015
554	REPORTE DE PRESUPUESTO ABRIL 2014	O.7.pdf	24/12/2014
555	REPORTE DE PRESUPUESTO AGOSTO 2014	P.2.pdf	24/12/2014
556	REPORTE DE PRESUPUESTO DICIEMBRE 2014	P.6.pdf	24/12/2014
557	REPORTE DE PRESUPUESTO ENERO 2014	O.4.pdf	24/12/2014
558	REPORTE DE PRESUPUESTO FEBRERO 2014	O.5.pdf	24/12/2014
559	REPORTE DE PRESUPUESTO JULIO 2014	P.1.pdf	24/12/2014
560	REPORTE DE PRESUPUESTO JUNIO 2014	O.9.pdf	24/12/2014
561	REPORTE DE PRESUPUESTO MARZO 2014	O.6.pdf	24/12/2014
562	REPORTE DE PRESUPUESTO MAYO 2014	O.8.pdf	24/12/2014
563	REPORTE DE PRESUPUESTO NOVIEMBRE 2014	P.5.pdf	24/12/2014
564	REPORTE DE PRESUPUESTO OCTUBRE 2014	P.4.pdf	24/12/2014
565	REPORTE DE PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2014	P.3.pdf	24/12/2014
566	REPORTE GRAFICO ABRIL 2016	W.4.pdf	04/05/2016
567	REPORTE LEGALIZADO ENERO 2016	U.9.pdf	03/02/2016
568	REPORTE MECANICO OCTUBRE 2015	T.7.xls	06/11/2015
569	REPORTE MECANICO SEPTIEMBRE	T.5.pdf	07/10/2015
570	REPORTE MECANICO SEPTIEMBRE	T.6.xls	07/10/2015
571	resolucion_de_contratacion_transformando_vias	resolucion_de_contratacion_transformando_vias.doc	05/07/2016
572	RESUMEN DICIEMBRE 2015	U.7.pdf	06/01/2016
573	RESUMEN INFORME MECANICO JULIO 2016	W.8.pdf	05/08/2016
574	SAN PEDRO DE GUALAQUIZA	W.6.pdf	05/08/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
575	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIA GUALAQUIZA - CHIGUINDA	J.7.pdf	07/05/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	FINANCIERO MTOP			
	ANALISTA ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO MTOP			
Jaramillo Vintimilla, José Francisco	PATROCINADOR EJECUTIVO MTOP	Subsecretario Zonal 6	jjaramillo@mtop.gob.ec	
Saavedra Correa, Jose Luis	ADMINISTRADOR DEL PROYECTO MTOP	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Morona Santiago	jsaavedra@mtop.gob.ec	64021
Tipan Guañuna, Jairo Fernando	SUPERVISOR VIAL MTOP ETAPA DE MANTENIMIENTO	Coordinador Técnico de Infraestructura Distrital/ Líder de Proyecto	jtipan@mtop.gob.ec	64213

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
38711_1.jpg	02/07/2019
